BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
6 Boulevard Archimède

77420 CHAMPS SUR MARNE

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 31595507/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 30/10/2026

Référence au programme de travaux :
Mail du donneur d'ordre Mail réalisé le 13/02/2026 par Samir CHERRADOU

DONNEUR D'ORDRE

DOUANE - RUNGIS

Samir CHERRADOU
3 RUE DE LA CORDERIE
94550 CHEVILLY LARUE

SITE D'INTERVENTION

DOUANE RUNGIS DBE

3 RUE DE LA CORDERIE
94550 CHEVILLY LARUE

BUREAU R1

Latitude : 48.760400 / Longitude : 2.362200

Date(s) d'intervention(s) :
Le 09/04/2026 ; Le 28/09/2026 ; Le 29/10/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Moh Ouhand DAHOUN	Diagnostiqueur immobilier	Certification N° 8168329	Moh Ouhand DAHOUN

Le présent rapport comporte 52 pages, dont 36 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 6
2.2. Remarque(s) complémentaire(s) 6
2.3. Obligations réglementaires 7

3. INFORMATIONS GENERALES **8**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 8
3.2. Parties prenantes 8

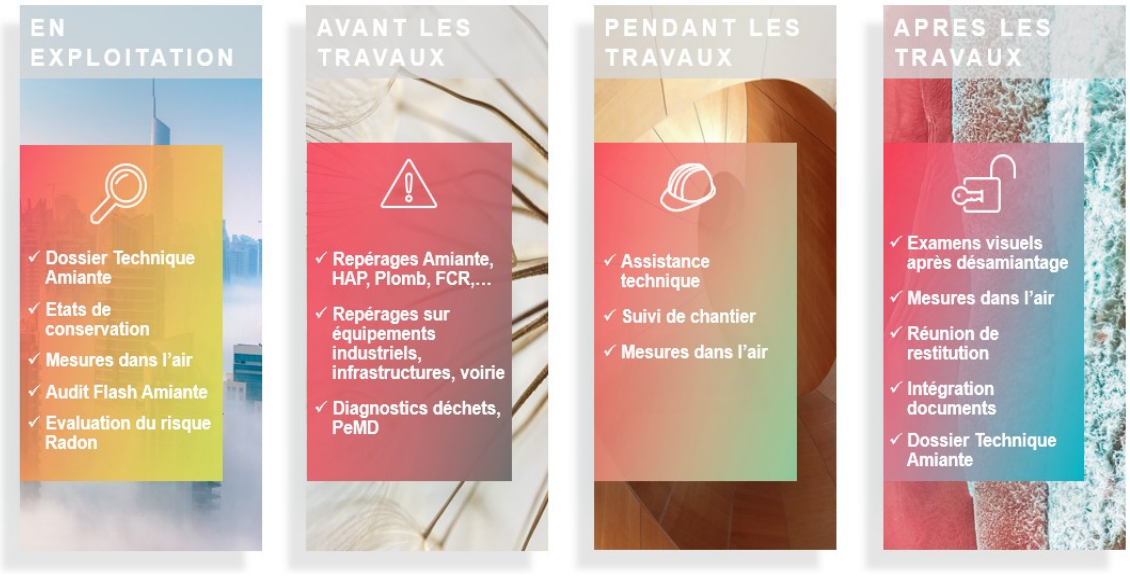
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **8**
4.1. Références réglementaires 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **9**
5.1. Date(s) de visite(s) 9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 9
5.3. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **10**
6.1. Matériaux et produits repérés 10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 16

7. ANNEXES **17**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 17
7.2. Photos prélèvements 18
7.3. Photos sondages 24
7.4. Attestation d'assurance 26
7.5. Certificat de compétence 28
7.6. Croquis de repérage 29
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire 32

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Rénovation des bureaux Descriptif: du 28/02/2025 -peinture mur des vestiaires et salle de réunion -faïence mur et carrelage sol des douches -Sol souple dans les vestiaires et salle de réunion

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs
Plinthes	Peintures plinthes
Portes	Peintures
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs portes, Joints bandes portes, Joints portes, Joints tresses portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Portes phoniques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits projetés charpente, Enduits projetés/talochés charpente, Flocages charpente, Joints charpentes, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures charpente, Peintures intumescentes charpente, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions entre panneaux, Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds
Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres, Enduits projetés poutres, Enduits projetés/talochés poutres, Entourages de poutres, Flocages poutres, Joints poutres, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures poutres, Revêtements bitumineux poutres
Suspentes et contrevents	Flocages suspentes, Peintures suspentes, Projections en plâtre suspentes
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints cantonnement planchers, Joints carrelage, Joints dilatation/assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures sol, Plaques fibrociment sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous couche moquette, Sous-couches revêtements souples

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

R+1
Bureau 1 à 5 - Dégagement 1 et 2

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
4	R+1 -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc
4	R+1 -> Bureau 2				
4	R+1 -> Bureau 3				
4	R+1 -> Bureau 4				
4	R+1 -> Bureau 5				
4	R+1 -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron
4	R+1 -> Bureau 2				
4	R+1 -> Bureau 3				
4	R+1 -> Bureau 4				
4	R+1 -> Bureau 5				

2.2. Remarque(s) complémentaire(s)

Concernant la ZPSO4, le laboratoire d'analyse a identifié la présence d'amiante dans les composants suivant : Matériau de type Maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron). Du fait de l'hétérogénéité des résultats d'analyse, la présence d'amiante est étendue a l'ensemble de la ZPSO

En date du Jeudi 8 Octobre 2026 le donneur d'ordre Monsieur Menad BENNABI nous a confirmer que le doublage ne sera pas concerné par les travaux, les volume à l'intérieur des doublages ne seront pas touché par ces travaux. Il n'y aura pas de percement pour passage de réseaux dans cette partie (Coté vitrage et fenêtre au R+1).

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DOUANE RUNGIS DBE
3 RUE DE LA CORDERIE
94550 CHEVILLY LARUE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DOUANE RUNGIS DBE	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Samir CHERRADOU	Donneur d'ordre	DOUANE - RUNGIS	3 RUE DE LA CORDERIE 94550 CHEVILLY LARUE	09 70 27 16 38

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 09/04/2026
Le 28/09/2026
Le 29/10/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Mail du donneur d'ordre	Samir CHERRADOU	13/02/2026	Mail	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 1	Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres	Ciment	Gris	10	P20* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Ciment	Gris	9	P21* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits projetés/talochés poteaux	Ciment, Peint	Gris	3	P7* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4 (i)	P10* N	/	AN	/	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	P10* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4 (i)	P10* N	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4 (i)	P26 N	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	P26 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4 (i)	P26 N	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4 (i)	P27 N	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	P27 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4 (i)	P27 N	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4 (i)	P28 N	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	P28 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4 (i)	P28 N	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc, Marron	12	P30* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4	/	S5	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	/	S5	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4	/	S5	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4	/	S6	AN	/	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	/	S6	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4	/	S6	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4	/	S7	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	/	S7	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4	/	S7	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Peint, Plâtre	Blanc	6	/	S8	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	1	/	S1	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	/	S1	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Ciment	Gris	9	P18 N	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres	Ciment	Gris	10	P19 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	1	P2 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P2 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Bois, Peint	/	5	P11* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4 (i)	P25 N	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	P25 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4 (i)	P25 N	/	AN	/	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Bois, Peint	/	5	/	S3	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	1	P3 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	P3 N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits projetés/talochés poteaux	Ciment, Peint	Gris	3	P8 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc, Marron	12	P29 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4 (i)	P31 N	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	P31 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4 (i)	P31 N	/	AN	/	***Oui***
R+1 -> Bureau 4	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	P4* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	2	P4* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Marron	2	P4* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mastic	Gris	13	P34* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4	Idem P 9	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	Idem P 9	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4	Idem P 9	/	AN	/	***Oui***
R+1 -> Bureau 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Bois, Peint	/	5	/	S4	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Peint, Plâtre	Blanc	6	/	S9	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4	P9 P	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	P9 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4	P9 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	P5 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	2	P5 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Marron	2	P5 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Bois, Peint	/	5	P12 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4 (i)	P23 N	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	P23 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4 (i)	P23 N	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Toile	Blanc	4 (i)	P24 N	/	AN	/	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	Blanc	4	P24 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Marron	4 (i)	P24 N	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mastic	Gris	13	P35 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Dégagement 1	Faux plafonds	Plaques	Laine de roche	Beige	11	P22* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Dégagement 1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Moquette	Foncé, Gris	8	P17* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Peint, Plâtre	Blanc	7	P15* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Peint, Plâtre	Blanc	6	P32* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Peint, Plâtre	Blanc	6	P33 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Bois, Peint	/	5	/	S11	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	1	/	S2	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	1	/	S2	AN	/	Non
R+1 -> Dégagement 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Bois, Peint	/	5	/	S10	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	2	P6 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	2	P6 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Marron	2	P6 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Peint, Plâtre	Blanc	6	P13 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Peint, Plâtre	Blanc	6	P14 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Peint, Plâtre	Blanc	7	P16 N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	33 m²
4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	33 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1	/
R+1 -> Bureau 1	/
R+1 -> Bureau 2	/
R+1 -> Bureau 3	/
R+1 -> Bureau 4	/
R+1 -> Bureau 5	/
R+1 -> Dégagement 1	/
R+1 -> Dégagement 2	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
R+1 -> Bureau 1	
	
Revêtements de sol -> Ragréages | Colles non bitumineuses	

P2	ZPSO 1
R+1 -> Bureau 2	
	
Revêtements de sol -> Ragréages | Colles non bitumineuses	

P3	ZPSO 1
R+1 -> Bureau 3	
	
Revêtements de sol -> Ragréages | Colles non bitumineuses	

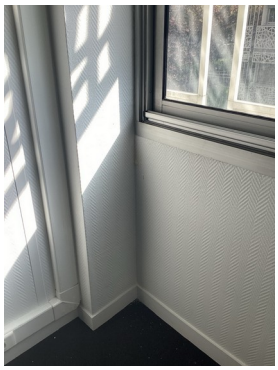
P4	ZPSO 2
R+1 -> Bureau 4	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment | Colles non bitumineuses | Ragréages	

P5	ZPSO 2
R+1 -> Bureau 5	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment | Colles non bitumineuses | Ragréages	

P6	ZPSO 2
R+1 -> Dégagement 2	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment | Colles non bitumineuses | Ragréages	

P7	ZPSO 3
R+1 -> Bureau 1	
	
Poteaux -> Enduits projetés/talochés poteaux	

P8	ZPSO 3
R+1 -> Bureau 3	
	
Poteaux -> Enduits projetés/talochés poteaux	

P9	ZPSO 4
R+1 -> Bureau 5	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

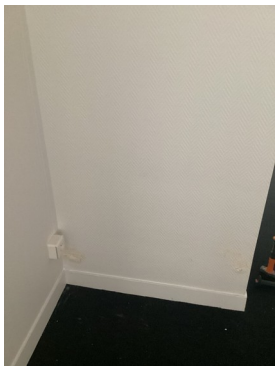
P10	ZPSO 4
R+1 -> Bureau 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Panneaux cloisons | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

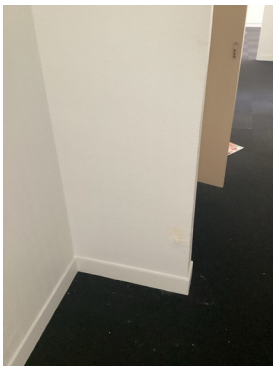
P11	ZPSO 5
R+1 -> Bureau 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

P12	ZPSO 5
R+1 -> Bureau 5	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

P13	ZPSO 6
R+1 -> Dégagement 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

P14	ZPSO 6
R+1 -> Dégagement 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

P15	ZPSO 7
R+1 -> Dégagement 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

P16	ZPSO 7
R+1 -> Dégagement 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

P17	ZPSO 8
R+1 -> Dégagement 1	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P18	ZPSO 9
R+1 -> Bureau 2	
	
Plafonds -> Enduits lissage/ragréage plafonds	

P19	ZPSO 10
R+1 -> Bureau 2	
	
Poutres -> Enduits lissage/ragréage poutres	

P20	ZPSO 10
R+1 -> Bureau 1	
	
Poutres -> Enduits lissage/ragréage poutres	

P21	ZPSO 9
R+1 -> Bureau 1	
	
Plafonds -> Enduits lissage/ragréage plafonds	

P22	ZPSO 11
R+1 -> Dégagement 1	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P23	ZPSO 4
R+1 -> Bureau 5	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Panneaux cloisons | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

P24	ZPSO 4
R+1 -> Bureau 5	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Panneaux cloisons | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

Copyright BUREAU VERITAS

P25	ZPSO 4
R+1 -> Bureau 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Panneaux cloisons | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

P26	ZPSO 4
R+1 -> Bureau 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Panneaux cloisons | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

P28	ZPSO 4
R+1 -> Bureau 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Panneaux cloisons | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

P29	ZPSO 12
R+1 -> Bureau 3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

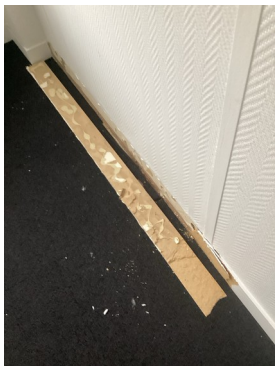
P30	ZPSO 12
R+1 -> Bureau 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

P31	ZPSO 4
R+1 -> Bureau 3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Panneaux cloisons | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

Copyright BUREAU VERITAS

P32	ZPSO 6
R+1 -> Dégagement 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

P33	ZPSO 6
R+1 -> Dégagement 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

P34	ZPSO 13
R+1 -> Bureau 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P35	ZPSO 13
R+1 -> Bureau 5	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

Copyright BUREAU VERITAS

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 1
R+1 -> Bureau 1	
	
Revêtements de sol -> Ragréages | Colles non bitumineuses	

S2	ZPSO 1
R+1 -> Dégagement 1	
	
Revêtements de sol -> Ragréages | Colles non bitumineuses	

S3	ZPSO 5
R+1 -> Bureau 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

S4	ZPSO 5
R+1 -> Bureau 5	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

S5	ZPSO 4
R+1 -> Bureau 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

S6	ZPSO 4
R+1 -> Bureau 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

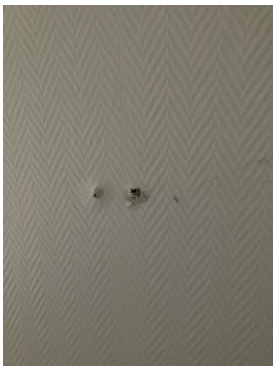
S7	ZPSO 4
R+1 -> Bureau 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales | Enduits finition plaques de plâtre verticales	

S8	ZPSO 6
R+1 -> Bureau 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

S8	ZPSO 6
R+1 -> Bureau 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

S9	ZPSO 6
R+1 -> Bureau 5	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés/talochés cloisons	

S10	ZPSO 5
R+1 -> Dégagement 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

S11	ZPSO 5
R+1 -> Dégagement 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

Copyright BUREAU VERITAS

7.4. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Moh Ouhand DAHOUN

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/11/2020	23/11/2027
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/11/2020	23/11/2027
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	14/03/2019	13/03/2024

Date : 02/05/2023
Numéro du certificat : 8160329

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au ci-dessus.
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOUANE RUNGIS DBE 3 RUE DE LA CORDERIE 94550 CHEVILLY LARUE	
Localisation R+1	Date visite	Le 09/04/2026
	Auteur	Moh Ouhand DAHOUN
	N° dossier	31595507/S1/1
	Planche	1 / 2
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Bandes calicot verticales + Enduits finition plaques de plâtre verticales

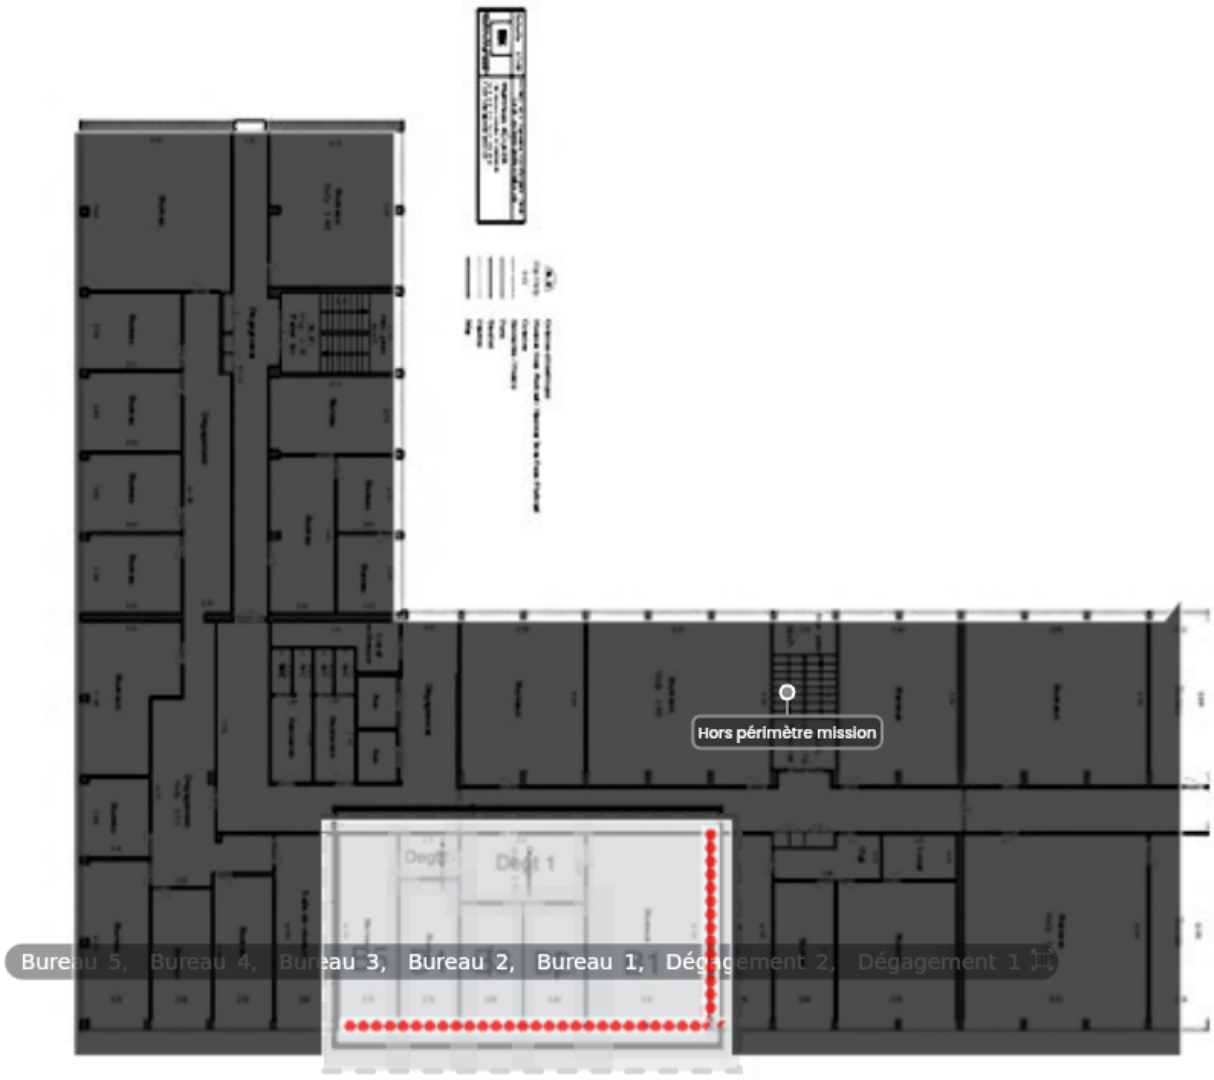


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DOUANE RUNGIS DBE 3 RUE DE LA CORDERIE 94550 CHEVILLY LARUE	
Localisation R+1	Date visite	Le 09/04/2026
	Auteur	Moh Ouhand DAHOUN
	N° dossier	31595507/S1/1
	Planche	2 / 2
	Indice	1

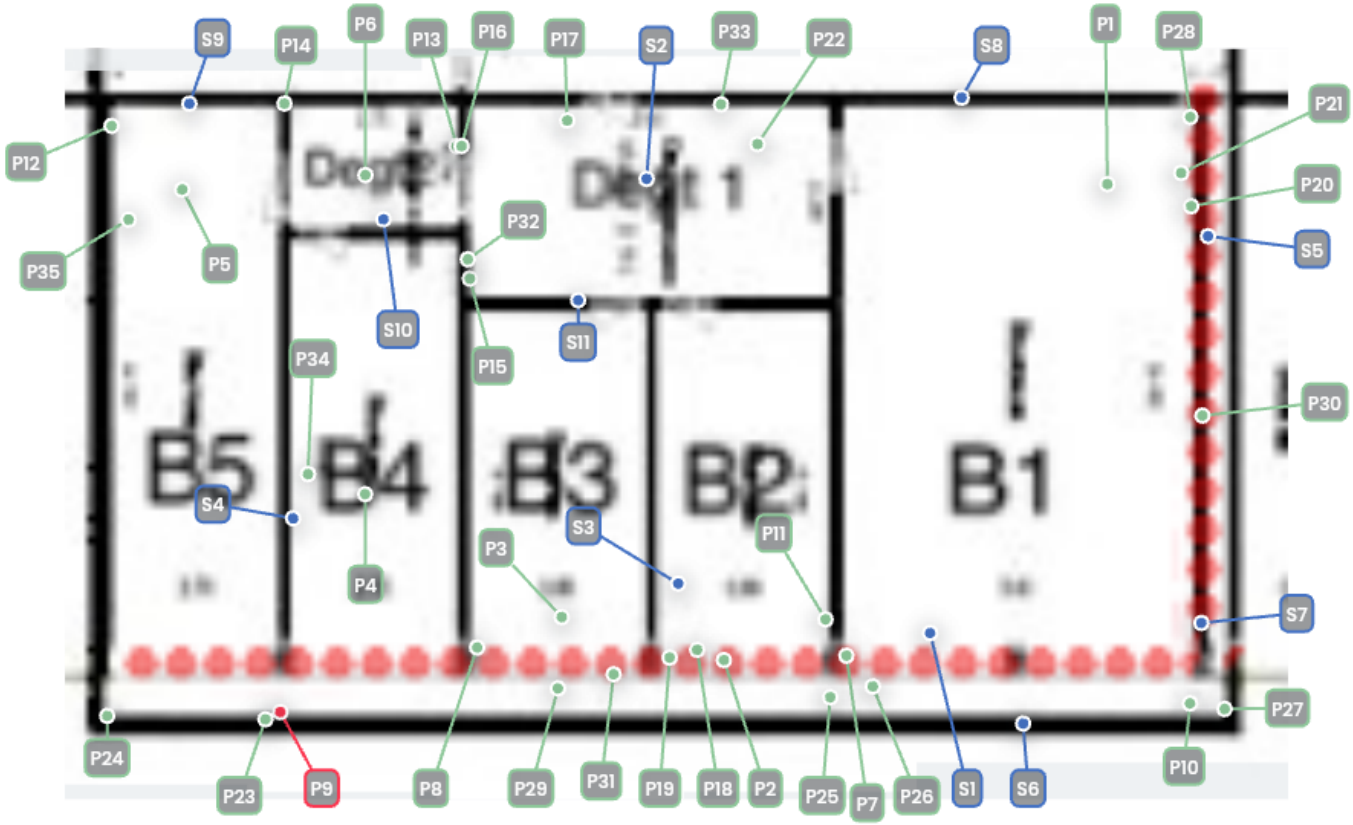
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Bandes calicot verticales + Enduits finition plaques de plâtre verticales

Localisation de la zone isolée





LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Moh Ouhand DAHOUN
6 Boulevard d'Archimède
77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-26-LE-111942-01

Numéro de dossier : 26A013741
Référence de dossier : 1510797622/31595507/S1/1/1_31595507/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26A013741-001 - Référence *EUROFINS250000050742 Réf. Prel : P1 R+1 - Bureau 1/Revêtements de sol : Ragréages / Colles non bitumineuses - (Ragréage/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-002 - Référence *EUROFINS250000050744 Réf. Prel : P2 R+1 - Bureau 2/Revêtements de sol : Ragréages / Colles non bitumineuses - (Ragréage/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-003 - Référence *EUROFINS250000050688 Réf. Prel : P3 R+1 - Bureau 3/Revêtements de sol : Ragréages / Colles non bitumineuses - (Ragréage/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-004 - Référence *EUROFINS250000050743 Réf. Prel : P4 R+1 - Bureau 4/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-005 - Référence *EUROFINS250000050739 Réf. Prel : P5 R+1 - Bureau 5/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-006 - Référence *EUROFINS250000050740 Réf. Prel : P6 R+1 - Dégagement 2/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-007 - Référence *EUROFINS250000050685 Réf. Prel : P7 R+1 - Bureau 1/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Peint/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-008 - Référence *EUROFINS250000050686 Réf. Prel : P8 R+1 - Bureau 3/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Peint/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-009 - Référence *EUROFINS250000050680 Réf. Prel : P9 R+1 - Bureau 5/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier, Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-010 - Référence *EUROFINS250000050681 Réf. Prel : P10 R+1 - Bureau 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier, Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-011 - Référence *EUROFINS250000050678 Réf. Prel : P11 R+1 - Bureau 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) - (Bois, Peint/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-012 - Référence *EUROFINS250000050676 Réf. Prel : P12 R+1 - Bureau 5/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) - (Bois, Peint/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-013 - Référence *EUROFINS250000050679 Réf. Prel : P13 R+1 - Dégagement 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-014 - Référence *EUROFINS250000050675 Réf. Prel : P14 R+1 - Dégagement 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-015 - Référence *EUROFINS250000050677 Réf. Prel : P15 R+1 - Dégagement 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-016 - Référence *EUROFINS250000050674 Réf. Prel : P16 R+1 - Dégagement 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-017 - Référence *EUROFINS250000050672 Réf. Prel : P17 R+1 - Dégagement 1/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) - (Moquette/Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-018 - Référence *EUROFINS250000050673 Réf. Prel : P18 R+1 - Bureau 2/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-019 - Référence *EUROFINS250000050671 Réf. Prel : P19 R+1 - Bureau 2/Poutres : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-020 - Référence *EUROFINS250000050670 Réf. Prel : P20 R+1 - Bureau 1/Poutres : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-021 - Référence *EUROFINS250000050669 Réf. Prel : P21 R+1 - Bureau 1/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A013741-022 - Référence *EUROFINS250000050682 Réf. Prel : P22 R+1 - Dégagement 1/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Laine de roche/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-024763-01 — Date d'émission de rapport : 18/04/2026 5:23 —
Référence laboratoire N° : 26RI024873 — Référence de suivi du dossier N° : 26A013741
Reçu au laboratoire le : 14/04/2026 — Date de réception :13/04/2026
Date d'analyse : 16/04/2026
Référence dossier Client:26A013741 - 1510797622/31595507/S1/1/1_31595507/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26A013741-001 - EUROFINS250000050 42 Réf. Prel : P1 R+1 - Bureau 1/Revêtements de sol : Ragréages / Colles non bitumineuses - (Ragréage/Gris)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type ciment (blanc)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26A013741-002 - EUROFINS250000050 44 Réf. Prel : P2 R+1 - Bureau 2/Revêtements de sol : Ragréages / Colles non bitumineuses - (Ragréage/Gris)	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type ciment (blanc)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26A013741-003 - EUROFINS250000050 88 Réf. Prel : P3 R+1 - Bureau 3/Revêtements de sol : Ragréages / Colles non bitumineuses - (Ragréage/Gris)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-024763-01
Référence laboratoire N° : 26RI024873
Reçu au laboratoire le : 14/04/2026
Date d'analyse : 16/04/2026
Référence dossier Client:26A013741 - 1510797622/31595507/S1/1/1_31595507/1/1

Date d'émission de rapport : 18/04/2026 5:23
Référence de suivi du dossier N° : 26A013741
Date de réception :13/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	26A013741-004 - EUROFINS250000050 43 Réf. Prel : P4 R+1 - Bureau 4/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26A013741-005 - EUROFINS250000050 39 Réf. Prel : P5 R+1 - Bureau 5/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment (beige)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	26A013741-006 - EUROFINS250000050 40 Réf. Prel : P6 R+1 - Dégagement 2/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-024763-01
Référence laboratoire N° : 26RI024873
Reçu au laboratoire le : 14/04/2026
Date d'analyse : 16/04/2026
Référence dossier Client:26A013741 - 1510797622/31595507/S1/1/1_31595507/1/1

Date d'émission de rapport : 18/04/2026 5:23
Référence de suivi du dossier N° : 26A013741
Date de réception :13/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	26A013741-007 - EUROFINS250000050 85 Réf. Prel : P7 R+1 - Bureau 1/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26A013741-008 - EUROFINS250000050 86 Réf. Prel : P8 R+1 - Bureau 3/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	26A013741-009 - EUROFINS250000050 80 Réf. Prel : P9 R+1 - Bureau 5/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier, Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	**MET** / L4FJ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / CV3T	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	26A013741-010 - EUROFINS250000050 81 Réf. Prel : P10 R+1 - Bureau 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier, Plâtre/Blanc)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-024763-01
Référence laboratoire N° : 26RI024873
Reçu au laboratoire le : 14/04/2026
Date d'analyse : 16/04/2026
Référence dossier Client:26A013741 - 1510797622/31595507/S1/1/1_31595507/1/1

Date d'émission de rapport : 18/04/2026 5:23
Référence de suivi du dossier N° : 26A013741
Date de réception :13/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	**MET** / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / CV3T	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	26A013741-011 - EUROFINS250000050 78 Réf. Prel : P11 R+1 - Bureau 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) - (Bois, Peint/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26A013741-012 - EUROFINS250000050 76 Réf. Prel : P12 R+1 - Bureau 5/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) - (Bois, Peint/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-024763-01
Référence laboratoire N° : 26RI024873
Reçu au laboratoire le : 14/04/2026
Date d'analyse : 16/04/2026
Référence dossier Client:26A013741 - 1510797622/31595507/S1/1/1_31595507/1/1

Date d'émission de rapport : 18/04/2026 5:23
Référence de suivi du dossier N° : 26A013741
Date de réception :13/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	26A013741-013 - EUROFINS250000050 79 Réf. Prel : P13 R+1 - Dégagement 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Peint/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26A013741-014 - EUROFINS250000050 75 Réf. Prel : P14 R+1 - Dégagement 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Peint/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	26A013741-015 - EUROFINS250000050 77 Réf. Prel : P15 R+1 - Dégagement 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Peint/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-024763-01
Référence laboratoire N° : 26RI024873
Reçu au laboratoire le : 14/04/2026
Date d'analyse : 16/04/2026
Référence dossier Client:26A013741 - 1510797622/31595507/S1/1/1_31595507/1/1

Date d'émission de rapport : 18/04/2026 5:23
Référence de suivi du dossier N° : 26A013741
Date de réception :13/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	26A013741-016 - EUROFINS250000050 74 Réf. Prel : P16 R+1 - Dégagement 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Peint/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	26A013741-017 - EUROFINS250000050 72 Réf. Prel : P17 R+1 - Dégagement 1/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) - (Moquette/Gris, Foncé)	Matériau souple fibreux de type moquette (noir)	**MET** / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	26A013741-018 - EUROFINS250000050 73 Réf. Prel : P18 R+1 - Bureau 2/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	26A013741-019 - EUROFINS250000050 71 Réf. Prel : P19 R+1 - Bureau 2/Poutres : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-024763-01 | Date d'émission de rapport : 18/04/2026 5:23 |
Référence laboratoire N° : 26RI024873 | Référence de suivi du dossier N° : 26A013741
Reçu au laboratoire le : 14/04/2026 | Date de réception :13/04/2026
Date d'analyse : 16/04/2026
Référence dossier Client:26A013741 - 1510797622/31595507/S1/1/1_31595507/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	26A013741-020 - EUROFINS250000050 70 Réf. Prel : P20 R+1 - Bureau 1/Poutres : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	26A013741-021 - EUROFINS250000050 69 Réf. Prel : P21 R+1 - Bureau 1/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)	Matériau (rouge) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	26A013741-022 - EUROFINS250000050 82 Réf. Prel : P22 R+1 - Dégagement 1/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Laine de roche/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / RV2T	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-024763-01
Référence laboratoire N° : 26RI024873
Reçu au laboratoire le : 14/04/2026
Date d'analyse : 16/04/2026
Date d'émission de rapport : 18/04/2026 5:23
Référence de suivi du dossier N° : 26A013741
Date de réception :13/04/2026
Référence dossier Client:26A013741 - 1510797622/31595507/S1/1/1_31595507/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Krzysztof Zemlo
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Moh Ouhand DAHOUN
6 Boulevard d'Archimède
77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-26-LE-180530-02

Numéro de dossier : 26A034653
Référence de dossier : 1510797622/31595507/S1/1/3_31595507/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26A034653-001 - Référence *EUROFINS250000286493 Réf. Prel : P23 R+1 - Bureau 5/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A034653-002 - Référence *EUROFINS250000286492 Réf. Prel : P24 R+1 - Bureau 5/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A034653-003 - Référence *EUROFINS250000286495 Réf. Prel : P25 R+1 - Bureau 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A034653-004 - Référence *EUROFINS250000286496 Réf. Prel : P26 R+1 - Bureau 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A034653-005 - Référence *EUROFINS250000286498 Réf. Prel : P27 R+1 - Bureau 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A034653-006 - Référence *EUROFINS250000286491 Réf. Prel : P28 R+1 - Bureau 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A034653-007 - Référence *EUROFINS250000286453 Réf. Prel : P29 R+1 - Bureau 3/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) - (Plaque de plâtre/Blanc, Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A034653-008 - Référence *EUROFINS250000286494 Réf. Prel : P30 R+1 - Bureau 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) - (Plaque de plâtre/Blanc, Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A034653-009 - Référence *EUROFINS250000286452 Réf. Prel : P31 R+1 - Bureau 3/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A034653-010 - Référence *EUROFINS250000286450 Réf. Prel : P32 R+1 - Bureau 3/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A034653-011 - Référence *EUROFINS250000286451 Réf. Prel : P33 R+1 - Dégagement 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A034653-012 - Référence *EUROFINS250000286449 Réf. Prel : P34 R+1 - Bureau 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Mastic/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A034653-013 - Référence *EUROFINS250000286448 Réf. Prel : P35 R+1 - Bureau 5/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Mastic/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
SH-Analyses-EABE
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-066694-02 Date d'émission de rapport : 20/10/2026 17:26

Annule et remplace la version AR-26-EK-066694-01 ayant pour date d'émission le 07/10/2026 à 12:43, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Référence laboratoire N° : 26EK060120 Référence de suivi du dossier N° : 26A034653

Reçu au laboratoire le : 02/10/2026 Date de réception :01/10/2026

Date d'analyse : 06/10/2026

Référence dossier Client:26A034653 - 1510797622/31595507/S1/1/3_31595507/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26A034653-001 - EUROFINS25000028 6493 Réf. Prel : P23 R+1 - Bureau 5/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)	***Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)***	**MET** / ***UW6O***	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	***Fibres d'amiante de type chrysotile***
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / BV5E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
002	26A034653-002 - EUROFINS25000028 6492 Réf. Prel : P24 R+1 - Bureau 5/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MET** / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / BV5E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-066694-02 Date d'émission de rapport : 20/10/2026 17:26

Annule et remplace la version AR-26-EK-066694-01 ayant pour date d'émission le 07/10/2026 à 12:43, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Référence laboratoire N° : 26EK060120 Référence de suivi du dossier N° : 26A034653

Reçu au laboratoire le : 02/10/2026 Date de réception :01/10/2026

Date d'analyse : 06/10/2026

Référence dossier Client:26A034653 - 1510797622/31595507/S1/1/3_31595507/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	26A034653-003 - EUROFINS250000286495 Réf. Prel : P25 R+1 - Bureau 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	26A034653-004 - EUROFINS250000286496 Réf. Prel : P26 R+1 - Bureau 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / BV5E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MET** / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-066694-02 Date d'émission de rapport : 20/10/2026 17:26 Page3/7

Annule et remplace la version AR-26-EK-066694-01 ayant pour date d'émission le 07/10/2026 à 12:43, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Référence laboratoire N° : 26EK060120 Référence de suivi du dossier N° : 26A034653

Reçu au laboratoire le : 02/10/2026 Date de réception :01/10/2026

Date d'analyse : 06/10/2026

Référence dossier Client:26A034653 - 1510797622/31595507/S1/1/3_31595507/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	26A034653-005 - EUROFINS250000286498 Réf. Prel : P27 R+1 - Bureau 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	26A034653-006 - EUROFINS250000286491 Réf. Prel : P28 R+1 - Bureau 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	**MET** / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MET** / 9XGV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-066694-02 Date d'émission de rapport : 20/10/2026 17:26 Page4/7

Annule et remplace la version AR-26-EK-066694-01 ayant pour date d'émission le 07/10/2026 à 12:43, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Référence laboratoire N° : 26EK060120 Référence de suivi du dossier N° : 26A034653

Reçu au laboratoire le : 02/10/2026 Date de réception :01/10/2026

Date d'analyse : 06/10/2026

Référence dossier Client:26A034653 - 1510797622/31595507/S1/1/3_31595507/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	26A034653-007 - EUROFINS250000286453 Réf. Prel : P29 R+1 - Bureau 3/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) - (Plaque de plâtre/Blanc, Marron)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	**MET** / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MET** / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26A034653-008 - EUROFINS250000286494 Réf. Prel : P30 R+1 - Bureau 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux de cloisons (Liste B) - (Plaque de plâtre/Blanc, Marron)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MET** / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-066694-02 Date d'émission de rapport : 20/10/2026 17:26 Page5/7

Annule et remplace la version AR-26-EK-066694-01 ayant pour date d'émission le 07/10/2026 à 12:43, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Référence laboratoire N° : 26EK060120 Référence de suivi du dossier N° : 26A034653

Reçu au laboratoire le : 02/10/2026 Date de réception :01/10/2026

Date d'analyse : 06/10/2026

Référence dossier Client:26A034653 - 1510797622/31595507/S1/1/3_31595507/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	26A034653-009 - EUROFINS250000286452 Réf. Prel : P31 R+1 - Bureau 3/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Papier/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MET** / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / BV5E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	26A034653-010 - EUROFINS250000286450 Réf. Prel : P32 R+1 - Bureau 3/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Peint/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-066694-02 Date d'émission de rapport : 20/10/2026 17:26 Page6/7

Annule et remplace la version AR-26-EK-066694-01 ayant pour date d'émission le 07/10/2026 à 12:43, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Référence laboratoire N° : 26EK060120 Référence de suivi du dossier N° : 26A034653

Reçu au laboratoire le : 02/10/2026 Date de réception :01/10/2026

Date d'analyse : 06/10/2026

Référence dossier Client:26A034653 - 1510797622/31595507/S1/1/3_31595507/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	26A034653-011 - EUROFINS250000286451 Réf. Prel : P33 R+1 - Dégagement 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Peint/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26A034653-012 - EUROFINS250000286449 Réf. Prel : P34 R+1 - Bureau 4/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Mastic/Gris)	Matériau souple (beige) ; matériau souple (fibreux) (beige)	**MET** / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26A034653-013 - EUROFINS250000286448 Réf. Prel : P35 R+1 - Bureau 5/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Mastic/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau souple (fibreux) (beige)	**MET** / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-066694-02 Date d'émission de rapport : 20/10/2026 17:26 Page7/7

Annule et remplace la version AR-26-EK-066694-01 ayant pour date d'émission le 07/10/2026 à 12:43, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Référence laboratoire N° : 26EK060120 Référence de suivi du dossier N° : 26A034653

Reçu au laboratoire le : 02/10/2026 Date de réception :01/10/2026

Date d'analyse : 06/10/2026


Référence dossier Client:26A034653 - 1510797622/31595507/S1/1/3_31595507/1/1

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, arrêté du 1er octobre 2019 modifié.
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Ricardo Silva
Technical Referent

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios
