
RENOVATION SALLE 6242

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	ENTREPRISES
1	Réunion de lancement	0 jr	Mar 30/06/26	Mar 30/06/26	AN / TOUTES ENTREPRISES
2	Etudes d'execution	18 jrs	Mar 30/06/26	Ven 24/07/26	AN
3	Commande des nouveaux plateaux	50 jrs	Lun 08/03/27	Jeu 20/05/27	
4	Commande 2 tables neuves	50 jrs	Lun 08/03/27	Jeu 20/05/27	
5	Commande des nouvelles chaises	30 jrs	Ven 09/07/27	Ven 20/08/27	
6	Consultation lot 2 revêtements murs	24 jrs	Lun 12/10/26	Ven 13/11/26	
7	Analyse offre	15 jrs	Lun 16/11/26	Ven 04/12/26	
8	RQ attribution lot 2	0 jr	Mer 16/12/26	Mer 16/12/26	
9	Etude lot 2	20 jrs	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27	
10	Commande des revêtements murs	30 jrs	Lun 01/02/27	Lun 15/03/27	
11	Commande du matériel audio	35 jrs	Lun 12/10/26	Lun 30/11/26	
12	Fabrication des nouvelles tables	60 jrs	Lun 28/12/26	Mar 23/03/27	
13	Commande des 2 portes accès VTP	40 jrs	Lun 27/07/26	Ven 18/09/26	
14	Commandes CVC	95 jrs	Lun 27/07/26	Lun 07/12/26	
15	Etudes VTP	4 jrs	Mar 13/10/26	Ven 16/10/26	
16	**Travaux de désamiantages**	**58 jrs**	**Jeu 23/07/26**	**Lun 12/10/26**	
17	Désamiantage zone 1 SS1	20 jrs	Jeu 23/07/26	Mer 19/08/26	IDF
18	Désamiantage zone 2 SS2	17 jrs	Jeu 13/08/26	Ven 04/09/26	IDF
19	Diagnostic complementaire amiante	1 jr	Jeu 24/09/26	Jeu 24/09/26	AED Expertise
20	Désamiantage zone 3 Pical	13 jrs	Jeu 24/09/26	Lun 12/10/26	IDF
21	**Installations chantier extérieur**	**208 jrs**	**Mar 28/07/26**	**Ven 21/05/27**	
22	Installation emprise cour d'honneur	3 jrs	Mar 28/07/26	Jeu 30/07/26	HP BTP
23	Durée emprise	162 jrs	Jeu 17/09/26	Ven 07/05/27	HP BTP
24	Repli cour d'honneur	2 jrs	Jeu 20/05/27	Ven 21/05/27	HP BTP
25	**Travaux locaux techniques SS1 et SS2 (en dehors de la salle)**	**112 jrs**	**Jeu 23/07/26**	**Mar 29/12/26**	
26	Consignation et curage des reseaux et baies local technique SS2 baies régie	5 jrs	Jeu 23/07/26	Mer 29/07/26	BTB / POINT SYS
27	Démontage des équipements audiovisuels et baies local technique SS2 baies régie	4 jrs	Jeu 23/07/26	Mar 28/07/26	AN AUDIOVISUEL
28	Dépose des baies SS2 baies régie	1 jr	Mer 29/07/26	Mer 29/07/26	AN DEMENAGEURS
29	Déposes des gaines, extracteur, VEX, réseaux hydrauliques et VCO SS2	9 jrs	Lun 28/09/26	Jeu 08/10/26	MCFE
30	Déposes CVC et reseaux associés CTA SS1en local technique jusqu'en limite de salle	5 jrs	Jeu 20/08/26	Mer 26/08/26	MCFE
31	Percements et carottages pour accompagnements des autres lots, mise en place échafaudages au besoin	5 jrs	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26	HP BTP
32	Mise en oeuvre VCO eau glacée, reseaux hydrauliques et CALO LT SS2 baies régie	10 jrs	Lun 09/11/26	Lun 23/11/26	MCFE
33	Tirage réseau et pose désenfumage local 6111 SS1	10 jrs	Ven 06/11/26	Ven 20/11/26	MCFE
34	Peinture du nouveau local CTA et ancien (salle 6111) SS1	12 jrs	Lun 12/10/26	Mar 27/10/26	DUREAU
35	Mise en place nouvelle CTA SS1	10 jrs	Mar 08/12/26	Lun 21/12/26	MCFE
36	Raccordement electriques CVC	5 jrs	Mar 22/12/26	Mar 29/12/26	MCFE
37	**Travaux salle 6242 dépose et démolition**	**61 jrs**	**Jeu 23/07/26**	**Jeu 15/10/26**	
38	Consignation de la salle de commission et dépose cables notamment des tables	2 jrs	Jeu 23/07/26	Ven 24/07/26	BTB
39	Dépose des équipements audio des tables et tribune	2 jrs	Jeu 23/07/26	Ven 24/07/26	AN AUDIOVISUEL
40	Dépose du mobilier de la salle de commission tables et chaises	1 jr	Lun 27/07/26	Lun 27/07/26	AN DEMENAGEURS
41	Dépose de la tribune en conservation	1 jr	Mar 28/07/26	Mar 28/07/26	GUEGAN
42	Curage et protection des cables tribune	1 jr	Mar 28/07/26	Mar 28/07/26	BTB / POINT SYS
43	Mise en place de l'échafaudage roulant dans la salle de commission	1 jr	Lun 27/07/26	Lun 27/07/26	HP BTP
44	Démontages audiovisuels aux murs, écran, caméras, videoprojecteur	3 jrs	Mar 28/07/26	Jeu 30/07/26	AN AUDIOVISUEL
45	Dépose des panneaux bois des murs	1 jr	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26	GUEGAN
46	Mise en place des protections des cheminements et amené de l'échafaudage plateforme travail	4 jrs	Mer 29/07/26	Lun 03/08/26	HP BTP
47	Dépose partielle de la moquette de la salle de commission	2 jrs	Mer 29/07/26	Jeu 30/07/26	DUREAU
48	Dépose en conservation des trappes au sol	1 jr	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26	GUEGAN
49	Montage de l'échafaudage dans la salle de commission et plateforme de travail compris protection de celle-ci	5 jrs	Mar 04/08/26	Lun 10/08/26	HP BTP / ALTRAD



RENOVATION SALLE 6242

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	ENTREPRISES
50	Dépose terminaux audio plafond	2 jrs	Mar 11/08/26	Mer 12/08/26	AN AUDIOVISUEL
51	Dépose terminaux CFO-CFA SS1 plafond	2 jrs	Mar 11/08/26	Mer 12/08/26	BTB / POINT SYS / ERIS
52	Dépose grilles CVC plafond	2 jrs	Mar 11/08/26	Mer 12/08/26	MCFE
53	Démolition du faux plafonds staff	10 jrs	Jeu 13/08/26	Mer 26/08/26	HP BTP
54	Rehausse plateforme de travail	3 jrs	Lun 21/09/26	Mer 23/09/26	HP BTP
55	Dépose audiovisuel – plénum	3 jrs	Jeu 24/09/26	Lun 28/09/26	AN AUDIOVISUEL
56	Dépose CFO-CFA – plénum	3 jrs	Mar 13/10/26	Jeu 15/10/26	BTB / POINT SYS
57	Dépose CVC – plénum	3 jrs	Mar 13/10/26	Jeu 15/10/26	MCFE
58	**Plafond – travaux rénovation**	**84 jrs**	**Ven 09/10/26**	**Lun 08/02/27**	
59	Création du VTP compris cloison LT 6120	14 jrs	Lun 19/10/26	Jeu 05/11/26	HP BTP
60	Ouverture de deux baies accès au plenum pour VTP	3 jrs	Ven 06/11/26	Mar 10/11/26	HP BTP
61	Installation de l'escalier métallique d'accès au VTP	2 jrs	Jeu 12/11/26	Ven 13/11/26	
62	Mise en place des gaines en salle et gaines/coffret de desenfumage VTP	20 jrs	Ven 09/10/26	Jeu 05/11/26	MCFE
63	Installation des deux portes d'accès	2 jrs	Ven 06/11/26	Lun 09/11/26	GUEGAN
64	Mise en place des chemins de cable	21 jrs	Ven 16/10/26	Lun 16/11/26	BTB
65	Mise en place des tiges filetées plenum	3 jrs	Mar 17/11/26	Jeu 19/11/26	
66	Tirage de cable CFO CFA et raccordement elec du CVC	25 jrs	Ven 20/11/26	Jeu 24/12/26	BTB / POINT SYS
67	Réunion TCE et Audiovisuel	0 jr	Mar 13/10/26	Mar 13/10/26	AN / TOUTES ENTREPRISES
68	Audiovisuel etudes execution	31 jrs	Mar 13/10/26	Mer 25/11/26	AN AUDIOVISUEL
69	Audiovisuel prérequis communiqués CFO CFA	0 jr	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26	AN AUDIOVISUEL
70	Test de soufflage et ventilation	2 jrs	Lun 28/12/26	Mar 29/12/26	MCFE
71	Bon de fermeture du faux-plafond	0 jr	Mar 29/12/26	Mar 29/12/26	
72	Dépose de la réhausse échafaudage	3 jrs	Mer 30/12/26	Lun 04/01/27	HP BTP / ALTRAD
73	Pose du faux-plafond en staff	20 jrs	Mar 05/01/27	Lun 01/02/27	
74	Incorporations technique et equipement : DI – CFO/CFA – Audovisuel et appareillage plafond	10 jrs	Mar 26/01/27	Lun 08/02/27	MCFE / BTB / POINT SYS / ERIS / AN AUDIO
75	Peinture du plafond	5 jrs	Mar 02/02/27	Lun 08/02/27	DUREAU
76	**Sol et murs – travaux rénovation**	**135 jrs**	**Mar 09/02/27**	**Ven 20/08/27**	
77	Dépose des échafaudages et plateforme de travail	2 jrs	Mar 09/02/27	Mer 10/02/27	HP BTP
78	Agrandissement baies SS2 + descellement et recsellement 2 bâti	5 jrs	Jeu 11/02/27	Mer 17/02/27	HP BTP / ALTRAD
79	Mise en place de l'échafaudage roulant	0 jr	Mer 17/02/27	Mer 17/02/27	HP BTP
80	Curage et Tirage de cables CFA/CFO au sol	15 jrs	Jeu 18/02/27	Jeu 11/03/27	BTB / POINT SYS
81	Tirage de cables audiovisuels au sol	10 jrs	Ven 12/03/27	Jeu 25/03/27	AN AUDIOVISUEL
82	Démontage de l'échafaudage roulant	0 jr	Jeu 25/03/27	Jeu 25/03/27	HP BTP
83	Repose des cheminements trappes au sol	4 jrs	Ven 26/03/27	Mer 31/03/27	HP BTP
84	Création estrade + rampe	5 jrs	Jeu 01/04/27	Mer 07/04/27	GUEGAN
85	Pose de la moquette et protections	10 jrs	Jeu 08/04/27	Mer 21/04/27	DUREAU
86	Repose de la tribune	3 jrs	Jeu 22/04/27	Lun 26/04/27	GUEGAN
87	Fermeture sousbassement en bois	5 jrs	Mar 27/04/27	Lun 03/05/27	GUEGAN
88	Incorporation équipements muraux (caméras, VP, télé, radiateurs infrarouges, compte-temps, cimaises, grille DSF, interrupteurs, sondes…)	10 jrs	Mar 04/05/27	Mer 19/05/27	MCFE / BTB / POINT SYS / ERIS / AN AUDIO
89	Pose des nouveaux habillages des murs – revetement acoustique	10 jrs	Mar 04/05/27	Mer 19/05/27	
90	Pose des tables, tribune et réglages	10 jrs	Jeu 20/05/27	Mer 02/06/27	AN DEMENAGEUR / GUEGAN
91	Installation matériel Audiovisuel dans les tables et tribune	25 jrs	Jeu 03/06/27	Mer 07/07/27	AN AUDIOVISUEL
92	Incorporation CFO-CFA nourrices et micros dans les tables	8 jrs	Lun 31/05/27	Mer 09/06/27	BTB / POINT SYS
93	Déconsignation	1 jr	Jeu 08/07/27	Jeu 08/07/27	BTB
94	Mise en service et essais	21 jrs	Jeu 08/07/27	Ven 06/08/27	
95	Test de désenfumage	1 jr	Lun 09/08/27	Lun 09/08/27	MCFE
96	Repli des protections et nettoyage	5 jrs	Lun 02/08/27	Ven 06/08/27	HP BTP
97	OPR	10 jrs	Lun 09/08/27	Ven 20/08/27	AN
98	Reception	0 jr	Ven 20/08/27	Ven 20/08/27	AN

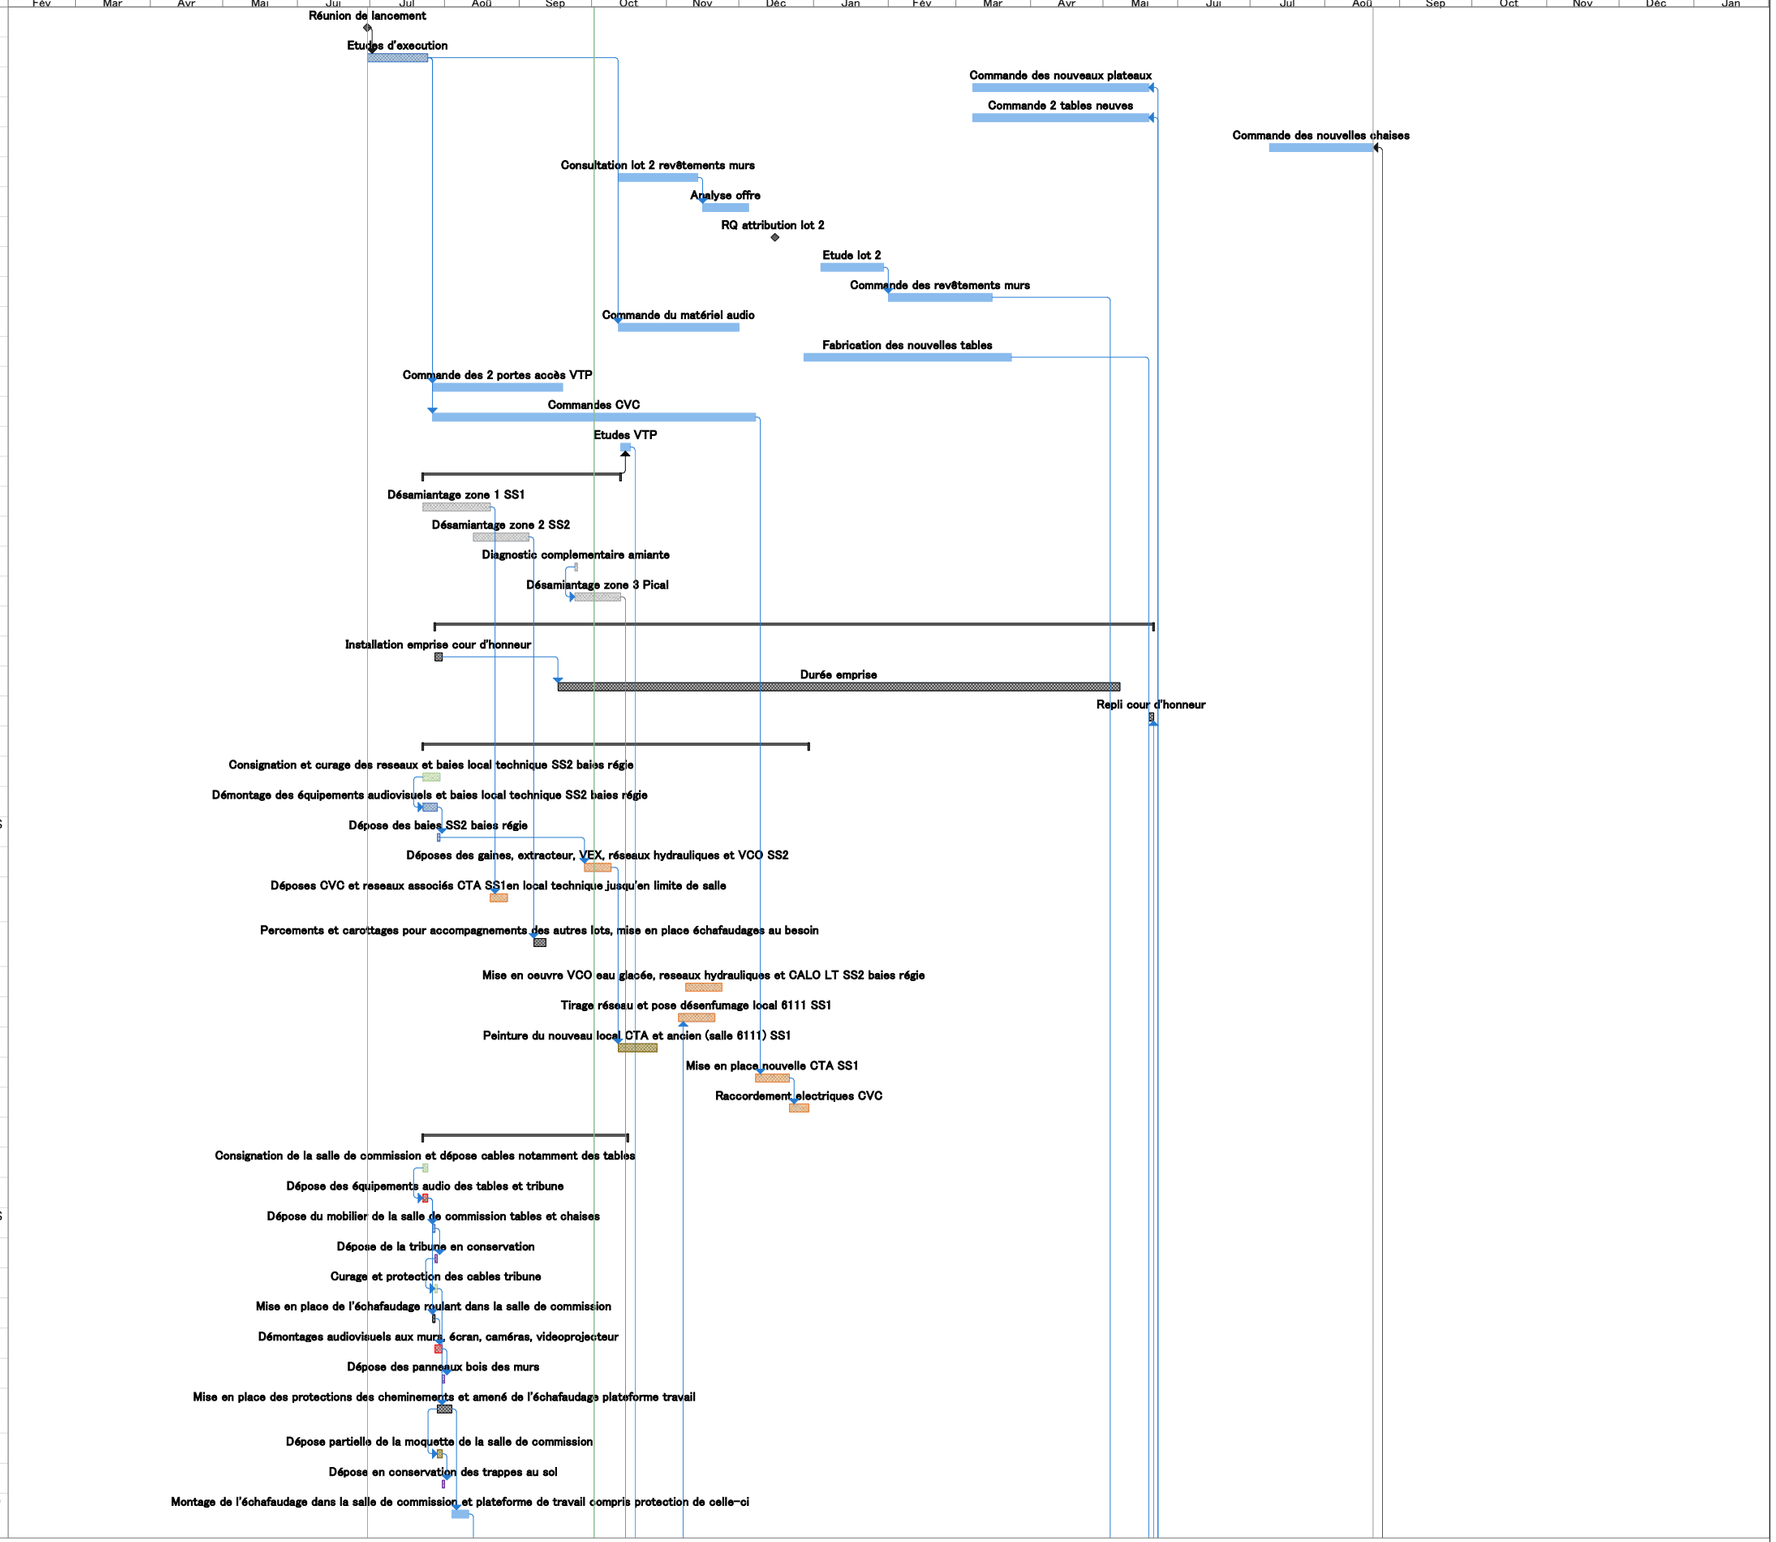
