
Planning prévisionnel chantier

Reconfiguration du hall d'accueil du centre des finances publiques de Villefranche-sur-Saône

Du 13/10/2026

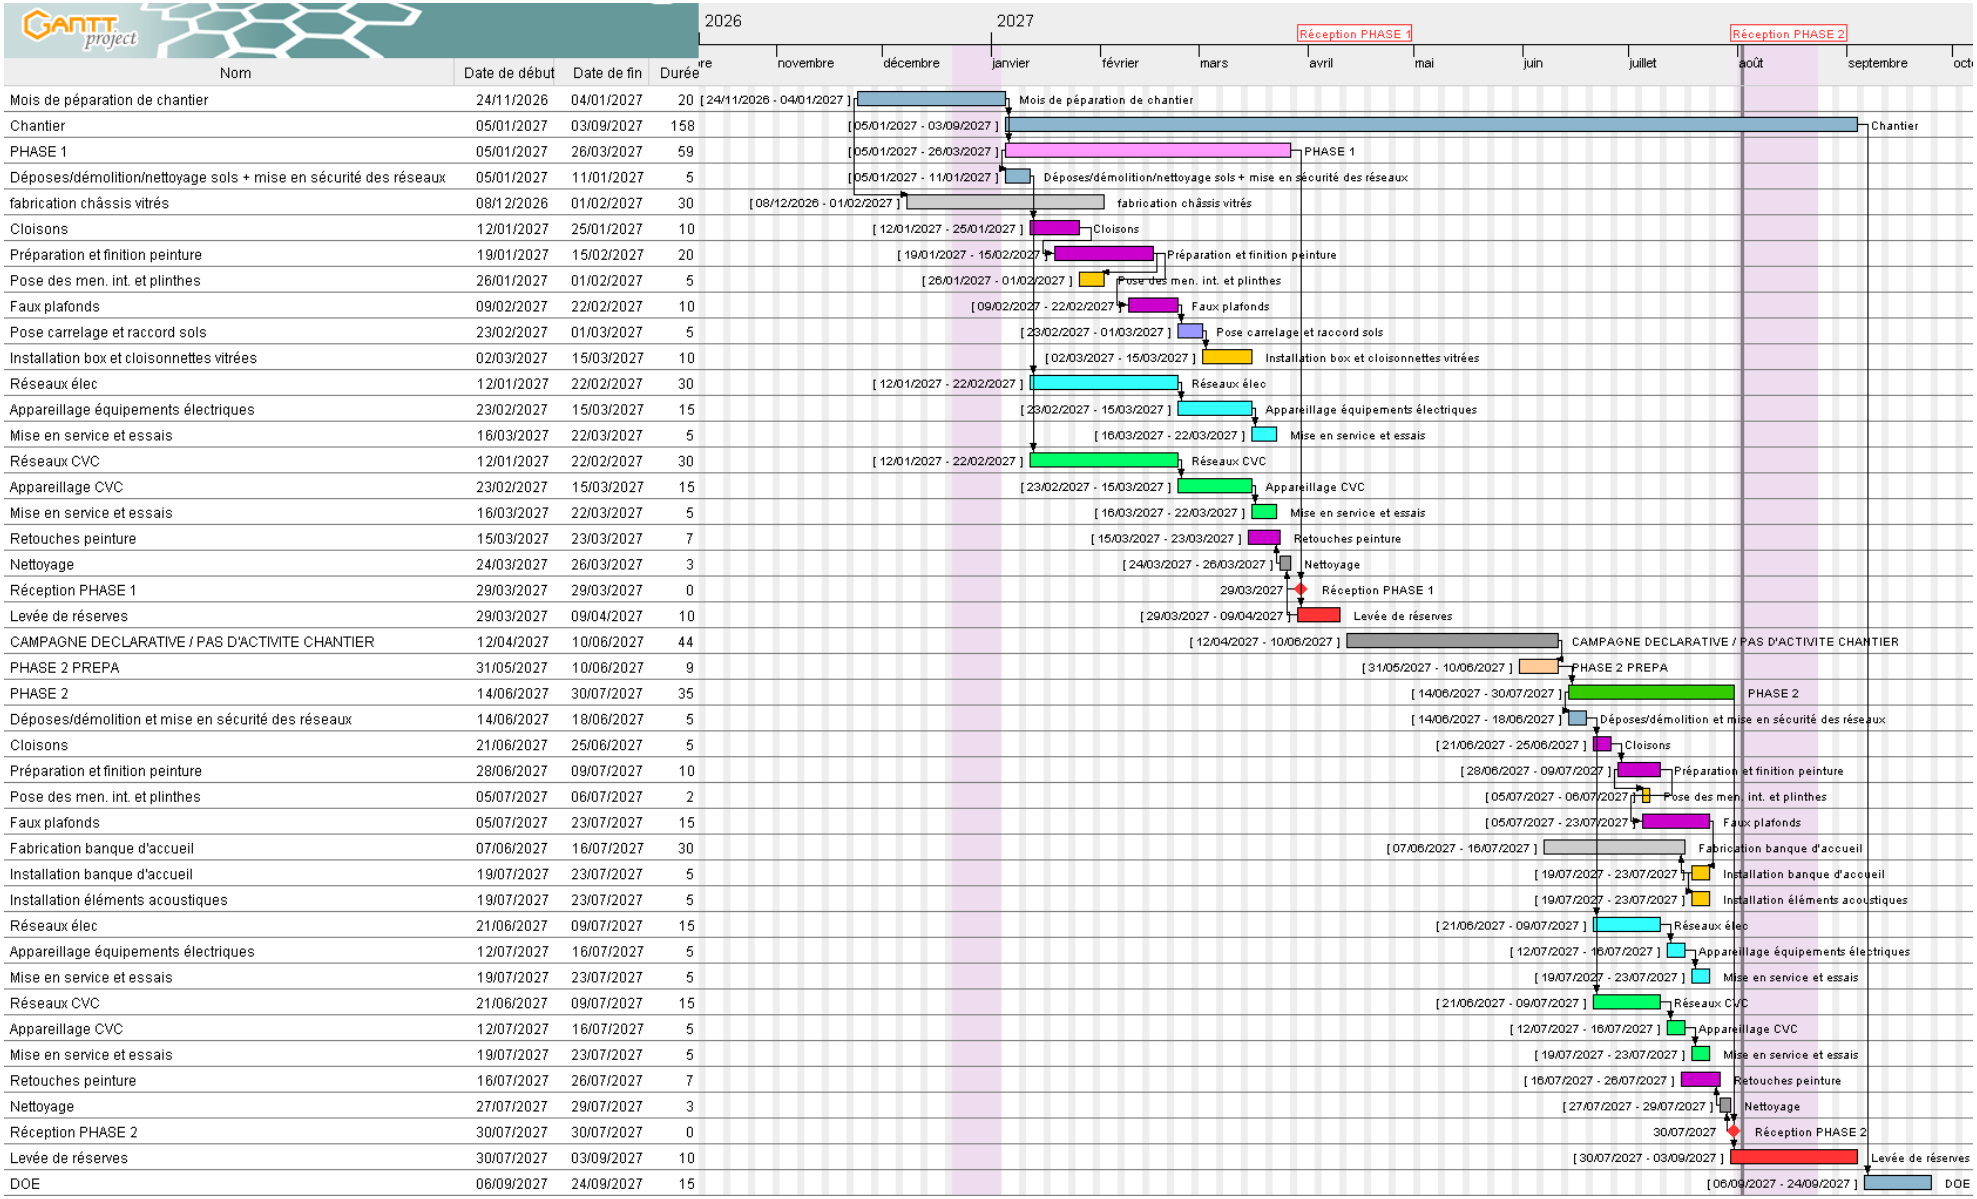

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
Mois de péparation de chantier	24/11/2026	04/01/2027	20
Chantier	05/01/2027	03/09/2027	158
PHASE 1	05/01/2027	26/03/2027	59
Déposes/démolition/nettoyage sols + mise en sécurité des réseaux	05/01/2027	11/01/2027	5
fabrication châssis vitrés	08/12/2026	01/02/2027	30
Cloisons	12/01/2027	25/01/2027	10
Préparation et finition peinture	19/01/2027	15/02/2027	20
Pose des men. int. et plinthes	26/01/2027	01/02/2027	5
Faux plafonds	09/02/2027	22/02/2027	10
Pose carrelage et raccord sols	23/02/2027	01/03/2027	5
Installation box et cloisonnettes vitrées	02/03/2027	15/03/2027	10
Réseaux élec	12/01/2027	22/02/2027	30
Appareillage équipements électriques	23/02/2027	15/03/2027	15
Mise en service et essais	16/03/2027	22/03/2027	5
Réseaux CVC	12/01/2027	22/02/2027	30
Appareillage CVC	23/02/2027	15/03/2027	15
Mise en service et essais	16/03/2027	22/03/2027	5
Retouches peinture	15/03/2027	23/03/2027	7
Nettoyage	24/03/2027	26/03/2027	3
Réception PHASE 1	29/03/2027	29/03/2027	0
Levée de réserves	29/03/2027	09/04/2027	10
CAMPAGNE DECLARATIVE / PAS D'ACTIVITE CHANTIER	12/04/2027	10/06/2027	44
PHASE 2 PREPA	31/05/2027	10/06/2027	9
PHASE 2	14/06/2027	30/07/2027	35
Déposes/démolition et mise en sécurité des réseaux	14/06/2027	18/06/2027	5
Cloisons	21/06/2027	25/06/2027	5
Préparation et finition peinture	28/06/2027	09/07/2027	10
Pose des men. int. et plinthes	05/07/2027	06/07/2027	2
Faux plafonds	05/07/2027	23/07/2027	15
Fabrication banque d'accueil	07/06/2027	16/07/2027	30
Installation banque d'accueil	19/07/2027	23/07/2027	5
Installation éléments acoustiques	19/07/2027	23/07/2027	5
Réseaux élec	21/06/2027	09/07/2027	15
Appareillage équipements électriques	12/07/2027	16/07/2027	5
Mise en service et essais	19/07/2027	23/07/2027	5
Réseaux CVC	21/06/2027	09/07/2027	15
Appareillage CVC	12/07/2027	16/07/2027	5
Mise en service et essais	19/07/2027	23/07/2027	5
Retouches peinture	16/07/2027	26/07/2027	7
Nettoyage	27/07/2027	29/07/2027	3
Réception PHASE 2	30/07/2027	30/07/2027	0
Levée de réserves	30/07/2027	03/09/2027	10
DOE	06/09/2027	24/09/2027	15

L. AYDOSTIAN
ARCHITECTE
