INERA GRAND EST
INGÉNIERIE • ÉTUDES • RECHERCHE ET CONTRÔLE DES RÉSEAUX



RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
N° 2403358-IT/02

Commune :	**GRESSWILLER**
Adresse :	**Q.CHASSEPOT -6RMAT**
Quartier ou complément :	
Date de début d'inspection :	**15 juillet 2025**
Date de fin d'inspection :	**8 septembre 2025**

Client :	**NEOCONCEPT VRD**
Autorité responsable :	**MINISTERE DES ARMEES**
Maître d'oeuvre :	**-**
Entreprise de pose :	**-**

Numéro de dossier :	**2403358-IT/02**
Objectif de l'inspection :	**Inspection de routine de l'état**
Nom du réseau :	**Réseaux autour et sous un bâtiment**
Type de réseau :	**Eaux pluviales et eaux usées**

Nombre d'inspections :	**131**	Long. inspectée : **1591.70 m**	Long. mesurée : **1637.23 m**
dont collecteurs :	**70**	Long. inspectée : **1297.02 m**	Long. mesurée : **1342.55 m**
branchements :	**61**	Long. inspectée : **294.68 m**	Long. mesurée : **294.68 m**
regards/noeuds :	**0**		

Observations particulières :
/02 : ce rapport annule et remplace le rapport précédent (ajout des dernières inspections réalisé début septembre 2025)

Certains tronçons n'ont pas pu être inspectés complètement – Les causes techniques sont mentionnées sur le ou les tronçons concer
En annexe du rapport : le schéma de principe de nos inspections

Vérifié par :C.OBERLE
Le : 09/09/2025

Caroline OBERLE
Certified by yousign

Approuvé par :S.ACKER
Le : 09/09/2025

Samuel ACKER
Certified by yousign

Les résultats de l'inspection se rapportent exclusivement au travail commandé ou à/aux objet(s) ou lot(s) inspecté(s).
Le rapport d'inspection ne doit pas être reproduit excepté dans sa totalité, sans l'accord de l'organisme d'inspection et du client.

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 1**
	Référence du noeud de départ : **REU1**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REU2**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REU2 vers REU1**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux usées**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **14.90 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REU1**	Référence du noeud : **REU2**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 1**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU2 vers REU1**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **14.90 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU1 vers REU2**	Longueur mesurée : **14.90 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REU1 VERS REU2




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REU1	1	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	5
0.50m / REU1	2/3	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU1 Niveau d'eau trouble de 20%	5
5.70m / REU1	4/5	BDA - Photographie générale - emboitement correct Niveau d'eau trouble de 20%	6
11.19m / REU1	6/7	BAJC - Déviation angulaire BAIAA - Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation Niveau d'eau trouble de 10%	6
12.46m / REU1	8	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente Niveau d'eau trouble de 10%	7
14.43m / REU1	9/10	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU2 Niveau d'eau trouble de 10%	7
14.90m / REU1	11	DCAZ - Autre type de raccordement à 9h - Conduite de raccordement 160 BAHD - La conduite de raccordement est endommagée Niveau d'eau trouble de 10%	7
14.90m / REU1	12	BDB - Remarque générale - fin d'inspection Niveau d'eau trouble de 10%	8

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 1** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REU2 vers REU1**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REU1 vers REU2**	Longueur inspectée : **14.90 m** Longueur mesurée : **14.90 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

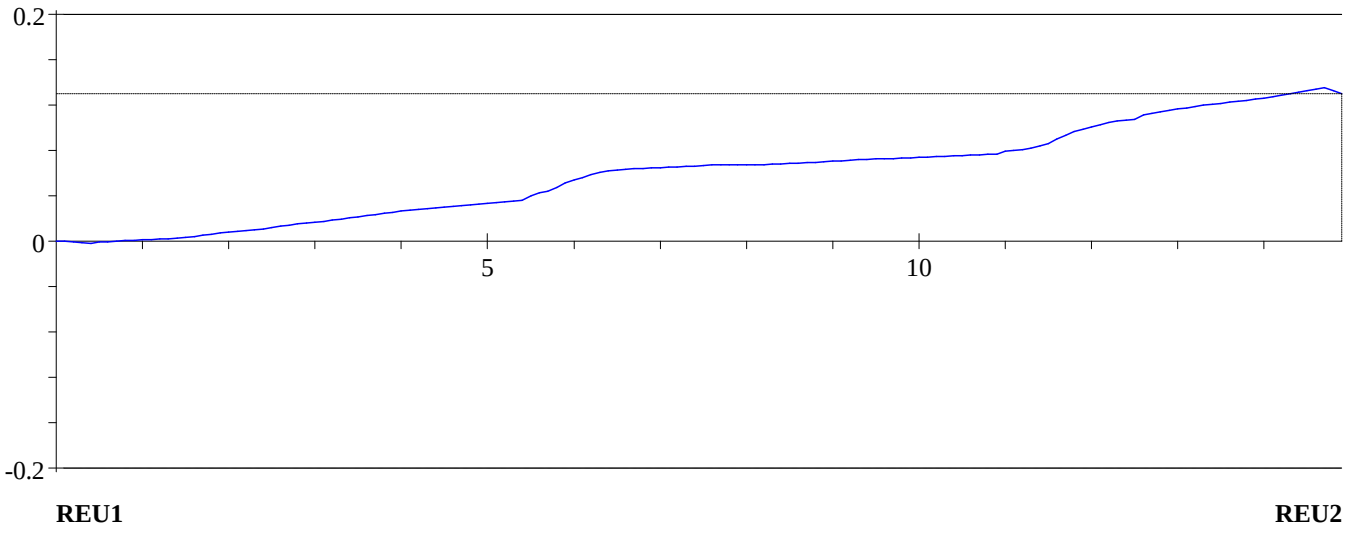

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 1** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REU2 vers REU1**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REU1 vers REU2**	Longueur inspectée : **14.90 m** Longueur mesurée : **14.90 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **1**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection




DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **2/3**	VIDEO : **00:00:14**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU1
Niveau d'eau trouble de 20%

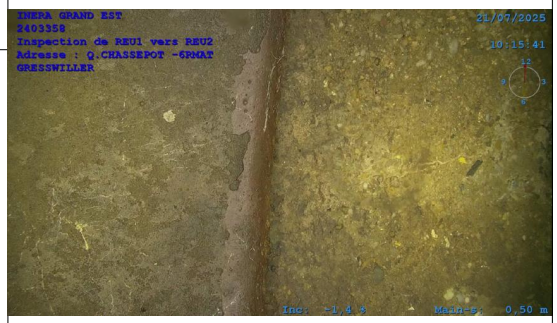

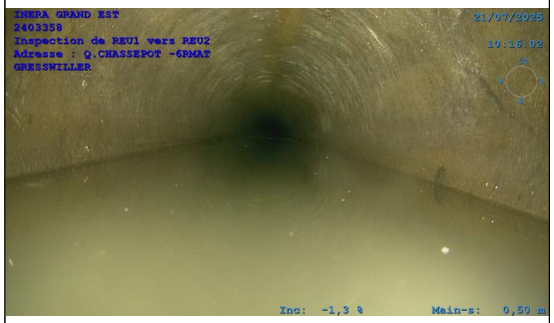

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU2 vers REU1**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **14.90 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU1 vers REU2**	Longueur mesurée : **14.90 m**

DISTANCE : **5.70 m** | PHOTO : **4/5** | VIDEO : **00:01:42**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct
Niveau d'eau trouble de 20%





DISTANCE : **11.19 m** | PHOTO : **6/7** | VIDEO : **00:02:32**

OBSERVATIONS :

BAJC - Déviation angulaire
BAIAA - Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation
Niveau d'eau trouble de 10%





DISTANCE : **12.46 m** | PHOTO : **8** | VIDEO : **00:03:45**

OBSERVATIONS :

BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente
Niveau d'eau trouble de 10%



DISTANCE : **14.43 m** | PHOTO : **9/10** | VIDEO : **00:04:09**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU2
Niveau d'eau trouble de 10%





DISTANCE : **14.90 m** | PHOTO : **11** | VIDEO : **00:04:29**

OBSERVATIONS :

DCAZ - Autre type de raccordement à 9h - Conduite de raccordement 160
BAHD - La conduite de raccordement est endommagée
Niveau d'eau trouble de 10%



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 1** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU2 vers REU1**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **14.90 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU1 vers REU2**	Longueur mesurée : **14.90 m**

DISTANCE : **14.90 m**	PHOTO : **12**	VIDEO : **00:04:37**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection
Niveau d'eau trouble de 10%



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 2**
	Référence du noeud de départ : **REU2**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REU3**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REU3 vers REU2**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux usées**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **7.47 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REU2**	Référence du noeud : **REU3**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 2**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU3 vers REU2**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **7.47 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU2 vers REU3**	Longueur mesurée : **7.47 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REU2 VERS REU3




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REU2	13	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	12
0.50m / REU2	14/15	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU2	12
3.18m / REU2	16	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente	12
3.67m / REU2	17	BALF - Trou dans le matériau de réparation - Longueur de 60mm	13
7.23m / REU2	18	BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut	13
7.23m / REU2	19	BAKGB - Détachement du revêtement intérieur situé sur la circonférence de la conduite	13
7.47m / REU2	20	BAKGA - Revêtement intérieur détaché parallèlement à l'axe de la conduite de 11h à 2h	13
7.47m / REU2	21	BDCZ- - Inspection abandonnée - Autre - Coude empêchant la progression de la caméra, reprise de l'inspection en s inverse	14

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 2** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REU3 vers REU2**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REU2 vers REU3**	Longueur inspectée : **7.47 m** Longueur mesurée : **7.47 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

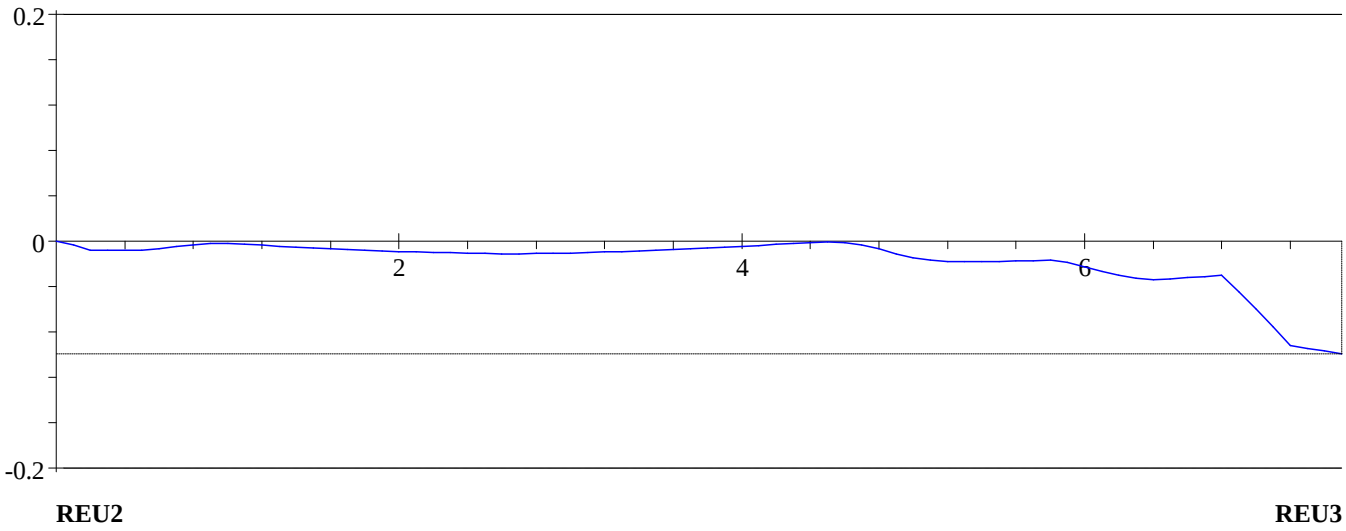

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU3 vers REU2**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **7.47 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU2 vers REU3**	Longueur mesurée : **7.47 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **13**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection




DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **14/15**	VIDEO : **00:00:53**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU2




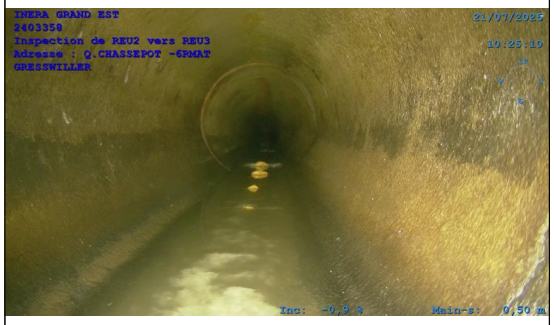

DISTANCE : **3.18 m**	PHOTO : **16**	VIDEO : **00:02:11**

OBSERVATIONS :


BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente

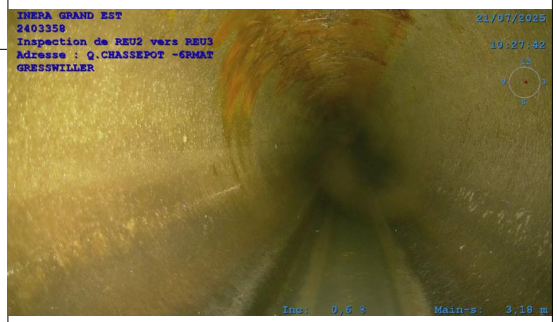

DISTANCE : **3.67 m**	PHOTO : **17**	VIDEO : **00:02:25**

OBSERVATIONS :


BALF - Trou dans le matériau de réparation - Longueur de 60mm

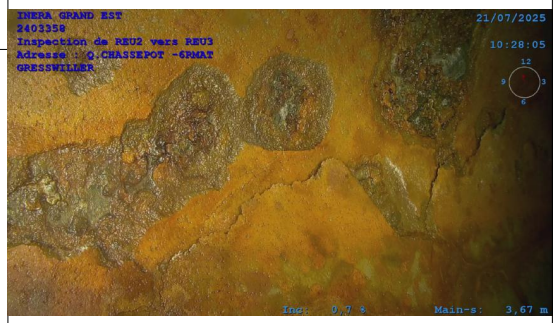

DISTANCE : **7.23 m**	PHOTO : **18**	VIDEO : **00:03:23**

OBSERVATIONS :

BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut

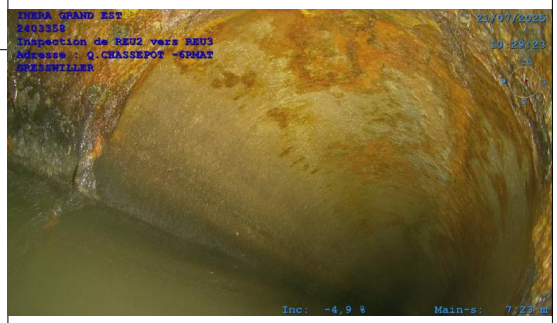

DISTANCE : **7.23 m**	PHOTO : **19**	VIDEO : **00:03:34**

OBSERVATIONS :

BAKGB - Détachement du revêtement intérieur situé sur la circonférence de la conduit



DISTANCE : **7.47 m**	PHOTO : **20**	VIDEO : **00:03:47**

OBSERVATIONS :

BAKGA - Revêtement intérieur détaché parallèlement à l'axe de la conduite de 11h à 2



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 2** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU3 vers REU2**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **7.47 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU2 vers REU3**	Longueur mesurée : **7.47 m**

DISTANCE : **7.47 m**	PHOTO : **21**	VIDEO : **00:03:48**

OBSERVATIONS :

BDCZ- - Inspection abandonnée - Autre - Coude empèchant la progression de la camér reprise de l'inspection en sens inverse



ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 2bis**
	Référence du noeud de départ : **REU3**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REU2**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REU3 vers REU2**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux usées**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **56.30 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REU3**	Référence du noeud : **REU2**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières

Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 2bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REU3 vers REU2**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REU3 vers REU2**	Longueur inspectée : **25.71 m** Longueur mesurée : **56.30 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REU3 VERS REU2



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REU3	22/23	BDB - Remarque générale - Reprise de l'inspection à contresens BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU3 - caméra poussée pour cause d 'accès	17
14.13m / REU3	24	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente	17
25.71m / REU3	25	BDCZD - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale non terminée suite à une inspection partielle précédente - Limite matériel atteinte - Contresens non atteint BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	17

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **22/23**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Reprise de l'inspection à contresens
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU3 - caméra poussée pour cause d 'accès



DISTANCE : **14.13 m**	PHOTO : **24**	VIDEO : **00:00:55**

OBSERVATIONS :

BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente



DISTANCE : **25.71 m**	PHOTO : **25**	VIDEO : **00:02:35**

OBSERVATIONS :

BDCZD - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale non terminée suite à u inspection partielle précédente - Limite matériel atteinte - Contresens non atteint
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection


ABANDON INSPECTION



GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **Brt Beu 1**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux usées	**160 mm**		**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **4.96 m**
PVC-U	**3.00 m**	**REU3 vers Beu 1**	Longueur mesurée : **4.96 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT REU3 VERS Beu 1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/REU3	26/27	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU3	19
4.00 m/REU3	28	BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut	19
4.96 m/REU3	29	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référence du noeud Beu1	19

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **REU3**

Position : **dans REU3**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt Beu 1** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REU3 vers Beu 1**	Longueur inspectée : **4.96 m** Longueur mesurée : **4.96 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **26/27**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU3






DISTANCE : **4.00 m**	PHOTO : **28**	VIDEO : **00:00:26**

OBSERVATIONS :

BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut

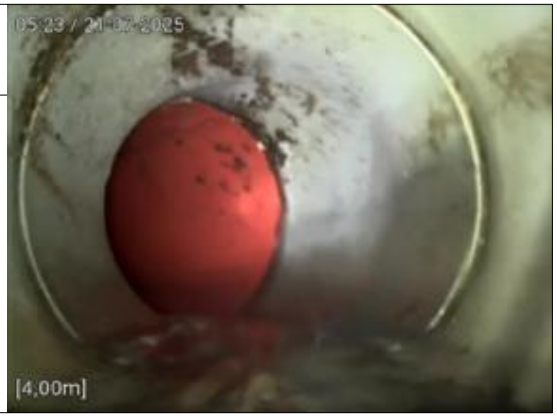

DISTANCE : **4.96 m**	PHOTO : **29**	VIDEO : **00:00:32**

OBSERVATIONS :

BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut
BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspecti
Référence du noeud Beu1



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 3**
	Référence du noeud de départ : **REU8**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REU9**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REU9 vers REU8**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux usées**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **63.67 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REU8**	Référence du noeud : **REU9**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU9 vers REU8**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **63.67 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU8 vers REU9**	Longueur mesurée : **63.67 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REU8 VERS REU9




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REU8	30	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	23
0.42m / REU8	31/32	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU8	23
1.49m / REU8	33	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon Niveau d'eau trouble de 10%	23
29.07m / REU8	34	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon Niveau d'eau trouble de 10%	24
60.74m / REU8	35/36	BDA - Photographie générale - emboitement correct Niveau d'eau trouble de 10%	24
63.01m / REU8	37/38	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU9 Niveau d'eau trouble de 10%	25
63.67m / REU8	39	BDB - Remarque générale - fin d'inspection Niveau d'eau trouble de 10%	25

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 3** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REU9 vers REU8**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REU8 vers REU9**	Longueur inspectée : **63.67 m** Longueur mesurée : **63.67 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

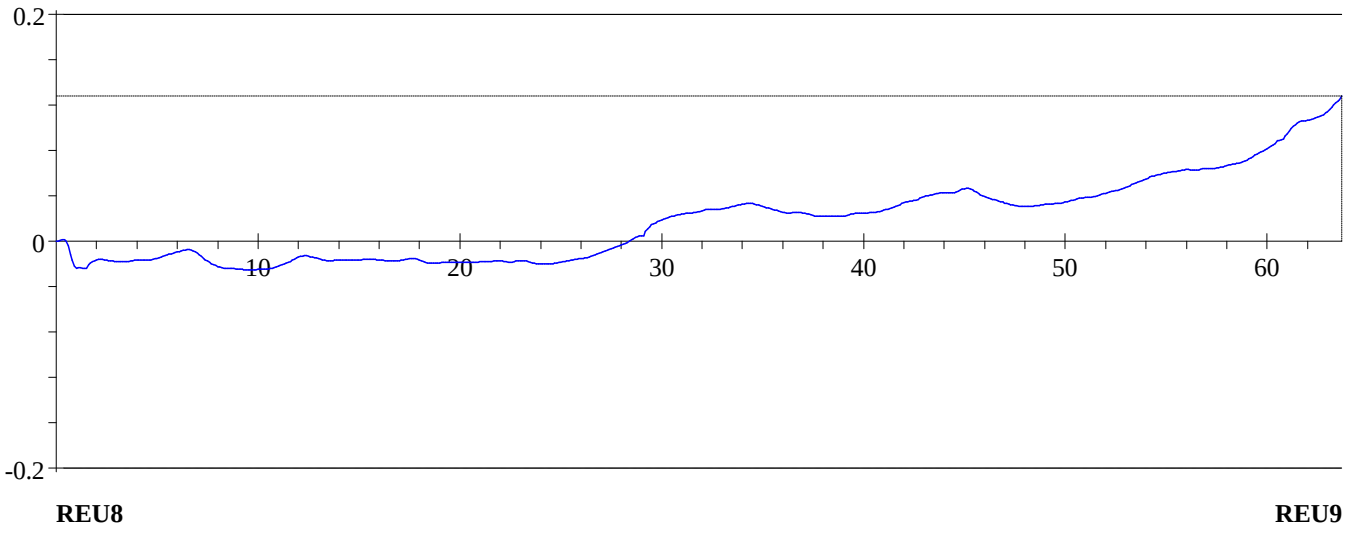

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU9 vers REU8**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **63.67 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU8 vers REU9**	Longueur mesurée : **63.67 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **30**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.42 m**	PHOTO : **31/32**	VIDEO : **00:00:13**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU8






DISTANCE : **1.49 m**	PHOTO : **33**	VIDEO : **00:00:39**

OBSERVATIONS :

BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon
Niveau d'eau trouble de 10%

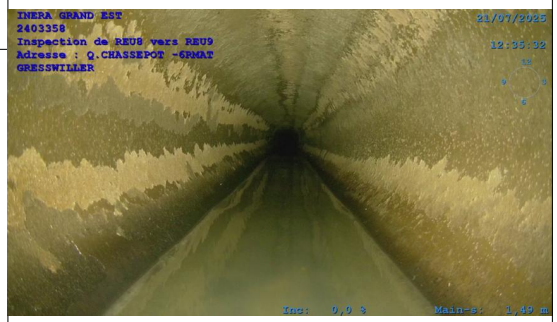

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU9 vers REU8**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **63.67 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU8 vers REU9**	Longueur mesurée : **63.67 m**

DISTANCE : **29.07 m**	PHOTO : **34**	VIDEO : **00:02:35**

OBSERVATIONS :


BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon
Niveau d'eau trouble de 10%



DISTANCE : **60.74 m**	PHOTO : **35/36**	VIDEO : **00:04:49**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct
Niveau d'eau trouble de 10%

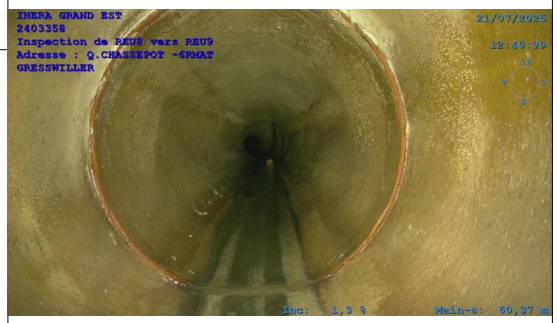



Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU9 vers REU8**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **63.67 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU8 vers REU9**	Longueur mesurée : **63.67 m**

DISTANCE : **63.01 m**	PHOTO : **37/38**	VIDEO : **00:05:59**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU9
Niveau d'eau trouble de 10%





DISTANCE : **63.67 m**	PHOTO : **39**	VIDEO : **00:06:49**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection
Niveau d'eau trouble de 10%



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n°4**
	Référence du noeud de départ : **REU7**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REU8**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REU8 vers REU7**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux usées**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **36.46 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REU7**	Référence du noeud : **REU8**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n°4**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU8 vers REU7**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **36.46 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU7 vers REU8**	Longueur mesurée : **36.46 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REU7 VERS REU8




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REU7	40	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	29
0.50m / REU7	41/42	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU7	29
0.50m / REU7	43	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon Niveau d'eau trouble de 5%	29
15.55m / REU7	44	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon Niveau d'eau trouble de 5%	30
35.74m / REU7	45/46	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU8 Niveau d'eau trouble de 5%	30
36.46m / REU7	47	BDB - Remarque générale - fin d'inspection Niveau d'eau trouble de 5%	30

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n°4** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REU8 vers REU7**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REU7 vers REU8**	Longueur inspectée : **36.46 m** Longueur mesurée : **36.46 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

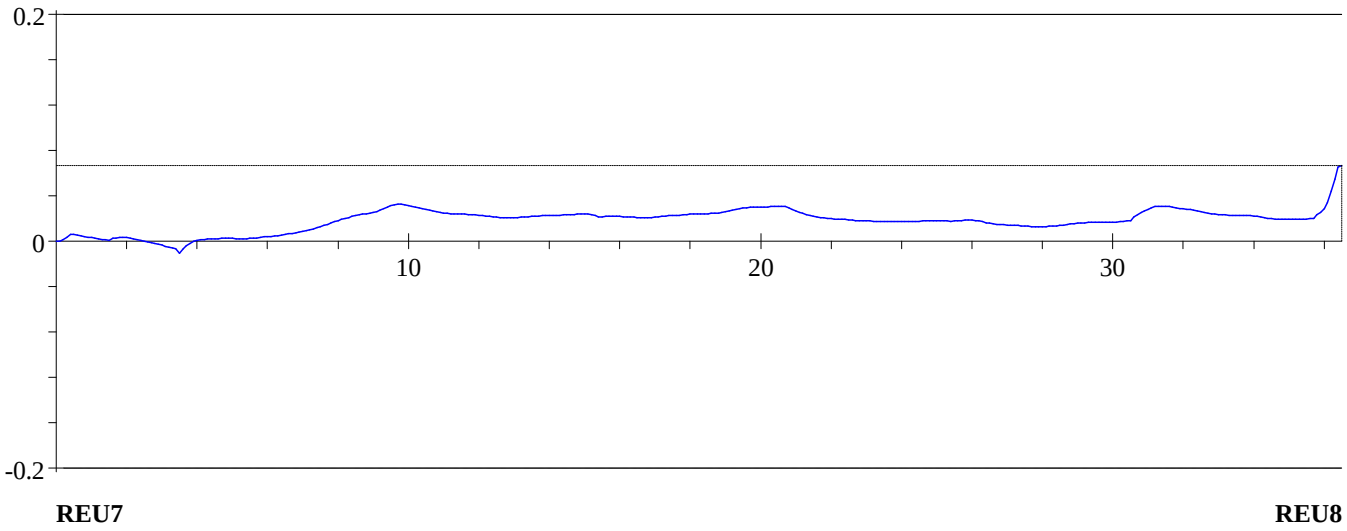

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU8 vers REU7**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **36.46 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU7 vers REU8**	Longueur mesurée : **36.46 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **40**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **41/42**	VIDEO : **00:00:19**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU7





DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **43**	VIDEO : **00:00:28**

OBSERVATIONS :


BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon
Niveau d'eau trouble de 5%



DISTANCE : **15.55 m**	PHOTO : **44**	VIDEO : **00:02:52**

OBSERVATIONS :

BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon
Niveau d'eau trouble de 5%

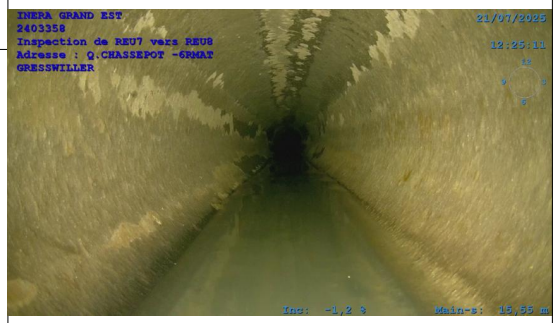

DISTANCE : **35.74 m**	PHOTO : **45/46**	VIDEO : **00:04:26**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU8
Niveau d'eau trouble de 5%





DISTANCE : **36.46 m**	PHOTO : **47**	VIDEO : **00:04:47**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection
Niveau d'eau trouble de 5%



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n°5**
	Référence du noeud de départ : **REU7**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REU6**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REU7 vers REU6**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux usées**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **5.54 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REU7**	Référence du noeud : **REU6**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU7 vers REU6**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **5.54 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU7 vers REU6**	Longueur mesurée : **5.54 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REU7 VERS REU6




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REU7	48	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	34
0.50m / REU7	49/50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU7	34
0.50m / REU7	51	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente	34
1.60m / REU7	52/53	BDA - Photographie générale - emboitement correct	35
5.03m / REU7	54/55	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU6	35
5.54m / REU7	56	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	36

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n°5** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REU7 vers REU6**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REU7 vers REU6**	Longueur inspectée : **5.54 m** Longueur mesurée : **5.54 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

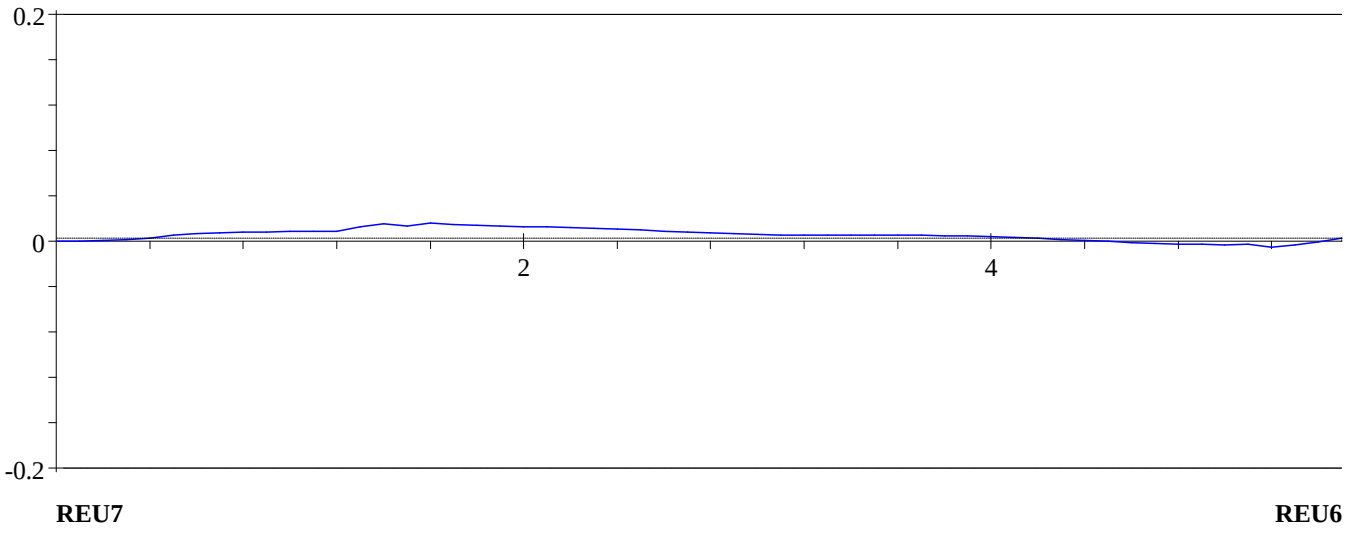

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU7 vers REU6**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **5.54 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU7 vers REU6**	Longueur mesurée : **5.54 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **48**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **49/50**	VIDEO : **00:00:17**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU7





DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **51**	VIDEO : **00:00:31**

OBSERVATIONS :

BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente



Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU7 vers REU6**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **5.54 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU7 vers REU6**	Longueur mesurée : **5.54 m**

DISTANCE : **1.60 m**	PHOTO : **52/53**	VIDEO : **00:00:52**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct






DISTANCE : **5.03 m**	PHOTO : **54/55**	VIDEO : **00:01:46**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU6



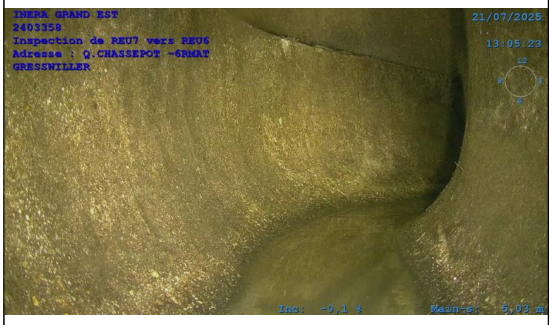


GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n°5**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU7 vers REU6**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **5.54 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU7 vers REU6**	Longueur mesurée : **5.54 m**

DISTANCE : **5.54 m**	PHOTO : **56**	VIDEO : **00:02:14**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection

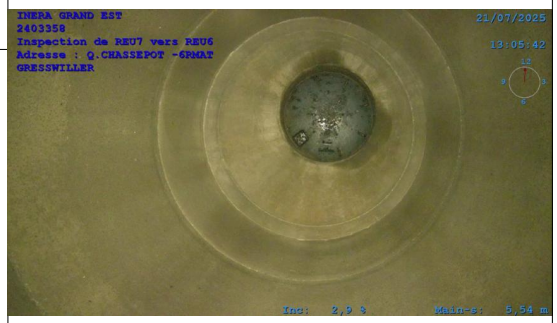

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 6**
	Référence du noeud de départ : **REU6**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REU5**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REU6 vers REU5**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux usées**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **10.23 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REU6**	Référence du noeud : **REU5**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 6**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU6 vers REU5**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **10.23 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU6 vers REU5**	Longueur mesurée : **10.23 m**


SYNTHESE DU TRONÇON REU6 VERS REU5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REU6	57	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	40
0.50m / REU6	58/59	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU6	40
10.23m / REU6	60	BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10% BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - curage a reprendre	40

Observations générales :

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

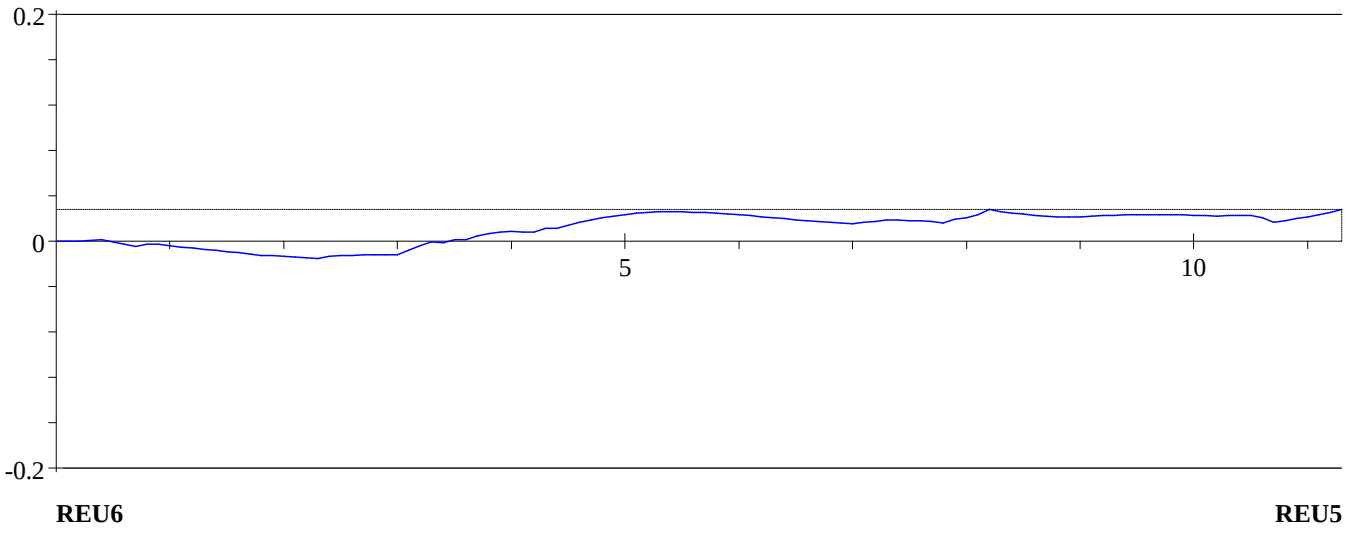


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 6** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU6 vers REU5**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **10.23 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU6 vers REU5**	Longueur mesurée : **10.23 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **57**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection

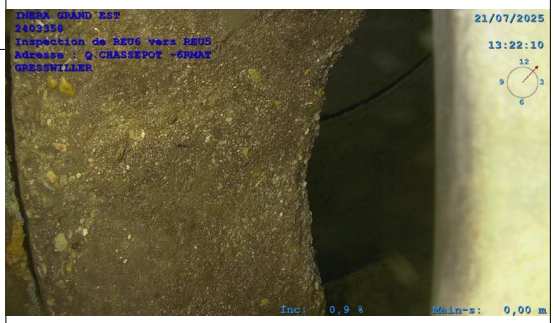


DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **58/59**	VIDEO : **00:00:13**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU6



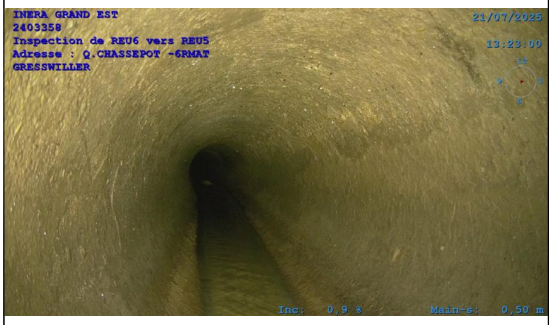

DISTANCE : **10.23 m**	PHOTO : **60**	VIDEO : **00:02:33**

OBSERVATIONS :

BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%
BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - curage a reprendr



ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 6bis**
	Référence du noeud de départ : **REU6**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REU5**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REU6 vers REU5**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux usées**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **74.10 m**
Date de l'inspection : **22/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pluie**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REU6**	Référence du noeud : **REU5**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU6 vers REU5**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **74.10 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU6 vers REU5**	Longueur mesurée : **74.10 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REU6 VERS REU5




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REU6	61	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	44
		BDB - Remarque générale - contre visite après curage	
0.50m / REU6	62/63	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU6	44
1.40m / REU6	64	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon	44
16.54m / REU6	65	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon	45
28.14m / REU6	66	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente	45
46.10m / REU6	67	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - réseau en charge	45
66.16m / REU6	68	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon	45
73.45m / REU6	69/70	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU5	46
74.10m / REU6	71	DACA - Rupture de 6h à 9h - Longueur de 100mm	46
74.10m / REU6	72	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	46

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 6bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REU6 vers REU5**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REU6 vers REU5**	Longueur inspectée : **74.10 m** Longueur mesurée : **74.10 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

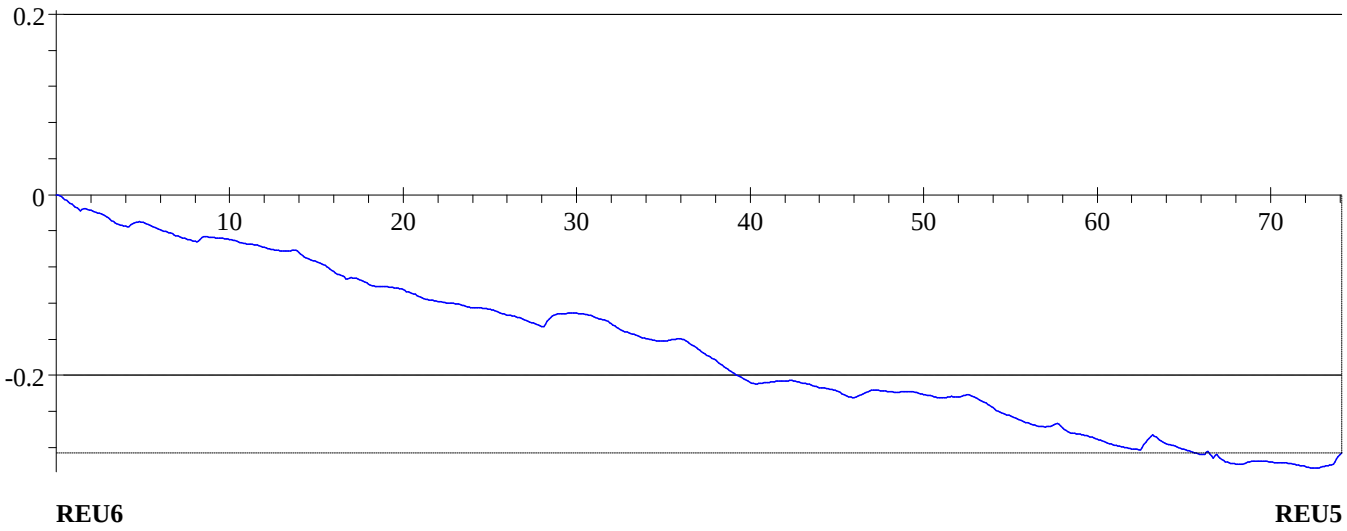

REU6 **REU5**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU6 vers REU5**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **74.10 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU6 vers REU5**	Longueur mesurée : **74.10 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **61**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection
BDB - Remarque générale - contre visite après curage




DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **62/63**	VIDEO : **00:00:35**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU6




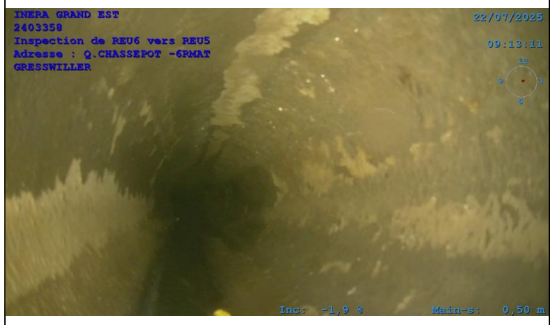

DISTANCE : **1.40 m**	PHOTO : **64**	VIDEO : **00:01:26**

OBSERVATIONS :

BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon

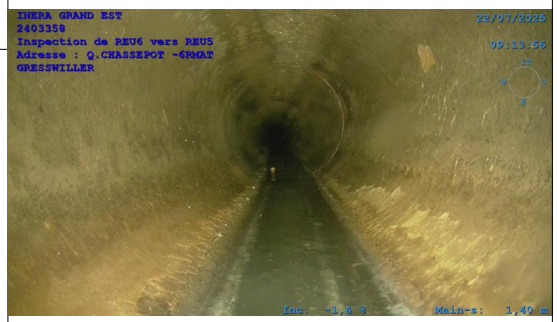

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 6bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU6 vers REU5**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **74.10 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU6 vers REU5**	Longueur mesurée : **74.10 m**

DISTANCE : **16.54 m**	PHOTO : **65**	VIDEO : **00:02:50**

OBSERVATIONS :


BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon



DISTANCE : **28.14 m**	PHOTO : **66**	VIDEO : **00:03:42**

OBSERVATIONS :


BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente

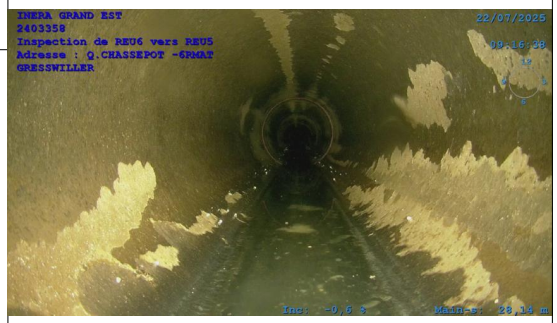

DISTANCE : **46.10 m**	PHOTO : **67**	VIDEO : **00:05:03**

OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - réseau en charge

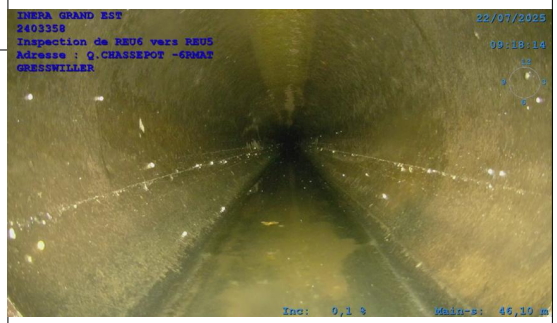

DISTANCE : **66.16 m**	PHOTO : **68**	VIDEO : **00:07:08**

OBSERVATIONS :

BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon




DISTANCE : **73.45 m**	PHOTO : **69/70**	VIDEO : **00:08:06**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU5



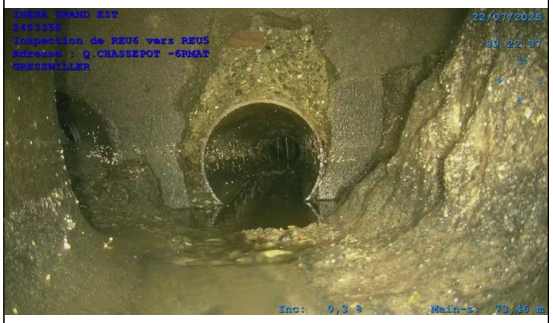

DISTANCE : **74.10 m**	PHOTO : **71**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

DACA - Rupture de 6h à 9h - Longueur de 100mm



DISTANCE : **74.10 m**	PHOTO : **72**	VIDEO : **00:08:30**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 7**
	Référence du noeud de départ : **REU5**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REU4**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REU5 vers REU4**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux usées**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **3.33 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REU5**	Référence du noeud : **REU4**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø800**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Echelons doubles**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU5 vers REU4**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **3.33 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU5 vers REU4**	Longueur mesurée : **3.33 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REU5 VERS REU4



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REU5	73/74	BDB - Remarque générale - départ d'inspection BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU5 - caméra poussée pour cause d 'accès BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 15% - poste de relevage en charge	49
2.50m / REU5	75	BDGA - Perte de visibilité par immersion de la caméra BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 30%	49
3.33m / REU5	76/77/78	BDCBZ - Inspection abandonnée à cause d'un niveau d'eau trop élevé - Autre - réseau en charge BDB - Remarque générale - contre sens non faisable poste en charge BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	50

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 7**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU5 vers REU4**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **3.33 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU5 vers REU4**	Longueur mesurée : **3.33 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **73/74**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU5 - caméra poussée pour cause d 'accès
BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 15% - poste de relevage en charge



DISTANCE : **2.50 m**	PHOTO : **75**	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :

BDGA - Perte de visibilité par immersion de la caméra
BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 30%

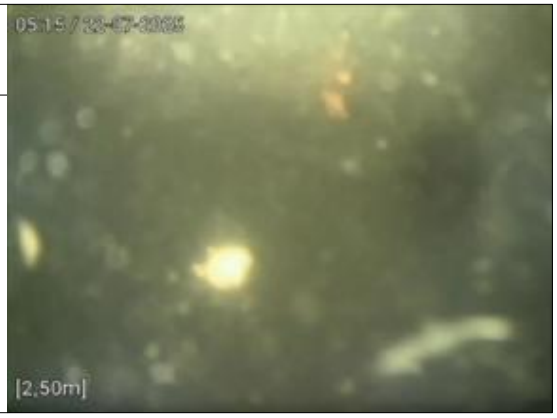

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 7** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**200 mm**	**REU5 vers REU4**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **3.33 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU5 vers REU4**	Longueur mesurée : **3.33 m**

DISTANCE : **3.33 m**	PHOTO : **76/77/78**	VIDEO : **00:00:45**



OBSERVATIONS :

BDCBZ - Inspection abandonnée à cause d'un niveau d'eau trop élevé - Autre - réseau charge
BDB - Remarque générale - contre sens non faisable poste en charge
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection





ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n°8**
	Référence du noeud de départ : **REU10**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REU11**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REU10 vers REU11**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux usées**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **25.38 m**
Date de l'inspection : **22/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **150**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REU10**	Référence du noeud : **REU11**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n°8**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**150 mm**	**REU10 vers REU11**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **25.38 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU10 vers REU11**	Longueur mesurée : **25.38 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REU10 VERS REU11



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REU10	79/80	BDB - Remarque générale - départ d'inspection BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU10	53
8.12m / REU10	81	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon	53
18.67m / REU10	82	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - début	53
19.58m / REU10	83	BDGA - Perte de visibilité par immersion de la caméra BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 50% - point bas flache	54
24.79m / REU10	84	BDDC - Niveau d'eaux troubles - fin	54
25.38m / REU10	85	BDCZ- - Inspection abandonnée - Autre - limite matériel atteint, reprise de l'inspection en sens inverse	54


Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**150 mm**	**REU10 vers REU11**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **25.38 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU10 vers REU11**	Longueur mesurée : **25.38 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **79/80**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU10

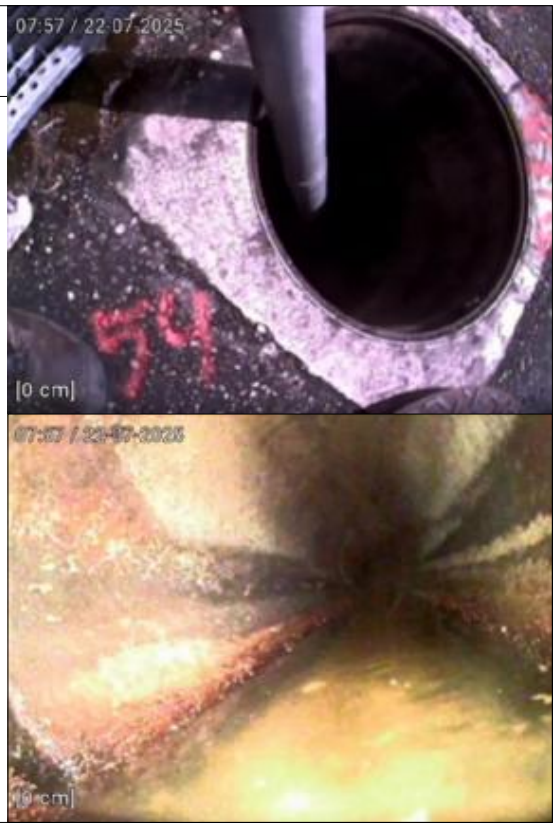

DISTANCE : **8.12 m**	PHOTO : **81**	VIDEO : **00:00:39**

OBSERVATIONS :

BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon



DISTANCE : **18.67 m**	PHOTO : **82**	VIDEO : **00:01:36**

OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - début




INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n°8** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**150 mm**	**REU10 vers REU11**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **25.38 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU10 vers REU11**	Longueur mesurée : **25.38 m**

DISTANCE : **19.58 m**	PHOTO : **83**	VIDEO : **00:01:40**

OBSERVATIONS :

BDGA - Perte de visibilité par immersion de la caméra
BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 50% - point bas flache

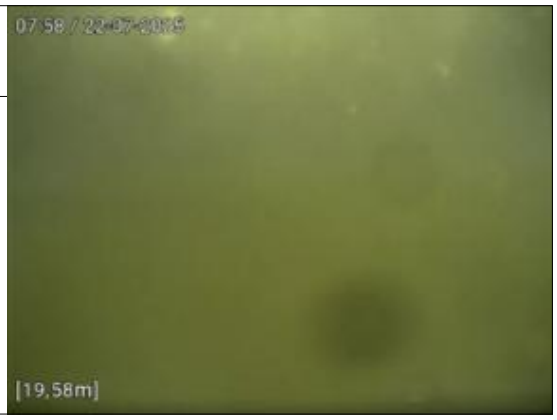

DISTANCE : **24.79 m**	PHOTO : **84**	VIDEO : **00:02:42**

OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux troubles - fin



DISTANCE : **25.38 m**	PHOTO : **85**	VIDEO : **00:02:57**

OBSERVATIONS :

BDCZ- - Inspection abandonnée - Autre - limite matériel atteint, reprise de l'inspection sens inverse

ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 8bis**
	Référence du noeud de départ : **REU11**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REU10**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REU10 vers REU11**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux usées**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **4.75 m**
Date de l'inspection : **22/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **150**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**


Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REU11**	Référence du noeud : **REU10**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

SYNTHESE DU TRONÇON REU11 VERS REU10



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REU11	86/87	BDB - Remarque générale - Reprise de l'inspection à contresens BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU11	57
3.16m / REU11	88	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon	57
4.75m / REU11	89	BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précéden Contresens atteint BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	57

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 8bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux usées	**150 mm**	**REU10 vers REU11**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **4.75 m**
Fonte	**3.00 m**	**REU11 vers REU10**	Longueur mesurée : **4.75 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **86/87**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - Reprise de l'inspection à contresens
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU11



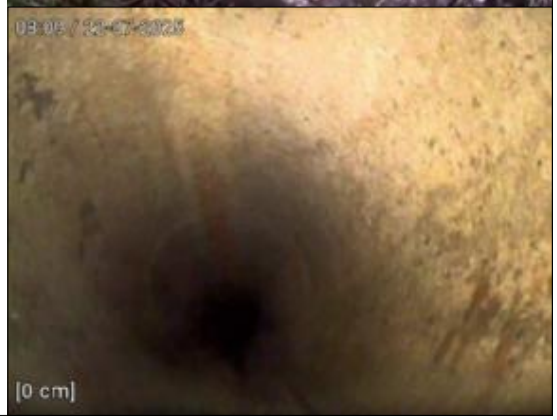

DISTANCE : **3.16 m**	PHOTO : **88**	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :

BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon



DISTANCE : **4.75 m**	PHOTO : **89**	VIDEO : **00:00:42**

OBSERVATIONS :

BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente - Contresens atteint
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection

ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n°9**
	Référence du noeud de départ : **REP1**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ : **1.5 m**
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP2**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : **0.7 m**
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP2 vers REP1**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **25.26 m**
Date de l'inspection : **15/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP1**	Référence du noeud : **REP2**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Profondeur de la canalisation inspectée : **1.5 m**	Profondeur de la canalisation inspectée : **0.7 m**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP2 vers REP1**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **25.26 m**
Grès	**3.00 m**	**REP1 vers REP2**	Longueur mesurée : **25.26 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP1 VERS REP2




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP1	90	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	61
0.50m / REP1	91/92	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP1	61
5.86m / REP1	93/94/95	BAIAA - Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation à 9h BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	62
6.02m / REP1	96/97	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	62
6.39m / REP1	98/99	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm BAJA - Deboîtement (longitudinal) à 9h BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 15%	63
7.97m / REP1	100/101	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 3h - Largeur de 1mm	63
24.10m / REP1	102/103	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 20%	64
24.45m / REP1	104/105	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 50%	64
25.26m / REP1	106	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP2 BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	65

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n°9** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP2 vers REP1**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP1 vers REP2**	Longueur inspectée : **25.26 m** Longueur mesurée : **25.26 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

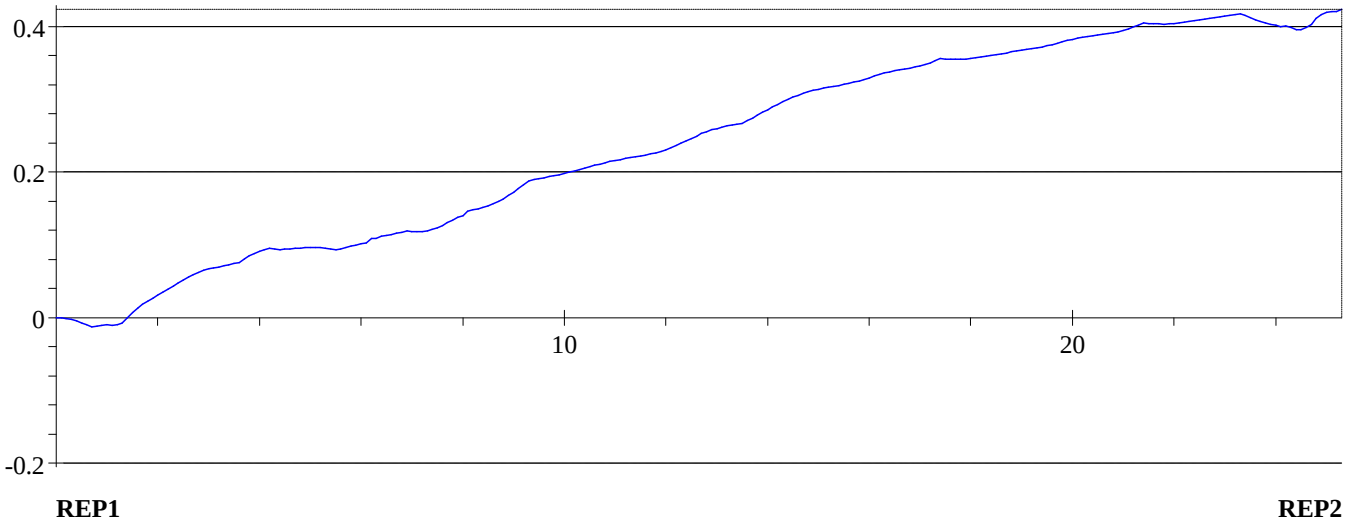


Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP2 vers REP1**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **25.26 m**
Grès	**3.00 m**	**REP1 vers REP2**	Longueur mesurée : **25.26 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **90**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection

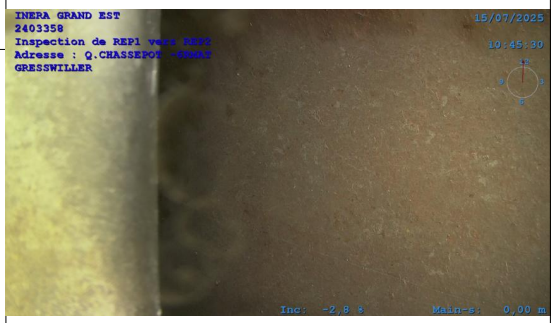

DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **91/92**	VIDEO : **00:00:10**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP1

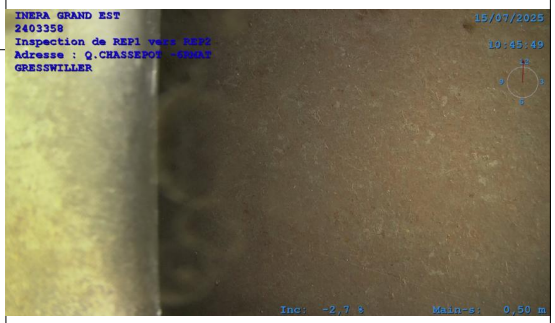




GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n°9** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP2 vers REP1**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP1 vers REP2**	Longueur inspectée : **25.26 m** Longueur mesurée : **25.26 m**

DISTANCE : **5.86 m** | PHOTO : **93/94/95** | VIDEO : **00:03:08**

OBSERVATIONS :

BAIAA - Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation à 9h
BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm

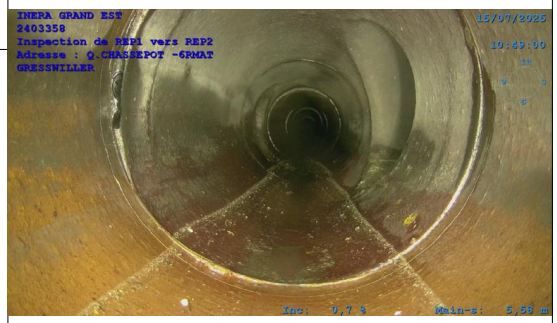





DISTANCE : **6.02 m** | PHOTO : **96/97** | VIDEO : **00:03:57**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm





Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP2 vers REP1**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **25.26 m**
Grès	**3.00 m**	**REP1 vers REP2**	Longueur mesurée : **25.26 m**

DISTANCE : **6.39 m**	PHOTO : **98/99**	VIDEO : **00:04:12**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm
BAJA - Deboîtement (longitudinal) à 9h
BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 15%







DISTANCE : **7.97 m**	PHOTO : **100/101**	VIDEO : **00:04:42**

OBSERVATIONS :

BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 3h - Largeur de 1mm

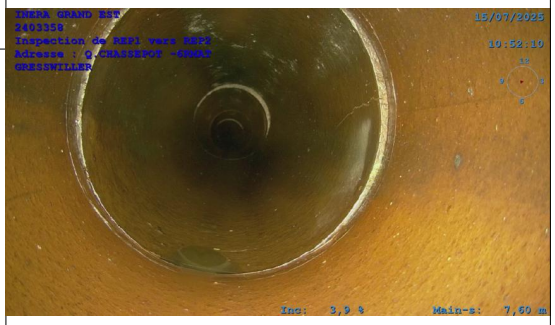

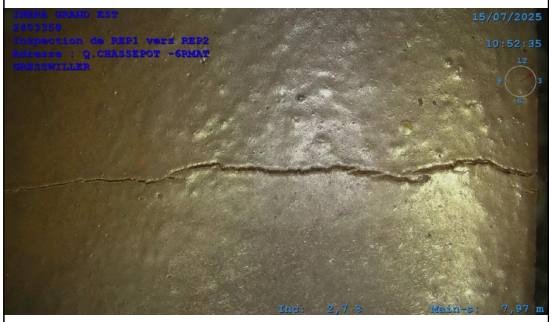

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n°9**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP2 vers REP1**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **25.26 m**
Grès	**3.00 m**	**REP1 vers REP2**	Longueur mesurée : **25.26 m**

DISTANCE : **24.10 m**	PHOTO : **102/103**	VIDEO : **00:06:31**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm
BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 20%





DISTANCE : **24.45 m**	PHOTO : **104/105**	VIDEO : **00:06:51**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm
BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 50%






INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n°9** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP2 vers REP1**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP1 vers REP2**	Longueur inspectée : **25.26 m** Longueur mesurée : **25.26 m**

DISTANCE : **25.26 m**	PHOTO : **106**	VIDEO : **00:07:12**	
OBSERVATIONS : **BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP2** **BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection**			

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G4** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G4 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.59 m** Longueur mesurée : **6.59 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G4 VERS Collecteur

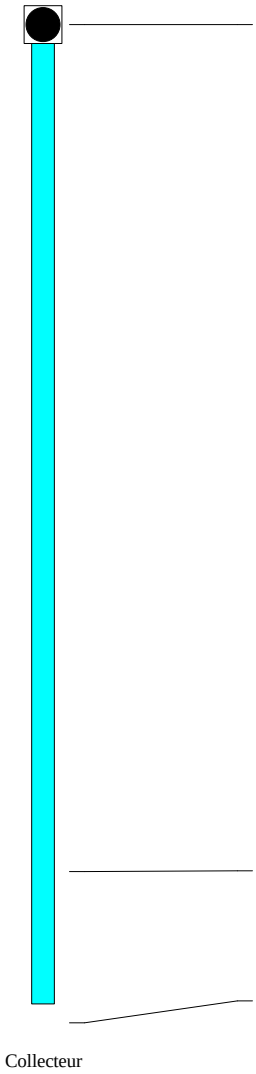

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G4	107/108	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G4	67
5.59 m/G4	109	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10%	67
6.59 m/G4	110	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	67

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP1 - REP2**


Position : **dans REP1 - REP2**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G4** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G4 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.59 m** Longueur mesurée : **6.59 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **107/108**	VIDEO : **00:00:02**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G4

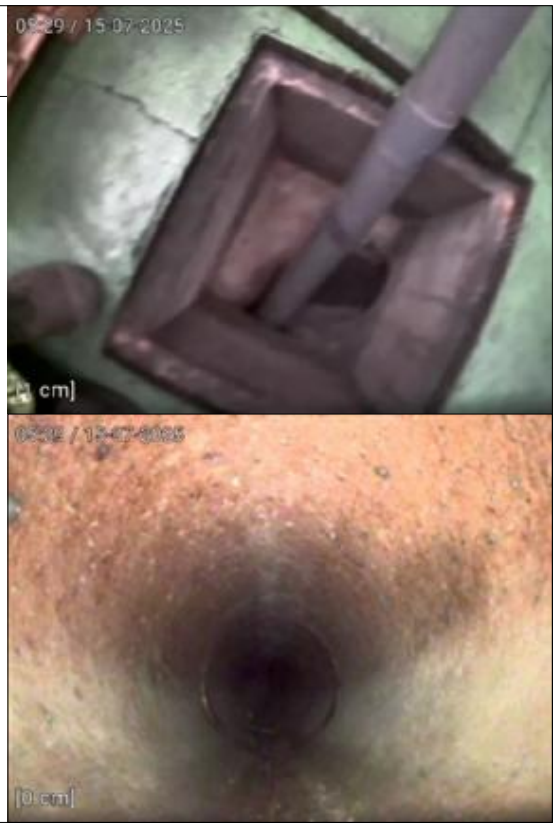

DISTANCE : **5.59 m**	PHOTO : **109**	VIDEO : **00:00:56**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas
BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10%



DISTANCE : **6.59 m**	PHOTO : **110**	VIDEO : **00:01:13**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **G4 bis**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**		**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.21 m**
Grès	**3.00 m**	**G4 vers Collecteur**	Longueur mesurée : **6.21 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G4 VERS Collecteur

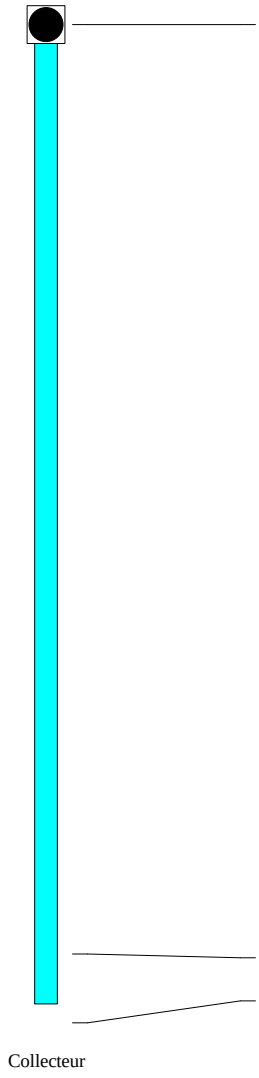

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G4	111/112	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G4 - contre visite après curage	69
5.78 m/G4	113	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	69
6.21 m/G4	114	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	69

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP1 - REP2**

Position : **dans REP1 - REP2**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G4 bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G4 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.21 m** Longueur mesurée : **6.21 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **111/112**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G4 - contre visite après curage



DISTANCE : **5.78 m**	PHOTO : **113**	VIDEO : **00:00:31**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas



DISTANCE : **6.21 m**	PHOTO : **114**	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G3** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G3 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.88 m** Longueur mesurée : **5.88 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G3 VERS Collecteur

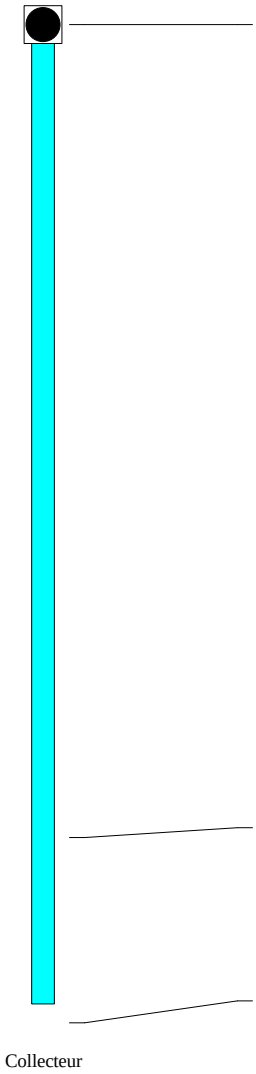

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G3	115/116	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G3	71
4.79 m/G3	117	BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 70%	71
5.88 m/G3	118	BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - dépots empèchant la progression de la caméra	71

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP1 - REP2**

Position : **dans REP1 - REP2**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G3** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G3 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.88 m** Longueur mesurée : **5.88 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **115/116**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G3



DISTANCE : **4.79 m**	PHOTO : **117**	VIDEO : **00:00:44**

OBSERVATIONS :

BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 70%



DISTANCE : **5.88 m**	PHOTO : **118**	VIDEO : **00:00:56**

OBSERVATIONS :

BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - dépots empèchant progression de la caméra


ABANDON INSPECTION



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G3bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G3 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.97 m** Longueur mesurée : **5.97 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G3 VERS Collecteur

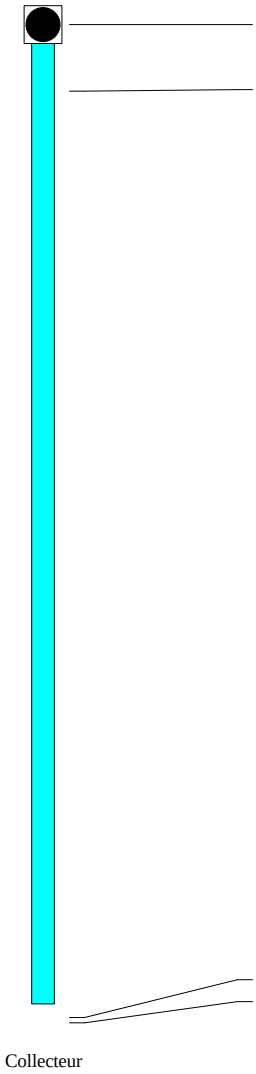

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G3	119/120	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G3 - contre visite après curage	73
0.40 m/G3	121	BAJA - Deboîtement (longitudinal)	73
5.94 m/G3	122	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	73
5.97 m/G3	123	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	74
		BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP1 - REP2**


Position : **dans REP1 - REP2**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G3bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G3 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.97 m** Longueur mesurée : **5.97 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **119/120**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G3 - contre visite après curage

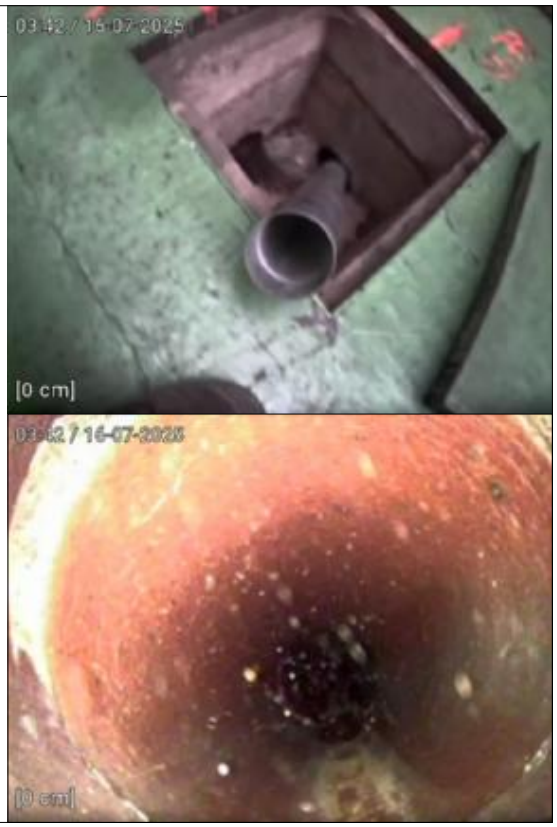

DISTANCE : **0.40 m**	PHOTO : **121**	VIDEO : **00:00:14**

OBSERVATIONS :

BAJA - Deboîtement (longitudinal)



DISTANCE : **5.94 m**	PHOTO : **122**	VIDEO : **00:00:30**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas



	GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G3bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G3 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.97 m** Longueur mesurée : **5.97 m**

DISTANCE : **5.97 m**	PHOTO : **123**	VIDEO : **00:00:38**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G2** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G2 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.31 m** Longueur mesurée : **6.31 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G2 VERS Collecteur

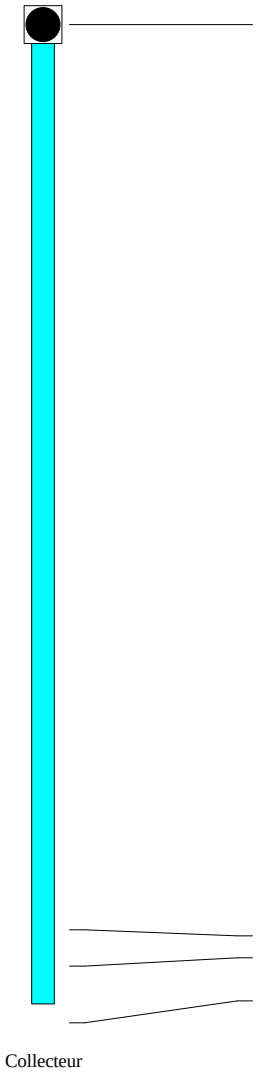

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G2	124/125	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G2	76
5.72 m/G2	126	BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	76
5.95 m/G2	127	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	76
6.31 m/G2	128	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	77
		BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP1 - REP2**

Position : **dans REP1 - REP2**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **124/125**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G2



DISTANCE : **5.72 m**	PHOTO : **126**	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :


BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%

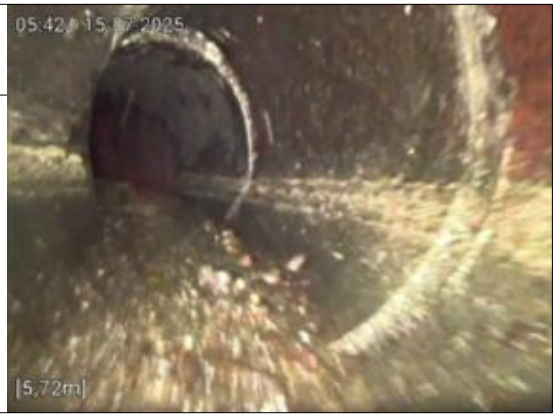

DISTANCE : **5.95 m**	PHOTO : **127**	VIDEO : **00:00:35**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas

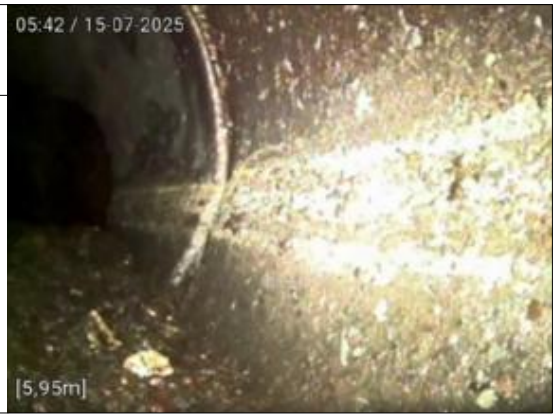


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G2** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G2 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.31 m** Longueur mesurée : **6.31 m**

DISTANCE : **6.31 m**	PHOTO : **128**	VIDEO : **00:00:41**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur

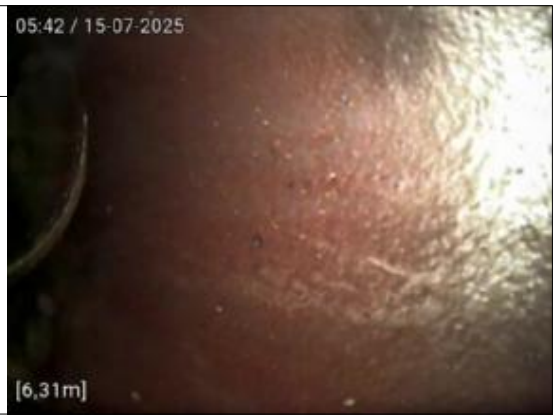


INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G2 bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G2 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.02 m** Longueur mesurée : **6.02 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G2 VERS Collecteur

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G2	129/130	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G2 - contre visite après curage	79
5.49 m/G2	131	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	79
6.02 m/G2	132	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	79

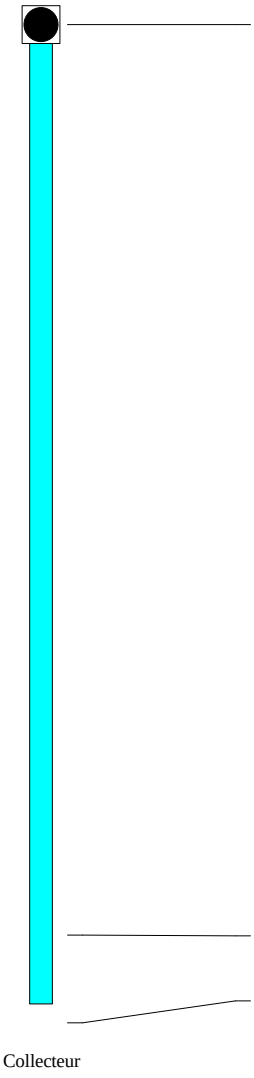

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP1 - REP2**

Position : **dans REP1 - REP2**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G2 bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G2 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.02 m** Longueur mesurée : **6.02 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **129/130**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G2 - contre visite après curage



DISTANCE : **5.49 m**	PHOTO : **131**	VIDEO : **00:00:31**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



DISTANCE : **6.02 m**	PHOTO : **132**	VIDEO : **00:00:38**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G1** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G1 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.57 m** Longueur mesurée : **6.57 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G1 VERS Collecteur

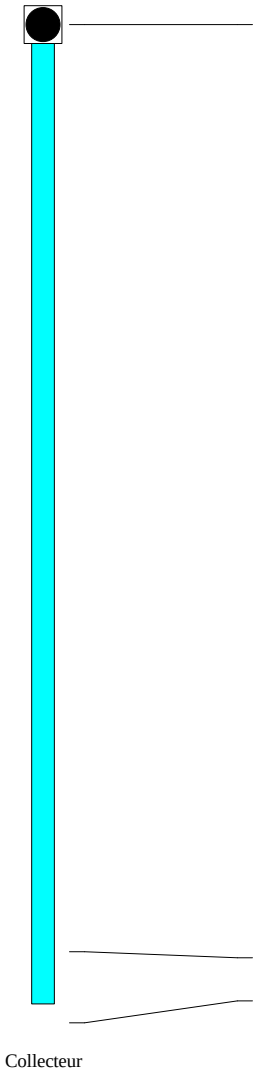

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G1	133/134	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G1	81
6.10 m/G1	135	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	81
6.57 m/G1	136	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	81

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP1 - REP2**

Position : **dans REP1 - REP2**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G1** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G1 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.57 m** Longueur mesurée : **6.57 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **133/134**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G1





DISTANCE : **6.10 m**	PHOTO : **135**	VIDEO : **00:00:37**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



DISTANCE : **6.57 m**	PHOTO : **136**	VIDEO : **00:00:41**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G1 bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G1 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.53 m** Longueur mesurée : **6.53 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G1 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G1	137/138	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G1 - contre visite après curage	83
6.20 m/G1	139	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	83
6.53 m/G1	140	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	83
		BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP1 - REP2**

Position : **dans REP1 - REP2**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G1 bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G1 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.53 m** Longueur mesurée : **6.53 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **137/138**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G1 - contre visite après curage



DISTANCE : **6.20 m**	PHOTO : **139**	VIDEO : **00:00:40**

OBSERVATIONS :


BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



DISTANCE : **6.53 m**	PHOTO : **140**	VIDEO : **00:00:44**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur

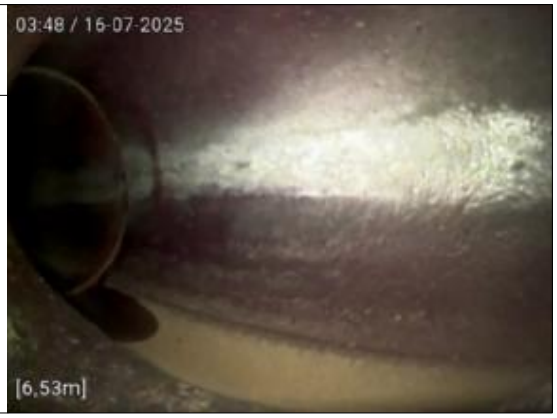

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 10**
	Référence du noeud de départ : **REP1**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP3**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP3 vers REP1**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **29.95 m**
Date de l'inspection : **15/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP1**	Référence du noeud : **REP3**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 10**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP3 vers REP1**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **15.01 m**
Grès	**3.00 m**	**REP1 vers REP3**	Longueur mesurée : **29.95 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP1 VERS REP3




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP1	141	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	87
0.50m / REP1	142/143	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 1	87
8.01m / REP1	144/145	BAIAA - Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation	88
9.14m / REP1	146/147	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	88
		BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	
9.46m / REP1	148/149	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	89
		BBCA - Dépôt de matériau fin à 3h - Epaisseur du dépôt de 30%	
14.58m / REP1	150/151	BACB - Effondrement partiel	89
15.01m / REP1	152	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - effondrement partiel risquant de bloquer la caméra	90
		BDB - Remarque générale - contre sens non faisable ,regard bloqué	

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 10** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP3 vers REP1**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP1 vers REP3**	Longueur inspectée : **15.01 m** Longueur mesurée : **29.95 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

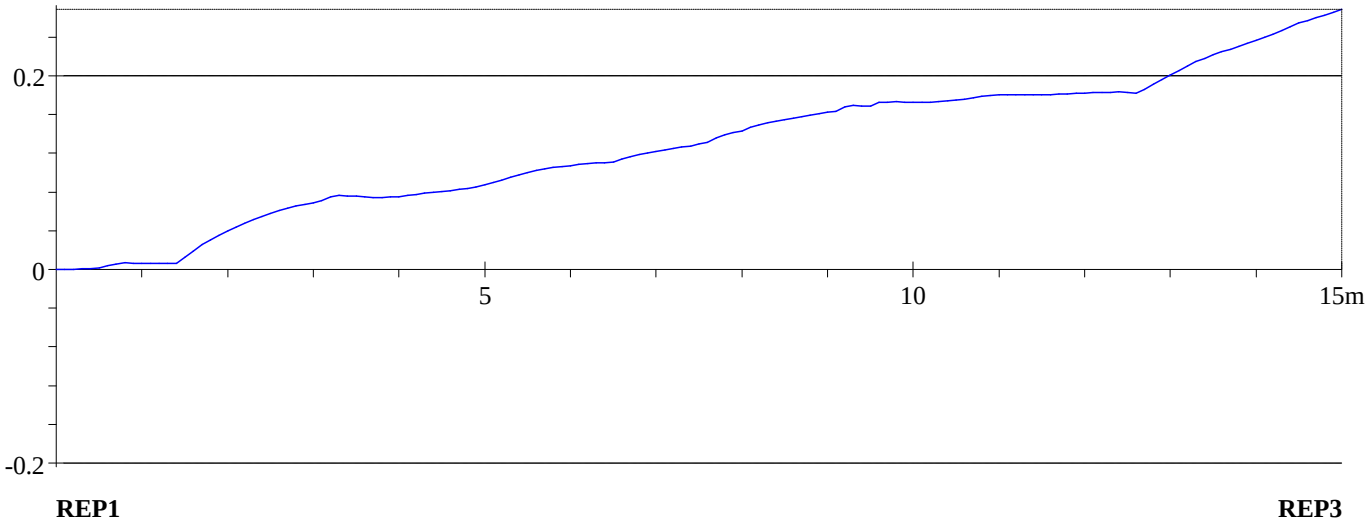


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 10** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP3 vers REP1**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP1 vers REP3**	Longueur inspectée : **15.01 m** Longueur mesurée : **29.95 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **141**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection

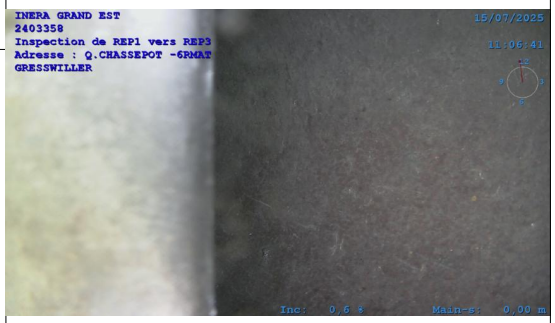

DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **142/143**	VIDEO : **00:00:11**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 1

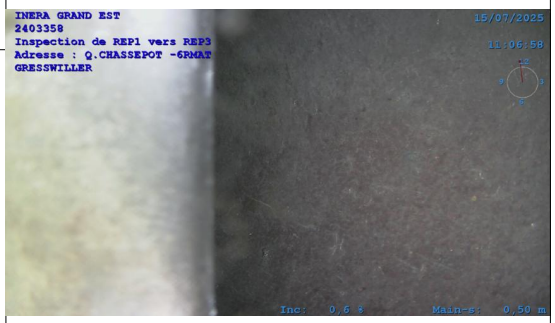




DISTANCE : **8.01 m**	PHOTO : **144/145**	VIDEO : **00:02:58**

OBSERVATIONS :

BAIAA - Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation



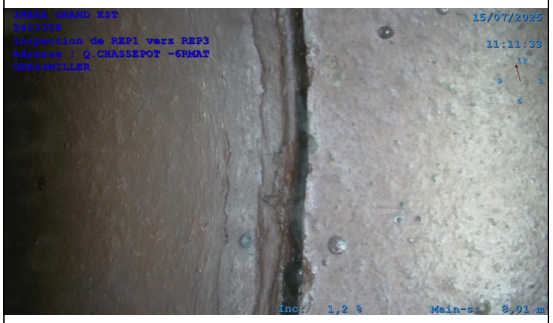

DISTANCE : **9.14 m**	PHOTO : **146/147**	VIDEO : **00:03:25**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm
BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%





DISTANCE : **9.46 m**	PHOTO : **148/149**	VIDEO : **00:03:40**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm
BBCA - Dépôt de matériau fin à 3h - Epaisseur du dépôt de 30%





DISTANCE : **14.58 m**	PHOTO : **150/151**	VIDEO : **00:04:26**

OBSERVATIONS :

BACB - Effondrement partiel





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 10** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP3 vers REP1**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP1 vers REP3**	Longueur inspectée : **15.01 m** Longueur mesurée : **29.95 m**

DISTANCE : **15.01 m**	PHOTO : **152**	VIDEO : **00:06:18**

OBSERVATIONS :


BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - effondrement partiel risquant de bloquer la caméra
BDB - Remarque générale - contre sens non faisable ,regard bloqué

ABANDON INSPECTION



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G6** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G6 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.52 m** Longueur mesurée : **6.52 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G6 VERS Collecteur

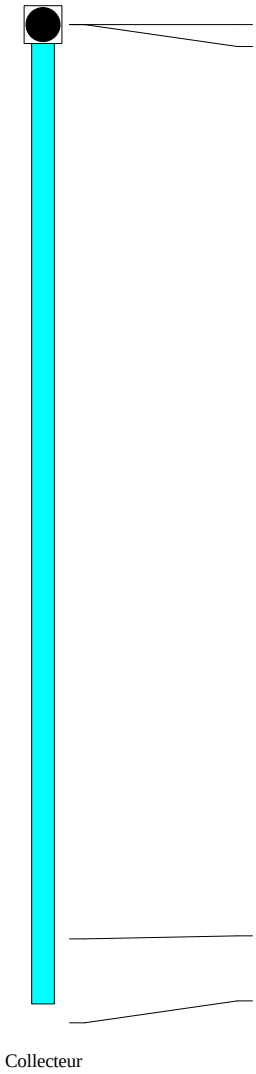

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G6	153/154	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G6	92
0.00 m/G6	155/156	BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 30%	92
5.97 m/G6	157	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	93
6.52 m/G6	158	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	93

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP2 - REP3**

Position : **dans REP2 - REP3**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G6** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G6 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.52 m** Longueur mesurée : **6.52 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **153/154**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G6





DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **155/156**	VIDEO : **00:00:11**

OBSERVATIONS :

BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 30%





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G6** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G6 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.52 m** Longueur mesurée : **6.52 m**

DISTANCE : **5.97 m**	PHOTO : **157**	VIDEO : **00:00:32**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



DISTANCE : **6.52 m**	PHOTO : **158**	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G6bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G6 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.29 m** Longueur mesurée : **6.29 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G6 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G6	159/160	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G6 - contre visite après curage	95
4.50 m/G6	161	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	95
5.91 m/G6	162	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	95
6.29 m/G6	163	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	96

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP1 - REP3**

Position : **dans REP1 - REP3**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G6bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G6 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.29 m** Longueur mesurée : **6.29 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **159/160**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G6 - contre visite après curage





DISTANCE : **4.50 m**	PHOTO : **161**	VIDEO : **00:00:33**

OBSERVATIONS :

BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm



DISTANCE : **5.91 m**	PHOTO : **162**	VIDEO : **00:00:38**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G6bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G6 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.29 m** Longueur mesurée : **6.29 m**

DISTANCE : **6.29 m**	PHOTO : **163**	VIDEO : **00:00:44**


OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G5** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G5 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.32 m** Longueur mesurée : **6.32 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G5 VERS Collecteur

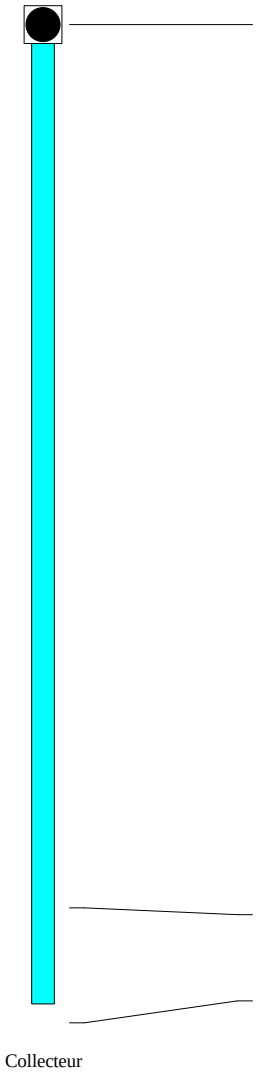

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G5	164/165	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G5	98
5.59 m/G5	166	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	98
6.32 m/G5	167	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	98

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP1 - REP3**

Position : **dans REP1 - REP3**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G5** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :	
Eaux pluviales	**200 mm**		**16 juillet 2025**	
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée :	**6.32 m**
Grès	**3.00 m**	**G5 vers Collecteur**	Longueur mesurée :	**6.32 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **164/165**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :


BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G5



DISTANCE : **5.59 m**	PHOTO : **166**	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas

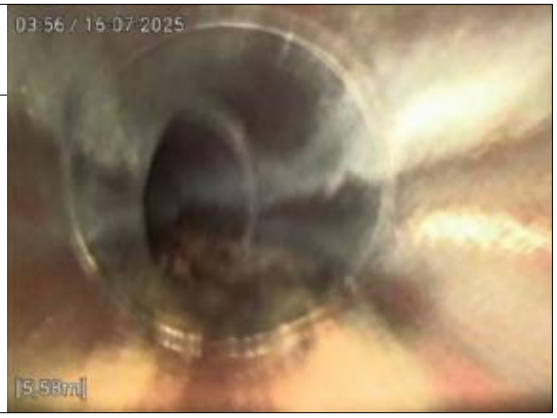

DISTANCE : **6.32 m**	PHOTO : **167**	VIDEO : **00:00:40**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G8** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G8 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G8 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G8	168	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Inaccessible	100

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP1 - REP3**

Position : **dans REP1 - REP3**


INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G8** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G8 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **168**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Inaccessible


ABANDON INSPECTION



GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **G7**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**		**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.73 m**
Grès	**3.00 m**	**G7 vers Collecteur**	Longueur mesurée : **6.73 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G7 VERS Collecteur

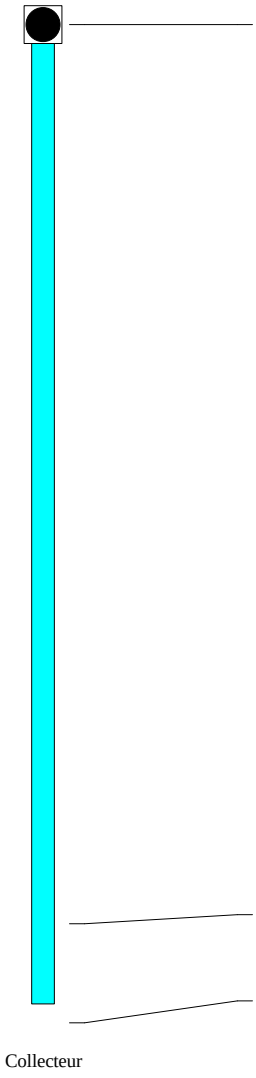

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G7	169/170	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G7	102
6.06 m/G7	171	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	102
6.73 m/G7	172	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	102

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP1 - REP3**

Position : **dans REP1 - REP3**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G7** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G7 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.73 m** Longueur mesurée : **6.73 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **169/170**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G7



DISTANCE : **6.06 m**	PHOTO : **171**	VIDEO : **00:00:33**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas



DISTANCE : **6.73 m**	PHOTO : **172**	VIDEO : **00:00:40**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 11**
	Référence du noeud de départ : **REP1**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP4**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP1 vers REP4**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **27.60 m**
Date de l'inspection : **15/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **250**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP1**	Référence du noeud : **REP4**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 11**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP1 vers REP4**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **27.60 m**
Grès	**3.00 m**	**REP1 vers REP4**	Longueur mesurée : **27.60 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP1 VERS REP4




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP1	173	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	106
0.50m / REP1	174/175	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP1	106
5.80m / REP1	176/177/178	BABCA - Fissure longitudinale ouverte - Largeur de 1mm - 5h,6h	107
6.86m / REP1	179	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 6h - Largeur de 1mm - fin	107
17.13m / REP1	180/181	BDA - Photographie générale - emboitement correct	108
22.56m / REP1	182	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 5% - Début de flache	108
24.31m / REP1	183	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - point bas flache	108
27.20m / REP1	184/185	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP4	109
27.60m / REP1	186	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	109

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 11** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **250 mm**	Sens de l'écoulement **REP1 vers REP4**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP1 vers REP4**	Longueur inspectée : **27.60 m** Longueur mesurée : **27.60 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

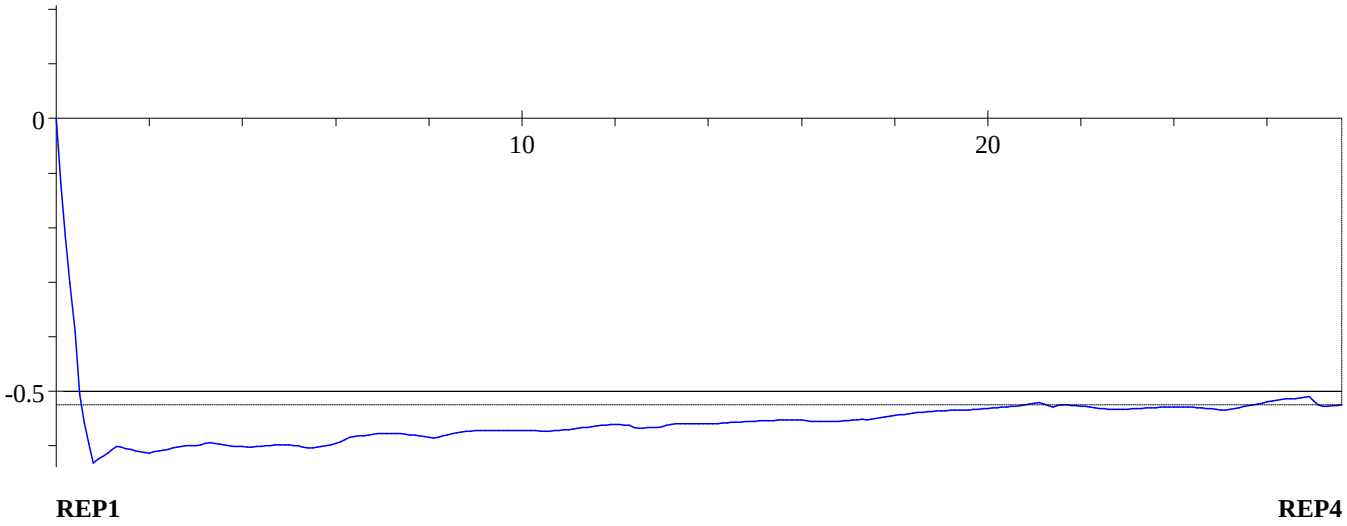

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 11** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP1 vers REP4**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **27.60 m**
Grès	**3.00 m**	**REP1 vers REP4**	Longueur mesurée : **27.60 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **173**	VIDEO : **00:00:04**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **174/175**	VIDEO : **00:00:13**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP1







GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 11** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **250 mm**	Sens de l'écoulement **REP1 vers REP4**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP1 vers REP4**	Longueur inspectée : **27.60 m** Longueur mesurée : **27.60 m**


DISTANCE : **5.80 m**	PHOTO : **176/177/178**	VIDEO : **00:01:43**

OBSERVATIONS :

BABCA - Fissure longitudinale ouverte - Largeur de 1mm - 5h,6h

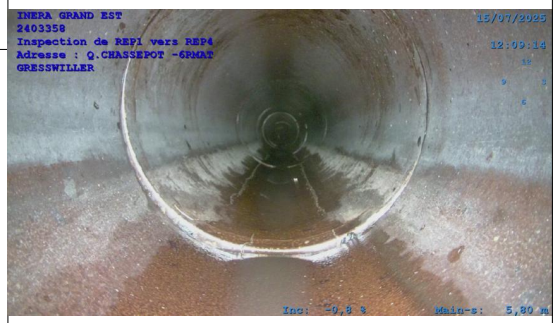

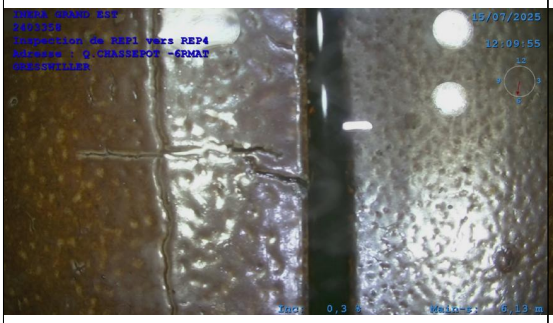


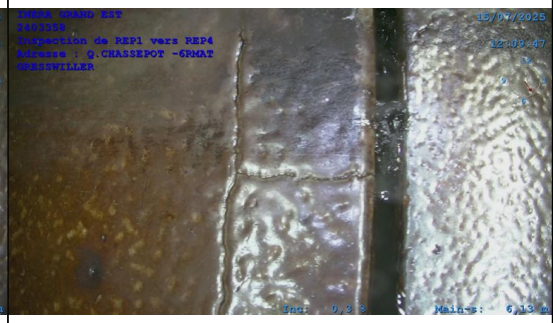

DISTANCE : **6.86 m**	PHOTO : **179**	VIDEO : **00:02:32**

OBSERVATIONS :

BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 6h - Largeur de 1mm - fin

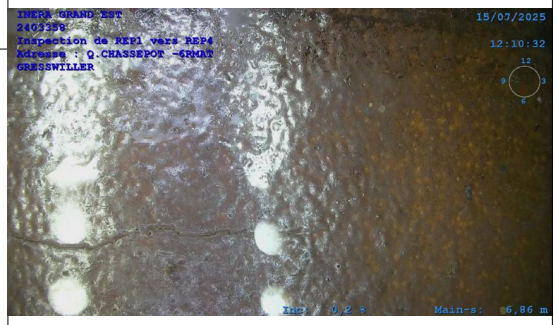


DISTANCE : **17.13 m**	PHOTO : **180/181**	VIDEO : **00:03:22**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct




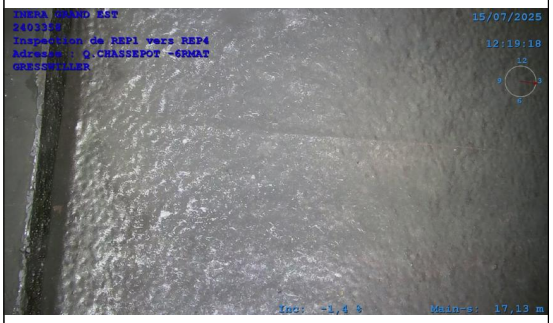

DISTANCE : **22.56 m**	PHOTO : **182**	VIDEO : **00:04:02**

OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 5% - Début de flache

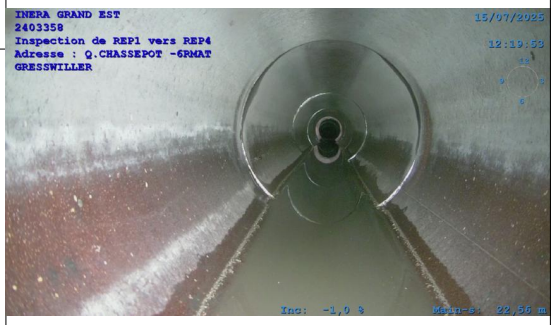

DISTANCE : **24.31 m**	PHOTO : **183**	VIDEO : **00:04:14**

OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - point bas flache



DISTANCE : **27.20 m**	PHOTO : **184/185**	VIDEO : **00:04:34**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP4





DISTANCE : **27.60 m**	PHOTO : **186**	VIDEO : **00:05:19**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 12**
	Référence du noeud de départ : **REP4**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP 5**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP 5 vers REP4**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **25.75 m**
Date de l'inspection : **15/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP4**	Référence du noeud : **REP 5**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Echelons doubles**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 12**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP 5 vers REP4**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **25.75 m**
Grès	**3.00 m**	**REP4 vers REP 5**	Longueur mesurée : **25.75 m**


SYNTHESE DU TRONÇON REP4 VERS REP 5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP4	187	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	113
0.50m / REP4	188/189	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 4	113
5.89m / REP4	190/191	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	114
		BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	
6.80m / REP4	192/193	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	114
		BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 30%	
24.09m / REP4	194/195	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	115
		BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	
24.90m / REP4	196/197	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	115
		BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	
25.20m / REP4	198	BAJB - Décentrage (radial) - Distance de 3mm	116
25.25m / REP4	199	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 5 - visible à 0.5	116
25.75m / REP4	200	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	116

Observations générales :

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

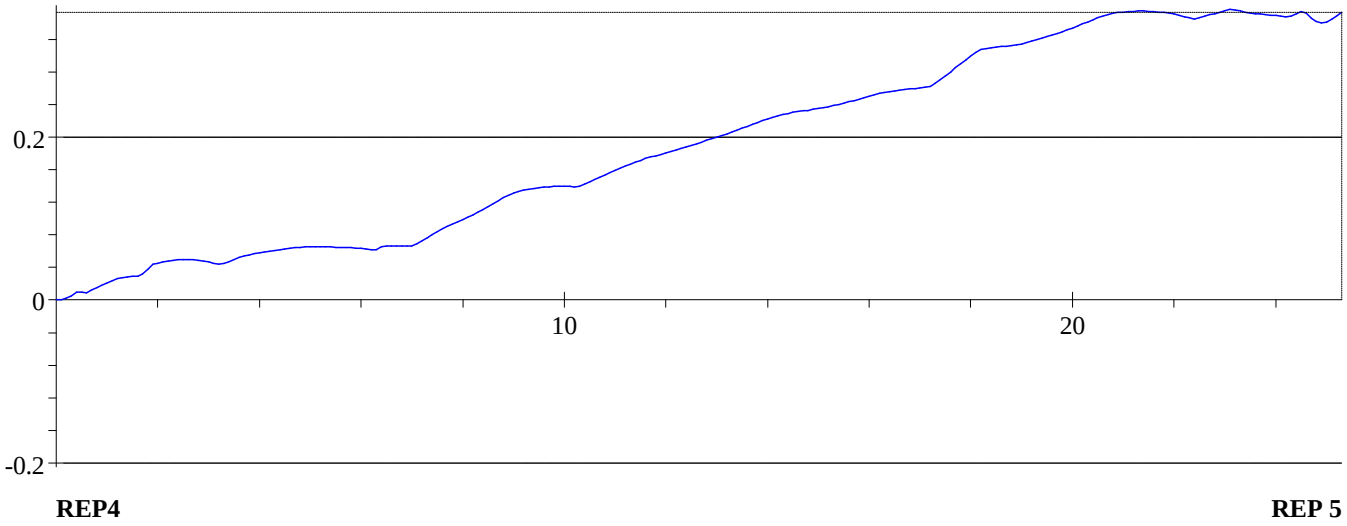


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 12** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP 5 vers REP4**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP4 vers REP 5**	Longueur inspectée : **25.75 m** Longueur mesurée : **25.75 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **187**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection

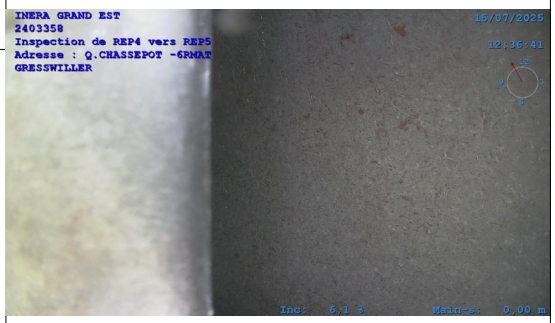

DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **188/189**	VIDEO : **00:00:08**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 4

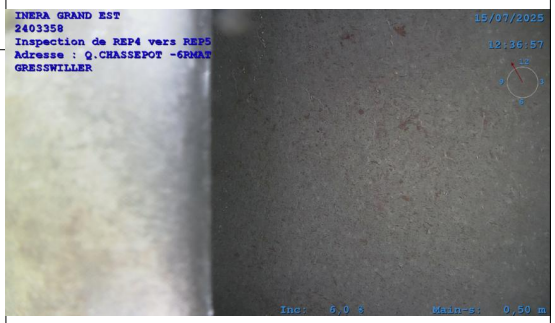




GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 12** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP 5 vers REP4**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **25.75 m**
Grès	**3.00 m**	**REP4 vers REP 5**	Longueur mesurée : **25.75 m**

DISTANCE : **5.89 m**	PHOTO : **190/191**	VIDEO : **00:02:44**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm
BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%

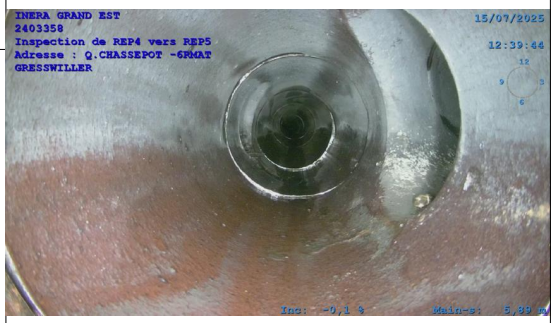




DISTANCE : **6.80 m**	PHOTO : **192/193**	VIDEO : **00:02:58**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm
BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 30%

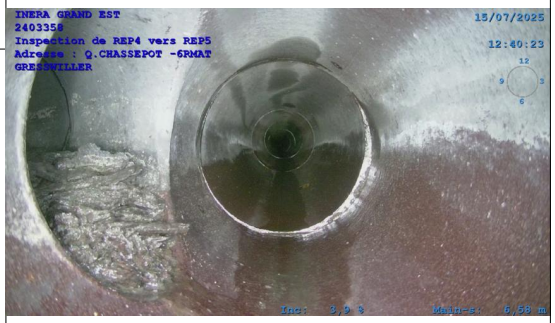



Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP 5 vers REP4**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **25.75 m**
Grès	**3.00 m**	**REP4 vers REP 5**	Longueur mesurée : **25.75 m**

DISTANCE : **24.09 m**	PHOTO : **194/195**	VIDEO : **00:04:33**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm
BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%






DISTANCE : **24.90 m**	PHOTO : **196/197**	VIDEO : **00:04:46**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm
BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%

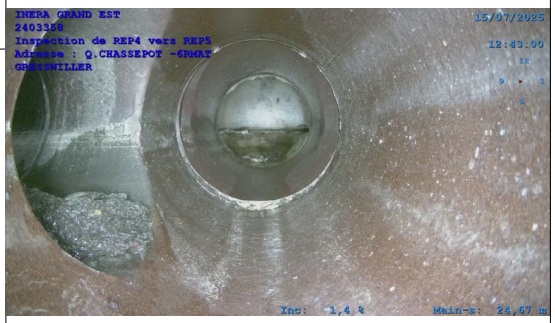



DISTANCE : **25.20 m**	PHOTO : **198**	VIDEO : **00:05:32**

OBSERVATIONS :


BAJB - Décentrage (radial) - Distance de 3mm



DISTANCE : **25.25 m**	PHOTO : **199**	VIDEO : **00:05:50**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 5 - visible à 0.5

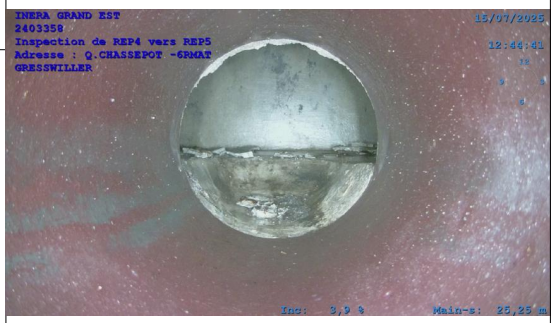

DISTANCE : **25.75 m**	PHOTO : **200**	VIDEO : **00:05:59**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - fin d'inspection



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G12** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G12 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.15 m** Longueur mesurée : **6.15 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G12 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G12	201/202	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G12	118
5.55 m/G12	203	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	118
6.15 m/G12	204	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	118

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP4 - REP 5**

Position : **dans REP4 - REP 5**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G12** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**		**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.15 m**
Grès	**3.00 m**	**G12 vers Collecteur**	Longueur mesurée : **6.15 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **201/202**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G12





DISTANCE : **5.55 m**	PHOTO : **203**	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



DISTANCE : **6.15 m**	PHOTO : **204**	VIDEO : **00:00:43**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G11** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G11 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.22 m** Longueur mesurée : **6.22 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G11 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G11	205/206	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G11	120
0.00 m/G11	207	BACA - Rupture	120
5.30 m/G11	208	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	120
6.22 m/G11	209	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	121

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP4 - REP 5**

Position : **dans REP4 - REP 5**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G11** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G11 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.22 m** Longueur mesurée : **6.22 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **205/206**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G11



DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **207**	VIDEO : **00:00:13**

OBSERVATIONS :

BACA - Rupture

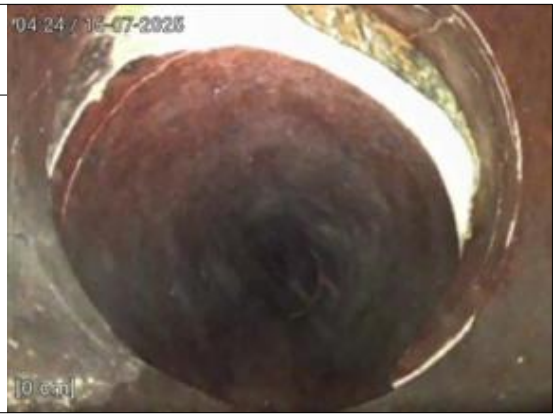

DISTANCE : **5.30 m**	PHOTO : **208**	VIDEO : **00:00:33**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas




INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G11** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G11 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.22 m** Longueur mesurée : **6.22 m**

DISTANCE : **6.22 m**	PHOTO : **209**	VIDEO : **00:00:42**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur

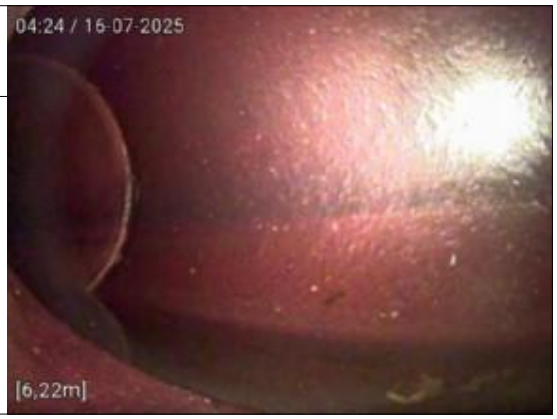

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G10** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G10 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.55 m** Longueur mesurée : **6.55 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G10 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G10	210/211	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G10	123
3.81 m/G10	212	BABCC - Fissure complexe ouverte - Largeur de 2mm	123
5.96 m/G10	213	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	123
6.55 m/G10	214	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	124

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP4 - REP 5**


Position : **dans REP4 - REP 5**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**		**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.55 m**
Grès	**3.00 m**	**G10 vers Collecteur**	Longueur mesurée : **6.55 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **210/211**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G10

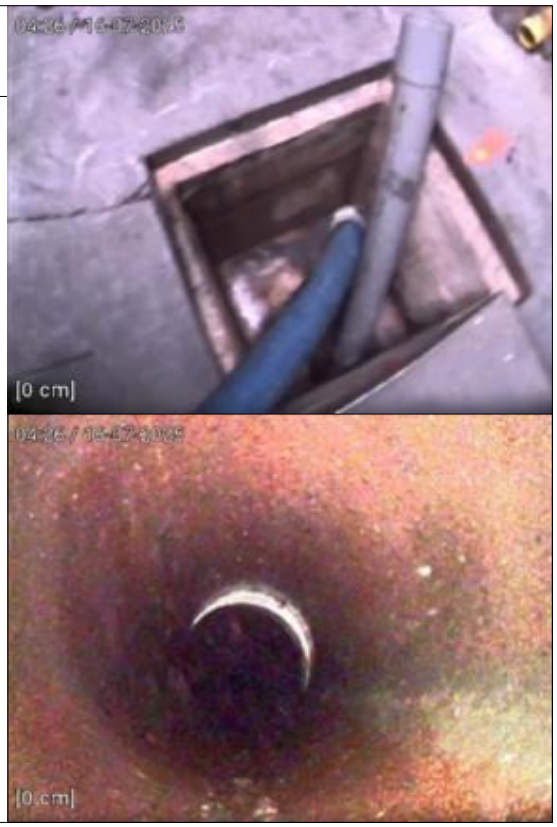

DISTANCE : **3.81 m**	PHOTO : **212**	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :

BABCC - Fissure complexe ouverte - Largeur de 2mm



DISTANCE : **5.96 m**	PHOTO : **213**	VIDEO : **00:00:45**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G10** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G10 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.55 m** Longueur mesurée : **6.55 m**

DISTANCE : **6.55 m**	PHOTO : **214**	VIDEO : **00:00:50**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G9** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G9 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.39 m** Longueur mesurée : **6.39 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G9 VERS Collecteur

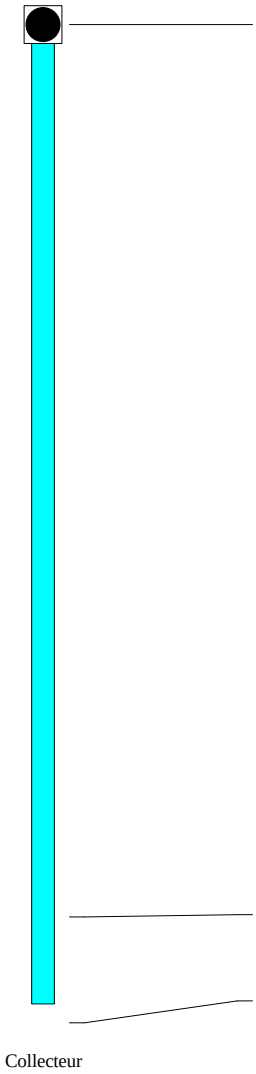

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G9	215/216	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G9 BDB - Remarque générale - erreur d 'incrustation distance	126
5.71 m/G9	217	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	126
6.39 m/G9	218	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	126

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP4 - REP 5**

Position : **dans REP4 - REP 5**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G9** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G9 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.39 m** Longueur mesurée : **6.39 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **215/216**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G9
BDB - Remarque générale - erreur d 'incrustation distance



DISTANCE : **5.71 m**	PHOTO : **217**	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas



DISTANCE : **6.39 m**	PHOTO : **218**	VIDEO : **00:00:55**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 13**
	Référence du noeud de départ : **REP4**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP 6**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP 6 vers REP4**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **29.02 m**
Date de l'inspection : **15/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP4**	Référence du noeud : **REP 6**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 13**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP 6 vers REP4**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **29.02 m**
Grès	**3.00 m**	**REP4 vers REP 6**	Longueur mesurée : **29.02 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP4 VERS REP 6




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP4	219	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	130
0.50m / REP4	220/221	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP4	130
9.16m / REP4	222/223	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	131
		BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	
9.72m / REP4	224/225	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	131
		BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	
14.36m / REP4	226/227	BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h - Hauteur 150mm	132
		BAHD - La conduite de raccordement est endommagée	
26.32m / REP4	228/229	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	132
		BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	
26.84m / REP4	230/231	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	133
		BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 30%	
28.10m / REP4	232/233	BABCC - Fissure complexe ouverte de 4h à 6h - Largeur de 2mm	133
28.62m / REP4	234/235	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP6	134
29.02m / REP4	236	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	134

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 13** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP 6 vers REP4**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP4 vers REP 6**	Longueur inspectée : **29.02 m** Longueur mesurée : **29.02 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

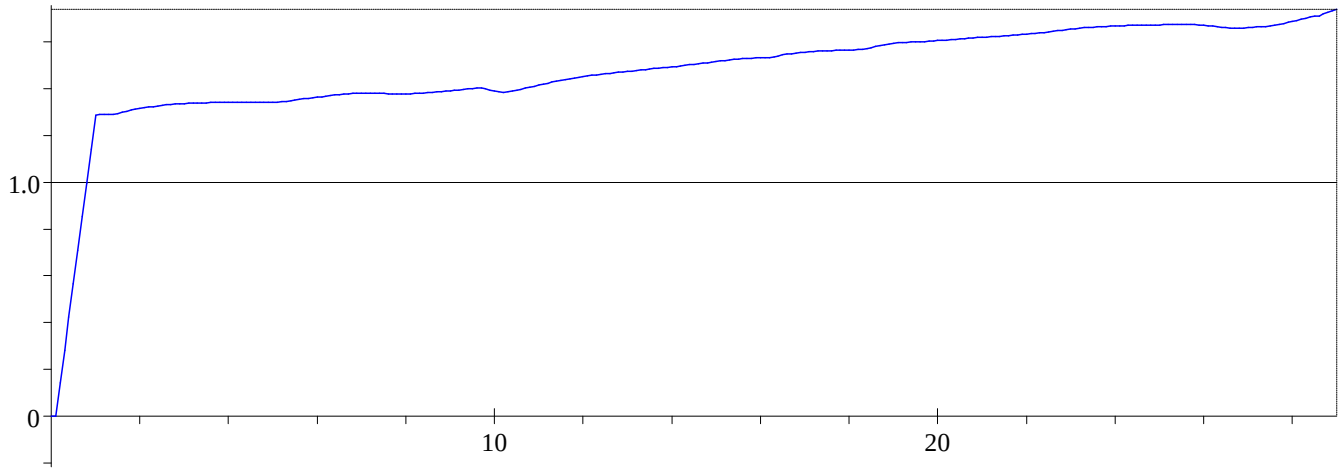


REP4 **REP 6**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 13** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP 6 vers REP4**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP4 vers REP 6**	Longueur inspectée : **29.02 m** Longueur mesurée : **29.02 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **219**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection

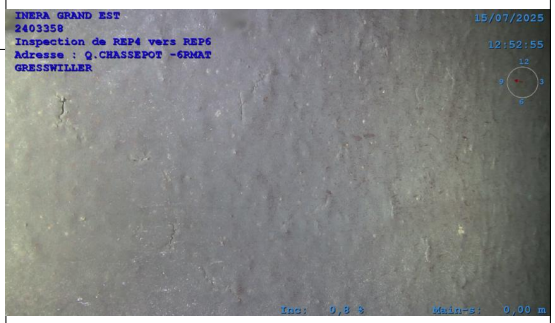

DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **220/221**	VIDEO : **00:00:13**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP4





DISTANCE : **9.16 m**	PHOTO : **222/223**	VIDEO : **00:01:59**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm
BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%





DISTANCE : **9.72 m**	PHOTO : **224/225**	VIDEO : **00:02:17**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm
BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 13** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP 6 vers REP4**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **29.02 m**
Grès	**3.00 m**	**REP4 vers REP 6**	Longueur mesurée : **29.02 m**

DISTANCE : **14.36 m**	PHOTO : **226/227**	VIDEO : **00:02:52**

OBSERVATIONS :

BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h - Hauteur 150mm
BAHD - La conduite de raccordement est endommagée





DISTANCE : **26.32 m**	PHOTO : **228/229**	VIDEO : **00:04:07**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm
BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%





GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 13**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP 6 vers REP4**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **29.02 m**
Grès	**3.00 m**	**REP4 vers REP 6**	Longueur mesurée : **29.02 m**

DISTANCE : **26.84 m**	PHOTO : **230/231**	VIDEO : **00:04:29**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm
BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 30%






DISTANCE : **28.10 m**	PHOTO : **232/233**	VIDEO : **00:04:52**

OBSERVATIONS :

BABCC - Fissure complexe ouverte de 4h à 6h - Largeur de 2mm



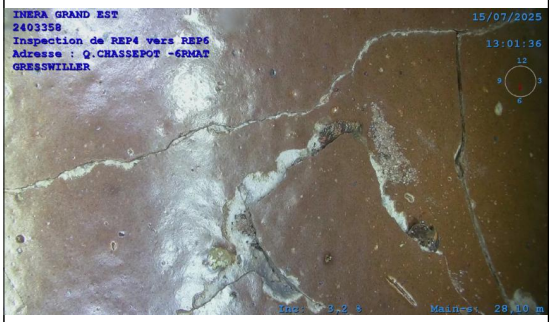

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 13** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP 6 vers REP4**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP4 vers REP 6**	Longueur inspectée : **29.02 m** Longueur mesurée : **29.02 m**

DISTANCE : **28.62 m**	PHOTO : **234/235**	VIDEO : **00:05:19**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP6






DISTANCE : **29.02 m**	PHOTO : **236**	VIDEO : **00:05:37**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - fin d'inspection

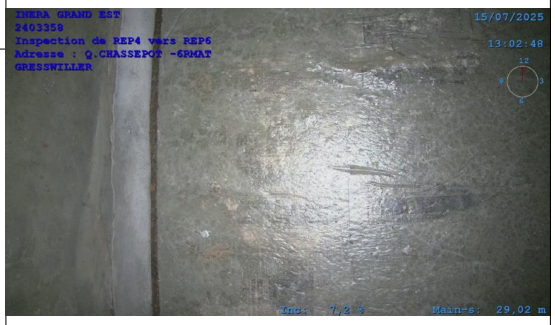

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **G13**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G13 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G13 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G13	237	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Inaccessible	136

Observations générales :


SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP4 - REP 6**

Position : **dans REP4 - REP 6**


	GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G13** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G13 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **237**	VIDEO : **00:00:00**	
OBSERVATIONS : **BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Inaccessible**			
ABANDON INSPECTION			

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G16** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G16 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G16 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G16	238	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Inaccessible	138

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP4 - REP 6**

Position : **dans REP4 - REP 6**


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G16** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G16 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **238**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Inaccessible

ABANDON INSPECTION



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G15** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G15 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.78 m** Longueur mesurée : **6.78 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G15 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G15	239/240	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G15	140
4.15 m/G15	241	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 11h - Largeur de 1mm	140
5.15 m/G15	242	BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 5% - Début	140
5.31 m/G15	243	BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 10% - point bas flache	141
6.23 m/G15	244	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	141
6.78 m/G15	245	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	141

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP4 - REP 6**

Position : **dans REP4 - REP 6**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G15** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G15 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.78 m** Longueur mesurée : **6.78 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **239/240**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G15





DISTANCE : **4.15 m**	PHOTO : **241**	VIDEO : **00:00:33**

OBSERVATIONS :

BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 11h - Largeur de 1mm



DISTANCE : **5.15 m**	PHOTO : **242**	VIDEO : **00:00:37**

OBSERVATIONS :

BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 5% - Début



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G15** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G15 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.78 m** Longueur mesurée : **6.78 m**

DISTANCE : **5.31 m**	PHOTO : **243**	VIDEO : **00:00:38**	


OBSERVATIONS :

BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 10% - point bas flache

DISTANCE : **6.23 m**	PHOTO : **244**	VIDEO : **00:00:42**	

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas

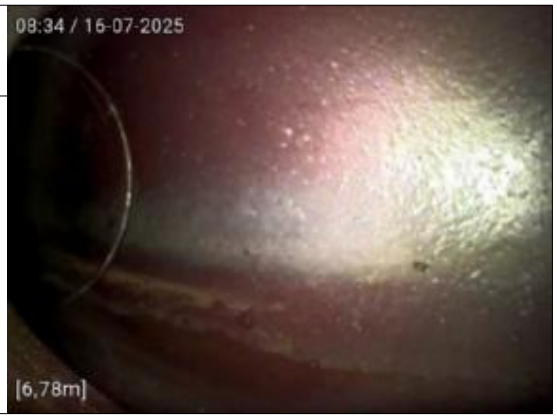DISTANCE : **6.78 m**	PHOTO : **245**	VIDEO : **00:00:50**	


OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G14** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G14 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G14 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G14	246	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Inaccessible	143

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP4 - REP 6**

Position : **dans REP4 - REP 6**

	GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G14** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G14 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **246**	VIDEO : **00:00:00**	
OBSERVATIONS : **BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Inaccessible**			
ABANDON INSPECTION			

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 14**
	Référence du noeud de départ : **REP7**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ : **1.86 m**
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP8**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP8 vers REP7**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **26.54 m**
Date de l'inspection : **15/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP7**	Référence du noeud : **REP8**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Profondeur de la canalisation inspectée : **1.86 m**	Nombre de branchements : **0**
Nombre de branchements : **0**	Dispositif de descente : **Aucun**
Dispositif de descente : **Aucun**	Cunette réalisée : **Oui**
Cunette réalisée : **Oui**	Traces d'infiltration : **Non**
Traces d'infiltration : **Non**	


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 14**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP8 vers REP7**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **26.54 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP8**	Longueur mesurée : **26.54 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP7 VERS REP8




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP7	247	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	147
0.50m / REP7	248/249	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP7	147
5.28m / REP7	250/251	BAJB - Décentrage (radial)	148
6.41m / REP7	252/253	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	148
7.04m / REP7	254/255	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	149
		BAJA - Deboîtement (longitudinal)	
24.61m / REP7	256/257	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	149
24.99m / REP7	258/259	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	150
		BAJA - Deboîtement (longitudinal)	
26.32m / REP7	260/261	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 8	150
26.54m / REP7	262	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	151

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 14** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP8 vers REP7**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP7 vers REP8**	Longueur inspectée : **26.54 m** Longueur mesurée : **26.54 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

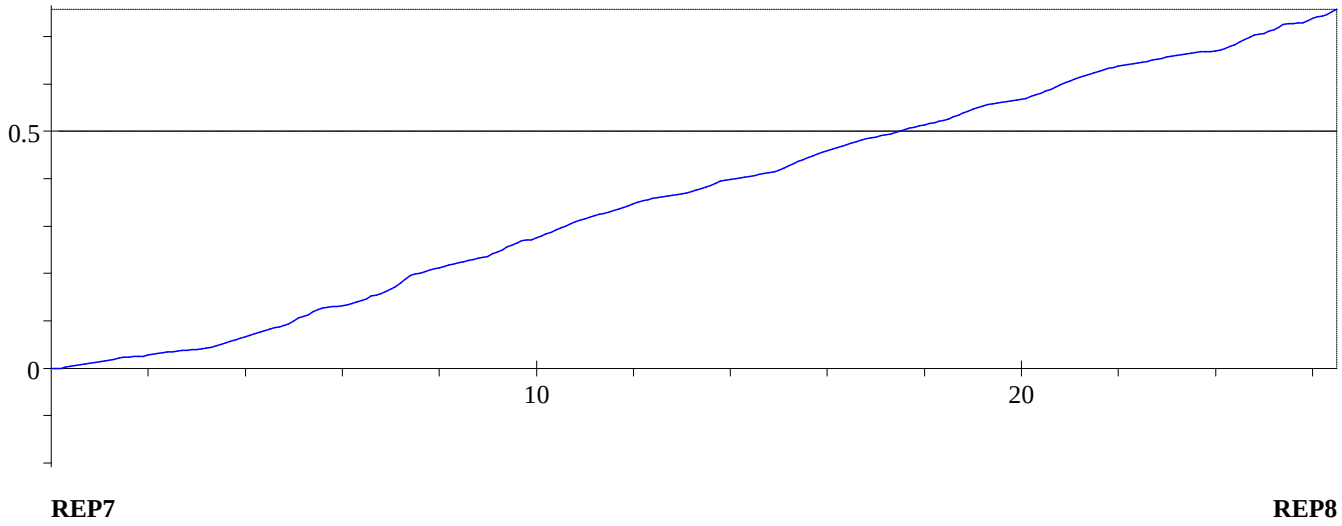

REP7 **REP8**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 14** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP8 vers REP7**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP7 vers REP8**	Longueur inspectée : **26.54 m** Longueur mesurée : **26.54 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **247**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **248/249**	VIDEO : **00:00:11**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP7

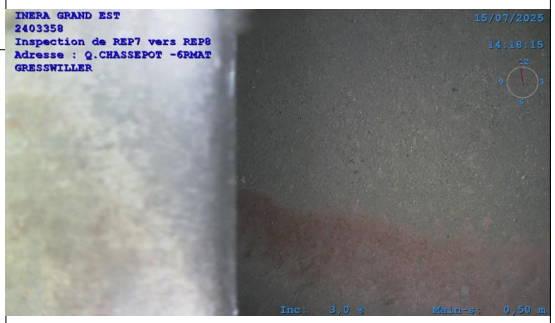



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 14** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP8 vers REP7**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **26.54 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP8**	Longueur mesurée : **26.54 m**

DISTANCE : **5.28 m**	PHOTO : **250/251**	VIDEO : **00:01:38**

OBSERVATIONS :

BAJB - Décentrage (radial)






DISTANCE : **6.41 m**	PHOTO : **252/253**	VIDEO : **00:01:59**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm

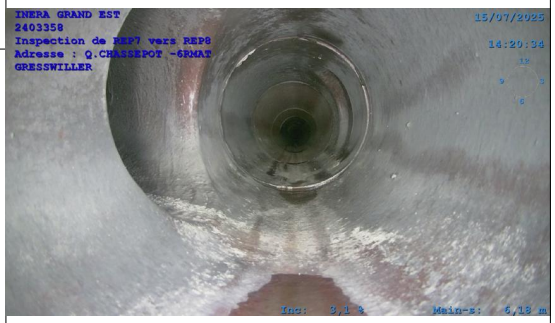




DISTANCE : **7.04 m**	PHOTO : **254/255**	VIDEO : **00:02:16**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm
BAJA - Deboîtement (longitudinal)



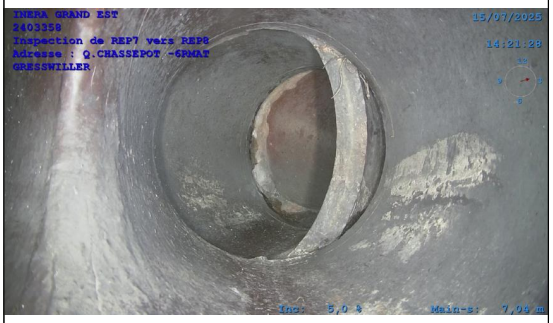

DISTANCE : **24.61 m**	PHOTO : **256/257**	VIDEO : **00:03:49**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm





DISTANCE : **24.99 m** | PHOTO : **258/259** | VIDEO : **00:04:07**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm
BAJA - Deboîtement (longitudinal)





DISTANCE : **26.32 m** | PHOTO : **260/261** | VIDEO : **00:04:36**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 8





GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 14**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP8 vers REP7**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **26.54 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP8**	Longueur mesurée : **26.54 m**

DISTANCE : **26.54 m**	PHOTO : **262**	VIDEO : **00:04:52**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - fin d'inspection



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G17** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G17 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.01 m** Longueur mesurée : **6.01 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G17 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G17	263/264	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G17	153
5.59 m/G17	265	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas BAJA - Deboîtement (longitudinal)	153
6.01 m/G17	266	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	153

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP7 - REP8**

Position : **dans REP7 - REP8**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G17** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G17 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.01 m** Longueur mesurée : **6.01 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **263/264**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G17





DISTANCE : **5.59 m**	PHOTO : **265**	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas
BAJA - Deboîtement (longitudinal)



DISTANCE : **6.01 m**	PHOTO : **266**	VIDEO : **00:00:39**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G18** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G18 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.30 m** Longueur mesurée : **0.30 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G18 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G18	267/268	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G18	155
0.30 m/G18	269	BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 70% BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - dépots empèchant la progression de la caméra	155

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP7 - REP8**

Position : **dans REP7 - REP8**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G18** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G18 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.30 m** Longueur mesurée : **0.30 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **267/268**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G18



DISTANCE : **0.30 m**	PHOTO : **269**	VIDEO : **00:00:17**

OBSERVATIONS :

BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 70%
BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - dépots empèchant progression de la caméra


ABANDON INSPECTION



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G18bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G18 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.66 m** Longueur mesurée : **6.66 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G18 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G18	270/271	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G18 - contre visite après curage	157
0.80 m/G18	272	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - Début de flache	157
2.28 m/G18	273	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 30% - point bas flache BDGA - Perte de visibilité par immersion de la caméra	157
4.05 m/G18	274	BDDC - Niveau d'eaux troubles - fin de flache	158
6.13 m/G18	275	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	158
6.66 m/G18	276	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	158

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP7 - REP8**

Position : **dans REP7 - REP8**

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G18bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G18 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.66 m** Longueur mesurée : **6.66 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **270/271**	VIDEO : **00:00:03**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G18 - contre visite après curage



DISTANCE : **0.80 m**	PHOTO : **272**	VIDEO : **00:00:18**

OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - Début de flache



DISTANCE : **2.28 m**	PHOTO : **273**	VIDEO : **00:00:27**

OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 30% - point bas flache
BDGA - Perte de visibilité par immersion de la caméra



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G18bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G18 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.66 m** Longueur mesurée : **6.66 m**

DISTANCE : **4.05 m**	PHOTO : **274**	VIDEO : **00:00:37**	
OBSERVATIONS : **BDDC - Niveau d'eaux troubles - fin de flache**			


DISTANCE : **6.13 m**	PHOTO : **275**	VIDEO : **00:00:50**	
OBSERVATIONS : **BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas**			

DISTANCE : **6.66 m**	PHOTO : **276**	VIDEO : **00:01:06**	
OBSERVATIONS : **BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm** **BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur**			

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G19** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G19 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.56 m** Longueur mesurée : **6.56 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G19 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G19	277/278	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G19	160
6.02 m/G19	279	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	160
6.56 m/G19	280	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	160

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP7 - REP8**

Position : **dans REP7 - REP8**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G19** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G19 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.56 m** Longueur mesurée : **6.56 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **277/278**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G19





DISTANCE : **6.02 m**	PHOTO : **279**	VIDEO : **00:00:31**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas



DISTANCE : **6.56 m**	PHOTO : **280**	VIDEO : **00:00:35**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G20** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G20 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.99 m** Longueur mesurée : **6.99 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G20 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G20	281/282	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G20	162
5.83 m/G20	283	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas BACA - Rupture à 9h - Longueur de 50mm	162
6.99 m/G20	284	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	162

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP7 - REP8**

Position : **dans REP7 - REP8**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G20** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G20 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.99 m** Longueur mesurée : **6.99 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **281/282**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G20





DISTANCE : **5.83 m**	PHOTO : **283**	VIDEO : **00:00:30**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas
BACA - Rupture à 9h - Longueur de 50mm



DISTANCE : **6.99 m**	PHOTO : **284**	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 15**
	Référence du noeud de départ : **REP7**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP9**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP9 vers REP7**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **28.77 m**
Date de l'inspection : **15/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP7**	Référence du noeud : **REP9**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP9 vers REP7**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **28.77 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP9**	Longueur mesurée : **28.77 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP7 VERS REP9




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP7	285	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	166
0.50m / REP7	286/287	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP7	166
1.89m / REP7	288/289	BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu à 10h	167
8.96m / REP7	290/291	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	167
		BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	
9.54m / REP7	292/293	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	168
24.91m / REP7	294/295	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	168
		BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	
25.70m / REP7	296/297	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	169
28.52m / REP7	298/299	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP9	169
28.77m / REP7	300	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	170

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 15** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP9 vers REP7**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP7 vers REP9**	Longueur inspectée : **28.77 m** Longueur mesurée : **28.77 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

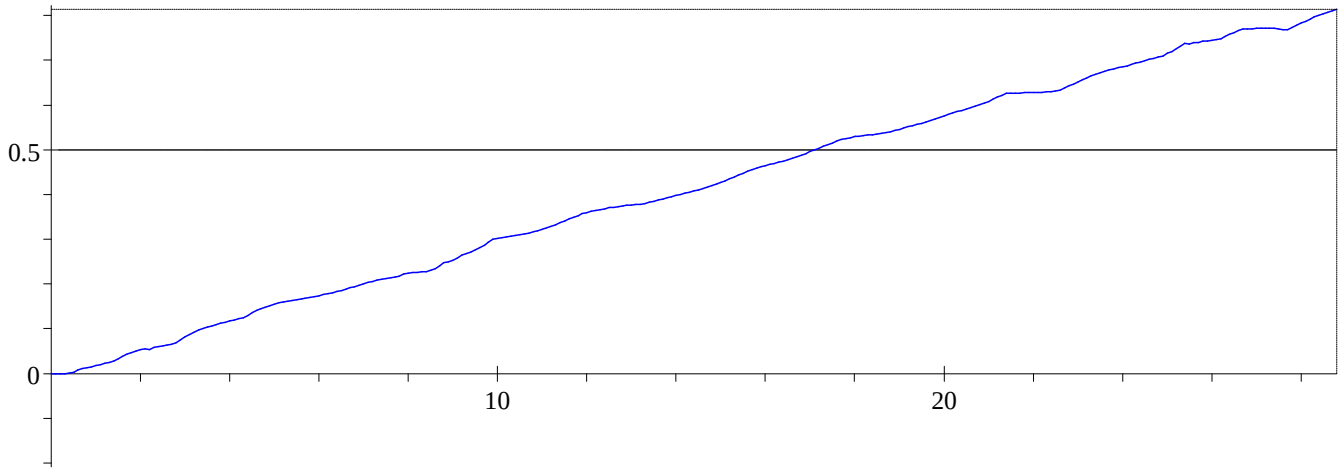

REP7 **REP9**


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 15** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP9 vers REP7**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **28.77 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP9**	Longueur mesurée : **28.77 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **285**	VIDEO : **00:00:19**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection

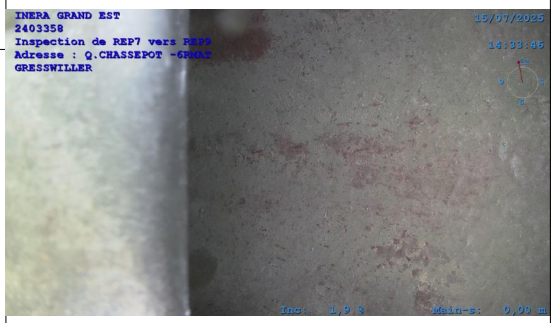

DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **286/287**	VIDEO : **00:00:28**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP7

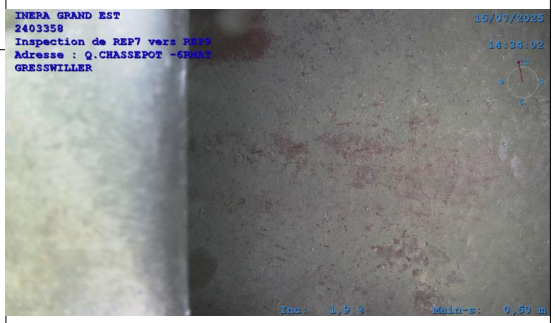



DISTANCE : **1.89 m**	PHOTO : **288/289**	VIDEO : **00:01:24**

OBSERVATIONS :

BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu à 10h






DISTANCE : **8.96 m**	PHOTO : **290/291**	VIDEO : **00:03:51**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm
BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%

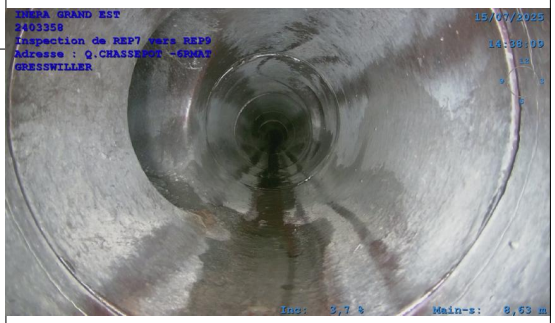



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 15** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP9 vers REP7**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **28.77 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP9**	Longueur mesurée : **28.77 m**

DISTANCE : **9.54 m**	PHOTO : **292/293**	VIDEO : **00:04:09**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm





DISTANCE : **24.91 m**	PHOTO : **294/295**	VIDEO : **00:05:33**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm
BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%






GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 15** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP9 vers REP7**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP7 vers REP9**	Longueur inspectée : **28.77 m** Longueur mesurée : **28.77 m**

DISTANCE : **25.70 m**	PHOTO : **296/297**	VIDEO : **00:05:48**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm

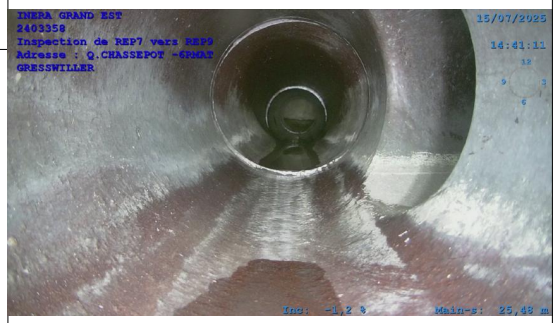



DISTANCE : **28.52 m**	PHOTO : **298/299**	VIDEO : **00:06:38**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP9





	GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 15** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP9 vers REP7**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP7 vers REP9**	Longueur inspectée : **28.77 m** Longueur mesurée : **28.77 m**

DISTANCE : **28.77 m**	PHOTO : **300**	VIDEO : **00:07:01**	


OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G21** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G21 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.63 m** Longueur mesurée : **6.63 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G21 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G21	301/302	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G21	172
2.06 m/G21	303	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	172
6.03 m/G21	304	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	172
6.63 m/G21	305	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	173

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP7 - REP9**

Position : **dans REP7 - REP9**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G21** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G21 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.63 m** Longueur mesurée : **6.63 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **301/302**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G21





DISTANCE : **2.06 m**	PHOTO : **303**	VIDEO : **00:00:19**

OBSERVATIONS :

BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm



DISTANCE : **6.03 m**	PHOTO : **304**	VIDEO : **00:00:31**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G21** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G21 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.63 m** Longueur mesurée : **6.63 m**

DISTANCE : **6.63 m**	PHOTO : **305**	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G22** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G22 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **1.04 m** Longueur mesurée : **1.04 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G22 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G22	306/307	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G22	175
1.04 m/G22	308	BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 40% BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - effondrement empêchant la progression de la caméra	175

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP7 - REP9**

Position : **dans REP7 - REP9**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G22** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G22 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **1.04 m** Longueur mesurée : **1.04 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **306/307**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G22



DISTANCE : **1.04 m**	PHOTO : **308**	VIDEO : **00:00:31**

OBSERVATIONS :

BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 40%
BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - effondrement empêchant la progression de la caméra


ABANDON INSPECTION



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G22 bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G22 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **7.14 m** Longueur mesurée : **7.14 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G22 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G22	309/310	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G22 - contre visite après curage	177
5.09 m/G22	311	BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 5% - Début	177
5.88 m/G22	312	BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 10% - point bas flache	177
6.52 m/G22	313	BDDA - Niveau d'eaux claires - fin	178
6.60 m/G22	314	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	178
7.14 m/G22	315	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	178

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP7 - REP9**

Position : **dans REP7 - REP9**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G22 bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G22 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **7.14 m** Longueur mesurée : **7.14 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **309/310**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G22 - contre visite après curage



DISTANCE : **5.09 m**	PHOTO : **311**	VIDEO : **00:00:31**

OBSERVATIONS :

BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 5% - Début



DISTANCE : **5.88 m**	PHOTO : **312**	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :

BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 10% - point bas flache



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G22 bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G22 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **7.14 m** Longueur mesurée : **7.14 m**

DISTANCE : **6.52 m**	PHOTO : **313**	VIDEO : **00:00:38**

OBSERVATIONS :

BDDA - Niveau d'eaux claires - fin



DISTANCE : **6.60 m**	PHOTO : **314**	VIDEO : **00:00:38**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



DISTANCE : **7.14 m**	PHOTO : **315**	VIDEO : **00:00:42**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **G24**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**		**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.38 m**
Grès	**3.00 m**	**G24 vers Collecteur**	Longueur mesurée : **6.38 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G24 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G24	316/317	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G24	180
5.88 m/G24	318	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	180
6.38 m/G24	319	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	180

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP7 - REP9**

Position : **dans REP7 - REP9**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G24** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G24 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.38 m** Longueur mesurée : **6.38 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **316/317**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G24



DISTANCE : **5.88 m**	PHOTO : **318**	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas



DISTANCE : **6.38 m**	PHOTO : **319**	VIDEO : **00:00:46**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **G23**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**		**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.91 m**
Grès	**3.00 m**	**G23 vers Collecteur**	Longueur mesurée : **6.91 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G23 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G23	320/321	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G23	182
0.64 m/G23	322	BAJA - Deboîtement (longitudinal)	182
1.16 m/G23	323	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - début	182
1.30 m/G23	324	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 15% - point bas flache	183
2.04 m/G23	325	BDDC - Niveau d'eaux troubles - fin de flache	183
6.43 m/G23	326	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	183
6.91 m/G23	327	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	183

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP7 - REP9**

Position : **dans REP7 - REP9**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G23** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G23 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.91 m** Longueur mesurée : **6.91 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **320/321**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G23





DISTANCE : **0.64 m**	PHOTO : **322**	VIDEO : **00:00:20**

OBSERVATIONS :

BAJA - Deboîtement (longitudinal)



DISTANCE : **1.16 m**	PHOTO : **323**	VIDEO : **00:00:25**

OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - début



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G23** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G23 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.91 m** Longueur mesurée : **6.91 m**

DISTANCE : **1.30 m**	PHOTO : **324**	VIDEO : **00:00:26**	

OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 15% - point bas flache

DISTANCE : **2.04 m**	PHOTO : **325**	VIDEO : **00:00:33**	


OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux troubles - fin de flache

DISTANCE : **6.43 m**	PHOTO : **326**	VIDEO : **00:00:51**	

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas

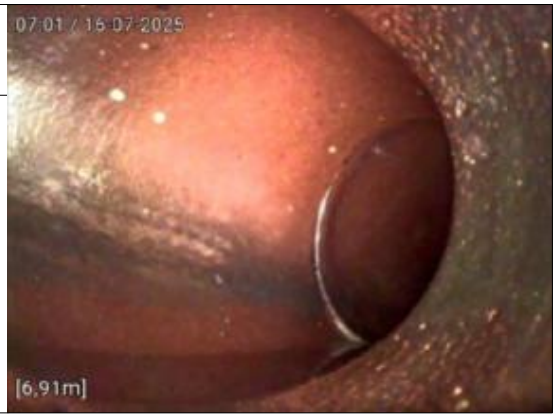DISTANCE : **6.91 m**	PHOTO : **327**	VIDEO : **00:00:59**	

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 16**
	Référence du noeud de départ : **REP7**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP4**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : **1.68 m**
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP4 vers REP7**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **27.76 m**
Date de l'inspection : **15/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **250**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP7**	Référence du noeud : **REP4**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Nombre de branchements : **0**	Profondeur de la canalisation inspectée : **1.68 m**
Dispositif de descente : **Aucun**	Nombre de branchements : **0**
Cunette réalisée : **Oui**	Dispositif de descente : **Aucun**
Traces d'infiltration : **Non**	Cunette réalisée : **Oui**
	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP4 vers REP7**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **27.76 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP4**	Longueur mesurée : **27.76 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP7 VERS REP4




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP7	328	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	187
0.50m / REP7	329/330	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP7	187
8.31m / REP7	331/332	BDA - Photographie générale - emboitement correct	188
22.29m / REP7	333/334	BAJB - Décentrage (radial)	188
27.33m / REP7	335/336	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP4	189
27.76m / REP7	337	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	189

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 16** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **250 mm**	Sens de l'écoulement **REP4 vers REP7**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP7 vers REP4**	Longueur inspectée : **27.76 m** Longueur mesurée : **27.76 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

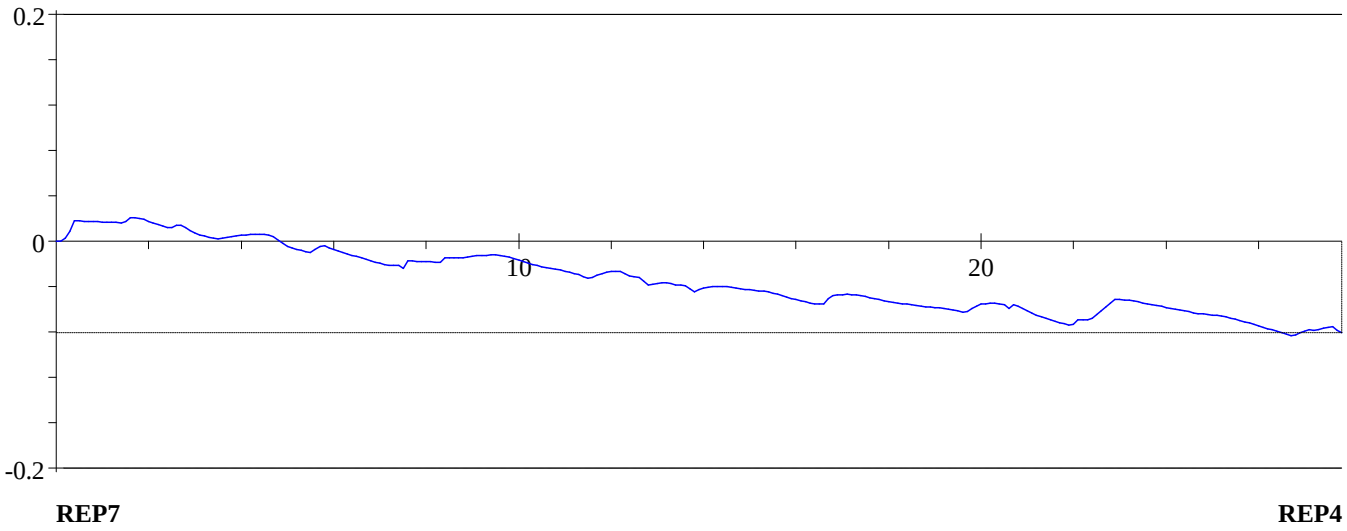

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 16** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP4 vers REP7**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **27.76 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP4**	Longueur mesurée : **27.76 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **328**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection




DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **329/330**	VIDEO : **00:00:24**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP7



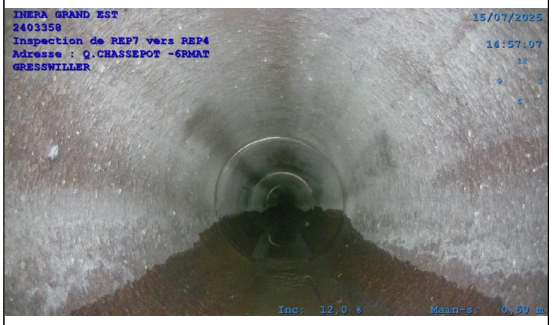


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 16** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP4 vers REP7**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **27.76 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP4**	Longueur mesurée : **27.76 m**

DISTANCE : **8.31 m**	PHOTO : **331/332**	VIDEO : **00:02:08**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct

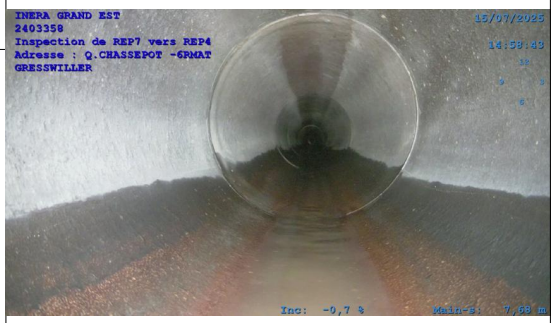



DISTANCE : **22.29 m**	PHOTO : **333/334**	VIDEO : **00:03:57**

OBSERVATIONS :

BAJB - Décentrage (radial)





Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP4 vers REP7**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **27.76 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP4**	Longueur mesurée : **27.76 m**

DISTANCE : **27.33 m**	PHOTO : **335/336**	VIDEO : **00:05:06**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP4





DISTANCE : **27.76 m**	PHOTO : **337**	VIDEO : **00:05:35**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 17**
	Référence du noeud de départ : **REP7**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ : **1.68 m**
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP10**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP7 vers REP10**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **12.93 m**
Date de l'inspection : **15/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **300**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP7**	Référence du noeud : **REP10**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Profondeur de la canalisation inspectée : **1.68 m**	Nombre de branchements : **0**
Nombre de branchements : **0**	Dispositif de descente : **Aucun**
Dispositif de descente : **Aucun**	Cunette réalisée : **Oui**
Cunette réalisée : **Oui**	Traces d'infiltration : **Non**
Traces d'infiltration : **Non**	


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 17**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP7 vers REP10**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **12.93 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP10**	Longueur mesurée : **12.93 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP7 VERS REP10




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP7	338	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	193
0.50m / REP7	339/340	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP7	193
9.71m / REP7	341/342	BDA - Photographie générale - emboitement correct	194
12.46m / REP7	343	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	194
12.93m / REP7	344	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - coude empêchant la progression de la caméra	194

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 17** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **REP7 vers REP10**	Date d'inspection : **15 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP7 vers REP10**	Longueur inspectée : **12.93 m** Longueur mesurée : **12.93 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

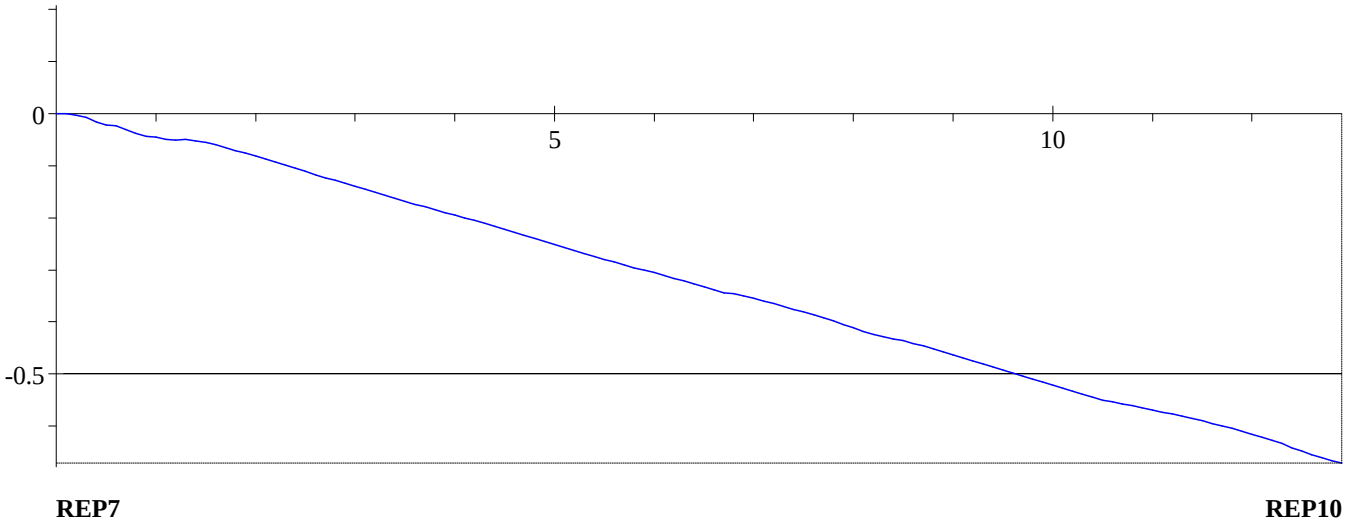

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 17** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP7 vers REP10**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **12.93 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP10**	Longueur mesurée : **12.93 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **338**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **339/340**	VIDEO : **00:00:14**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP7

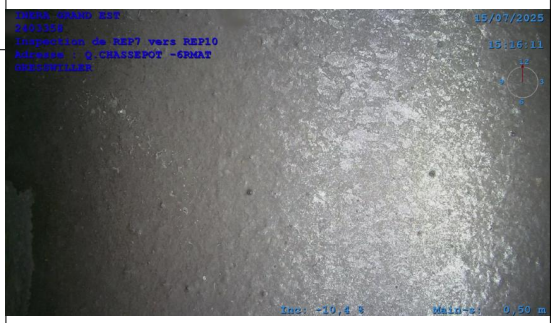



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 17** Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP7 vers REP10**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **12.93 m**
Grès	**3.00 m**	**REP7 vers REP10**	Longueur mesurée : **12.93 m**

DISTANCE : **9.71 m**	PHOTO : **341/342**	VIDEO : **00:02:30**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct



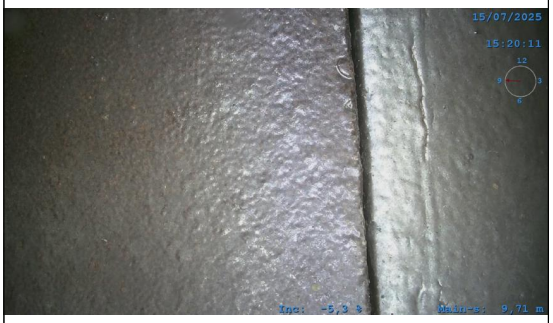

DISTANCE : **12.46 m**	PHOTO : **343**	VIDEO : **00:03:37**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas



DISTANCE : **12.93 m**	PHOTO : **344**	VIDEO : **00:04:13**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - coude empêchant la progression de la camér



ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 18**
	Référence du noeud de départ : **REP10**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP7**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP7 vers REP10**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **5.38 m**
Date de l'inspection : **15/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **300**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP10**	Référence du noeud : **REP7**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières

Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP7 vers REP10**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **5.38 m**
Grès	**3.00 m**	**REP10 vers REP7**	Longueur mesurée : **5.38 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP10 VERS REP7



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP10	345/346	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP10 - reprise de l inspection après curage en contresens	197
4.82m / REP10	347	BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut	197
5.38m / REP10	348	BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente Contresens atteint BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	197

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 18** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP7 vers REP10**	**15 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **5.38 m**
Grès	**3.00 m**	**REP10 vers REP7**	Longueur mesurée : **5.38 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **345/346**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP10 - reprise de l inspectio après curage en contresens





DISTANCE : **4.82 m**	PHOTO : **347**	VIDEO : **00:00:44**

OBSERVATIONS :

BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut



DISTANCE : **5.38 m**	PHOTO : **348**	VIDEO : **00:00:49**

OBSERVATIONS :

BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente - Contresens atteint
BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection



ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n°19**
	Référence du noeud de départ : **REP 11**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP12**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP12 vers REP 11**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **24.97 m**
Date de l'inspection : **16/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **250**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP 11**	Référence du noeud : **REP12**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**


Observations particulières

Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n°19**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP12 vers REP 11**	**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **24.97 m**
Grès	**3.00 m**	**REP 11 vers REP12**	Longueur mesurée : **24.97 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP 11 VERS REP12




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP 11	349	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	201
0.50m / REP 11	350/351	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP11	201
3.98m / REP 11	352/353	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	202
4.53m / REP 11	354/355	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	202
14.71m / REP 11	356/357	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 2mm	203
22.85m / REP 11	358/359	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	203
23.67m / REP 11	360/361	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	204
24.65m / REP 11	362/363	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP12	204
24.97m / REP 11	364	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	205

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n°19** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **250 mm**	Sens de l'écoulement **REP12 vers REP 11**	Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 11 vers REP12**	Longueur inspectée : **24.97 m** Longueur mesurée : **24.97 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

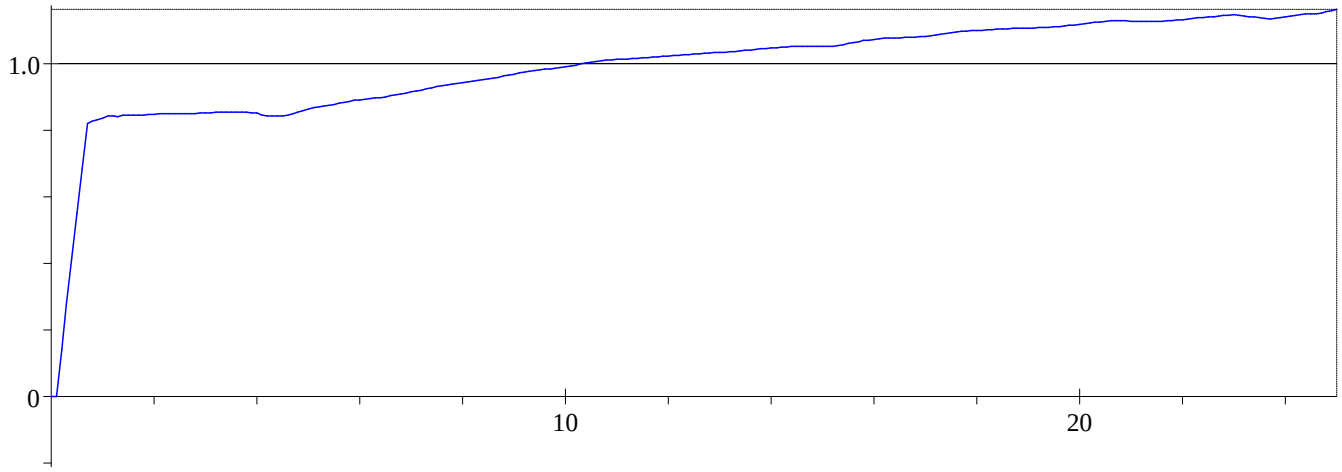

REP 11 **REP12**


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n°19** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP12 vers REP 11**	**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **24.97 m**
Grès	**3.00 m**	**REP 11 vers REP12**	Longueur mesurée : **24.97 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **349**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection

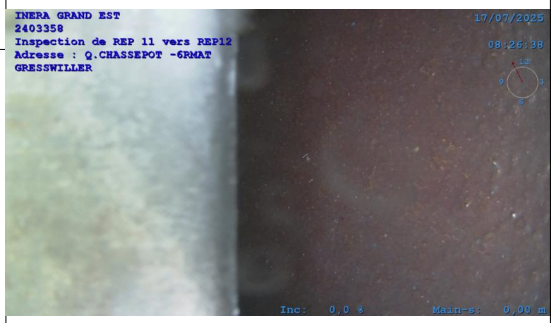


DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **350/351**	VIDEO : **00:00:09**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP11

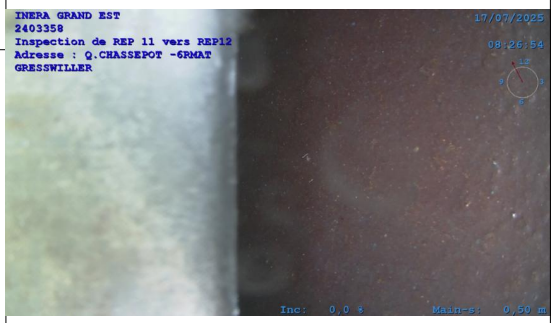

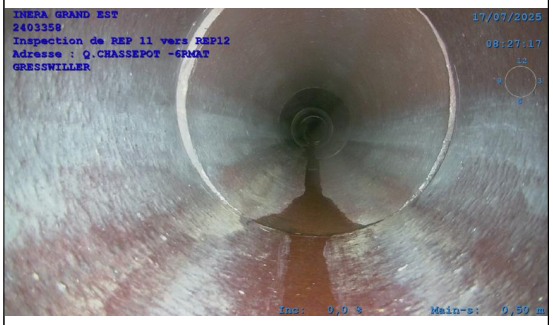

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n°19** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **250 mm**	Sens de l'écoulement **REP12 vers REP 11**	Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 11 vers REP12**	Longueur inspectée : **24.97 m** Longueur mesurée : **24.97 m**

DISTANCE : **3.98 m**	PHOTO : **352/353**	VIDEO : **00:00:58**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm






DISTANCE : **4.53 m**	PHOTO : **354/355**	VIDEO : **00:01:22**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm

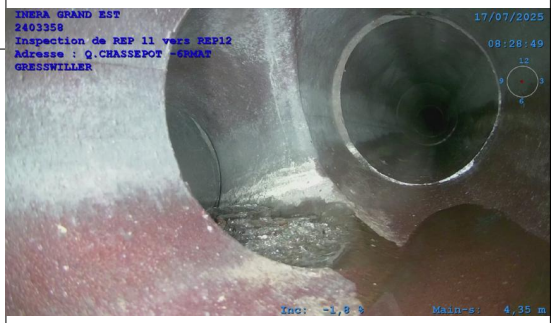



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n°19** Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP12 vers REP 11**	**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **24.97 m**
Grès	**3.00 m**	**REP 11 vers REP12**	Longueur mesurée : **24.97 m**

DISTANCE : **14.71 m**	PHOTO : **356/357**	VIDEO : **00:02:44**

OBSERVATIONS :

BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 2mm




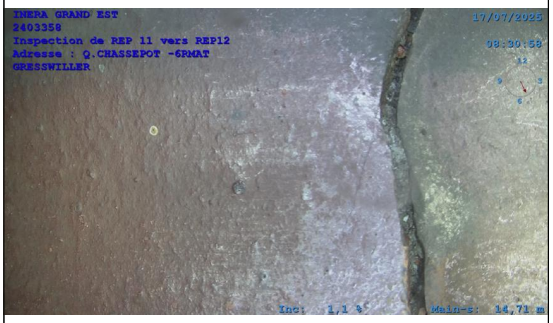

DISTANCE : **22.85 m**	PHOTO : **358/359**	VIDEO : **00:03:51**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm

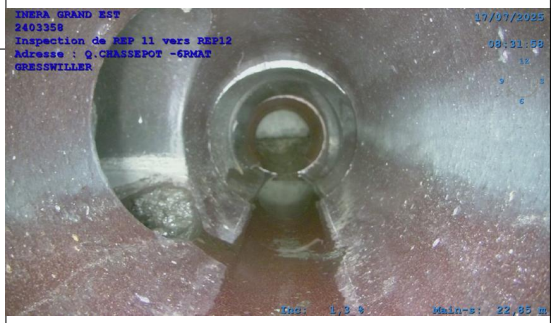




DISTANCE : **23.67 m**	PHOTO : **360/361**	VIDEO : **00:04:42**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm



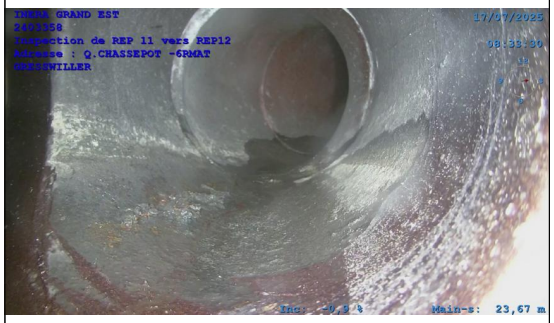

DISTANCE : **24.65 m**	PHOTO : **362/363**	VIDEO : **00:05:09**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP12





GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n°19**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP12 vers REP 11**	**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **24.97 m**
Grès	**3.00 m**	**REP 11 vers REP12**	Longueur mesurée : **24.97 m**

DISTANCE : **24.97 m**	PHOTO : **364**	VIDEO : **00:05:30**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - fin d'inspection



GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **G25**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :	
Eaux pluviales	**200 mm**		**16 juillet 2025**	
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée :	**7.55 m**
Grès	**3.00 m**	**G25 vers Collecteur**	Longueur mesurée :	**7.55 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G25 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G25	365/366	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G25	207
6.94 m/G25	367	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	207
7.48 m/G25	368	BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 20%	207
7.55 m/G25	369	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	208
		BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP 11 - REP12**

Position : **dans REP 11 - REP12**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G25** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G25 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **7.55 m** Longueur mesurée : **7.55 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **365/366**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G25



DISTANCE : **6.94 m**	PHOTO : **367**	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas



DISTANCE : **7.48 m**	PHOTO : **368**	VIDEO : **00:00:40**

OBSERVATIONS :

BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 20%



	GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G25** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G25 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **7.55 m** Longueur mesurée : **7.55 m**

DISTANCE : **7.55 m**	PHOTO : **369**	VIDEO : **00:00:42**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G25bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G25 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.37 m** Longueur mesurée : **6.37 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G25 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G25	370/371	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G25 - contre visite après curage BDB - Remarque générale - erreur d 'incrustation distance	210
4.95 m/G25	372	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	210
6.37 m/G25	373	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	210

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP 11 - REP12**

Position : **dans REP 11 - REP12**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G25bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G25 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **6.37 m** Longueur mesurée : **6.37 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **370/371**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G25 - contre visite après curage
BDB - Remarque générale - erreur d 'incrustation distance





DISTANCE : **4.95 m**	PHOTO : **372**	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas



DISTANCE : **6.37 m**	PHOTO : **373**	VIDEO : **00:01:00**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **G27**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**		**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **7.48 m**
Grès	**3.00 m**	**G27 vers Collecteur**	Longueur mesurée : **7.48 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G27 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G27	374/375	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G27	212
1.75 m/G27	376	BABCC - Fissure complexe ouverte à 11h - Largeur de 1mm	212
6.69 m/G27	377	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	212
7.48 m/G27	378	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	213

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP 11 - REP12**

Position : **dans REP 11 - REP12**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G27** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G27 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **7.48 m** Longueur mesurée : **7.48 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **374/375**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G27





DISTANCE : **1.75 m**	PHOTO : **376**	VIDEO : **00:00:17**

OBSERVATIONS :


BABCC - Fissure complexe ouverte à 11h - Largeur de 1mm



DISTANCE : **6.69 m**	PHOTO : **377**	VIDEO : **00:00:35**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas

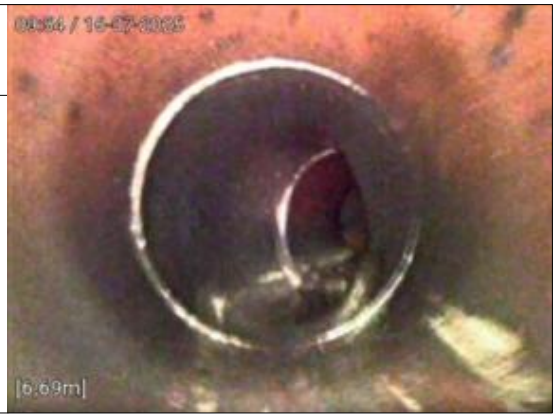

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G27** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G27 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **7.48 m** Longueur mesurée : **7.48 m**

DISTANCE : **7.48 m**	PHOTO : **378**	VIDEO : **00:00:45**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G26** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G26 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **4.89 m** Longueur mesurée : **4.89 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G26 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G26	379/380	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G26	215
4.18 m/G26	381	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	215
4.89 m/G26	382	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	215

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP 11 - REP12**

Position : **dans REP 11 - REP12**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G26** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G26 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **4.89 m** Longueur mesurée : **4.89 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **379/380**	VIDEO : **00:00:02**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G26





DISTANCE : **4.18 m**	PHOTO : **381**	VIDEO : **00:00:41**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



DISTANCE : **4.89 m**	PHOTO : **382**	VIDEO : **00:00:45**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **G28**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**		**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **5.32 m**
Grès	**3.00 m**	**G28 vers Collecteur**	Longueur mesurée : **5.32 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G28 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G28	383/384	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G28	217
4.76 m/G28	385	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	217
5.10 m/G28	386	BAJA - Deboîtement (longitudinal) BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 5%	217
5.32 m/G28	387	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	218

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP 11 - REP12**

Position : **dans REP 11 - REP12**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G28** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G28 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.32 m** Longueur mesurée : **5.32 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **383/384**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G28





DISTANCE : **4.76 m**	PHOTO : **385**	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



DISTANCE : **5.10 m**	PHOTO : **386**	VIDEO : **00:00:38**

OBSERVATIONS :

BAJA - Deboîtement (longitudinal)
BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 5%



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G28** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G28 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.32 m** Longueur mesurée : **5.32 m**

DISTANCE : **5.32 m**	PHOTO : **387**	VIDEO : **00:00:48**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 20**
	Référence du noeud de départ : **REP 11**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ : **1.5 m**
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP13**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP13 vers REP 11**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **29.99 m**
Date de l'inspection : **16/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP 11**	Référence du noeud : **REP13**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Profondeur de la canalisation inspectée : **1.5 m**	Nombre de branchements : **0**
Nombre de branchements : **0**	Dispositif de descente : **Aucun**
Dispositif de descente : **Aucun**	Cunette réalisée : **Oui**
Cunette réalisée : **Oui**	Traces d'infiltration : **Non**
Traces d'infiltration : **Non**	

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP13 vers REP 11**	**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **29.99 m**
Grès	**3.00 m**	**REP 11 vers REP13**	Longueur mesurée : **29.99 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP 11 VERS REP13




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP 11	388	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	222
0.50m / REP 11	389/390	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 11	222
9.51m / REP 11	391/392	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	223
		BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	
10.09m / REP 11	393/394	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	223
15.50m / REP 11	395/396	BAIAA - Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation à 9h	224
25.54m / REP 11	397/398	BAJB - Décentrage (radial)	224
26.65m / REP 11	399/400	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	225
27.23m / REP 11	401/402	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	225
29.56m / REP 11	403/404	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	226
29.71m / REP 11	405/406	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP13	226
29.99m / REP 11	407	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	227

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 20** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP13 vers REP 11**	Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 11 vers REP13**	Longueur inspectée : **29.99 m** Longueur mesurée : **29.99 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

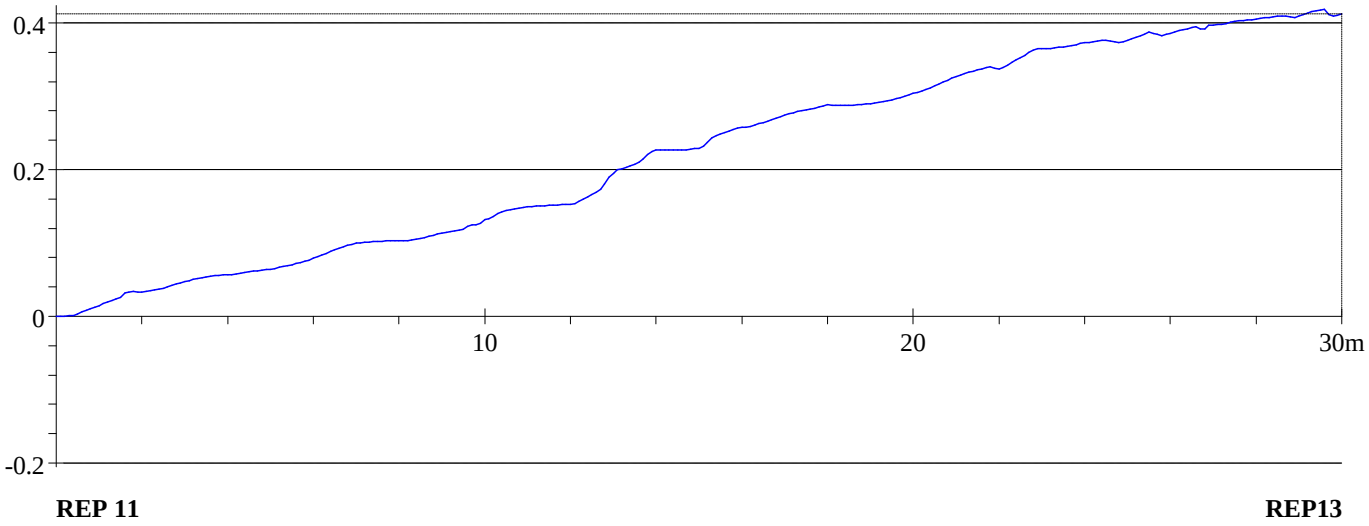

REP 11 **REP13**


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 20** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP13 vers REP 11**	**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **29.99 m**
Grès	**3.00 m**	**REP 11 vers REP13**	Longueur mesurée : **29.99 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **388**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection

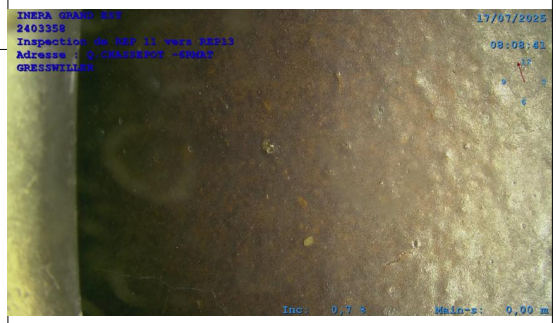


DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **389/390**	VIDEO : **00:00:11**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 11

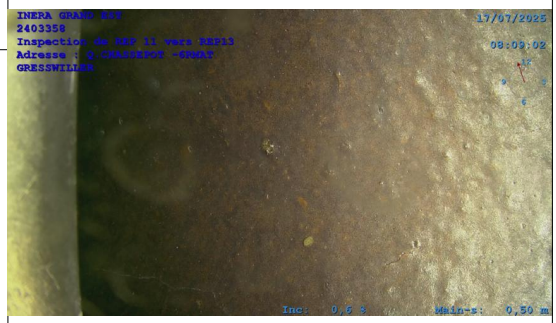

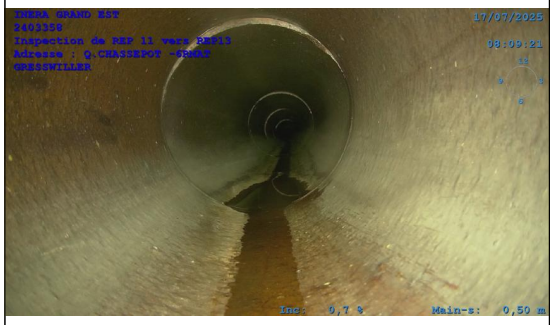


Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP13 vers REP 11**	**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **29.99 m**
Grès	**3.00 m**	**REP 11 vers REP13**	Longueur mesurée : **29.99 m**

DISTANCE : **9.51 m**	PHOTO : **391/392**	VIDEO : **00:01:30**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm
BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%

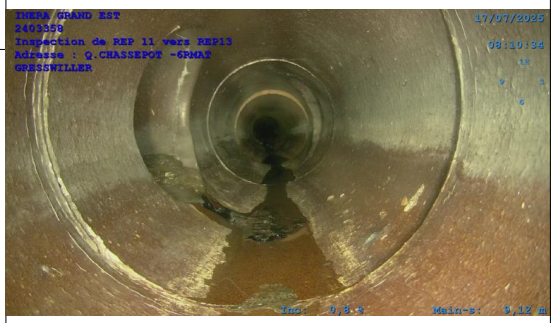



DISTANCE : **10.09 m**	PHOTO : **393/394**	VIDEO : **00:01:53**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm





GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 20**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP13 vers REP 11**	**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **29.99 m**
Grès	**3.00 m**	**REP 11 vers REP13**	Longueur mesurée : **29.99 m**

DISTANCE : **15.50 m**	PHOTO : **395/396**	VIDEO : **00:03:16**

OBSERVATIONS :

BAIAA - Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation à 9h






DISTANCE : **25.54 m**	PHOTO : **397/398**	VIDEO : **00:04:27**

OBSERVATIONS :

BAJB - Décentrage (radial)

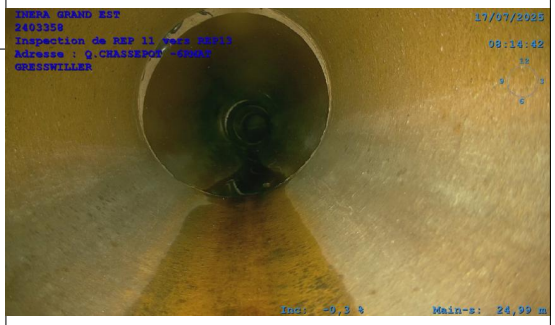




GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 20** Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP13 vers REP 11**	Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 11 vers REP13**	Longueur inspectée : **29.99 m** Longueur mesurée : **29.99 m**

DISTANCE : **26.65 m**	PHOTO : **399/400**	VIDEO : **00:04:51**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm

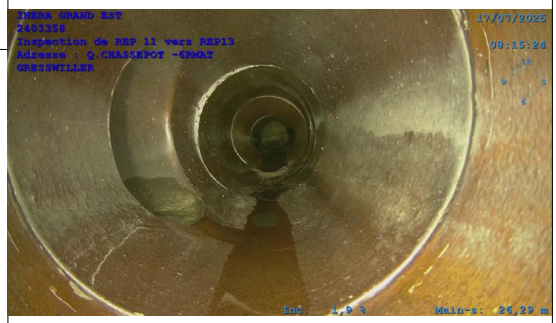


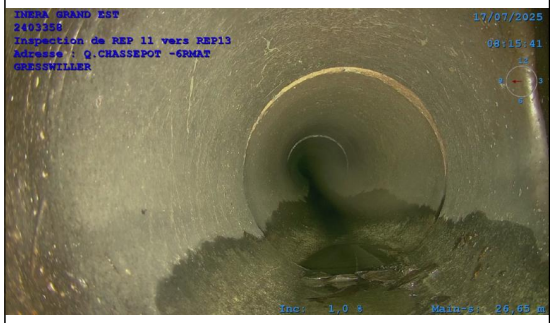

DISTANCE : **27.23 m**	PHOTO : **401/402**	VIDEO : **00:05:16**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm

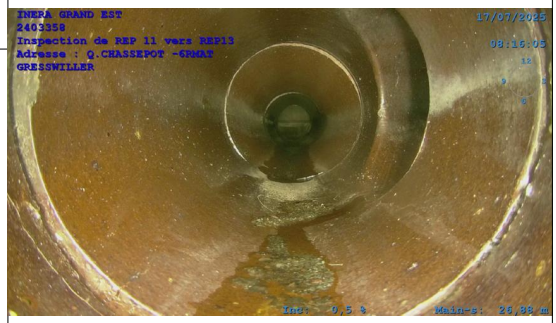




GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 20** Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP13 vers REP 11**	**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **29.99 m**
Grès	**3.00 m**	**REP 11 vers REP13**	Longueur mesurée : **29.99 m**

DISTANCE : **29.56 m**	PHOTO : **403/404**	VIDEO : **00:05:41**

OBSERVATIONS :

BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm

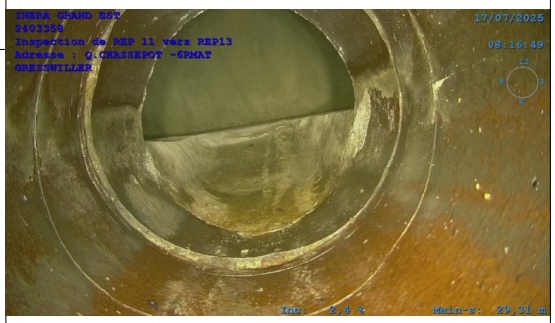

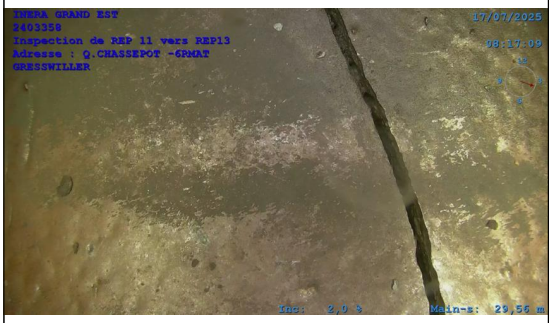

DISTANCE : **29.71 m**	PHOTO : **405/406**	VIDEO : **00:06:24**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP13





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 20** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP13 vers REP 11**	Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 11 vers REP13**	Longueur inspectée : **29.99 m** Longueur mesurée : **29.99 m**

DISTANCE : **29.99 m**	PHOTO : **407**	VIDEO : **00:06:44**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - fin d'inspection



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G29** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G29 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **7.34 m** Longueur mesurée : **7.34 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G29 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G29	408/409	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G29	229
6.92 m/G29	410	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	229
7.34 m/G29	411	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	229

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP 11 - REP13**

Position : **dans REP 11 - REP13**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G29** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G29 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **7.34 m** Longueur mesurée : **7.34 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **408/409**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G29



DISTANCE : **6.92 m**	PHOTO : **410**	VIDEO : **00:00:53**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



DISTANCE : **7.34 m**	PHOTO : **411**	VIDEO : **00:00:59**


OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G31** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G31 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **8.00 m** Longueur mesurée : **8.00 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G31 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G31	412/413	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G31	231
0.23 m/G31	414	BAJA - Deboîtement (longitudinal) de 5h à 11h - Distance de 50mm	231
8.00 m/G31	415	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	231

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP 11 - REP13**

Position : **dans REP 11 - REP13**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G31** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G31 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **8.00 m** Longueur mesurée : **8.00 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **412/413**	VIDEO : **00:00:02**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G31





DISTANCE : **0.23 m**	PHOTO : **414**	VIDEO : **00:00:18**

OBSERVATIONS :

BAJA - Deboîtement (longitudinal) de 5h à 11h - Distance de 50mm



DISTANCE : **8.00 m**	PHOTO : **415**	VIDEO : **00:01:08**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G30** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G30 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.14 m** Longueur mesurée : **5.14 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G30 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G30	416/417	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G30	233
4.43 m/G30	418	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	233
5.14 m/G30	419	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	233

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP 11 - REP13**

Position : **dans REP 11 - REP13**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G30** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G30 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.14 m** Longueur mesurée : **5.14 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **416/417**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G30





DISTANCE : **4.43 m**	PHOTO : **418**	VIDEO : **00:00:30**

OBSERVATIONS :


BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas



DISTANCE : **5.14 m**	PHOTO : **419**	VIDEO : **00:00:39**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur

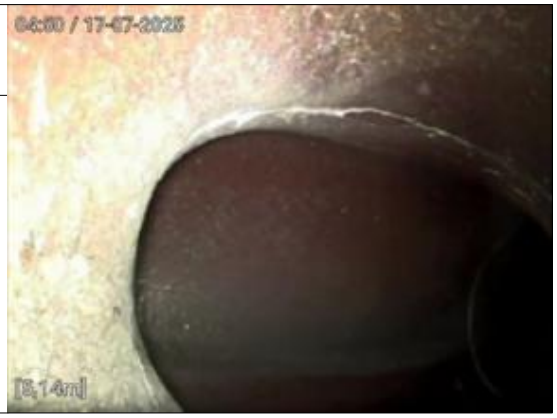

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G32** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G32 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **4.96 m** Longueur mesurée : **4.96 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G32 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G32	420/421	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G32	235
3.23 m/G32	422	BDA - Photographie générale	235
4.96 m/G32	423	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	235

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP 11 - REP13**

Position : **dans REP 11 - REP13**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G32** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G32 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **4.96 m** Longueur mesurée : **4.96 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **420/421**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G32





DISTANCE : **3.23 m**	PHOTO : **422**	VIDEO : **00:00:35**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale



DISTANCE : **4.96 m**	PHOTO : **423**	VIDEO : **00:00:42**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 21**
	Référence du noeud de départ : **REP 11**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ : **1.5 m**
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP14**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : **1.8 m**
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP 11 vers REP14**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **24.02 m**
Date de l'inspection : **16/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **250**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP 11**	Référence du noeud : **REP14**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Profondeur de la canalisation inspectée : **1.5 m**	Profondeur de la canalisation inspectée : **1.8 m**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 21**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP 11 vers REP14**	**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **24.02 m**
Grès	**3.00 m**	**REP 11 vers REP14**	Longueur mesurée : **24.02 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP 11 VERS REP14




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP 11	424	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	239
0.50m / REP 11	425/426	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP11	239
8.39m / REP 11	427	BDA - Photographie générale	239
22.93m / REP 11	428/429	BAJB - Décentrage (radial)	240
23.68m / REP 11	430/431	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP14	240
24.02m / REP 11	432	DCAZ - Autre type de raccordement à 3h - Conduite de raccordement 200	241
24.02m / REP 11	433	DCAZ - Autre type de raccordement à 9h - Conduite de raccordement 200	241
24.02m / REP 11	434	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	241

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 21** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **250 mm**	Sens de l'écoulement **REP 11 vers REP14**	Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 11 vers REP14**	Longueur inspectée : **24.02 m** Longueur mesurée : **24.02 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

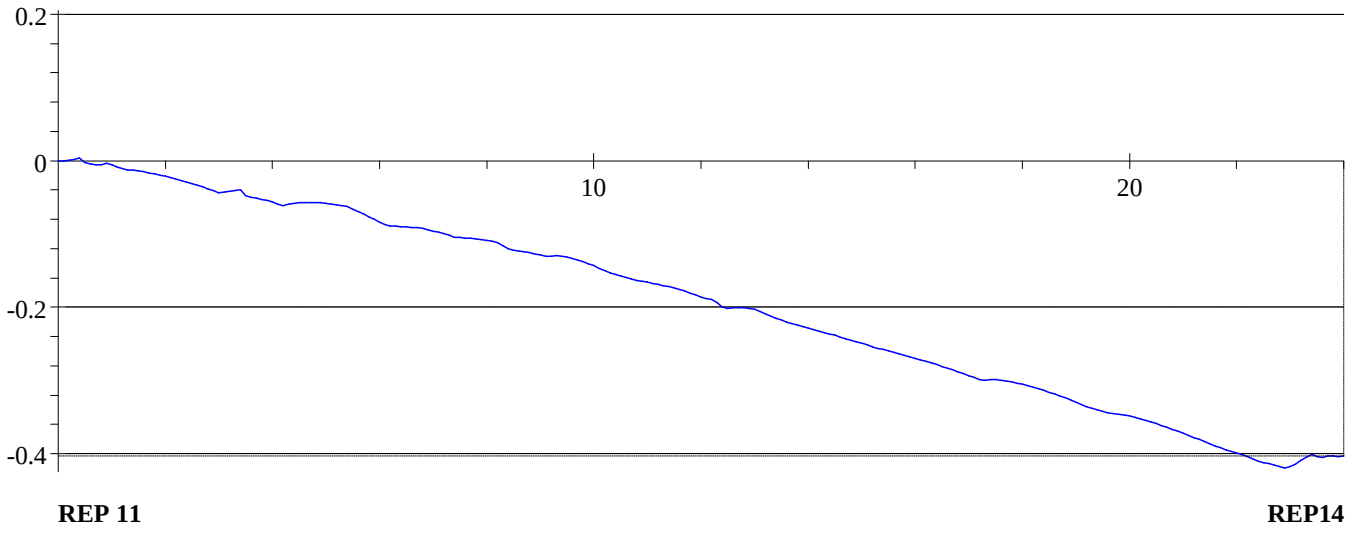


Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP 11 vers REP14**	**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **24.02 m**
Grès	**3.00 m**	**REP 11 vers REP14**	Longueur mesurée : **24.02 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **424**	VIDEO : **00:00:03**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection

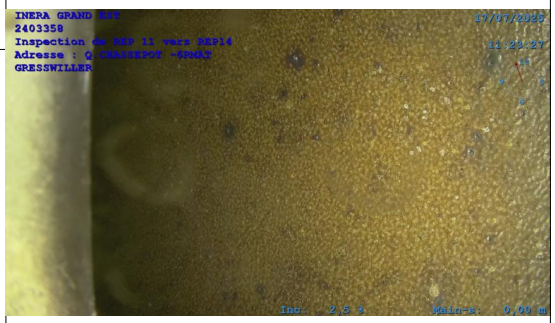


DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **425/426**	VIDEO : **00:00:13**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP11

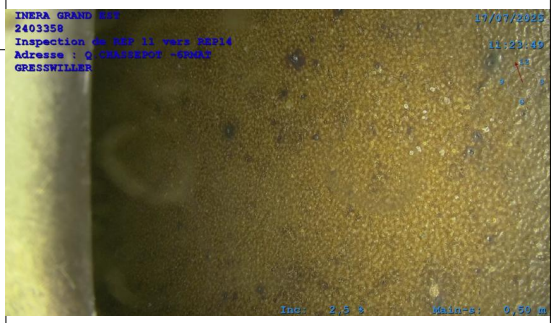


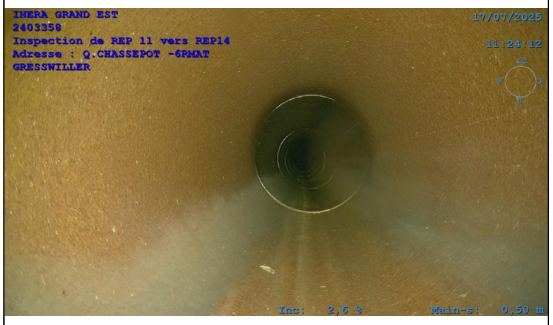

DISTANCE : **8.39 m**	PHOTO : **427**	VIDEO : **00:01:38**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale

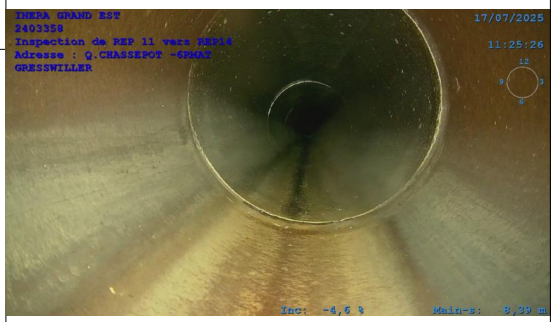

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 21** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **250 mm**	Sens de l'écoulement **REP 11 vers REP14**	Date d'inspection : **16 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 11 vers REP14**	Longueur inspectée : **24.02 m** Longueur mesurée : **24.02 m**

DISTANCE : **22.93 m**	PHOTO : **428/429**	VIDEO : **00:02:41**

OBSERVATIONS :

BAJB - Décentrage (radial)





DISTANCE : **23.68 m**	PHOTO : **430/431**	VIDEO : **00:04:06**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP14





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 21** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**250 mm**	**REP 11 vers REP14**	**16 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **24.02 m**
Grès	**3.00 m**	**REP 11 vers REP14**	Longueur mesurée : **24.02 m**

DISTANCE : **24.02 m**	PHOTO : **432**	VIDEO : **00:04:28**

OBSERVATIONS :

DCAZ - Autre type de raccordement à 3h - Conduite de raccordement 200



DISTANCE : **24.02 m**	PHOTO : **433**	VIDEO : **00:04:47**

OBSERVATIONS :

DCAZ - Autre type de raccordement à 9h - Conduite de raccordement 200



DISTANCE : **24.02 m**	PHOTO : **434**	VIDEO : **00:06:08**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 22**
	Référence du noeud de départ : **REP14**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP16**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP16 vers REP14**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **24.28 m**
Date de l'inspection : **17/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP14**	Référence du noeud : **REP16**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 22**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP16 vers REP14**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **24.28 m**
Grès	**3.00 m**	**REP14 vers REP16**	Longueur mesurée : **24.28 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP14 VERS REP16




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP14	435	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	245
0.50m / REP14	436/437	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP14	245
4.03m / REP14	438/439	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm BAJA - Deboîtement (longitudinal) à 9h	246
6.56m / REP14	440/441/442	BABCA - Fissure longitudinale ouverte - Largeur de 1mm - 6h,7h	246
22.62m / REP14	443/444	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	247
23.88m / REP14	445/446	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	247
24.06m / REP14	447/448	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP16	248
24.28m / REP14	449	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	248

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 22** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP16 vers REP14**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP14 vers REP16**	Longueur inspectée : **24.28 m** Longueur mesurée : **24.28 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

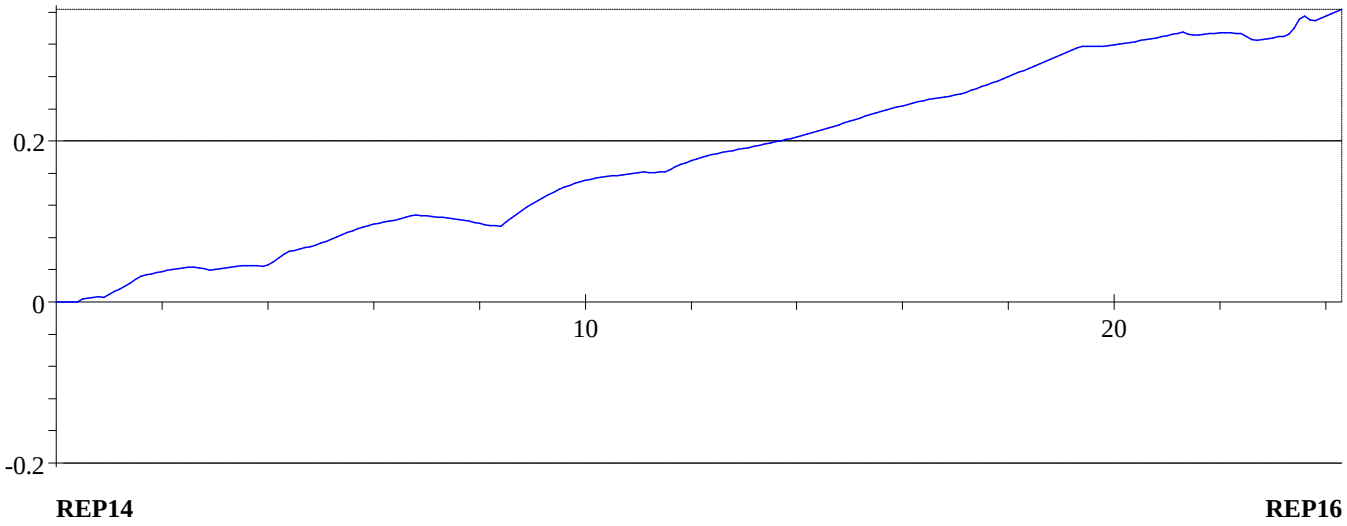

REP14 **REP16**


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 22** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP16 vers REP14**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **24.28 m**
Grès	**3.00 m**	**REP14 vers REP16**	Longueur mesurée : **24.28 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **435**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection

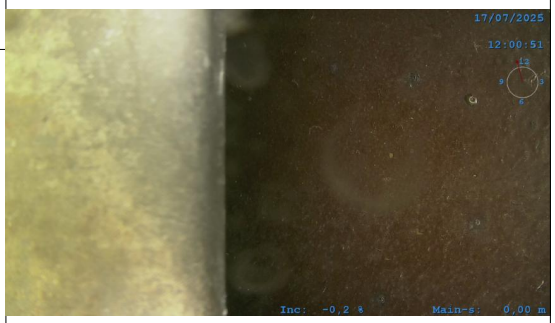

DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **436/437**	VIDEO : **00:00:10**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP14

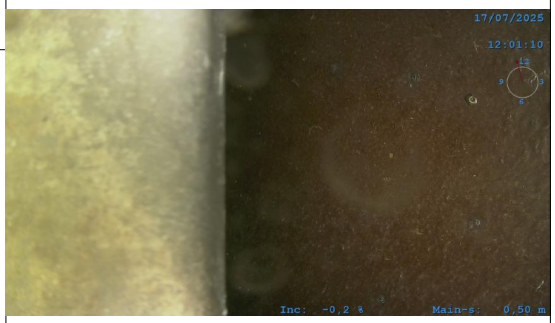





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 22** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP16 vers REP14**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP14 vers REP16**	Longueur inspectée : **24.28 m** Longueur mesurée : **24.28 m**

DISTANCE : **4.03 m**	PHOTO : **438/439**	VIDEO : **00:01:21**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm
BAJA - Deboîtement (longitudinal) à 9h

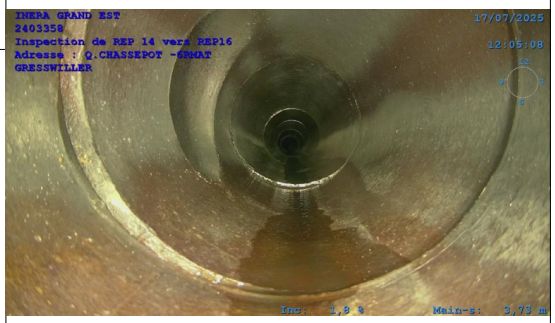


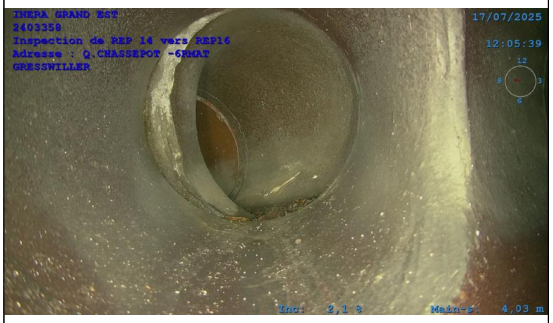

DISTANCE : **6.56 m**	PHOTO : **440/441/442**	VIDEO : **00:02:01**

OBSERVATIONS :

BABCA - Fissure longitudinale ouverte - Largeur de 1mm - 6h,7h

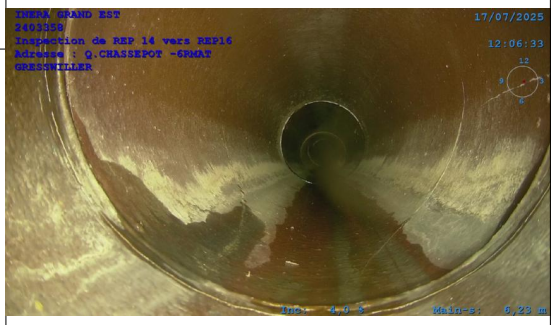






GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 22** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP16 vers REP14**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **24.28 m**
Grès	**3.00 m**	**REP14 vers REP16**	Longueur mesurée : **24.28 m**

DISTANCE : **22.62 m**	PHOTO : **443/444**	VIDEO : **00:03:44**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm

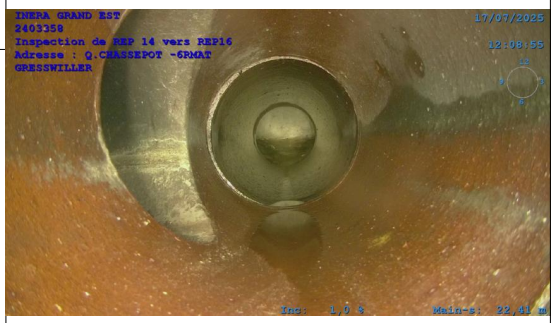




DISTANCE : **23.88 m**	PHOTO : **445/446**	VIDEO : **00:04:31**

OBSERVATIONS :

BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm



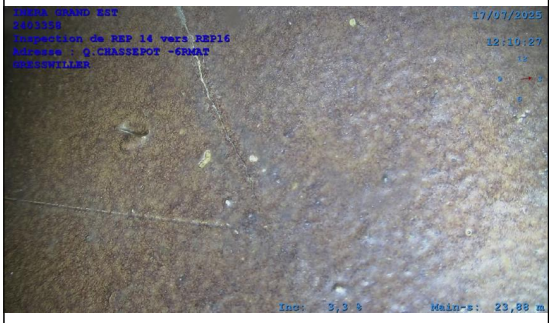



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 22** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP16 vers REP14**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP14 vers REP16**	Longueur inspectée : **24.28 m** Longueur mesurée : **24.28 m**

DISTANCE : **24.06 m**	PHOTO : **447/448**	VIDEO : **00:05:04**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP16

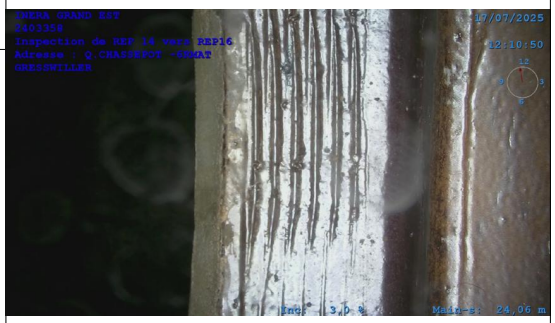

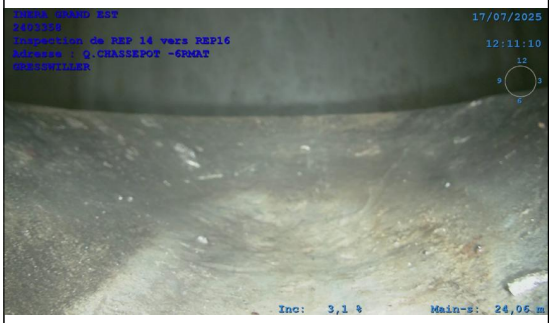

DISTANCE : **24.28 m**	PHOTO : **449**	VIDEO : **00:05:28**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - fin d'inspection



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G34** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G34 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **4.98 m** Longueur mesurée : **4.98 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G34 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G34	450/451	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G34	250
4.70 m/G34	452	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	250
4.98 m/G34	453	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	250

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP14 - REP16**

Position : **dans REP14 - REP16**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G34** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G34 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **4.98 m** Longueur mesurée : **4.98 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **450/451**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G34





DISTANCE : **4.70 m**	PHOTO : **452**	VIDEO : **00:02:50**

OBSERVATIONS :

BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas



DISTANCE : **4.98 m**	PHOTO : **453**	VIDEO : **00:03:19**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 23**
	Référence du noeud de départ : **REP14**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP17**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP17 vers REP14**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **29.20 m**
Date de l'inspection : **17/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP14**	Référence du noeud : **REP17**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 23**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP17 vers REP14**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **29.20 m**
Grès	**3.00 m**	**REP14 vers REP17**	Longueur mesurée : **29.20 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP14 VERS REP17




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP14	454	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	254
0.50m / REP14	455/456	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP14	254
2.80m / REP14	457/458	BABCE - Fissure radiale ouverte à partir d'un point (en étoile) - Largeur de 1mm	255
4.66m / REP14	459/460	BAJB - Décentrage (radial)	255
9.88m / REP14	461/462	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm BAJA - Deboîtement (longitudinal)	256
26.88m / REP14	463/464	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	256
28.93m / REP14	465/466	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP17	257
29.20m / REP14	467	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	257

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 23** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP17 vers REP14**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP14 vers REP17**	Longueur inspectée : **29.20 m** Longueur mesurée : **29.20 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

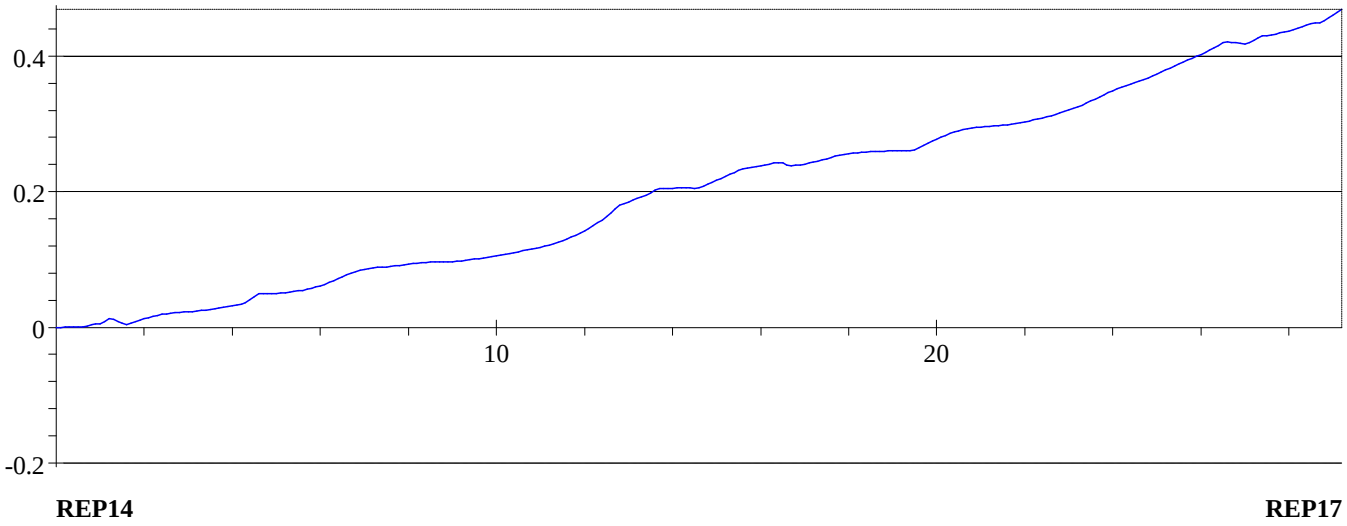

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 23** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP17 vers REP14**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP14 vers REP17**	Longueur inspectée : **29.20 m** Longueur mesurée : **29.20 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **454**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection




DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **455/456**	VIDEO : **00:00:09**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP14



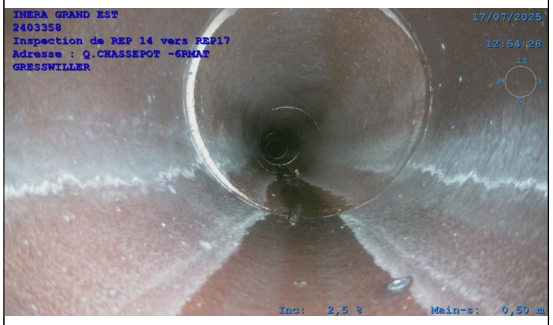

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 23** Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP17 vers REP14**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP14 vers REP17**	Longueur inspectée : **29.20 m** Longueur mesurée : **29.20 m**

DISTANCE : **2.80 m**	PHOTO : **457/458**	VIDEO : **00:02:16**

OBSERVATIONS :

BABCE - Fissure radiale ouverte à partir d'un point (en étoile) - Largeur de 1mm



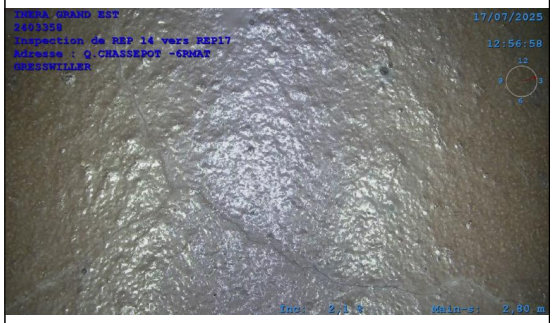

DISTANCE : **4.66 m**	PHOTO : **459/460**	VIDEO : **00:02:47**

OBSERVATIONS :

BAJB - Décentrage (radial)





Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP17 vers REP14**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **29.20 m**
Grès	**3.00 m**	**REP14 vers REP17**	Longueur mesurée : **29.20 m**

DISTANCE : **9.88 m**	PHOTO : **461/462**	VIDEO : **00:04:27**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm
BAJA - Deboîtement (longitudinal)





DISTANCE : **26.88 m**	PHOTO : **463/464**	VIDEO : **00:06:40**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 23** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP17 vers REP14**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **29.20 m**
Grès	**3.00 m**	**REP14 vers REP17**	Longueur mesurée : **29.20 m**

DISTANCE : **28.93 m**	PHOTO : **465/466**	VIDEO : **00:07:20**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP17





DISTANCE : **29.20 m**	PHOTO : **467**	VIDEO : **00:07:41**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - fin d'inspection



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G33** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G33 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **4.57 m** Longueur mesurée : **4.57 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G33 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G33	468/469	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G33	259
2.24 m/G33	470	BABCC - Fissure complexe ouverte de 9h à 3h - Largeur de 1mm	259
4.22 m/G33	471	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	259
4.57 m/G33	472	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	260

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP14 - REP17**

Position : **dans REP14 - REP17**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G33** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G33 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **4.57 m** Longueur mesurée : **4.57 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **468/469**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G33



DISTANCE : **2.24 m**	PHOTO : **470**	VIDEO : **00:00:24**

OBSERVATIONS :

BABCC - Fissure complexe ouverte de 9h à 3h - Largeur de 1mm



DISTANCE : **4.22 m**	PHOTO : **471**	VIDEO : **00:00:32**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G33** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G33 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **4.57 m** Longueur mesurée : **4.57 m**

DISTANCE : **4.57 m**	PHOTO : **472**	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :


BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G35** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G35 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.53 m** Longueur mesurée : **5.53 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT G35 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/G35	473/474	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G35	262
4.63 m/G35	475	BDA - Photographie générale	262
5.53 m/G35	476	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	262

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement : **REP14 - REP17**

Position : **dans REP14 - REP17**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **G35** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **G35 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **5.53 m** Longueur mesurée : **5.53 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **473/474**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G35





DISTANCE : **4.63 m**	PHOTO : **475**	VIDEO : **00:00:30**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale



DISTANCE : **5.53 m**	PHOTO : **476**	VIDEO : **00:00:38**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n°24**
	Référence du noeud de départ : **REP14**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP15**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP14 vers REP15**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **30.01 m**
Date de l'inspection : **17/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Grès**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP14**	Référence du noeud : **REP15**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n°24**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP14 vers REP15**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **30.01 m**
Grès	**3.00 m**	**REP14 vers REP15**	Longueur mesurée : **30.01 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP14 VERS REP15




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP14	477	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	266
0.50m / REP14	478/479	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP14	266
1.36m / REP14	480	BAJB - Décentrage (radial) - sur l'ensemble du tronçon	266
12.14m / REP14	481	BAJB - Décentrage (radial) - sur l'ensemble du tronçon	267
29.98m / REP14	482/483	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP15 - en chute	267
30.01m / REP14	484	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	267

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n°24** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **200 mm**	Sens de l'écoulement **REP14 vers REP15**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP14 vers REP15**	Longueur inspectée : **30.01 m** Longueur mesurée : **30.01 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

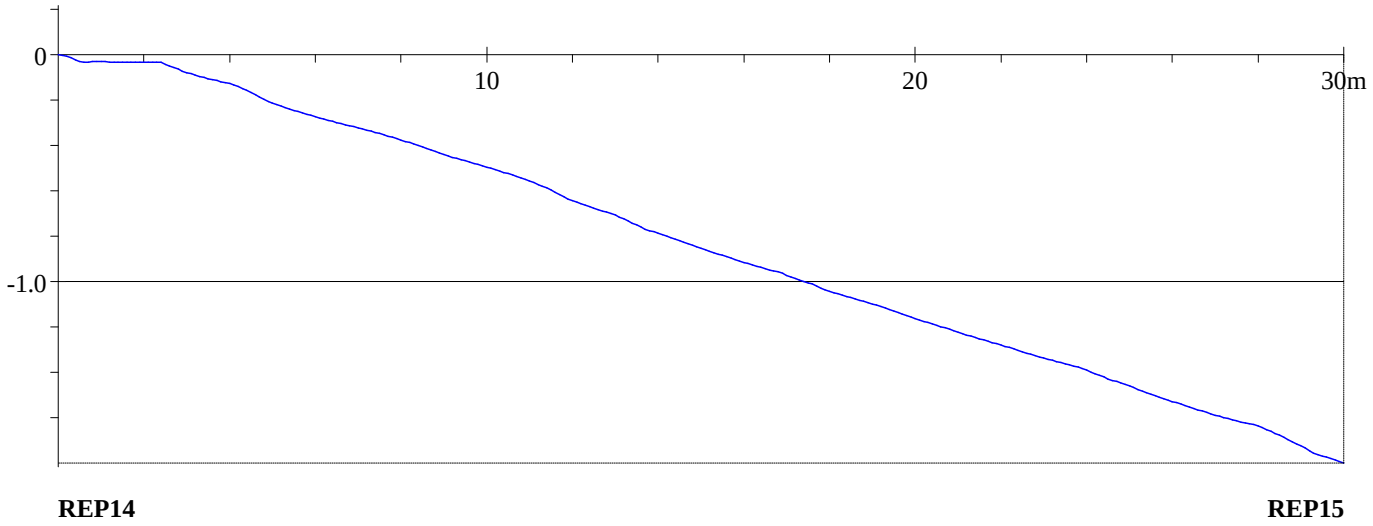

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP14 vers REP15**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **30.01 m**
Grès	**3.00 m**	**REP14 vers REP15**	Longueur mesurée : **30.01 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **477**	VIDEO : **00:00:02**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **478/479**	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP14






DISTANCE : **1.36 m**	PHOTO : **480**	VIDEO : **00:01:57**

OBSERVATIONS :

BAJB - Décentrage (radial) - sur l'ensemble du tronçon

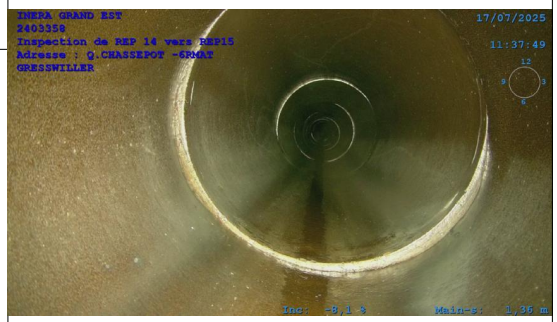

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n°24** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**200 mm**	**REP14 vers REP15**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **30.01 m**
Grès	**3.00 m**	**REP14 vers REP15**	Longueur mesurée : **30.01 m**

DISTANCE : **12.14 m**	PHOTO : **481**	VIDEO : **00:02:52**

OBSERVATIONS :


BAJB - Décentrage (radial) - sur l'ensemble du tronçon



DISTANCE : **29.98 m**	PHOTO : **482/483**	VIDEO : **00:04:28**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP15 - en chute

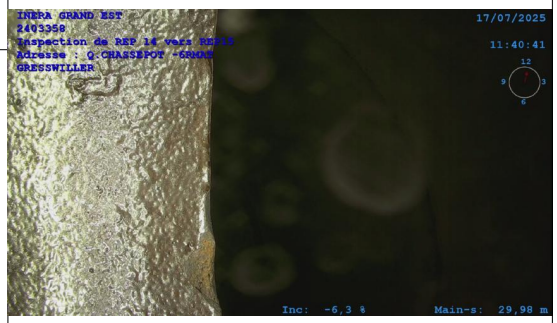




DISTANCE : **30.01 m**	PHOTO : **484**	VIDEO : **00:05:29**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection

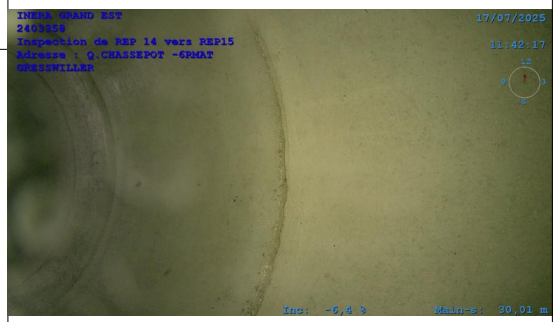

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 25**
	Référence du noeud de départ : **REP19**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP18**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP19 vers REP18**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **27.16 m**
Date de l'inspection : **17/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **400**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP19**	Référence du noeud : **REP18**
Dimensions du regard : **400 x 400**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP19 vers REP18**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **27.16 m**
Béton	**3.00 m**	**REP19 vers REP18**	Longueur mesurée : **27.16 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP19 VERS REP18




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP19	485	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	271
		BDB - Remarque générale - erreur d 'incrustation REP19-->REP18	
0.50m / REP19	486/487	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP19	271
12.26m / REP19	488/489	BDA - Photographie générale - emboitement correct	272
27.15m / REP19	490/491	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18 - en chute	272
27.16m / REP19	492	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	273

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 25** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP19 vers REP18**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP19 vers REP18**	Longueur inspectée : **27.16 m** Longueur mesurée : **27.16 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

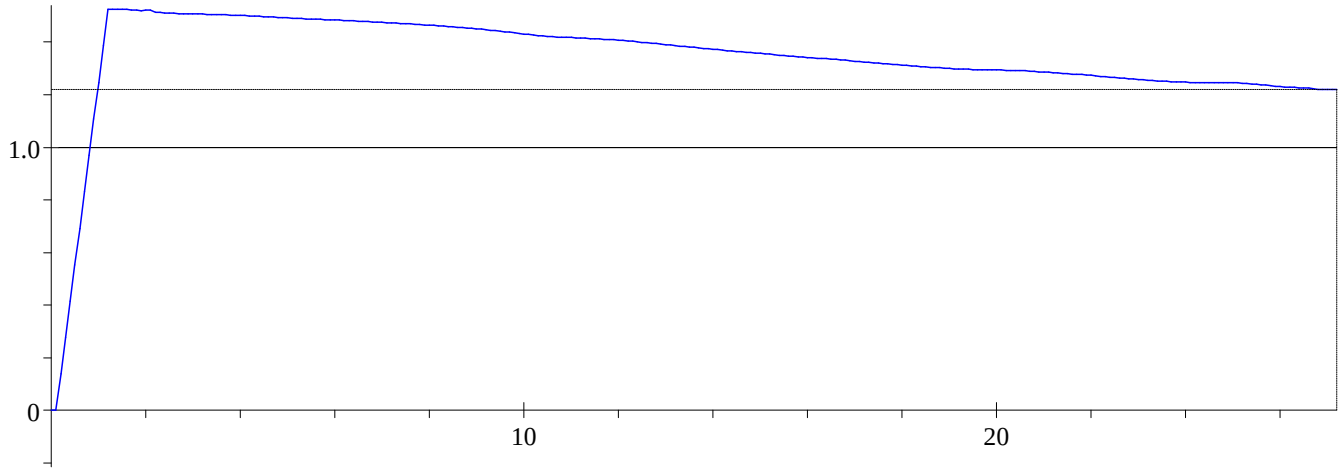

REP19 **REP18**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 25** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP19 vers REP18**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **27.16 m**
Béton	**3.00 m**	**REP19 vers REP18**	Longueur mesurée : **27.16 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **485**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection
BDB - Remarque générale - erreur d 'incrustation REP19-->REP18



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **486/487**	VIDEO : **00:00:19**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP19





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 25** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP19 vers REP18**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP19 vers REP18**	Longueur inspectée : **27.16 m** Longueur mesurée : **27.16 m**

DISTANCE : **12.26 m**	PHOTO : **488/489**	VIDEO : **00:02:52**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





DISTANCE : **27.15 m**	PHOTO : **490/491**	VIDEO : **00:06:37**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18 - en chute





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 25** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP19 vers REP18**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP19 vers REP18**	Longueur inspectée : **27.16 m** Longueur mesurée : **27.16 m**

DISTANCE : **27.16 m**	PHOTO : **492**	VIDEO : **00:07:19**


OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV1** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP19 vers AV1**	Longueur inspectée : **9.73 m** Longueur mesurée : **9.73 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT REP19 VERS AV1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/REP19	493/494	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP19	275
0.00 m/REP19	495	BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut	275
3.71 m/REP19	496	BACA - Rupture à 2h - Longueur de 300mm	275
5.36 m/REP19	497	BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut	276
9.73 m/REP19	498	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV1 - Grille avaloir	276

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **REP19**

Position : **dans REP19**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV1** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP19 vers AV1**	Longueur inspectée : **9.73 m** Longueur mesurée : **9.73 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **493/494**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP19





DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **495**	VIDEO : **00:00:17**

OBSERVATIONS :

BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut



DISTANCE : **3.71 m**	PHOTO : **496**	VIDEO : **00:00:48**

OBSERVATIONS :

BACA - Rupture à 2h - Longueur de 300mm



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV1** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP19 vers AV1**	Longueur inspectée : **9.73 m** Longueur mesurée : **9.73 m**

DISTANCE : **5.36 m**	PHOTO : **497**	VIDEO : **00:00:58**

OBSERVATIONS :

BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut



DISTANCE : **9.73 m**	PHOTO : **498**	VIDEO : **00:01:33**

OBSERVATIONS :

BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV1 - Grille avaloir



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 26**
	Référence du noeud de départ : **REP15**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP18**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP15 vers REP18**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **15.41 m**
Date de l'inspection : **17/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **500**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP15**	Référence du noeud : **REP18**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**500 mm**	**REP15 vers REP18**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **15.41 m**
Béton	**3.00 m**	**REP15 vers REP18**	Longueur mesurée : **15.41 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP15 VERS REP18




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP15	499	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	280
0.50m / REP15	500/501	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP15	280
0.50m / REP15	502	BAFCZ - Dégradation de surface, granulats exposés - Autres causes à 6h	280
1.50m / REP15	503	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 12h - Largeur de 1mm - début	281
9.41m / REP15	504	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 12h - Largeur de 1mm - fin	281
13.81m / REP15	505/506	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	281
14.58m / REP15	507/508	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18	282
15.41m / REP15	509	DCAZ - Autre type de raccordement - Conduite de raccordement 400 - 3h,6h	282
15.41m / REP15	510	DCAZ - Autre type de raccordement à 6h - Conduite de raccordement 300	282
15.41m / REP15	511	DCAZ - Autre type de raccordement à 11h - Conduite de raccordement 200	283
15.41m / REP15	512	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	283

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 26** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **500 mm**	Sens de l'écoulement **REP15 vers REP18**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP15 vers REP18**	Longueur inspectée : **15.41 m** Longueur mesurée : **15.41 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

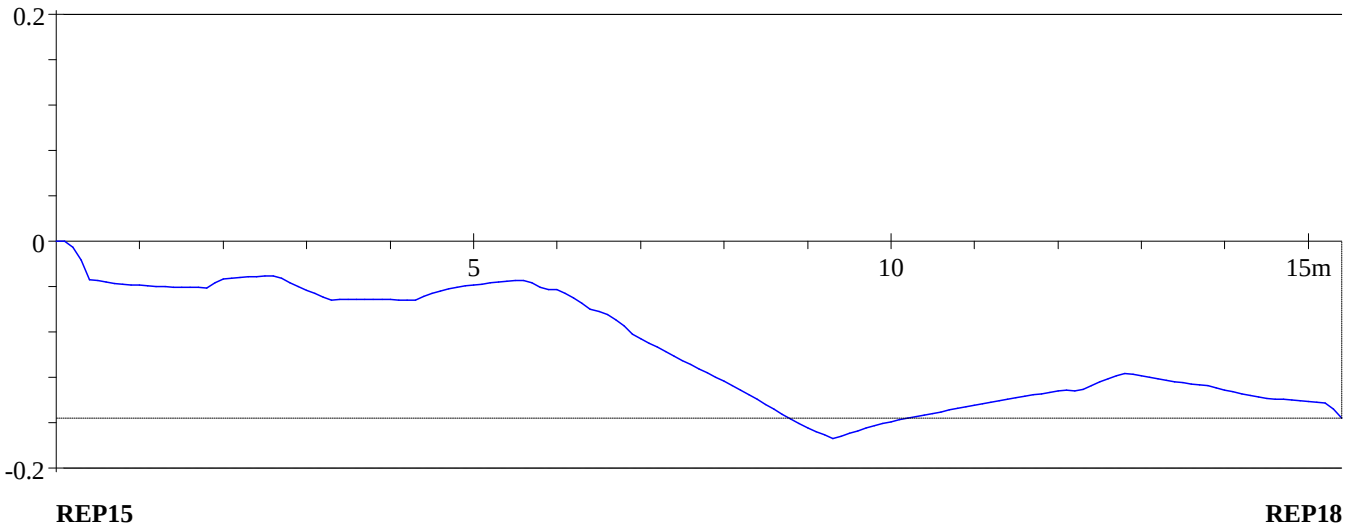

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**500 mm**	**REP15 vers REP18**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **15.41 m**
Béton	**3.00 m**	**REP15 vers REP18**	Longueur mesurée : **15.41 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **499**	VIDEO : **00:00:29**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **500/501**	VIDEO : **00:00:40**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP15





DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **502**	VIDEO : **00:00:52**

OBSERVATIONS :

BAFCZ - Dégradation de surface, granulats exposés - Autres causes à 6h




GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 26** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**500 mm**	**REP15 vers REP18**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **15.41 m**
Béton	**3.00 m**	**REP15 vers REP18**	Longueur mesurée : **15.41 m**

DISTANCE : **1.50 m**	PHOTO : **503**	VIDEO : **00:01:57**

OBSERVATIONS :

BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 12h - Largeur de 1mm - début

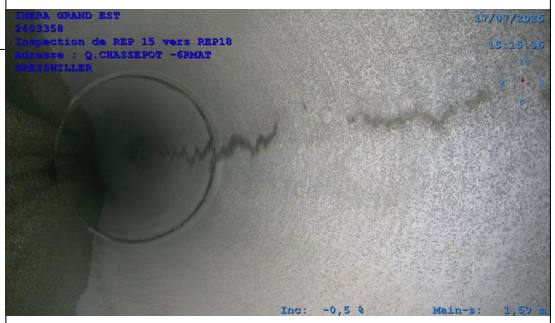

DISTANCE : **9.41 m**	PHOTO : **504**	VIDEO : **00:03:00**

OBSERVATIONS :

BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 12h - Largeur de 1mm - fin



DISTANCE : **13.81 m**	PHOTO : **505/506**	VIDEO : **00:03:28**

OBSERVATIONS :

BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 26** Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**500 mm**	**REP15 vers REP18**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **15.41 m**
Béton	**3.00 m**	**REP15 vers REP18**	Longueur mesurée : **15.41 m**

DISTANCE : **14.58 m**	PHOTO : **507/508**	VIDEO : **00:06:19**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18



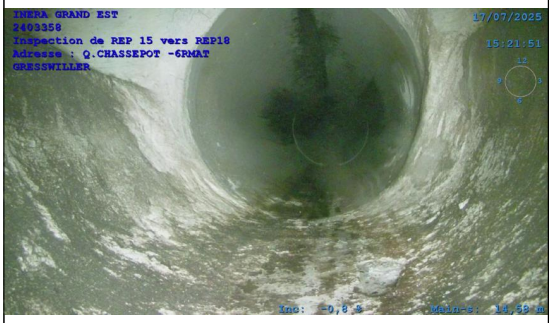

DISTANCE : **15.41 m**	PHOTO : **509**	VIDEO : **00:06:41**

OBSERVATIONS :

DCAZ - Autre type de raccordement - Conduite de raccordement 400 - 3h,6h



DISTANCE : **15.41 m**	PHOTO : **510**	VIDEO : **00:06:43**

OBSERVATIONS :

DCAZ - Autre type de raccordement à 6h - Conduite de raccordement 300



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 26** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**500 mm**	**REP15 vers REP18**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **15.41 m**
Béton	**3.00 m**	**REP15 vers REP18**	Longueur mesurée : **15.41 m**

DISTANCE : **15.41 m**	PHOTO : **511**	VIDEO : **00:06:51**	
OBSERVATIONS : **DCAZ - Autre type de raccordement à 11h - Conduite de raccordement 200**			

DISTANCE : **15.41 m**	PHOTO : **512**	VIDEO : **00:07:01**	
OBSERVATIONS : **BDB - Remarque générale - fin d'inspection**			

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 27**
	Référence du noeud de départ : **REP18**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP20**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP18 vers REP20**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **15.58 m**
Date de l'inspection : **17/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **500**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP18**	Référence du noeud : **REP20**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1200**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**500 mm**	**REP18 vers REP20**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **15.58 m**
Béton	**3.00 m**	**REP18 vers REP20**	Longueur mesurée : **15.58 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP18 VERS REP20




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP18	513	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	287
0.46m / REP18	514/515	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP18	287
9.02m / REP18	516/517	BDA - Photographie générale - emboitement correct	288
15.11m / REP18	518/519	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP20	288
15.58m / REP18	520	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	289

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 27** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **500 mm**	Sens de l'écoulement **REP18 vers REP20**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP18 vers REP20**	Longueur inspectée : **15.58 m** Longueur mesurée : **15.58 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

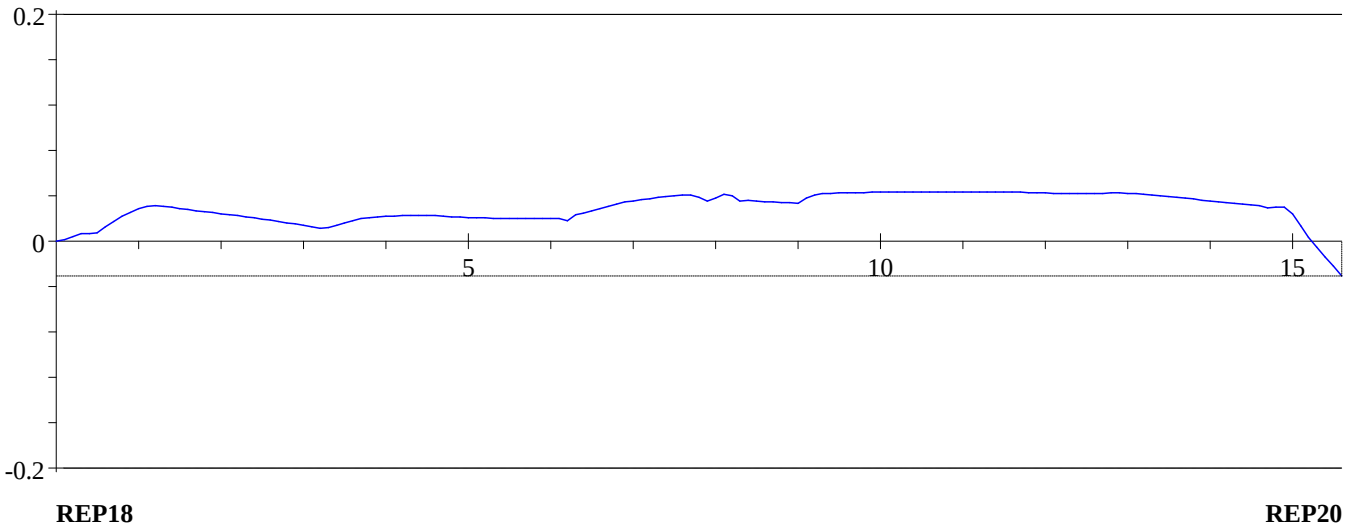

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 27** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**500 mm**	**REP18 vers REP20**	**17 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **15.58 m**
Béton	**3.00 m**	**REP18 vers REP20**	Longueur mesurée : **15.58 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **513**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection




DISTANCE : **0.46 m**	PHOTO : **514/515**	VIDEO : **00:00:19**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP18



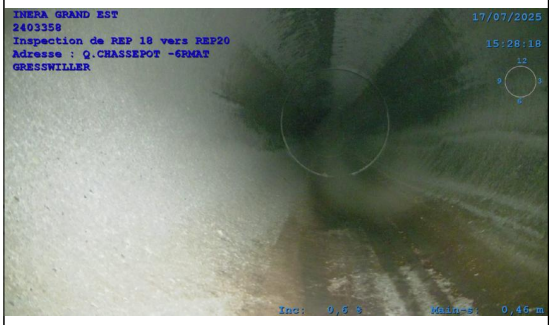


DISTANCE : **9.02 m**	PHOTO : **516/517**	VIDEO : **00:01:32**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct




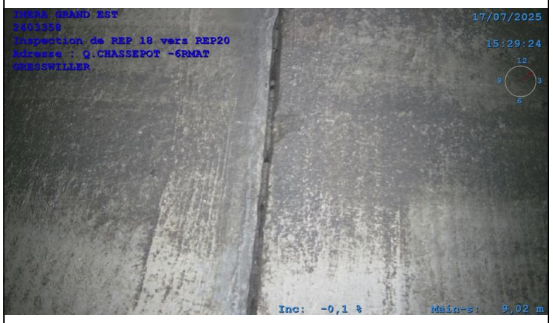

DISTANCE : **15.11 m**	PHOTO : **518/519**	VIDEO : **00:02:31**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP20

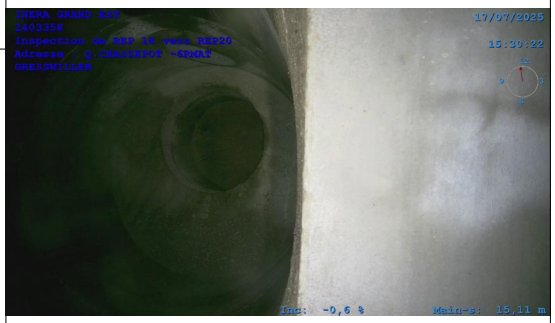



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 27** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **500 mm**	Sens de l'écoulement **REP18 vers REP20**	Date d'inspection : **17 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP18 vers REP20**	Longueur inspectée : **15.58 m** Longueur mesurée : **15.58 m**

DISTANCE : **15.58 m**	PHOTO : **520**	VIDEO : **00:02:54**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 28**
	Référence du noeud de départ : **REP19.1**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP19**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP19.1 vers REP19**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **5.86 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **300**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP19.1**	Référence du noeud : **REP19**
Dimensions du regard : **400 x 400**	Dimensions du regard : **400 x 400**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP19.1 vers REP19**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **5.86 m**
Béton	**3.00 m**	**REP19.1 vers REP19**	Longueur mesurée : **5.86 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP19.1 VERS REP19



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP19.1	521/522	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 19.1	292
2.51m / REP19.1	523	BDA - Photographie générale - emboitement correct	292
5.86m / REP19.1	524	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 19	292

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 28** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **REP19.1 vers REP19**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP19.1 vers REP19**	Longueur inspectée : **5.86 m** Longueur mesurée : **5.86 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **521/522**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 19.1





DISTANCE : **2.51 m**	PHOTO : **523**	VIDEO : **00:00:38**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct



DISTANCE : **5.86 m**	PHOTO : **524**	VIDEO : **00:00:52**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 19



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n°29**
	Référence du noeud de départ : **REP19.1**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP19.2**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP19.2 vers REP19.1**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **19.88 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **160**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **PVC-U**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**


Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP19.1**	Référence du noeud : **REP19.2**
Dimensions du regard : **400 x 400**	Dimensions du regard : **400 x 400**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

SYNTHESE DU TRONÇON REP19.1 VERS REP19.2



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP19.1	525/526	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 19.1	295
14.68m / REP19.1	527	BDA - Photographie générale - emboitement correct	295
19.88m / REP19.1	528	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP19.2	295

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n°29**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**	**REP19.2 vers REP19.1**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **19.88 m**
PVC-U	**3.00 m**	**REP19.1 vers REP19.2**	Longueur mesurée : **19.88 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **525/526**	VIDEO : **00:00:25**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 19.1



DISTANCE : **14.68 m**	PHOTO : **527**	VIDEO : **00:01:17**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct



DISTANCE : **19.88 m**	PHOTO : **528**	VIDEO : **00:01:36**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP19.2



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 30**
	Référence du noeud de départ : **REP19.2**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP19.3**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP19.3 vers REP19.2**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **16.34 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **300**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP19.2**	Référence du noeud : **REP19.3**
Dimensions du regard : **400 x 400**	Dimensions du regard : **Ø800**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 30**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	160 **mm**	**REP19.3 vers REP19.2**	**21 juillet 2025**
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **16.34 m**
	3.00 m	**REP19.2 vers REP19.3**	Longueur mesurée : **16.34 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP19.2 VERS REP19.3



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP19.2	529/530	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 19.2	298
10.85m / REP19.2	531	BDA - Photographie générale - emboitement correct	298
16.34m / REP19.2	532	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 19.3	298

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 30** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : 160 **mm**	Sens de l'écoulement **REP19.3 vers REP19.2**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : PVC-U	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP19.2 vers REP19.3**	Longueur inspectée : **16.34 m** Longueur mesurée : **16.34 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **529/530**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 19.2



DISTANCE : **10.85 m**	PHOTO : **531**	VIDEO : **00:00:38**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct



DISTANCE : **16.34 m**	PHOTO : **532**	VIDEO : **00:00:59**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 19.3



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 31**
	Référence du noeud de départ : **REP46**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP47**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP47 vers REP46**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **27.60 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **600**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP46**	Référence du noeud : **REP47**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 31**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP47 vers REP46**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **27.60 m**
Béton	**3.00 m**	**REP46 vers REP47**	Longueur mesurée : **27.60 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP46 VERS REP47




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP46	533	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	302
0.00m / REP46	534	DCAZ - Autre type de raccordement à 9h - Conduite de raccordement 300 - Emplacement : cunette	302
0.50m / REP46	535/536	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP46	302
0.45m / REP46	537	BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation à 12h - Réduction de la section de 10%	303
6.76m / REP46	538/539	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 12h - Largeur de 1mm - début	303
8.48m / REP46	540	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 12h - Largeur de 1mm	303
14.30m / REP46	541/542	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm	304
26.73m / REP46	543/544	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP47	304
27.60m / REP46	545	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	305

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 31** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **REP47 vers REP46**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP46 vers REP47**	Longueur inspectée : **27.60 m** Longueur mesurée : **27.60 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

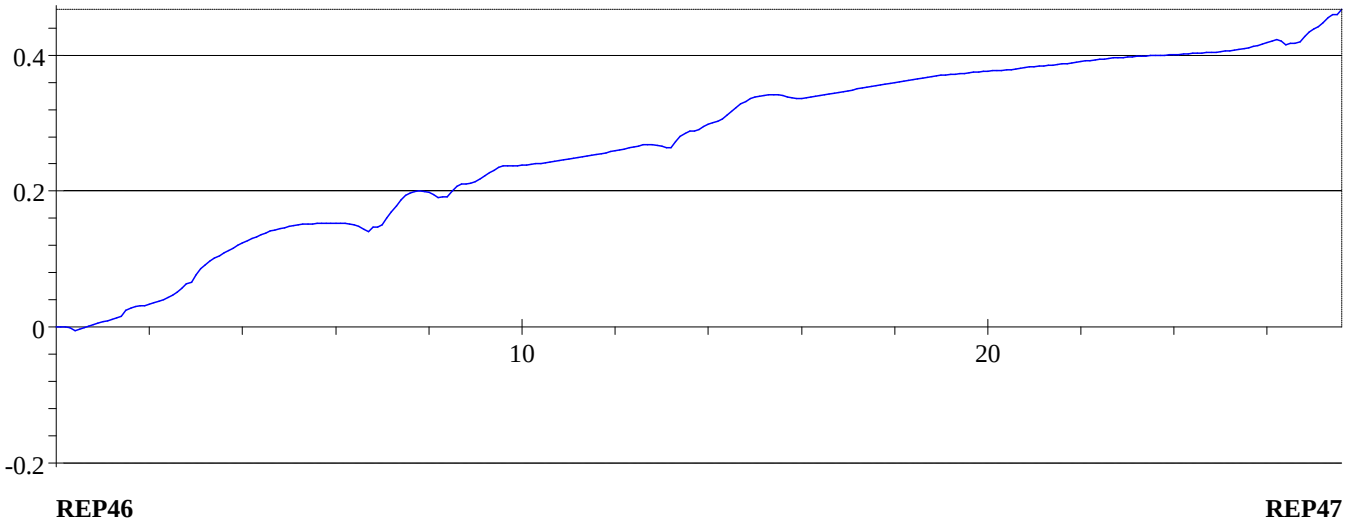

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **533**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **534**	VIDEO : **00:00:10**

OBSERVATIONS :

DCAZ - Autre type de raccordement à 9h - Conduite de raccordement 300 - Emplacem : cunette



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **535/536**	VIDEO : **00:01:04**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP46





DISTANCE : **0.45 m**	PHOTO : **537**	VIDEO : **00:01:56**

OBSERVATIONS :


BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation à 12h - Réduction de l section de 10%



DISTANCE : **6.76 m**	PHOTO : **538/539**	VIDEO : **00:03:27**

OBSERVATIONS :

BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 12h - Largeur de 1mm - début

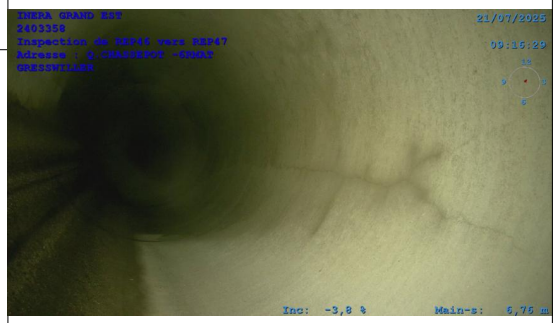



DISTANCE : **8.48 m**	PHOTO : **540**	VIDEO : **00:03:53**

OBSERVATIONS :

BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 12h - Largeur de 1mm



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 31** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP47 vers REP46**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **27.60 m**
Béton	**3.00 m**	**REP46 vers REP47**	Longueur mesurée : **27.60 m**

DISTANCE : **14.30 m**	PHOTO : **541/542**	VIDEO : **00:04:10**

OBSERVATIONS :

BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm






DISTANCE : **26.73 m**	PHOTO : **543/544**	VIDEO : **00:05:08**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP47

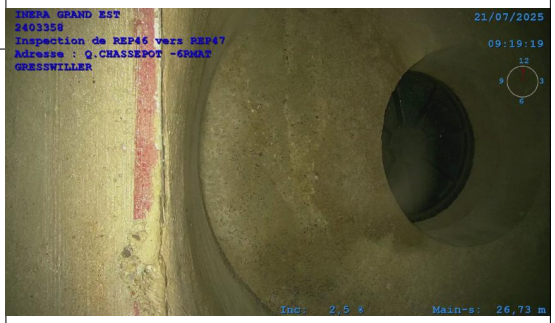



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 31** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **REP47 vers REP46**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP46 vers REP47**	Longueur inspectée : **27.60 m** Longueur mesurée : **27.60 m**

DISTANCE : **27.60 m**	PHOTO : **545**	VIDEO : **00:05:32**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - fin d'inspection



GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **Brt G0**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**		**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **0.00 m**
PVC-U	**3.00 m**	**Brt G0 vers Collecteur**	Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT Brt G0 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/Brt G0	546/547	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Pas d 'accès	307

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement :


Position : **dans**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt G0** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Brt G0 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **546/547**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Pas d 'accès






ABANDON INSPECTION

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt G0.1** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Brt G0.1 vers collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT Brt G0.1 VERS collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/Brt G0.1	548/549	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - pas de sortie en aval	309

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement :

Position : **dans**

	GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt G0.1** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Brt G0.1 vers collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **548/549**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - pas de sortie en aval

ABANDON INSPECTION






GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **Brt G0.2**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Brt G0.2 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT Brt G0.2 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/Brt G0.2	550/551	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - pas de sortie en aval	311

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement :

Position : **dans**

	GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt G0.2** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Brt G0.2 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **550/551**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - pas de sortie en aval






ABANDON INSPECTION

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **Brt G0.3**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Brt G0.3 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT Brt G0.3 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/Brt G0.3	552/553	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Pas de sortie en aval	313

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement :

Position : **dans**

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt G0.3** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Brt G0.3 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **552/553**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Pas de sortie en aval






ABANDON INSPECTION

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **Brt AV6**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**		**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **0.00 m**
PVC-U	**3.00 m**	**REP44 vers AV6**	Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT REP44 VERS AV6



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/REP44	554/555	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Pas de piquage dans regard	315

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement :

Position : **dans**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV6** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP44 vers AV6**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **554/555**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Pas de piquage dans regard






ABANDON INSPECTION

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV7** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP45 vers AV7**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT REP45 VERS AV7



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/REP45	556/557	DARE - Cadre déboîté BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Pas de piquage dans regard	317

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement :

Position : **dans**

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV7** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP45 vers AV7**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **556/557**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

DARE - Cadre déboîté
BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Pas de piquage dans regard





ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 32**
	Référence du noeud de départ : **REP47**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP10**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP10 vers REP47**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **18.82 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **600**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP47**	Référence du noeud : **REP10**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP10 vers REP47**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **18.82 m**
Béton	**3.00 m**	**REP47 vers REP10**	Longueur mesurée : **18.82 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP47 VERS REP10




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP47	558	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	321
0.32m / REP47	559/560	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP47	321
2.67m / REP47	561	BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 5% - début	321
9.90m / REP47	562/563	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm	322
13.81m / REP47	564/565	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm	322
17.37m / REP47	566/567	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm	323
		BAAA - Réduction verticale de la section de la canalisation - Réduction de 8.3%	
18.63m / REP47	568/569	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP10	323
18.82m / REP47	570	DCAZ - Autre type de raccordement à 3h - Conduite de raccordement 300 - Emplacement : cunette	324
18.81m / REP47	571	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	324

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 32** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **REP10 vers REP47**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP47 vers REP10**	Longueur inspectée : **18.82 m** Longueur mesurée : **18.82 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

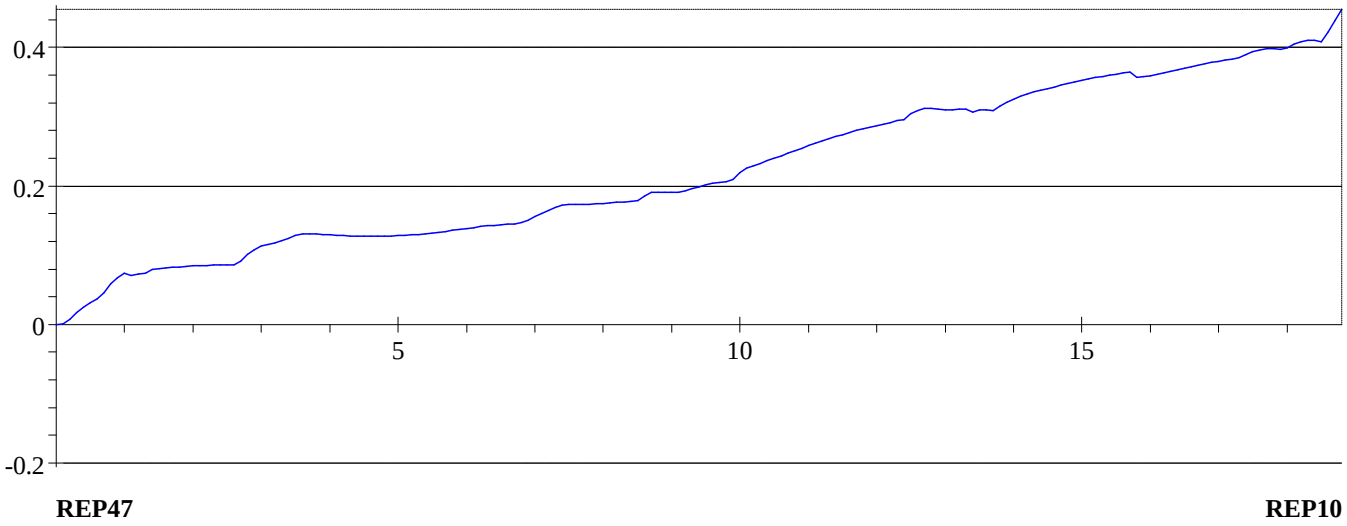

REP47 **REP10**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 32** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP10 vers REP47**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **18.82 m**
Béton	**3.00 m**	**REP47 vers REP10**	Longueur mesurée : **18.82 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **558**	VIDEO : **00:00:03**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.32 m**	PHOTO : **559/560**	VIDEO : **00:00:13**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP47





DISTANCE : **2.67 m**	PHOTO : **561**	VIDEO : **00:00:54**

OBSERVATIONS :

BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 5% - début




GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 32** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP10 vers REP47**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **18.82 m**
Béton	**3.00 m**	**REP47 vers REP10**	Longueur mesurée : **18.82 m**

DISTANCE : **9.90 m**	PHOTO : **562/563**	VIDEO : **00:01:30**

OBSERVATIONS :

BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm

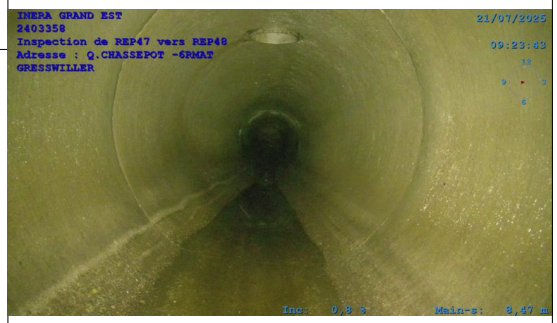




DISTANCE : **13.81 m**	PHOTO : **564/565**	VIDEO : **00:02:00**

OBSERVATIONS :

BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm

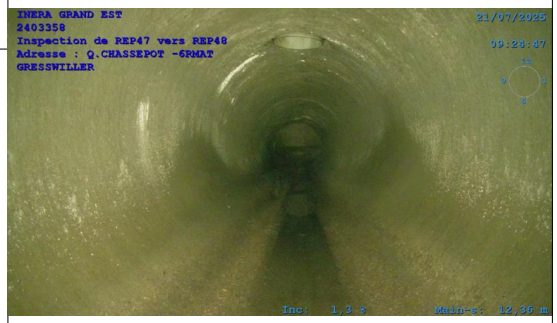



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 32** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP10 vers REP47**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **18.82 m**
Béton	**3.00 m**	**REP47 vers REP10**	Longueur mesurée : **18.82 m**

DISTANCE : **17.37 m**	PHOTO : **566/567**	VIDEO : **00:02:28**

OBSERVATIONS :

BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm
BAAA - Réduction verticale de la section de la canalisation - Réduction de 8.3%





DISTANCE : **18.63 m**	PHOTO : **568/569**	VIDEO : **00:03:08**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP10





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 32** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP10 vers REP47**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **18.82 m**
Béton	**3.00 m**	**REP47 vers REP10**	Longueur mesurée : **18.82 m**

DISTANCE : **18.82 m**	PHOTO : **570**	VIDEO : **00:00:00**	
OBSERVATIONS : **DCAZ - Autre type de raccordement à 3h - Conduite de raccordement 300 - Emplacem : cunette**			

DISTANCE : **18.81 m**	PHOTO : **571**	VIDEO : **00:03:53**	
OBSERVATIONS : **BDB - Remarque générale - fin d'inspection**			

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 33**
	Référence du noeud de départ : **REP18**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP18.1**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP18.1 vers REP18**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **10.97 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **400**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP18**	Référence du noeud : **REP18.1**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 33**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP18.1 vers REP18**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **10.97 m**
Béton	**3.00 m**	**REP18 vers REP18.1**	Longueur mesurée : **10.97 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP18 VERS REP18.1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP18	572/573	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18 - caméra poussée pour cause d 'accès	327
9.79m / REP18	574	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm	327
10.97m / REP18	575	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18.1	327

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 33** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP18.1 vers REP18**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **10.97 m**
Béton	**3.00 m**	**REP18 vers REP18.1**	Longueur mesurée : **10.97 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **572/573**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18 - caméra poussée pou cause d 'accès





DISTANCE : **9.79 m**	PHOTO : **574**	VIDEO : **00:02:19**

OBSERVATIONS :

BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm



DISTANCE : **10.97 m**	PHOTO : **575**	VIDEO : **00:03:16**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18.1



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 34**
	Référence du noeud de départ : **REP 18.2**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP18.1**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP 18.2 vers REP18.1**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **1.87 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **300**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP 18.2**	Référence du noeud : **REP18.1**
Dimensions du regard : **400 x 400**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP 18.2 vers REP18.1**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **1.87 m**
Béton	**3.00 m**	**REP 18.2 vers REP18.1**	Longueur mesurée : **1.87 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP 18.2 VERS REP18.1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP 18.2	576/577	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.2	330
0.85m / REP 18.2	578	BAFAE - Dégradation de surface, rugosité accrue sans cause évidente	330
1.87m / REP 18.2	579	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 18.1	330

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 34** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **REP 18.2 vers REP18.1**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 18.2 vers REP18.1**	Longueur inspectée : **1.87 m** Longueur mesurée : **1.87 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **576/577**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.2



DISTANCE : **0.85 m**	PHOTO : **578**	VIDEO : **00:00:14**

OBSERVATIONS :

BAFAE - Dégradation de surface, rugosité accrue sans cause évidente



DISTANCE : **1.87 m**	PHOTO : **579**	VIDEO : **00:00:19**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 18.1



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 35**
	Référence du noeud de départ : **REP18.3**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP 18.2**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP 18.2 vers REP18.3**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **16.59 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **160**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **PVC-U**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP18.3**	Référence du noeud : **REP 18.2**
Dimensions du regard : **400 x 400**	Dimensions du regard : **400 x 400**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**	**REP 18.2 vers REP18.3**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **16.59 m**
PVC-U	**3.00 m**	**REP18.3 vers REP 18.2**	Longueur mesurée : **16.59 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP18.3 VERS REP 18.2



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP18.3	580/581	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.3	333
9.91m / REP18.3	582	BDA - Photographie générale - emboitement correct	333
16.59m / REP18.3	583	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18.2	333

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 35** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **REP 18.2 vers REP18.3**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP18.3 vers REP 18.2**	Longueur inspectée : **16.59 m** Longueur mesurée : **16.59 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **580/581**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.3



DISTANCE : **9.91 m**	PHOTO : **582**	VIDEO : **00:00:54**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct



DISTANCE : **16.59 m**	PHOTO : **583**	VIDEO : **00:01:30**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18.2



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 36**
	Référence du noeud de départ : **REP18.3**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP18.4**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **REP18.4 vers REP18.3**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **16.58 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **300**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP18.3**	Référence du noeud : **REP18.4**
Dimensions du regard : **400 x 400**	Dimensions du regard : **400 x 400**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 36**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP18.4 vers REP18.3**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **16.58 m**
Béton	**3.00 m**	**REP18.3 vers REP18.4**	Longueur mesurée : **16.58 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP18.3 VERS REP18.4



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP18.3	584/585	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud REP18.3	336
11.16m / REP18.3	586	BDA - Photographie générale - emboitement correct	336
16.58m / REP18.3	587	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18.4	336

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP18.4 vers REP18.3**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **16.58 m**
Béton	**3.00 m**	**REP18.3 vers REP18.4**	Longueur mesurée : **16.58 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **584/585**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud REP18.3





DISTANCE : **11.16 m**	PHOTO : **586**	VIDEO : **00:00:45**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct



DISTANCE : **16.58 m**	PHOTO : **587**	VIDEO : **00:01:05**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18.4



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 37**
	Référence du noeud de départ : **REP 18.5**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP18**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP 18.5 vers REP18**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **8.48 m**
Date de l'inspection : **22/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **300**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP 18.5**	Référence du noeud : **REP18**
Dimensions du regard : **400 x 400**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP 18.5 vers REP18**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **8.48 m**
Béton	**3.00 m**	**REP 18.5 vers REP18**	Longueur mesurée : **8.48 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP 18.5 VERS REP18



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP 18.5	588/589	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.5	339
2.20m / REP 18.5	590	BDA - Photographie générale - emboitement correct	339
8.48m / REP 18.5	591	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 18 - en chute	339

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 37** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **REP 18.5 vers REP18**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 18.5 vers REP18**	Longueur inspectée : **8.48 m** Longueur mesurée : **8.48 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **588/589**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.5



DISTANCE : **2.20 m**	PHOTO : **590**	VIDEO : **00:00:29**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct



DISTANCE : **8.48 m**	PHOTO : **591**	VIDEO : **00:01:01**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 18 - en chute



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 39**
	Référence du noeud de départ : **REP 18.6**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP 18.5**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP 18.6 vers REP 18.5**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **20.98 m**
Date de l'inspection : **22/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **160**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **PVC-U**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP 18.6**	Référence du noeud : **REP 18.5**
Dimensions du regard : **400 x 400**	Dimensions du regard : **400 x 400**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 39**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**	**REP 18.6 vers REP 18.5**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **20.98 m**
PVC-U	**3.00 m**	**REP 18.6 vers REP 18.5**	Longueur mesurée : **20.98 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP 18.6 VERS REP 18.5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP 18.6	592/593	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP18.6	342
1.39m / REP 18.6	594	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	342
1.83m / REP 18.6	595	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 160mm	342
19.19m / REP 18.6	596	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm	343
20.98m / REP 18.6	597	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 18.5	343

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 39** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**	**REP 18.6 vers REP 18.5**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **20.98 m**
PVC-U	**3.00 m**	**REP 18.6 vers REP 18.5**	Longueur mesurée : **20.98 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **592/593**	VIDEO : **00:00:02**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP18.6



DISTANCE : **1.39 m**	PHOTO : **594**	VIDEO : **00:00:11**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



DISTANCE : **1.83 m**	PHOTO : **595**	VIDEO : **00:00:14**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 160mm



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 39** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **REP 18.6 vers REP 18.5**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 18.6 vers REP 18.5**	Longueur inspectée : **20.98 m** Longueur mesurée : **20.98 m**

DISTANCE : **19.19 m**	PHOTO : **596**	VIDEO : **00:01:14**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm



DISTANCE : **20.98 m**	PHOTO : **597**	VIDEO : **00:01:29**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 18.5



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 38**
	Référence du noeud de départ : **REP 18.7**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP 18.6**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP 18.6 vers REP 18.7**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **15.21 m**
Date de l'inspection : **22/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **160**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **PVC-U**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP 18.7**	Référence du noeud : **REP 18.6**
Dimensions du regard : **400 x 400**	Dimensions du regard : **400 x 400**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières
Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**	**REP 18.6 vers REP 18.7**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **15.21 m**
PVC-U	**3.00 m**	**REP 18.7 vers REP 18.6**	Longueur mesurée : **15.21 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP 18.7 VERS REP 18.6



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP 18.7	598/599	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.7	346
0.22m / REP 18.7	600	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	346
11.02m / REP 18.7	601	BAAB - Réduction horizontale de la section de la canalisation - Réduction de 4.2%	346
15.21m / REP 18.7	602	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 18.6 BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm	347

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 38** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**	Sens de l'écoulement **REP 18.6 vers REP 18.7**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 18.7 vers REP 18.6**	Longueur inspectée : **15.21 m** Longueur mesurée : **15.21 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **598/599**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.7





DISTANCE : **0.22 m**	PHOTO : **600**	VIDEO : **00:00:28**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



DISTANCE : **11.02 m**	PHOTO : **601**	VIDEO : **00:01:15**

OBSERVATIONS :

BAAB - Réduction horizontale de la section de la canalisation - Réduction de 4.2%




INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 38** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**	**REP 18.6 vers REP 18.7**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **15.21 m**
PVC-U	**3.00 m**	**REP 18.7 vers REP 18.6**	Longueur mesurée : **15.21 m**

DISTANCE : **15.21 m**	PHOTO : **602**	VIDEO : **00:01:41**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 18.6
BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm

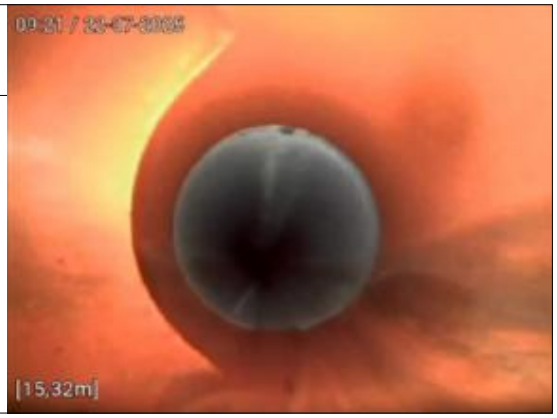

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 40**
	Référence du noeud de départ : **REP18**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **Amont 1**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous un bâtiment permanent**	Sens d'écoulement : **Amont 1 vers REP18**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **6.39 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **160**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **PVC-U**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP18**	Référence du noeud : **Amont 1**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard :
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel :	Modèle du chariot :
	- Numéro de série : **019316**
Modèle de l'enrouleur :	Modèle de la caméra :
- Numéro de série : **5020188111165**	- Numéro de série : **CPO35**

Observations particulières

Remarques générales : **Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**	**Amont 1 vers REP18**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.39 m**
PVC-U	**3.00 m**	**REP18 vers Amont 1**	Longueur mesurée : **6.39 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP18 VERS Amont 1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP18	603/604	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP18	350
5.64m / REP18	605	BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut	350
6.39m / REP18	606	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - coude empêchant la progression de la caméra	350

Observations générales :
Inspection réalisée en caméra portative, pas de prise de pente possible.


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 40** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**	**Amont 1 vers REP18**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.39 m**
PVC-U	**3.00 m**	**REP18 vers Amont 1**	Longueur mesurée : **6.39 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **603/604**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP18

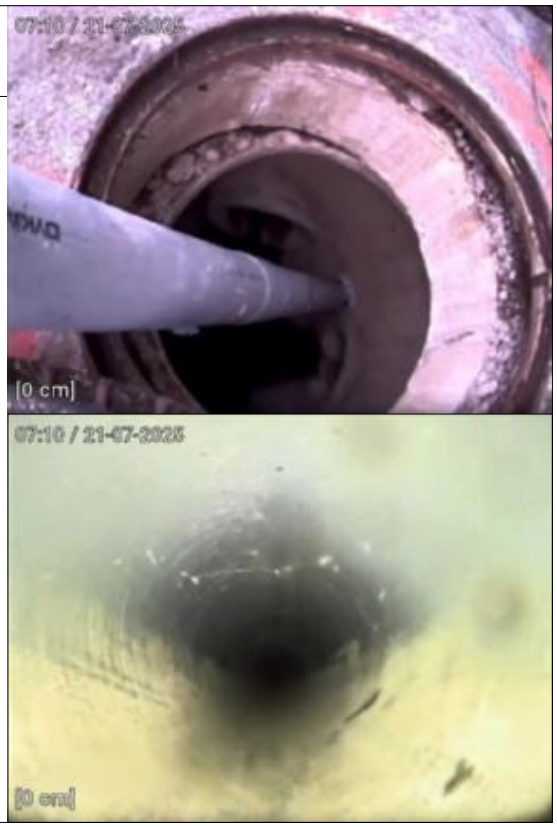

DISTANCE : **5.64 m**	PHOTO : **605**	VIDEO : **00:00:34**

OBSERVATIONS :

BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut

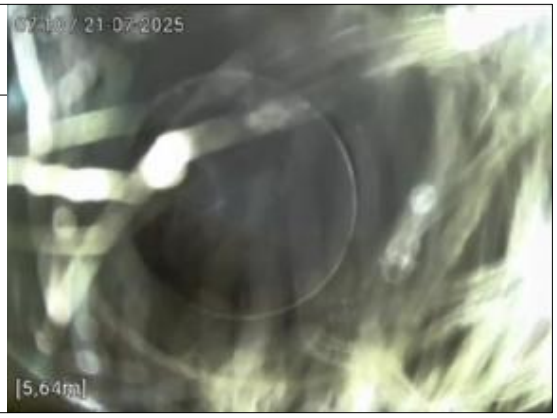

DISTANCE : **6.39 m**	PHOTO : **606**	VIDEO : **00:01:00**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - coude empêchant la progression de la camér

ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 42**
	Référence du noeud de départ : **REP23**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP24**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP24 vers REP23**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **39.58 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **400**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP23**	Référence du noeud : **REP24**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Echelons doubles**	Dispositif de descente : **Echelons doubles**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP24 vers REP23**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **39.58 m**
Béton	**3.00 m**	**REP23 vers REP24**	Longueur mesurée : **39.58 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP23 VERS REP24




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP23	607	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	354
0.41m / REP23	608/609	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP23	354
12.27m / REP23	610/611	BDA - Photographie générale - emboitement correct	355
39.19m / REP23	612/613	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP24	355
39.58m / REP23	614	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	356

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 42** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP24 vers REP23**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP23 vers REP24**	Longueur inspectée : **39.58 m** Longueur mesurée : **39.58 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

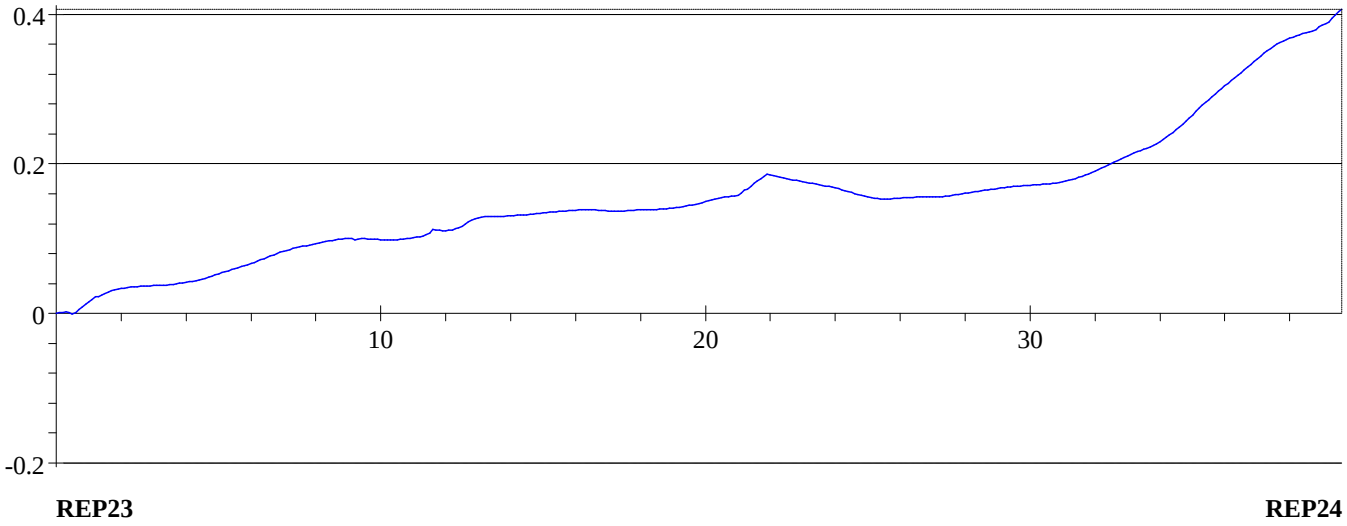


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 42** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP24 vers REP23**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP23 vers REP24**	Longueur inspectée : **39.58 m** Longueur mesurée : **39.58 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **607**	VIDEO : **00:00:05**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection

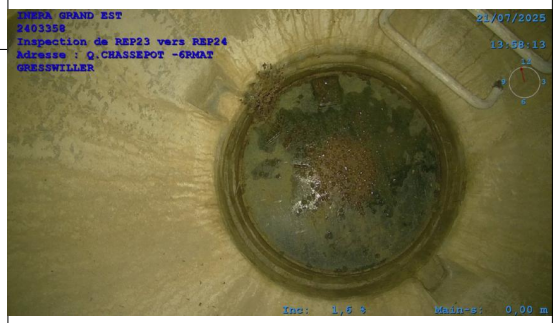

DISTANCE : **0.41 m**	PHOTO : **608/609**	VIDEO : **00:00:25**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP23





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 42** Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP24 vers REP23**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP23 vers REP24**	Longueur inspectée : **39.58 m** Longueur mesurée : **39.58 m**

DISTANCE : **12.27 m**	PHOTO : **610/611**	VIDEO : **00:01:23**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct



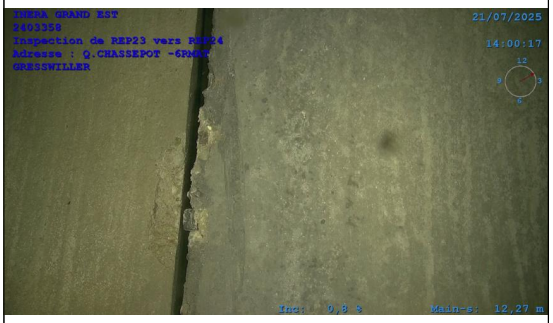

DISTANCE : **39.19 m**	PHOTO : **612/613**	VIDEO : **00:04:21**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP24





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 42** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP24 vers REP23**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP23 vers REP24**	Longueur inspectée : **39.58 m** Longueur mesurée : **39.58 m**

DISTANCE : **39.58 m**	PHOTO : **614**	VIDEO : **00:04:47**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 41**
	Référence du noeud de départ : **REP22**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP23**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP23 vers REP22**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **9.91 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **400**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP22**	Référence du noeud : **REP23**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Echelons doubles**	Dispositif de descente : **Echelons doubles**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP23 vers REP22**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **9.91 m**
Béton	**3.00 m**	**REP22 vers REP23**	Longueur mesurée : **9.91 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP22 VERS REP23




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP22	615	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	360
0.50m / REP22	616/617	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP22	360
6.07m / REP22	618/619	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm	361
9.29m / REP22	620/621	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP23	361
9.91m / REP22	622	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	362

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 41** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP23 vers REP22**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP22 vers REP23**	Longueur inspectée : **9.91 m** Longueur mesurée : **9.91 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

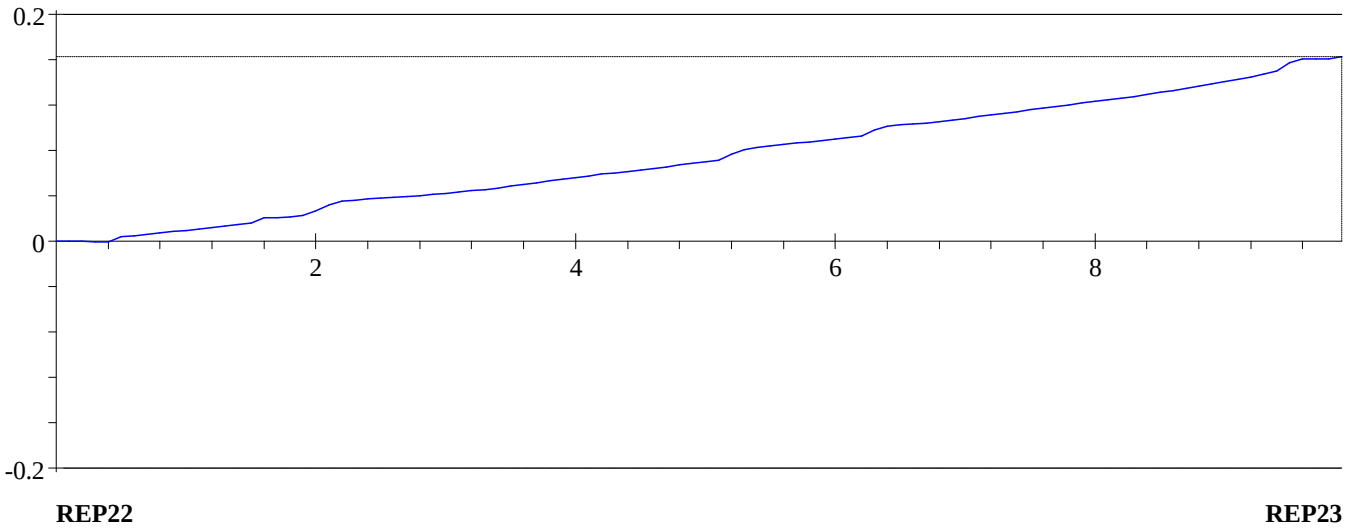

REP22 **REP23**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 41** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP23 vers REP22**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP22 vers REP23**	Longueur inspectée : **9.91 m** Longueur mesurée : **9.91 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **615**	VIDEO : **00:00:01**	
OBSERVATIONS : **BDB - Remarque générale - départ d'inspection**			

DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **616/617**	VIDEO : **00:00:16**	
OBSERVATIONS : **BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP22**			

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP23 vers REP22**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **9.91 m**
Béton	**3.00 m**	**REP22 vers REP23**	Longueur mesurée : **9.91 m**

DISTANCE : **6.07 m**	PHOTO : **618/619**	VIDEO : **00:01:52**

OBSERVATIONS :

BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm






DISTANCE : **9.29 m**	PHOTO : **620/621**	VIDEO : **00:02:33**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP23

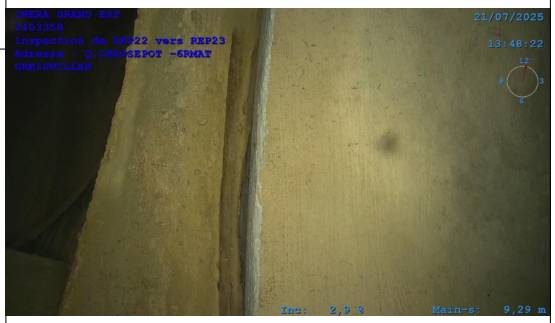




GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 41** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP23 vers REP22**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP22 vers REP23**	Longueur inspectée : **9.91 m** Longueur mesurée : **9.91 m**

DISTANCE : **9.91 m**	PHOTO : **622**	VIDEO : **00:02:59**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection

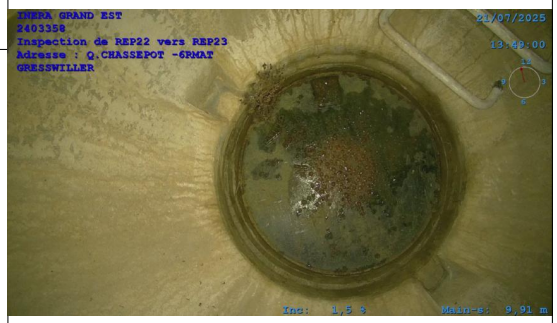

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 43**
	Référence du noeud de départ : **REP22**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP20**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP22 vers REP20**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **35.63 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **400**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP22**	Référence du noeud : **REP20**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1200**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Echelons doubles**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP22 vers REP20**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **35.63 m**
Béton	**3.00 m**	**REP22 vers REP20**	Longueur mesurée : **35.63 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP22 VERS REP20




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP22	623	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	366
0.50m / REP22	624/625	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP22	366
14.76m / REP22	626/627	BDA - Photographie générale - emboitement correct	367
35.63m / REP22	628/629	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP20 - en chute	367
35.63m / REP22	630	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	368

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 43** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP22 vers REP20**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP22 vers REP20**	Longueur inspectée : **35.63 m** Longueur mesurée : **35.63 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

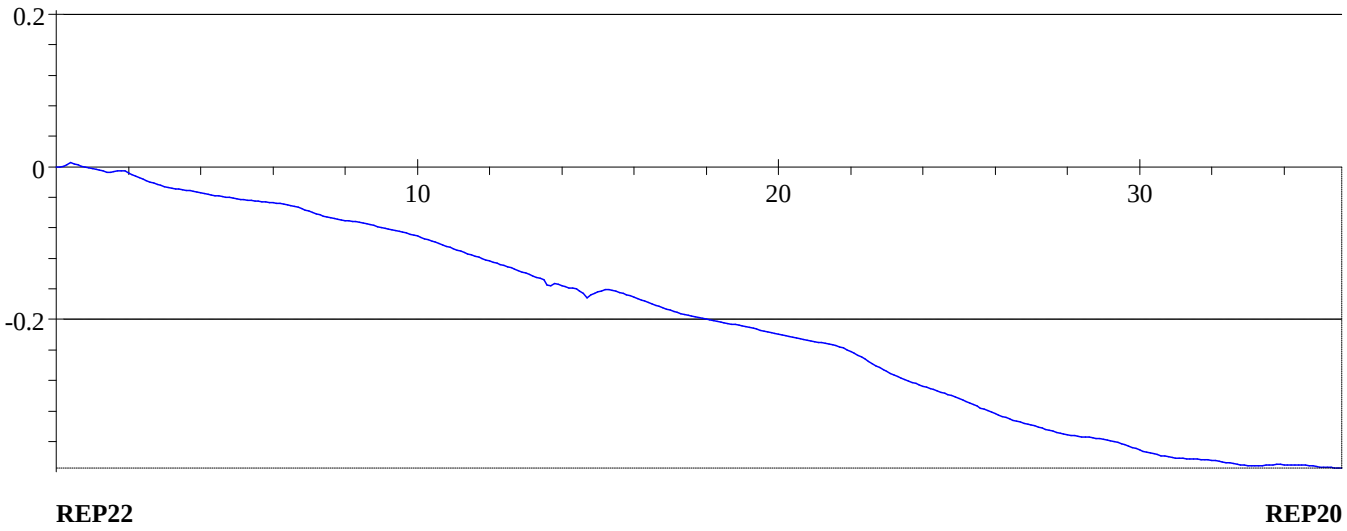

	GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 43** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP22 vers REP20**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP22 vers REP20**	Longueur inspectée : **35.63 m** Longueur mesurée : **35.63 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **623**	VIDEO : **00:00:18**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **624/625**	VIDEO : **00:00:30**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP22





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 43** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP22 vers REP20**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **35.63 m**
Béton	**3.00 m**	**REP22 vers REP20**	Longueur mesurée : **35.63 m**

DISTANCE : **14.76 m**	PHOTO : **626/627**	VIDEO : **00:01:51**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





DISTANCE : **35.63 m**	PHOTO : **628/629**	VIDEO : **00:04:26**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP20 - en chute





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 43** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP22 vers REP20**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP22 vers REP20**	Longueur inspectée : **35.63 m** Longueur mesurée : **35.63 m**

DISTANCE : **35.63 m**	PHOTO : **630**	VIDEO : **00:04:43**	
OBSERVATIONS : **BDB - Remarque générale - fin d'inspection**			

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 44**
	Référence du noeud de départ : **REP42**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP21**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP42 vers REP21**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **30.33 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **1200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP42**	Référence du noeud : **REP21**
Dimensions du regard : **Ø1500**	Dimensions du regard : **Ø1500**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Echelons doubles**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :	
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP42 vers REP21**	**21 juillet 2025**	
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée :	**30.33 m**
Béton	**3.00 m**	**REP42 vers REP21**	Longueur mesurée :	**30.33 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP42 VERS REP21




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP42	631	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	372
0.50m / REP42	632/633	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP42	372
9.95m / REP42	634/635	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm	373
29.75m / REP42	636/637	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP21	373
30.33m / REP42	638	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	374

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 44** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP42 vers REP21**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP42 vers REP21**	Longueur inspectée : **30.33 m** Longueur mesurée : **30.33 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

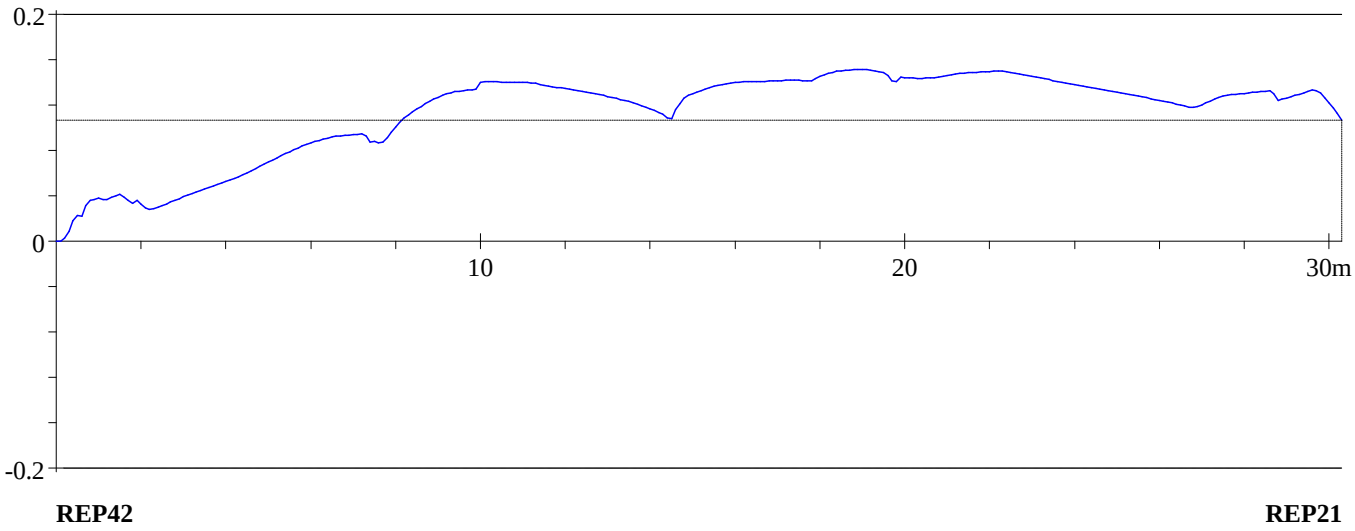

REP42 **REP21**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 44** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP42 vers REP21**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP42 vers REP21**	Longueur inspectée : **30.33 m** Longueur mesurée : **30.33 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **631**	VIDEO : **00:00:29**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection




DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **632/633**	VIDEO : **00:00:48**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP42



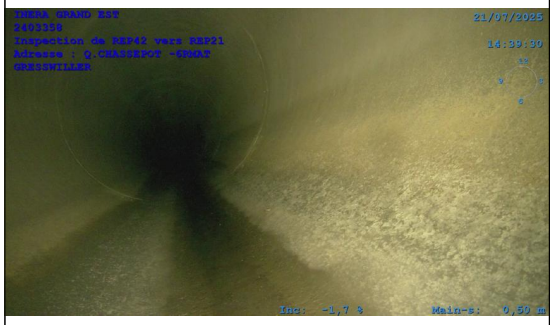

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 44** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP42 vers REP21**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **30.33 m**
Béton	**3.00 m**	**REP42 vers REP21**	Longueur mesurée : **30.33 m**

DISTANCE : **9.95 m**	PHOTO : **634/635**	VIDEO : **00:02:45**

OBSERVATIONS :

BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm





DISTANCE : **29.75 m**	PHOTO : **636/637**	VIDEO : **00:04:30**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP21





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 44** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP42 vers REP21**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP42 vers REP21**	Longueur inspectée : **30.33 m** Longueur mesurée : **30.33 m**

DISTANCE : **30.33 m**	PHOTO : **638**	VIDEO : **00:05:04**	
OBSERVATIONS : **BDB - Remarque générale - fin d'inspection**			

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 45**
	Référence du noeud de départ : **REP21**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP25**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP21 vers REP25**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **6.66 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **1200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP21**	Référence du noeud : **REP25**
Dimensions du regard : **Ø1500**	Dimensions du regard : **Ø1500**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Echelons doubles**	Dispositif de descente : **Echelons doubles**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP21 vers REP25**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.66 m**
Béton	**3.00 m**	**REP21 vers REP25**	Longueur mesurée : **6.66 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP21 VERS REP25




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP21	639	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	378
0.49m / REP21	640/641	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R5EP21	378
2.32m / REP21	642/643	BDA - Photographie générale - emboitement correct	379
6.28m / REP21	644/645	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP25	379
6.66m / REP21	646	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	380

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 45** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP21 vers REP25**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP21 vers REP25**	Longueur inspectée : **6.66 m** Longueur mesurée : **6.66 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

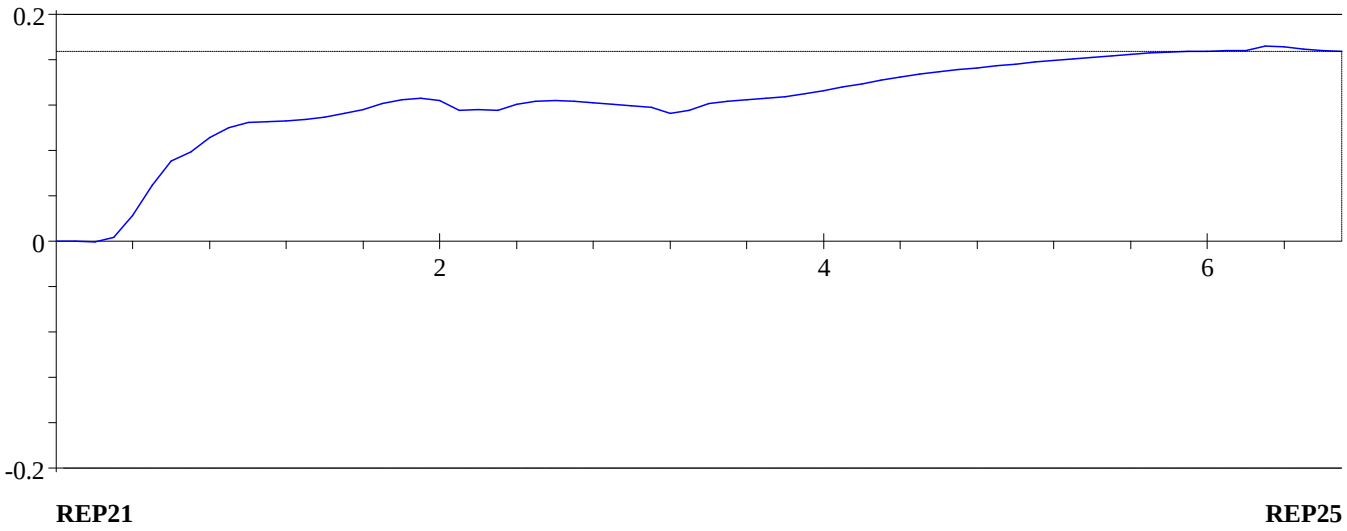

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 45** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP21 vers REP25**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.66 m**
Béton	**3.00 m**	**REP21 vers REP25**	Longueur mesurée : **6.66 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **639**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.49 m**	PHOTO : **640/641**	VIDEO : **00:01:10**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R5EP21





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 45** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP21 vers REP25**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP21 vers REP25**	Longueur inspectée : **6.66 m** Longueur mesurée : **6.66 m**

DISTANCE : **2.32 m**	PHOTO : **642/643**	VIDEO : **00:01:53**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





DISTANCE : **6.28 m**	PHOTO : **644/645**	VIDEO : **00:02:29**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP25






GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 45** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP21 vers REP25**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP21 vers REP25**	Longueur inspectée : **6.66 m** Longueur mesurée : **6.66 m**

DISTANCE : **6.66 m**	PHOTO : **646**	VIDEO : **00:03:09**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection

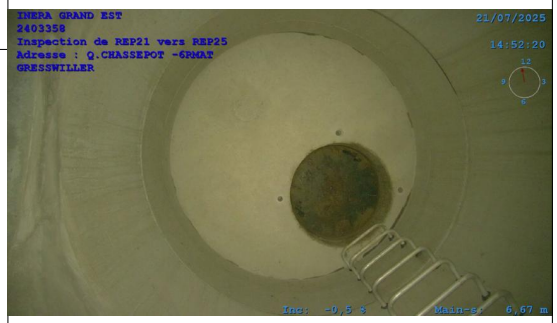

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 46**
	Référence du noeud de départ : **REP20**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP25**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP20 vers REP25**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **6.53 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **600**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP20**	Référence du noeud : **REP25**
Dimensions du regard : **Ø1200**	Dimensions du regard : **Ø1500**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Echelons doubles**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :	
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP20 vers REP25**	**21 juillet 2025**	
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée :	**6.53 m**
Béton	**3.00 m**	**REP20 vers REP25**	Longueur mesurée :	**6.53 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP20 VERS REP25




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP20	647	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	384
0.50m / REP20	648/649	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP20	384
3.32m / REP20	650	BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	384
4.23m / REP20	651	BDA - Photographie générale BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	385
5.64m / REP20	652/653	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP25 BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	385
6.53m / REP20	654	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	385

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 46** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **REP20 vers REP25**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP20 vers REP25**	Longueur inspectée : **6.53 m** Longueur mesurée : **6.53 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

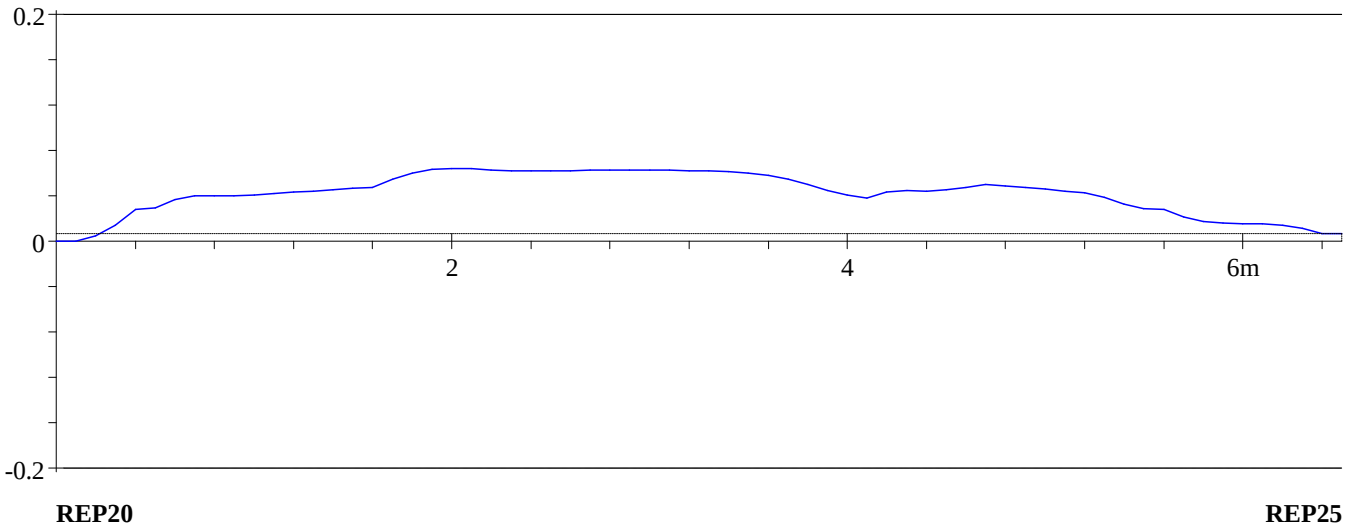

REP20 **REP25**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 46** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP20 vers REP25**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.53 m**
Béton	**3.00 m**	**REP20 vers REP25**	Longueur mesurée : **6.53 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **647**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **648/649**	VIDEO : **00:00:18**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP20





DISTANCE : **3.32 m**	PHOTO : **650**	VIDEO : **00:01:45**

OBSERVATIONS :

BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 46** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP20 vers REP25**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.53 m**
Béton	**3.00 m**	**REP20 vers REP25**	Longueur mesurée : **6.53 m**

DISTANCE : **4.23 m**	PHOTO : **651**	VIDEO : **00:01:53**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%



DISTANCE : **5.64 m**	PHOTO : **652/653**	VIDEO : **00:02:11**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP25
BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%






DISTANCE : **6.53 m**	PHOTO : **654**	VIDEO : **00:02:38**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection

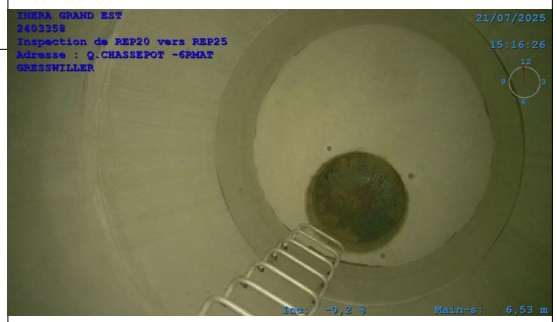

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 46 bis**
	Référence du noeud de départ : **REP20**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP25**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP20 vers REP25**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **6.13 m**
Date de l'inspection : **22/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **1200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP20**	Référence du noeud : **REP25**
Dimensions du regard : **Ø1200**	Dimensions du regard : **Ø1500**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Echelons doubles**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP20 vers REP25**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.13 m**
Béton	**3.00 m**	**REP20 vers REP25**	Longueur mesurée : **6.13 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP20 VERS REP25




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP20	655	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	389
		BDB - Remarque générale - contre essais après curage complémentaire	
0.50m / REP20	656/657	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP20	389
2.90m / REP20	658/659	BDA - Photographie générale - emboitement correct	390
5.95m / REP20	660/661	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP25	390
5.95m / REP20	662/663	DACA - Rupture à 7h - Longueur de 200mm	391
6.13m / REP20	664	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	391

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 46 bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP20 vers REP25**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP20 vers REP25**	Longueur inspectée : **6.13 m** Longueur mesurée : **6.13 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

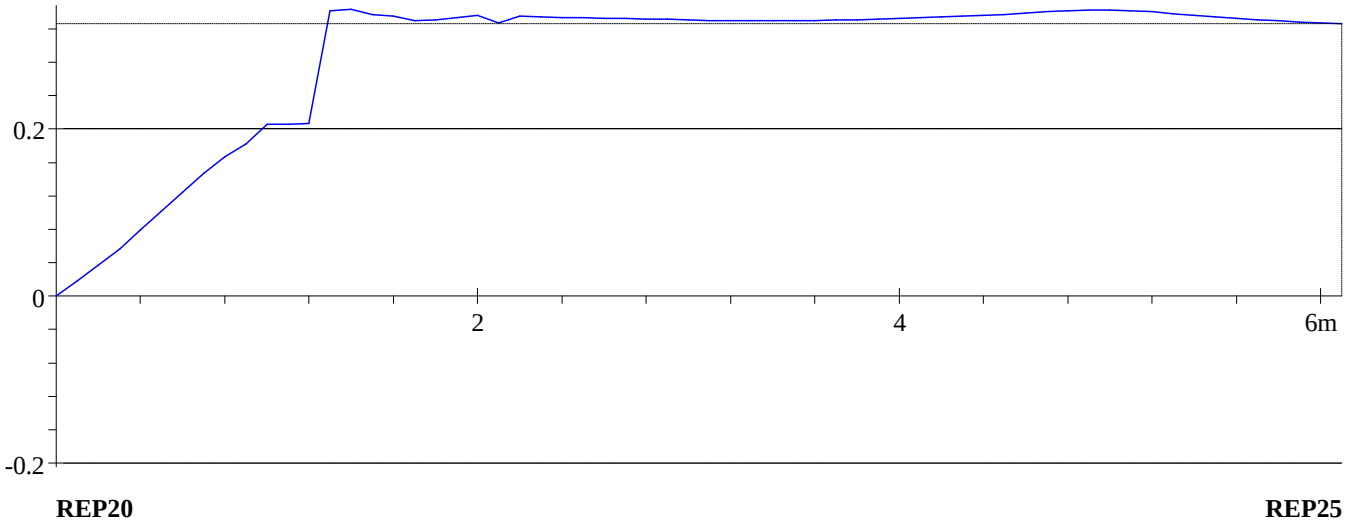

REP20 **REP25**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 46 bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP20 vers REP25**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP20 vers REP25**	Longueur inspectée : **6.13 m** Longueur mesurée : **6.13 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **655**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection
BDB - Remarque générale - contre essais après curage complémentaire



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **656/657**	VIDEO : **00:00:09**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP20





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 46 bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP20 vers REP25**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP20 vers REP25**	Longueur inspectée : **6.13 m** Longueur mesurée : **6.13 m**

DISTANCE : **2.90 m**	PHOTO : **658/659**	VIDEO : **00:01:15**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





DISTANCE : **5.95 m**	PHOTO : **660/661**	VIDEO : **00:02:04**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP25





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 46 bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP20 vers REP25**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP20 vers REP25**	Longueur inspectée : **6.13 m** Longueur mesurée : **6.13 m**

DISTANCE : **5.95 m**	PHOTO : **662/663**	VIDEO : **00:02:16**

OBSERVATIONS :

DACA - Rupture à 7h - Longueur de 200mm





DISTANCE : **6.13 m**	PHOTO : **664**	VIDEO : **00:02:58**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 47**
	Référence du noeud de départ : **REP25**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP26**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP25 vers REP26**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **34.41 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **1200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP25**	Référence du noeud : **REP26**
Dimensions du regard : **Ø1500**	Dimensions du regard : **Ø1500**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Echelons doubles**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 47**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP25 vers REP26**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **34.41 m**
Béton	**3.00 m**	**REP25 vers REP26**	Longueur mesurée : **34.41 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP25 VERS REP26




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP25	665	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	395
0.79m / REP25	666/667	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP25	395
13.62m / REP25	668/669	BDA - Photographie générale - emboitement correct	396
33.79m / REP25	670/671	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP26	396
34.41m / REP25	672	DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 9h - Diam./Hauteur 400mm - Emplacer : cheminée	397
34.41m / REP25	673	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	397

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 47** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP25 vers REP26**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP25 vers REP26**	Longueur inspectée : **34.41 m** Longueur mesurée : **34.41 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

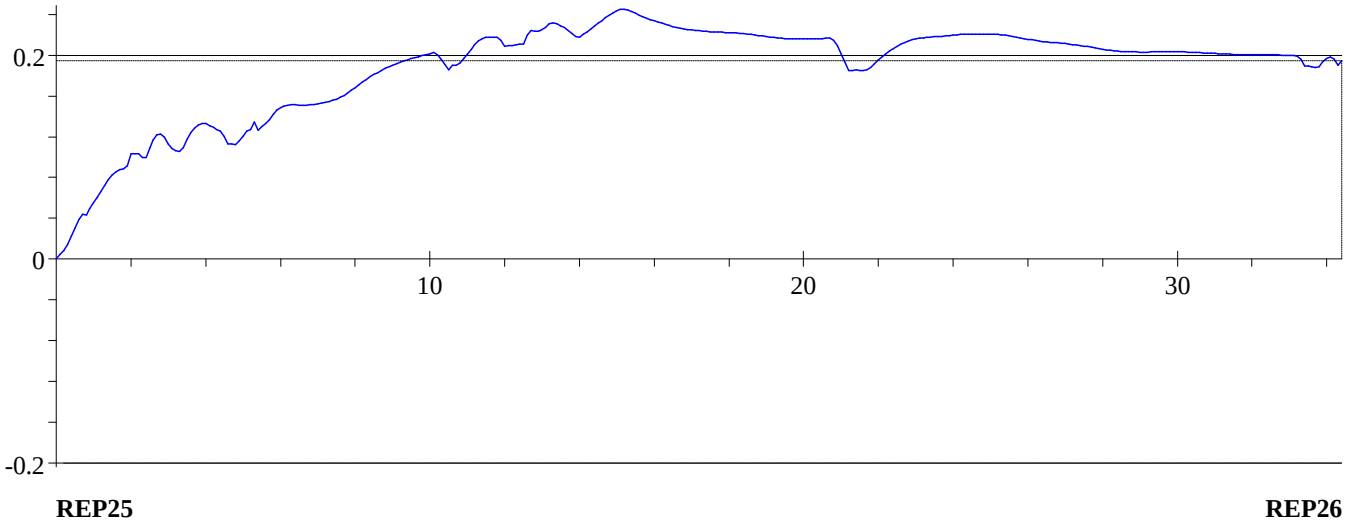

REP25 **REP26**


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 47** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP25 vers REP26**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **34.41 m**
Béton	**3.00 m**	**REP25 vers REP26**	Longueur mesurée : **34.41 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **665**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection

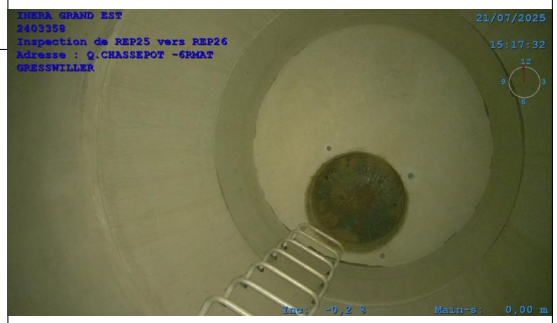

DISTANCE : **0.79 m**	PHOTO : **666/667**	VIDEO : **00:00:49**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP25






GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 47** Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP25 vers REP26**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP25 vers REP26**	Longueur inspectée : **34.41 m** Longueur mesurée : **34.41 m**

DISTANCE : **13.62 m**	PHOTO : **668/669**	VIDEO : **00:02:13**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct

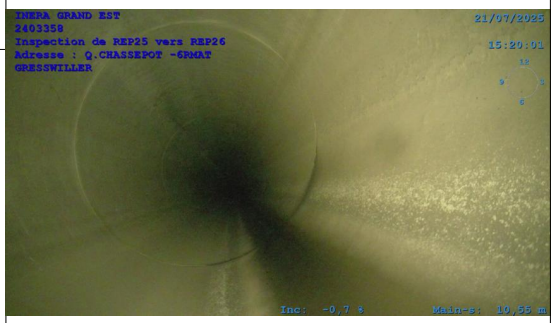

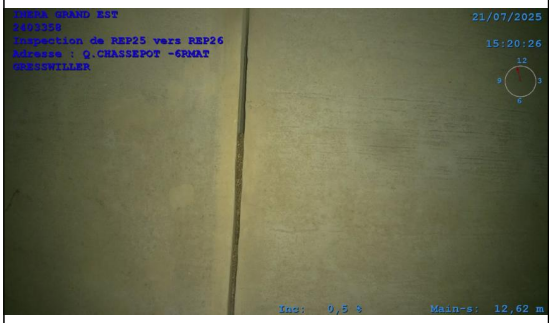

DISTANCE : **33.79 m**	PHOTO : **670/671**	VIDEO : **00:04:31**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP26





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 47** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP25 vers REP26**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **34.41 m**
Béton	**3.00 m**	**REP25 vers REP26**	Longueur mesurée : **34.41 m**

DISTANCE : **34.41 m**	PHOTO : **672**	VIDEO : **00:04:48**

OBSERVATIONS :

DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 9h - Diam./Hauteur 400mm - Emplacement : cheminée



DISTANCE : **34.41 m**	PHOTO : **673**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 48**
	Référence du noeud de départ : **REP26**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP27**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP26 vers REP27**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **37.56 m**
Date de l'inspection : **21/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **1200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP26**	Référence du noeud : **REP27**
Dimensions du regard : **Ø1500**	Dimensions du regard : **Ø1500**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Echelons doubles**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 48**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP26 vers REP27**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **37.56 m**
Béton	**3.00 m**	**REP26 vers REP27**	Longueur mesurée : **37.56 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP26 VERS REP27




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP26	674	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	401
0.96m / REP26	675/676	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP26	401
13.66m / REP26	677/678	BDA - Photographie générale - emboitement correct	402
30.45m / REP26	679	BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	402
37.32m / REP26	680/681	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP27	403
37.56m / REP26	682	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	403

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 48** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP26 vers REP27**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP26 vers REP27**	Longueur inspectée : **37.56 m** Longueur mesurée : **37.56 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

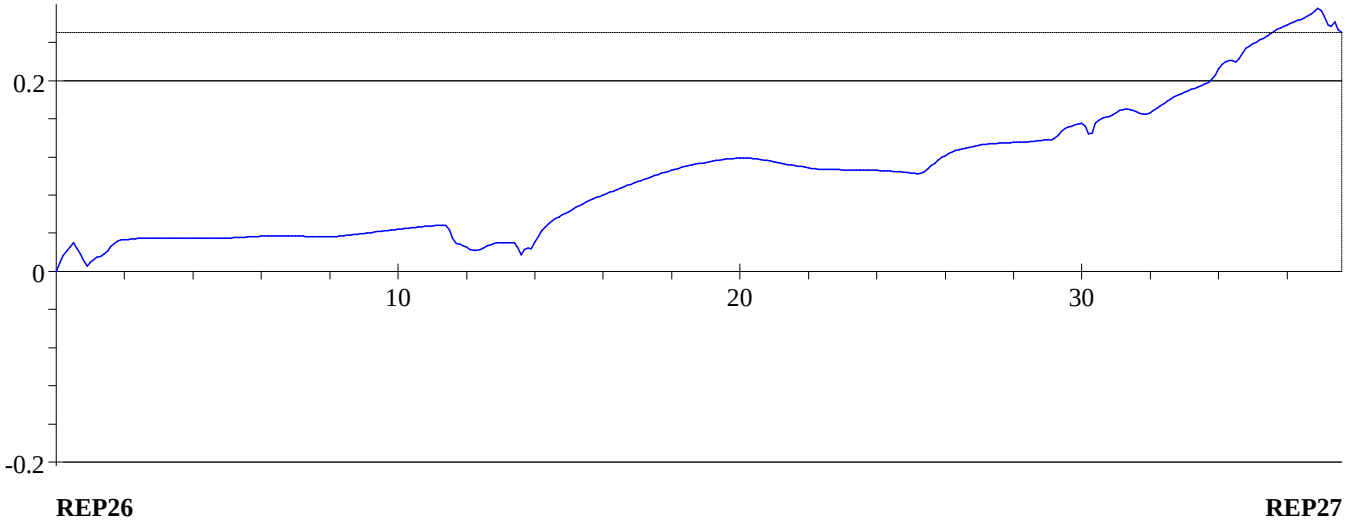

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 48** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP26 vers REP27**	**21 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **37.56 m**
Béton	**3.00 m**	**REP26 vers REP27**	Longueur mesurée : **37.56 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **674**	VIDEO : **00:00:09**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.96 m**	PHOTO : **675/676**	VIDEO : **00:00:15**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP26





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 48** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP26 vers REP27**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP26 vers REP27**	Longueur inspectée : **37.56 m** Longueur mesurée : **37.56 m**

DISTANCE : **13.66 m**	PHOTO : **677/678**	VIDEO : **00:00:43**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





DISTANCE : **30.45 m**	PHOTO : **679**	VIDEO : **00:01:53**

OBSERVATIONS :

BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 48** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP26 vers REP27**	Date d'inspection : **21 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP26 vers REP27**	Longueur inspectée : **37.56 m** Longueur mesurée : **37.56 m**

DISTANCE : **37.32 m**	PHOTO : **680/681**	VIDEO : **00:02:26**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP27





DISTANCE : **37.56 m**	PHOTO : **682**	VIDEO : **00:02:40**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 48bis**
	Référence du noeud de départ : **REP26**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP27**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP26 vers REP27**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **37.12 m**
Date de l'inspection : **22/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **1200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pluie**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP26**	Référence du noeud : **REP27**
Dimensions du regard : **Ø1500**	Dimensions du regard : **Ø1500**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Echelons doubles**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 48bis**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP26 vers REP27**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **37.12 m**
Béton	**3.00 m**	**REP26 vers REP27**	Longueur mesurée : **37.12 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP26 VERS REP27




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP26	683	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	407
		BDB - Remarque générale - contre visite après curage complémentaire	
0.50m / REP26	684/685	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP26	407
		Niveau d'eau claire de 5%	
12.10m / REP26	686/687	BDA - Photographie générale - emboitement correct	408
		Niveau d'eau claire de 5%	
27.01m / REP26	688/689	BDA - Photographie générale - emboitement correct	408
		Niveau d'eau claire de 5%	
36.40m / REP26	690/691	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP27	409
		Niveau d'eau claire de 5%	
37.12m / REP26	692	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	409
		Niveau d'eau claire de 5%	

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 48bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP26 vers REP27**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP26 vers REP27**	Longueur inspectée : **37.12 m** Longueur mesurée : **37.12 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

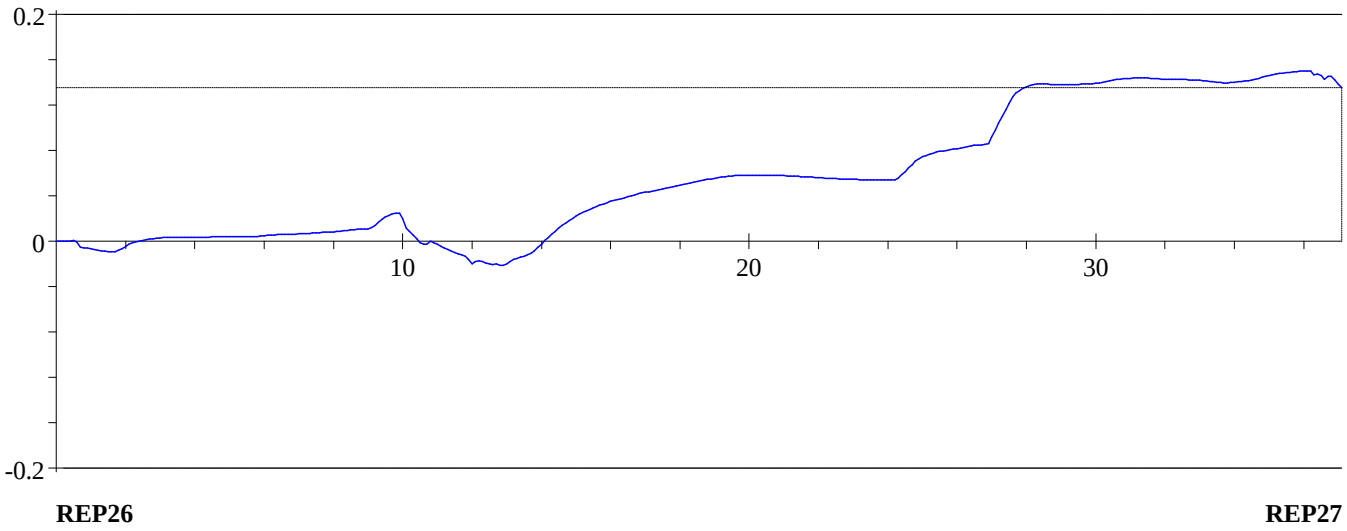


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 48bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP26 vers REP27**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP26 vers REP27**	Longueur inspectée : **37.12 m** Longueur mesurée : **37.12 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **683**	VIDEO : **00:00:21**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection
BDB - Remarque générale - contre visite après curage complémentaire

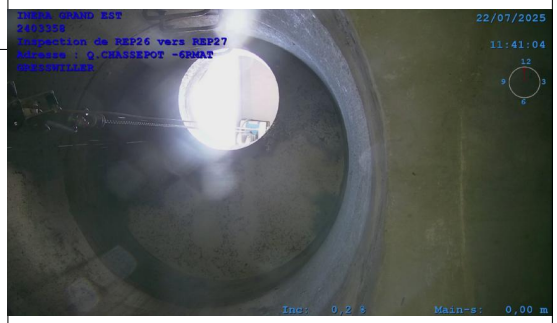


DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **684/685**	VIDEO : **00:00:42**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP26
Niveau d'eau claire de 5%



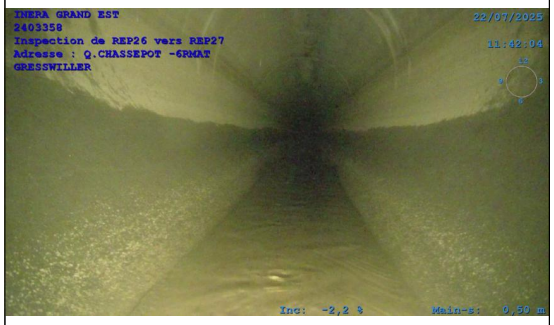


GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 48bis**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP26 vers REP27**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **37.12 m**
Béton	**3.00 m**	**REP26 vers REP27**	Longueur mesurée : **37.12 m**

DISTANCE : **12.10 m**	PHOTO : **686/687**	VIDEO : **00:02:21**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct
Niveau d'eau claire de 5%

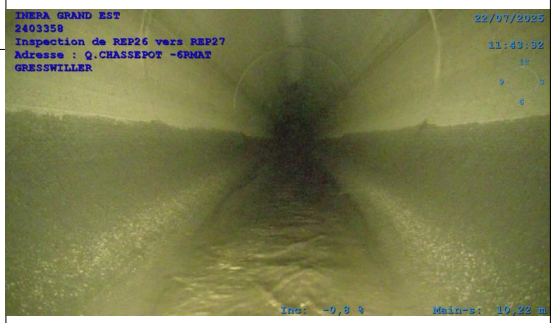


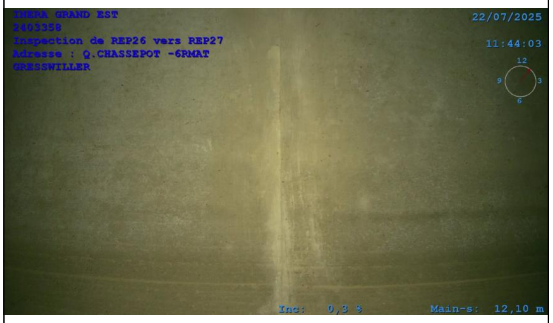

DISTANCE : **27.01 m**	PHOTO : **688/689**	VIDEO : **00:03:34**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct
Niveau d'eau claire de 5%

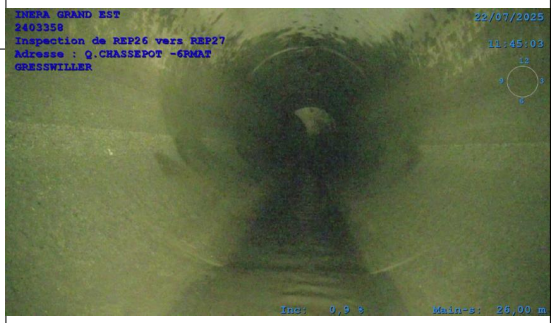




GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 48bis** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP26 vers REP27**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP26 vers REP27**	Longueur inspectée : **37.12 m** Longueur mesurée : **37.12 m**

DISTANCE : **36.40 m**	PHOTO : **690/691**	VIDEO : **00:04:29**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP27
Niveau d'eau claire de 5%



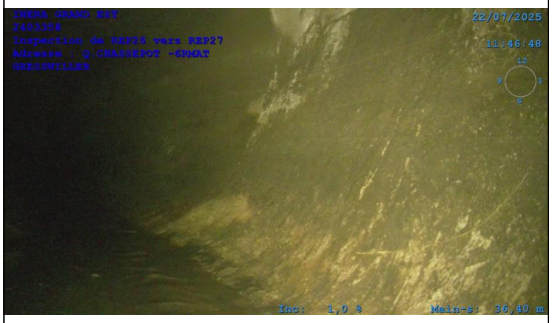

DISTANCE : **37.12 m**	PHOTO : **692**	VIDEO : **00:05:02**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection
Niveau d'eau claire de 5%



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 49**
	Référence du noeud de départ : **REP26.1**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP26**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP26.1 vers REP26**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **22.73 m**
Date de l'inspection : **22/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **400**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP26.1**	Référence du noeud : **REP26**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1500**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 49**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP26.1 vers REP26**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **22.73 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP26.1 vers REP26**	Longueur mesurée : **22.73 m**


SYNTHESE DU TRONÇON REP26.1 VERS REP26



Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP26.1	693	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	413
0.00m / REP26.1	694/695	DACB - Effondrement partiel à 12h - Longueur de 300mm	413
0.00m / REP26.1	696	DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 1h - Diam./Hauteur 160mm	413
0.50m / REP26.1	697/698	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP26.1	414
4.85m / REP26.1	699/700	BDA - Photographie générale - emboitement correct	414
16.89m / REP26.1	701/702	BDA - Photographie générale - emboitement correct	415
22.73m / REP26.1	703/704	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP26 - en chute	415
22.73m / REP26.1	705	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	416

Observations générales :

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

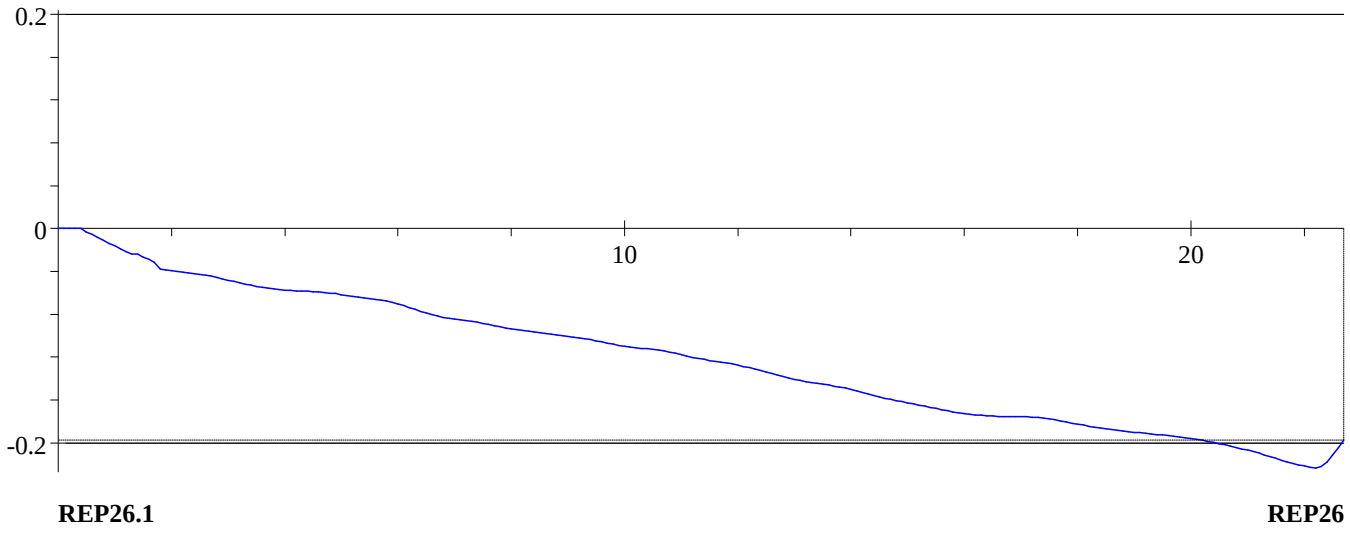

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP26.1 vers REP26**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **22.73 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP26.1 vers REP26**	Longueur mesurée : **22.73 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **693**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **694/695**	VIDEO : **00:00:03**

OBSERVATIONS :

DACB - Effondrement partiel à 12h - Longueur de 300mm





DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **696**	VIDEO : **00:00:14**

OBSERVATIONS :

DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 1h - Diam./Hauteur 160mm



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 49** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP26.1 vers REP26**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **22.73 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP26.1 vers REP26**	Longueur mesurée : **22.73 m**

DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **697/698**	VIDEO : **00:03:46**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP26.1





DISTANCE : **4.85 m**	PHOTO : **699/700**	VIDEO : **00:04:42**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 49**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP26.1 vers REP26**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **22.73 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP26.1 vers REP26**	Longueur mesurée : **22.73 m**

DISTANCE : **16.89 m**	PHOTO : **701/702**	VIDEO : **00:05:50**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





DISTANCE : **22.73 m**	PHOTO : **703/704**	VIDEO : **00:07:28**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP26 - en chute





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 49** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP26.1 vers REP26**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP26.1 vers REP26**	Longueur inspectée : **22.73 m** Longueur mesurée : **22.73 m**

DISTANCE : **22.73 m**	PHOTO : **705**	VIDEO : **00:07:56**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - fin d'inspection



GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **Brt Br26.1**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**		**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **0.00 m**
PVC-U	**3.00 m**	**REP26.1 vers Br26.1**	Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT REP26.1 VERS Br26.1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/REP26.1	706/707	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 26.1	418
0.00 m/REP26.1	708	BACC - Effondrement total	418
		BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - effondrement empêchant la progression de la caméra	

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **REP26.1**

Position : **dans REP26.1**

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt Br26.1** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP26.1 vers Br26.1**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **706/707**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 26.1





DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **708**	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :

BACC - Effondrement total
BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - effondrement empêchant la progression de la caméra

ABANDON INSPECTION



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 50**
	Référence du noeud de départ : **REP27**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP28**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP27 vers REP28**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **6.76 m**
Date de l'inspection : **22/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **1200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP27**	Référence du noeud : **REP28**
Dimensions du regard : **Ø1500**	Dimensions du regard : **Ø1500**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Echelons doubles**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP27 vers REP28**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.76 m**
Béton	**3.00 m**	**REP27 vers REP28**	Longueur mesurée : **6.76 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP27 VERS REP28




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP27	709	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	422
0.53m / REP27	710/711	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP27 Niveau d'eau claire de 5%	422
3.50m / REP27	712/713	BDA - Photographie générale - emboitement correct Niveau d'eau claire de 5%	423
6.30m / REP27	714/715	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP28 Niveau d'eau claire de 5%	423
6.76m / REP27	716	BDB - Remarque générale - fin d'inspection Niveau d'eau claire de 5%	424

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 50** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP27 vers REP28**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP27 vers REP28**	Longueur inspectée : **6.76 m** Longueur mesurée : **6.76 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

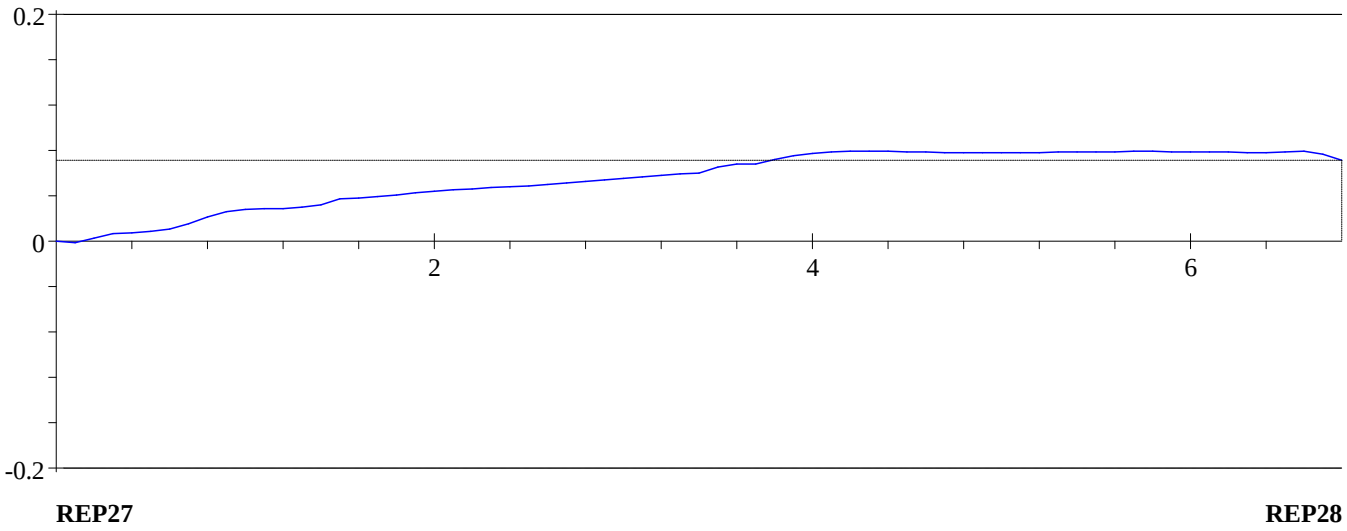

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 50** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP27 vers REP28**	**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.76 m**
Béton	**3.00 m**	**REP27 vers REP28**	Longueur mesurée : **6.76 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **709**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.53 m**	PHOTO : **710/711**	VIDEO : **00:00:22**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP27
Niveau d'eau claire de 5%






GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 50** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP27 vers REP28**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP27 vers REP28**	Longueur inspectée : **6.76 m** Longueur mesurée : **6.76 m**

DISTANCE : **3.50 m**	PHOTO : **712/713**	VIDEO : **00:01:16**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct
Niveau d'eau claire de 5%

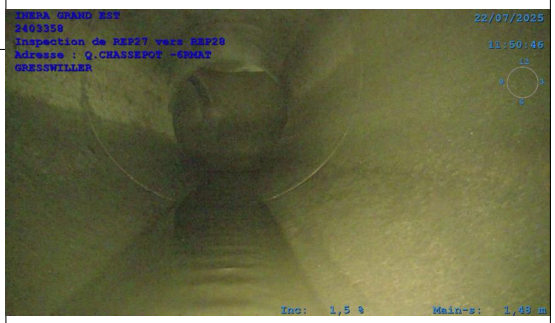



DISTANCE : **6.30 m**	PHOTO : **714/715**	VIDEO : **00:02:24**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP28
Niveau d'eau claire de 5%





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 50** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP27 vers REP28**	Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP27 vers REP28**	Longueur inspectée : **6.76 m** Longueur mesurée : **6.76 m**

DISTANCE : **6.76 m**	PHOTO : **716**	VIDEO : **00:02:58**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection
Niveau d'eau claire de 5%



GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Branchement : **Brt AV2**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**		**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **3.55 m**
PVC-U	**3.00 m**	**Brt AV 2 vers REP 41**	Longueur mesurée : **3.55 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT Brt AV 2 VERS REP 41

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/Brt AV 2	717/718	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41	426
2.15 m/Brt AV 2	719	BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut	426
3.55 m/Brt AV 2	720	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV2 - Grille avaloir	426
REP 41			

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **REP 41**

Position : **dans REP 41**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV2** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Brt AV 2 vers REP 41**	Longueur inspectée : **3.55 m** Longueur mesurée : **3.55 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **717/718**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41



DISTANCE : **2.15 m**	PHOTO : **719**	VIDEO : **00:00:17**

OBSERVATIONS :

BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut



DISTANCE : **3.55 m**	PHOTO : **720**	VIDEO : **00:00:24**

OBSERVATIONS :

BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV2 - Grille avaloir



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV 3** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**160 mm**		**22 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **9.93 m**
PVC-U	**3.00 m**	**Brt AV 3 vers REP 41**	Longueur mesurée : **9.93 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT Brt AV 3 VERS REP 41

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/Brt AV 3	721/722	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41	428
1.29 m/Brt AV 3	723	BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut	428
8.49 m/Brt AV 3	724	BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut	428
9.93 m/Brt AV 3	725	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV3 - Grille avaloir	429

REP 41

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **REP 41**

Position : **dans REP 41**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV 3** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Brt AV 3 vers REP 41**	Longueur inspectée : **9.93 m** Longueur mesurée : **9.93 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **721/722**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41





DISTANCE : **1.29 m**	PHOTO : **723**	VIDEO : **00:00:19**

OBSERVATIONS :

BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut



DISTANCE : **8.49 m**	PHOTO : **724**	VIDEO : **00:00:49**

OBSERVATIONS :

BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut



	GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV 3** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Brt AV 3 vers REP 41**	Longueur inspectée : **9.93 m** Longueur mesurée : **9.93 m**

DISTANCE : **9.93 m**	PHOTO : **725**	VIDEO : **00:00:55**

OBSERVATIONS :

BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV3 - Grille avaloir



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV 4** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Brt AV 4 vers REP 41**	Longueur inspectée : **21.31 m** Longueur mesurée : **21.31 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT Brt AV 4 VERS REP 41

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/Brt AV 4	726/727	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41	431
7.10 m/Brt AV 4	728	BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut	431
21.31 m/Brt AV 4	729	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV4 - Siphon de sol	431

REP 41

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **REP 41**

Position : **dans REP 41**


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV 4** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **22 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Brt AV 4 vers REP 41**	Longueur inspectée : **21.31 m** Longueur mesurée : **21.31 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **726/727**	VIDEO : **00:00:03**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41

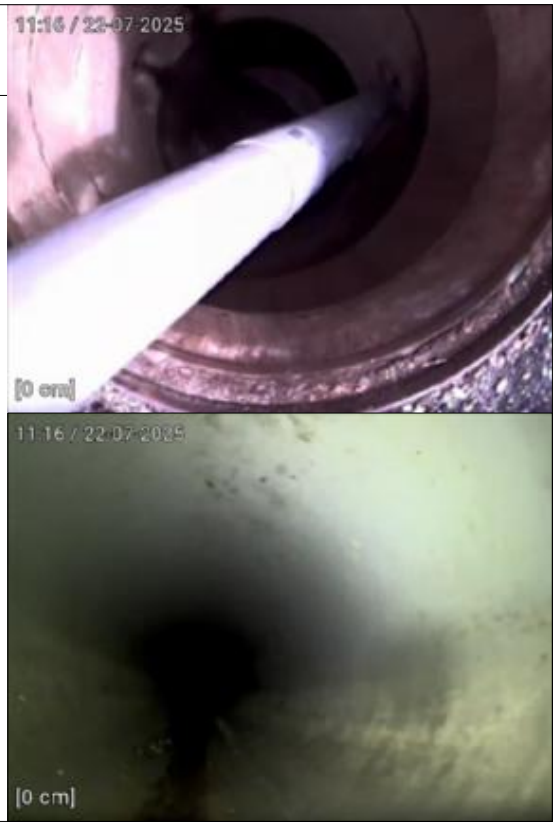

DISTANCE : **7.10 m**	PHOTO : **728**	VIDEO : **00:00:53**

OBSERVATIONS :


BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut



DISTANCE : **21.31 m**	PHOTO : **729**	VIDEO : **00:04:10**

OBSERVATIONS :

BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV4 - Siphon de sol

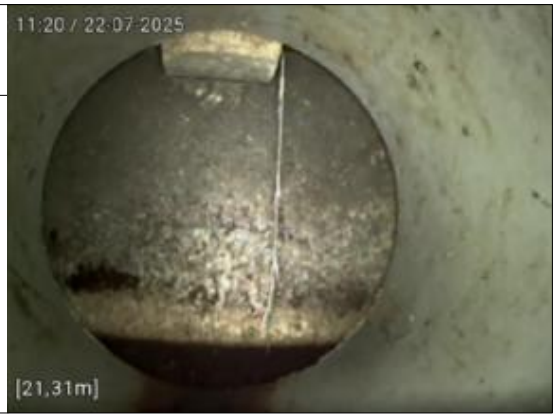

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 51**
	Référence du noeud de départ : **REP28**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP29**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP28 vers REP29**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **14.19 m**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **1200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP28**	Référence du noeud : **REP29**
Dimensions du regard : **Ø1500**	Dimensions du regard :
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP28 vers REP29**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **14.19 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP28 vers REP29**	Longueur mesurée : **14.19 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP28 VERS REP29




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP28	730	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	435
0.50m / REP28	731/732	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP28	435
6.19m / REP28	733/734	BDA - Photographie générale - emboitement correct	436
14.18m / REP28	735/736	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - désableure	436
14.19m / REP28	737	BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10% - nettoyage de l'ouvrage préconisé	437
14.19m / REP28	738	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud REP 29	437
		BDB - Remarque générale - fin d'inspection	

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 51** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP28 vers REP29**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP28 vers REP29**	Longueur inspectée : **14.19 m** Longueur mesurée : **14.19 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

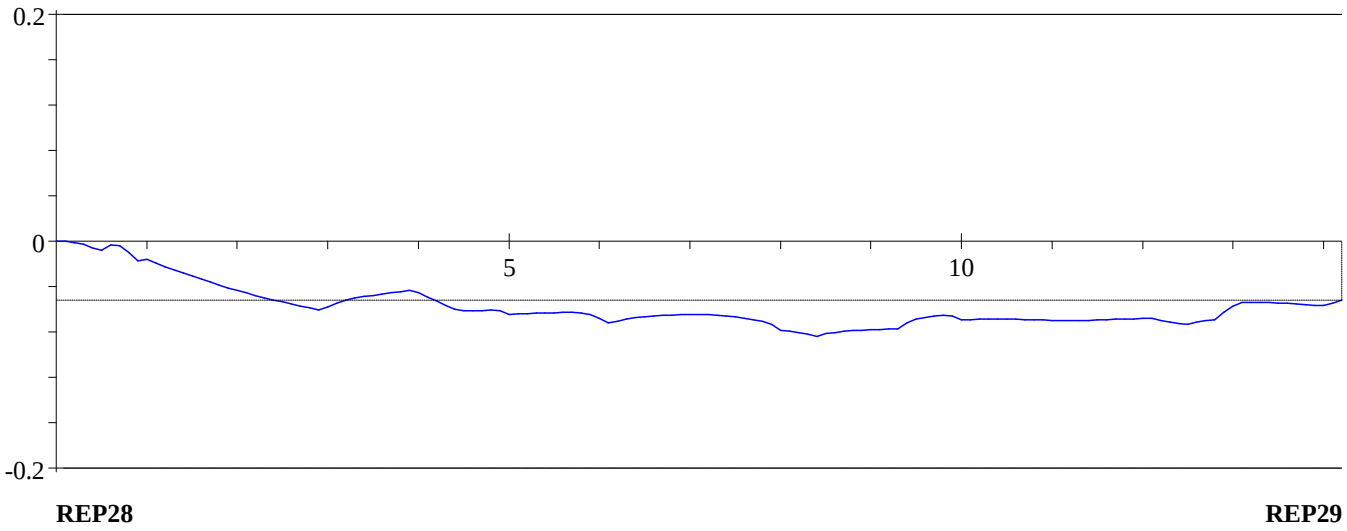


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 51** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP28 vers REP29**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **14.19 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP28 vers REP29**	Longueur mesurée : **14.19 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **730**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection

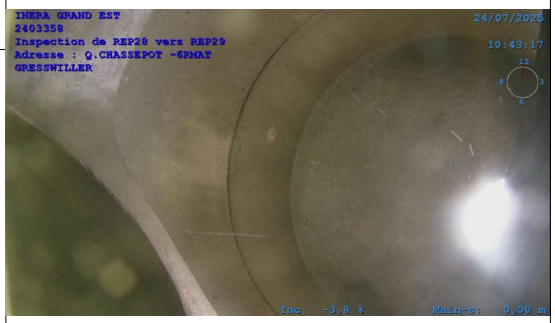


DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **731/732**	VIDEO : **00:00:18**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP28



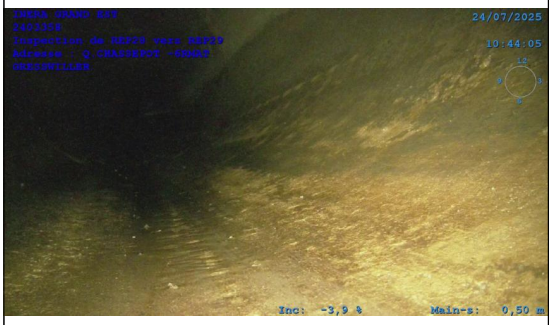

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 51** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP28 vers REP29**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP28 vers REP29**	Longueur inspectée : **14.19 m** Longueur mesurée : **14.19 m**

DISTANCE : **6.19 m**	PHOTO : **733/734**	VIDEO : **00:01:35**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





DISTANCE : **14.18 m**	PHOTO : **735/736**	VIDEO : **00:03:07**

OBSERVATIONS :

BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - désableure





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 51** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP28 vers REP29**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP28 vers REP29**	Longueur inspectée : **14.19 m** Longueur mesurée : **14.19 m**

DISTANCE : **14.19 m**	PHOTO : **737**	VIDEO : **00:03:15**

OBSERVATIONS :

BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10% - nettoyage de l'ouvra préconisé



DISTANCE : **14.19 m**	PHOTO : **738**	VIDEO : **00:03:27**

OBSERVATIONS :

BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud REP 29
BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 52**
	Référence du noeud de départ : **REP41**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP43**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP43 vers REP41**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **21.70 m**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **300**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP41**	Référence du noeud : **REP43**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **1000 x 1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Echelle**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP43 vers REP41**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **21.70 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP41 vers REP43**	Longueur mesurée : **21.70 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP41 VERS REP43




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP41	739	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	441
0.50m / REP41	740/741	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41	441
6.84m / REP41	742/743	BDA - Photographie générale - emboitement correct	442
21.63m / REP41	744/745	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP43	442
21.70m / REP41	746	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	443

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 52** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **REP43 vers REP41**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP41 vers REP43**	Longueur inspectée : **21.70 m** Longueur mesurée : **21.70 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

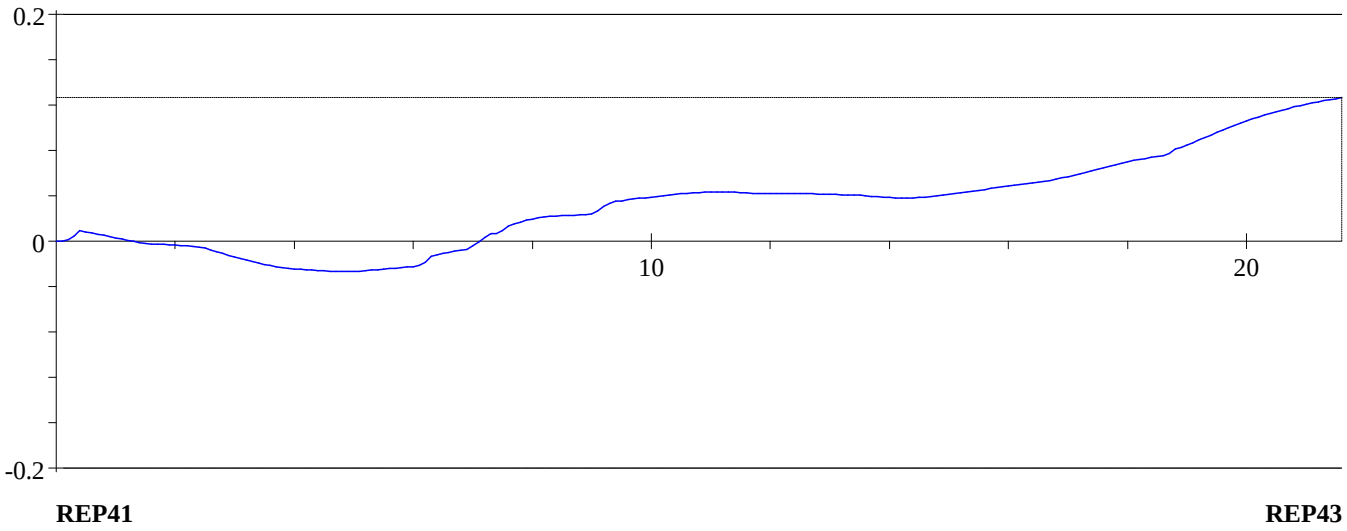

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 52** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP43 vers REP41**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **21.70 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP41 vers REP43**	Longueur mesurée : **21.70 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **739**	VIDEO : **00:00:02**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection




DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **740/741**	VIDEO : **00:00:31**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41

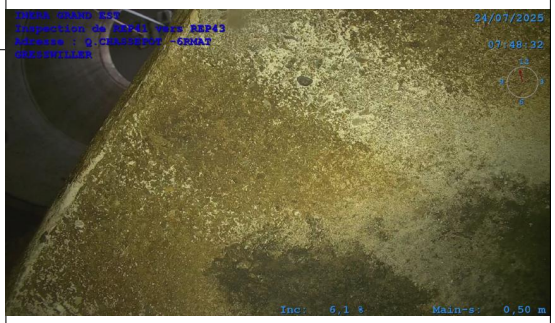

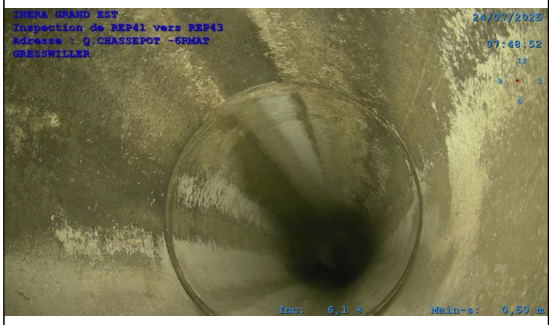

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 52** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**300 mm**	**REP43 vers REP41**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **21.70 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP41 vers REP43**	Longueur mesurée : **21.70 m**

DISTANCE : **6.84 m**	PHOTO : **742/743**	VIDEO : **00:02:34**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





DISTANCE : **21.63 m**	PHOTO : **744/745**	VIDEO : **00:04:45**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP43





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 52** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **300 mm**	Sens de l'écoulement **REP43 vers REP41**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP41 vers REP43**	Longueur inspectée : **21.70 m** Longueur mesurée : **21.70 m**

DISTANCE : **21.70 m**	PHOTO : **746**	VIDEO : **00:05:25**	
OBSERVATIONS : **BDB - Remarque générale - fin d'inspection**			

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 53**
	Référence du noeud de départ : **REP41**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP40**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP41 vers REP40**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **37.57 m**
Date de l'inspection : **23/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **400**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP41**	Référence du noeud : **REP40**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 53**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP41 vers REP40**	**23 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **37.57 m**
Béton	**3.00 m**	**REP41 vers REP40**	Longueur mesurée : **37.57 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP41 VERS REP40




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP41	747	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	447
0.50m / REP41	748/749	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41	447
18.63m / REP41	750/751	BDA - Photographie générale - emboitement correct	448
28.97m / REP41	752/753	BBHZA - Présence de vermine dans la canalisation - souris	448
36.95m / REP41	754/755	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP40	449
37.57m / REP41	756	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	449

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 53** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP41 vers REP40**	Date d'inspection : **23 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP41 vers REP40**	Longueur inspectée : **37.57 m** Longueur mesurée : **37.57 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

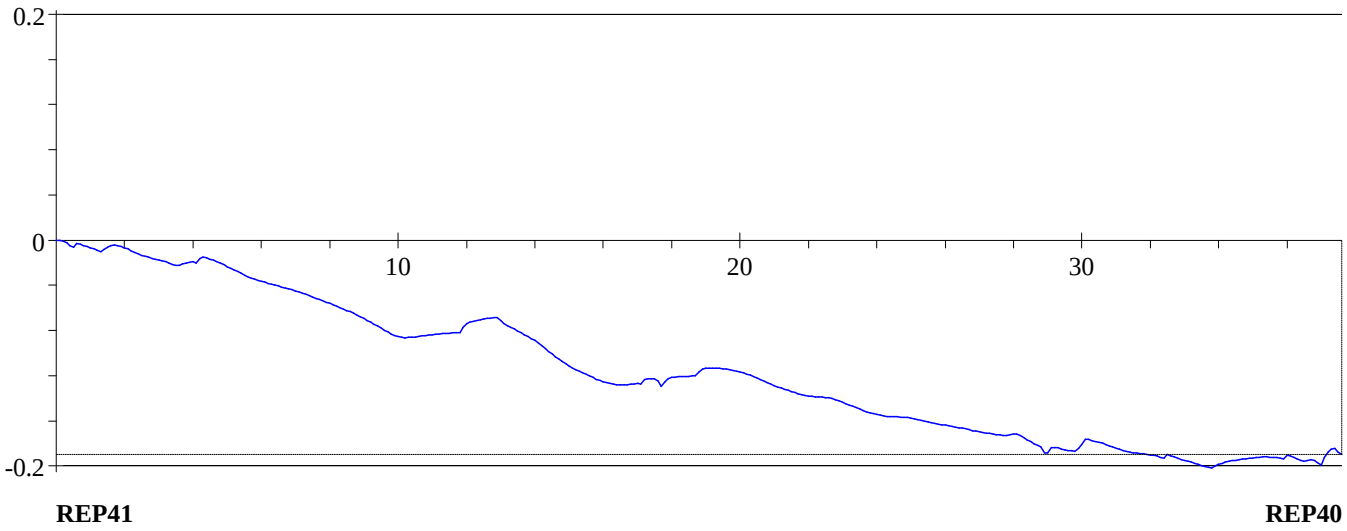

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 53** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP41 vers REP40**	Date d'inspection : **23 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP41 vers REP40**	Longueur inspectée : **37.57 m** Longueur mesurée : **37.57 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **747**	VIDEO : **00:00:01**	
OBSERVATIONS : **BDB - Remarque générale - départ d'inspection**			

DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **748/749**	VIDEO : **00:00:31**	
OBSERVATIONS : **BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41**			


GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 53**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP41 vers REP40**	**23 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **37.57 m**
Béton	**3.00 m**	**REP41 vers REP40**	Longueur mesurée : **37.57 m**

DISTANCE : **18.63 m**	PHOTO : **750/751**	VIDEO : **00:03:24**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct

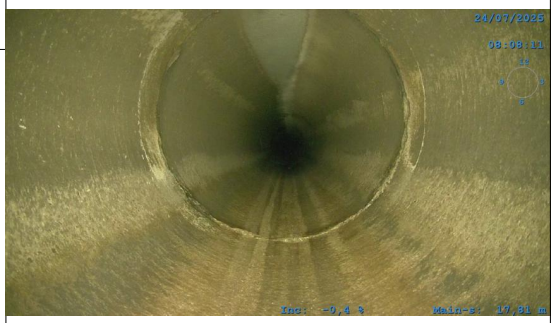




DISTANCE : **28.97 m**	PHOTO : **752/753**	VIDEO : **00:04:47**

OBSERVATIONS :

BBHZA - Présence de vermine dans la canalisation - souris

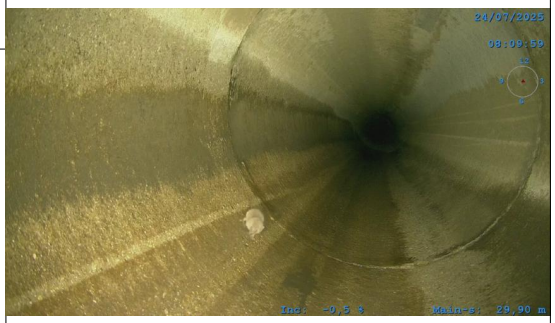




GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 53** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP41 vers REP40**	**23 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **37.57 m**
Béton	**3.00 m**	**REP41 vers REP40**	Longueur mesurée : **37.57 m**

DISTANCE : **36.95 m**	PHOTO : **754/755**	VIDEO : **00:06:07**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP40

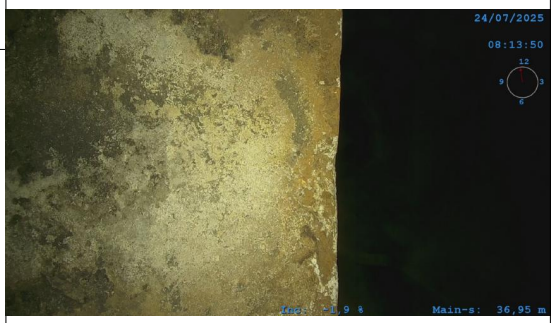



DISTANCE : **37.57 m**	PHOTO : **756**	VIDEO : **00:06:41**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 54**
	Référence du noeud de départ : **REP40**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP39**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP40 vers REP39**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **5.22 m**
Date de l'inspection : **23/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **400**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP40**	Référence du noeud : **REP39**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 54**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP40 vers REP39**	**23 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **5.22 m**
Béton	**3.00 m**	**REP40 vers REP39**	Longueur mesurée : **5.22 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP40 VERS REP39




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP40	757	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	453
0.00m / REP40	758	DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 3h - Diam./Hauteur 160mm	453
0.00m / REP40	759	DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 9h - Diam./Hauteur 400mm	453
0.33m / REP40	760/761	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP40	454
1.92m / REP40	762/763	BDA - Photographie générale - emboitement correct	454
4.89m / REP40	764/765	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP39	455
5.22m / REP40	766	DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 9h - Diam./Hauteur 160mm	455
5.22m / REP40	767	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	455

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 54** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP40 vers REP39**	Date d'inspection : **23 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP40 vers REP39**	Longueur inspectée : **5.22 m** Longueur mesurée : **5.22 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

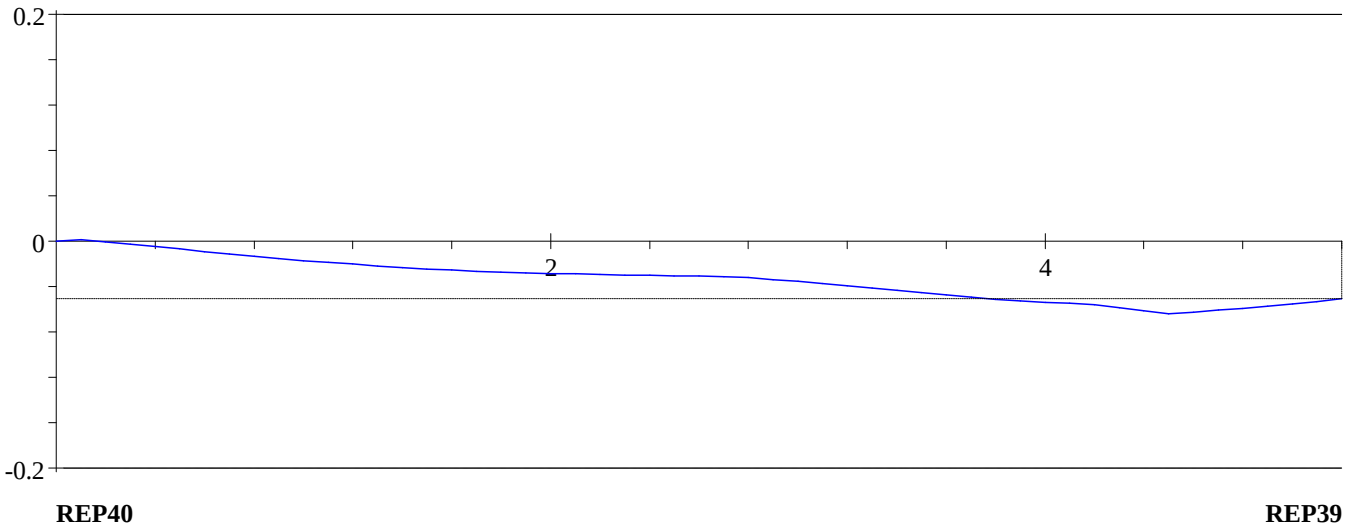

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 54** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP40 vers REP39**	**23 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **5.22 m**
Béton	**3.00 m**	**REP40 vers REP39**	Longueur mesurée : **5.22 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **757**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **758**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 3h - Diam./Hauteur 160mm



DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **759**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 9h - Diam./Hauteur 400mm




GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 54**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP40 vers REP39**	**23 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **5.22 m**
Béton	**3.00 m**	**REP40 vers REP39**	Longueur mesurée : **5.22 m**

DISTANCE : **0.33 m**	PHOTO : **760/761**	VIDEO : **00:00:21**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP40

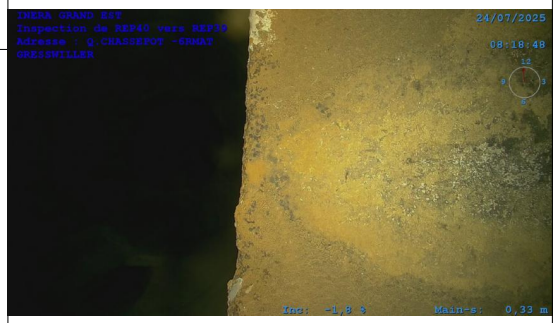



DISTANCE : **1.92 m**	PHOTO : **762/763**	VIDEO : **00:00:39**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





DISTANCE : **4.89 m**	PHOTO : **764/765**	VIDEO : **00:01:52**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP39





DISTANCE : **5.22 m**	PHOTO : **766**	VIDEO : **00:02:23**

OBSERVATIONS :

DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 9h - Diam./Hauteur 160mm



DISTANCE : **5.22 m**	PHOTO : **767**	VIDEO : **00:02:28**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 55**
	Référence du noeud de départ : **REP 40.1**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP40**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP 40.1 vers REP40**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **6.54 m**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **400**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP 40.1**	Référence du noeud : **REP40**
Dimensions du regard : **1000 x 1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Echelle**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 55**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP 40.1 vers REP40**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.54 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP 40.1 vers REP40**	Longueur mesurée : **6.54 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP 40.1 VERS REP40




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP 40.1	768	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	459
0.50m / REP 40.1	769/770	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP40.1	459
4.95m / REP 40.1	771/772	BDA - Photographie générale - emboitement correct	460
6.47m / REP 40.1	773/774	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP40 - en chute	460
6.54m / REP 40.1	775	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	461

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 55** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP 40.1 vers REP40**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 40.1 vers REP40**	Longueur inspectée : **6.54 m** Longueur mesurée : **6.54 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

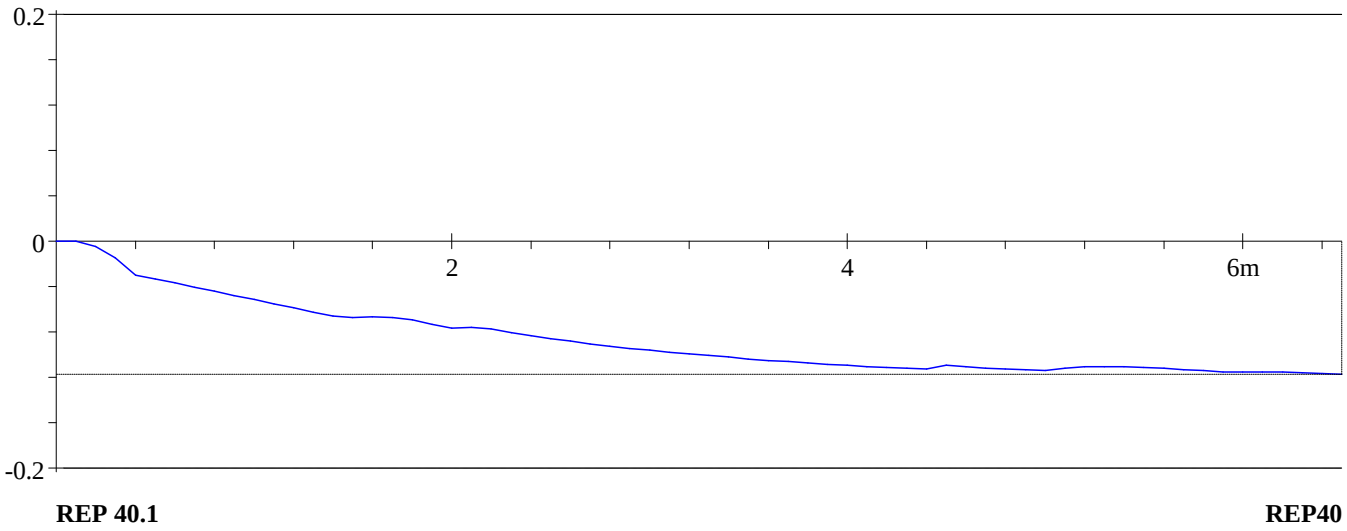

REP 40.1 **REP40**

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 55** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP 40.1 vers REP40**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.54 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP 40.1 vers REP40**	Longueur mesurée : **6.54 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **768**	VIDEO : **00:00:26**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **769/770**	VIDEO : **00:00:40**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP40.1






Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**400 mm**	**REP 40.1 vers REP40**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **6.54 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP 40.1 vers REP40**	Longueur mesurée : **6.54 m**

DISTANCE : **4.95 m**	PHOTO : **771/772**	VIDEO : **00:02:36**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct

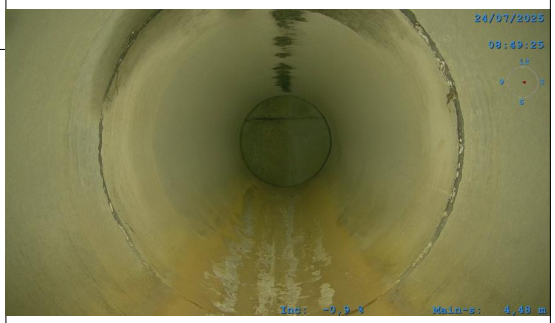



DISTANCE : **6.47 m**	PHOTO : **773/774**	VIDEO : **00:03:57**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP40 - en chute






GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 55** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **400 mm**	Sens de l'écoulement **REP 40.1 vers REP40**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 40.1 vers REP40**	Longueur inspectée : **6.54 m** Longueur mesurée : **6.54 m**

DISTANCE : **6.54 m**	PHOTO : **775**	VIDEO : **00:04:21**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection

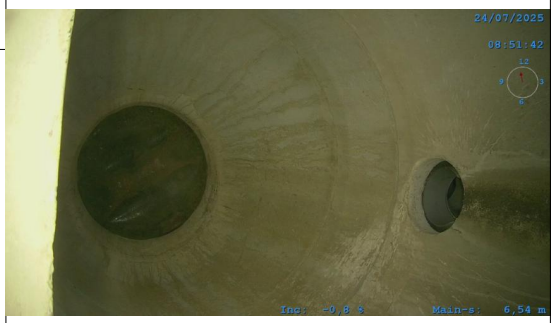

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV8** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 39 vers Brt AV8**	Longueur inspectée : **4.41 m** Longueur mesurée : **4.41 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT REP 39 VERS Brt AV8

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/REP 39	776/777	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP39	463
2.88 m/REP 39	778	BDA - Photographie générale - emboitement correct	463
4.41 m/REP 39	779	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV8 - Grille avaloir	463

Brt AV8

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **REP 39**

Position : **dans REP 39**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV8** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 39 vers Brt AV8**	Longueur inspectée : **4.41 m** Longueur mesurée : **4.41 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **776/777**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP39





DISTANCE : **2.88 m**	PHOTO : **778**	VIDEO : **00:00:23**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct



DISTANCE : **4.41 m**	PHOTO : **779**	VIDEO : **00:00:30**

OBSERVATIONS :


BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV8 - Grille avaloir



INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV5** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 40 vers Brt AV5**	Longueur inspectée : **0.58 m** Longueur mesurée : **0.58 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT REP 40 VERS Brt AV5



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/REP 40	780/781	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 40	465
0.00 m/REP 40	782	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut	465
0.58 m/REP 40	783	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV5 - Grille avaloir	465

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous une route**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Regard de visite de raccordement : **REP 40**

Position : **dans REP 40**

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt AV5** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **PVC-U**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 40 vers Brt AV5**	Longueur inspectée : **0.58 m** Longueur mesurée : **0.58 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **780/781**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 40





DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **782**	VIDEO : **00:00:18**

OBSERVATIONS :

BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut



DISTANCE : **0.58 m**	PHOTO : **783**	VIDEO : **00:00:36**

OBSERVATIONS :

BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV5 - Grille avaloir



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 56**
	Référence du noeud de départ : **REP39**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP38**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP39 vers REP38**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **21.47 m**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **600**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP39**	Référence du noeud : **REP38**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP39 vers REP38**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **21.47 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP39 vers REP38**	Longueur mesurée : **21.47 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP39 VERS REP38




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP39	784	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	469
0.50m / REP39	785/786	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 39	469
6.10m / REP39	787/788	BDA - Photographie générale - emboitement correct	470
20.89m / REP39	789/790	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP38	470
21.47m / REP39	791	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	471

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 56** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **REP39 vers REP38**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP39 vers REP38**	Longueur inspectée : **21.47 m** Longueur mesurée : **21.47 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

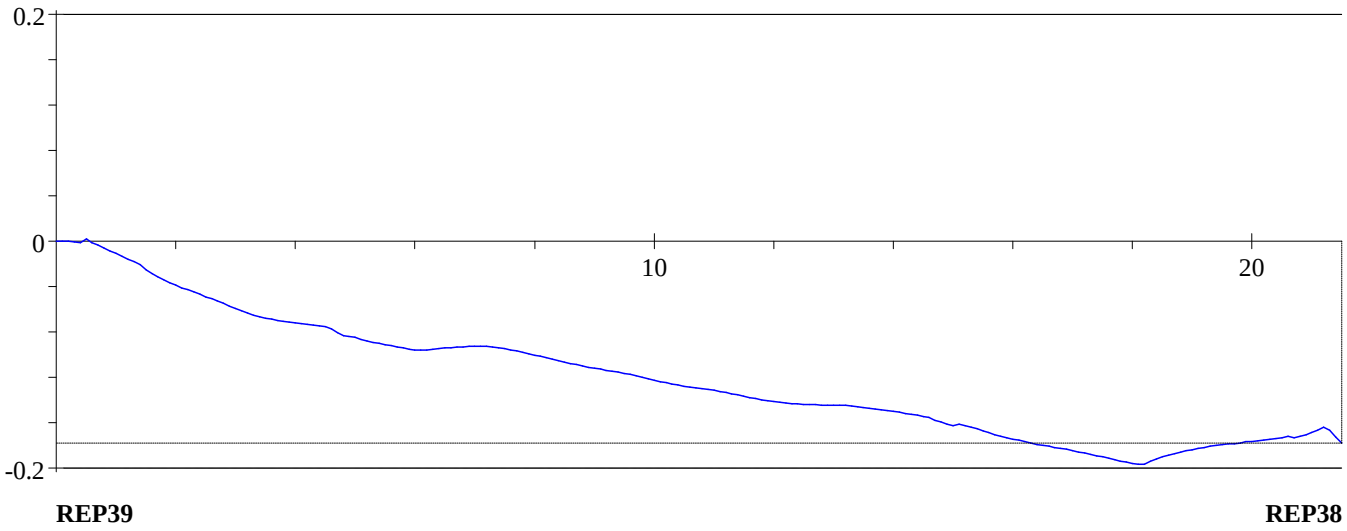

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 56** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP39 vers REP38**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **21.47 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP39 vers REP38**	Longueur mesurée : **21.47 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **784**	VIDEO : **00:00:09**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **785/786**	VIDEO : **00:00:45**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 39






GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 56** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP39 vers REP38**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **21.47 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP39 vers REP38**	Longueur mesurée : **21.47 m**

DISTANCE : **6.10 m**	PHOTO : **787/788**	VIDEO : **00:02:09**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct

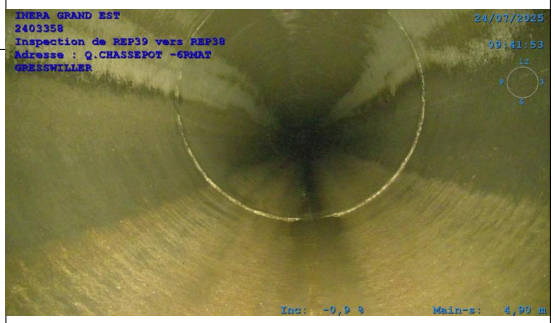



DISTANCE : **20.89 m**	PHOTO : **789/790**	VIDEO : **00:04:08**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP38






GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 56** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **REP39 vers REP38**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP39 vers REP38**	Longueur inspectée : **21.47 m** Longueur mesurée : **21.47 m**

DISTANCE : **21.47 m**	PHOTO : **791**	VIDEO : **00:05:07**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection

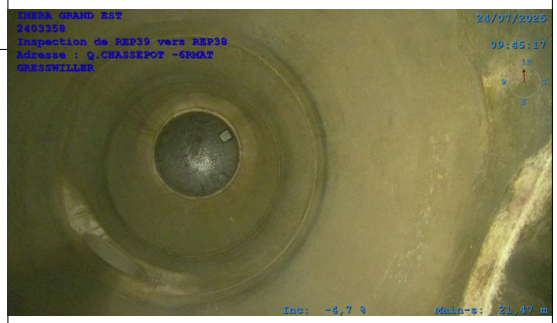

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 57**
	Référence du noeud de départ : **REP38**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP28**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP38 vers REP28**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **9.22 m**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **600**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Fonte**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP38**	Référence du noeud : **REP28**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1500**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 57**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**600 mm**	**REP38 vers REP28**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **9.22 m**
Fonte	**3.00 m**	**REP38 vers REP28**	Longueur mesurée : **9.22 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP38 VERS REP28




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP38	792	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	475
0.34m / REP38	793/794	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP38	475
5.95m / REP38	795/796	BDA - Photographie générale - emboitement correct	476
8.91m / REP38	797/798	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP28	476
9.22m / REP38	799	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	477

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 57** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **REP38 vers REP28**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP38 vers REP28**	Longueur inspectée : **9.22 m** Longueur mesurée : **9.22 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

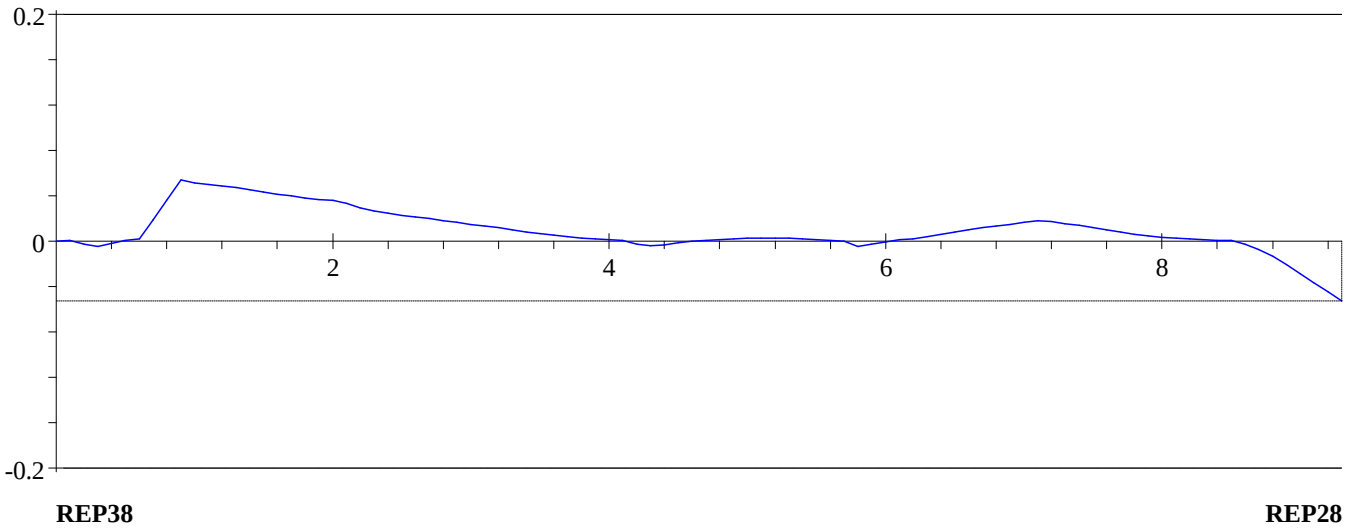

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 57** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **REP38 vers REP28**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP38 vers REP28**	Longueur inspectée : **9.22 m** Longueur mesurée : **9.22 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **792**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection




DISTANCE : **0.34 m**	PHOTO : **793/794**	VIDEO : **00:00:07**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP38



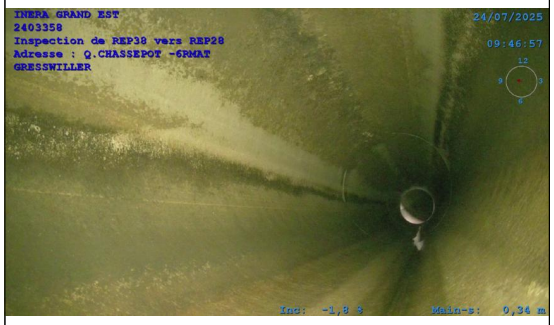

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 57** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **REP38 vers REP28**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP38 vers REP28**	Longueur inspectée : **9.22 m** Longueur mesurée : **9.22 m**

DISTANCE : **5.95 m**	PHOTO : **795/796**	VIDEO : **00:00:52**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





DISTANCE : **8.91 m**	PHOTO : **797/798**	VIDEO : **00:01:48**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP28





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 57** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **600 mm**	Sens de l'écoulement **REP38 vers REP28**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Fonte**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP38 vers REP28**	Longueur inspectée : **9.22 m** Longueur mesurée : **9.22 m**

DISTANCE : **9.22 m**	PHOTO : **799**	VIDEO : **00:02:12**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 58**
	Référence du noeud de départ : **REP31**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **Bassin**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP31 vers Bassin**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **7.18 m**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **800**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Non**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP31**	Référence du noeud : **Bassin**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 58**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**800 mm**	**REP31 vers Bassin**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **7.18 m**
Béton	**3.00 m**	**REP31 vers Bassin**	Longueur mesurée : **7.18 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP31 VERS Bassin




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP31	800	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	481
0.50m / REP31	801/802	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP31	481
4.38m / REP31	803/804	BDA - Photographie générale - emboitement correct	482
7.18m / REP31	805/806	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Bassin - en chute	482
7.18m / REP31	807/808/809	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	483

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 58** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **REP31 vers Bassin**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP31 vers Bassin**	Longueur inspectée : **7.18 m** Longueur mesurée : **7.18 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

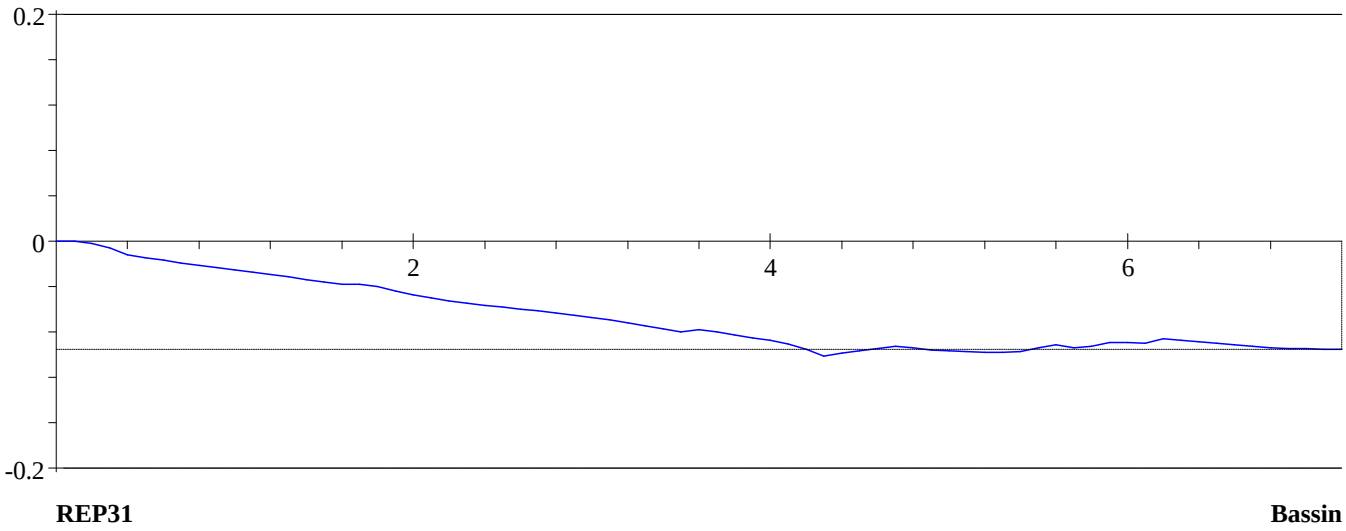


GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 58** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **REP31 vers Bassin**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP31 vers Bassin**	Longueur inspectée : **7.18 m** Longueur mesurée : **7.18 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **800**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :


BDB - Remarque générale - départ d'inspection

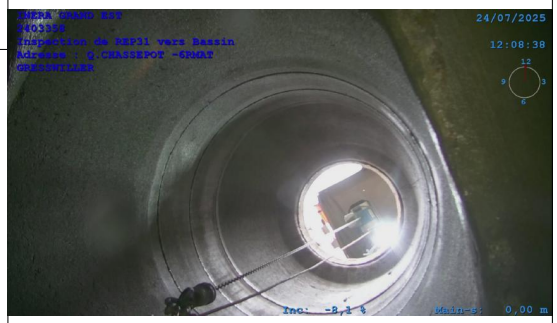

DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **801/802**	VIDEO : **00:00:12**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP31

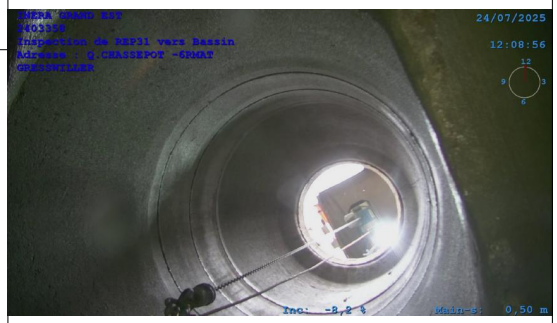



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 58** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **REP31 vers Bassin**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP31 vers Bassin**	Longueur inspectée : **7.18 m** Longueur mesurée : **7.18 m**

DISTANCE : **4.38 m**	PHOTO : **803/804**	VIDEO : **00:00:57**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





DISTANCE : **7.18 m**	PHOTO : **805/806**	VIDEO : **00:02:05**

OBSERVATIONS :

BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Bassin - en chute






GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 58** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**800 mm**	**REP31 vers Bassin**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **7.18 m**
Béton	**3.00 m**	**REP31 vers Bassin**	Longueur mesurée : **7.18 m**


DISTANCE : **7.18 m**	PHOTO : **807/808/809**	VIDEO : **00:02:22**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection







Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 59**
	Référence du noeud de départ : **REP36**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP37**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP36 vers REP37**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **4.58 m**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **1200**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Oui**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**


Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP36**	Référence du noeud : **REP37**
Dimensions du regard : **Ø1500**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**

Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**1200 mm**	**REP36 vers REP37**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **4.58 m**
Béton	**3.00 m**	**REP36 vers REP37**	Longueur mesurée : **4.58 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP36 VERS REP37




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP36	810	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	487
0.50m / REP36	811/812	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP36	487
2.02m / REP36	813/814	BDA - Photographie générale - emboitement correct	488
4.55m / REP36	815/816	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP37	488
4.58m / REP36	817/818/819	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	489

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 59** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP36 vers REP37**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP36 vers REP37**	Longueur inspectée : **4.58 m** Longueur mesurée : **4.58 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

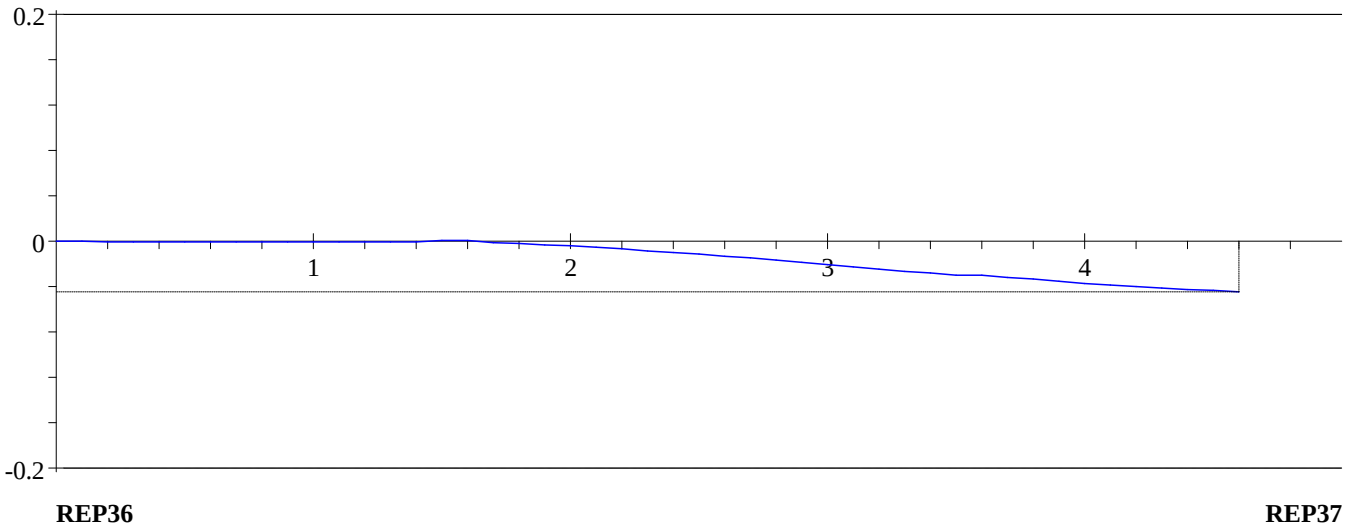

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 59** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP36 vers REP37**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP36 vers REP37**	Longueur inspectée : **4.58 m** Longueur mesurée : **4.58 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **810**	VIDEO : **00:00:01**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection



DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **811/812**	VIDEO : **00:00:27**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP36





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 59** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP36 vers REP37**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP36 vers REP37**	Longueur inspectée : **4.58 m** Longueur mesurée : **4.58 m**

DISTANCE : **2.02 m**	PHOTO : **813/814**	VIDEO : **00:01:25**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale - emboitement correct





DISTANCE : **4.55 m**	PHOTO : **815/816**	VIDEO : **00:02:33**

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP37





GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 59** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **1200 mm**	Sens de l'écoulement **REP36 vers REP37**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP36 vers REP37**	Longueur inspectée : **4.58 m** Longueur mesurée : **4.58 m**

DISTANCE : **4.58 m**	PHOTO : **817/818/819**	VIDEO : **00:02:48**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection







Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 60**
	Référence du noeud de départ : **REP36**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP 35**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP 35 vers REP36**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **3.27 m**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur : **800**
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Non**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP36**	Référence du noeud : **REP 35**
Dimensions du regard : **Ø1500**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 60**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**800 mm**	**REP 35 vers REP36**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **3.27 m**
Béton	**3.00 m**	**REP36 vers REP 35**	Longueur mesurée : **3.27 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP36 VERS REP 35




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP36	820	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	493
0.50m / REP36	821/822	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP36	493
1.50m / REP36	823	BDA - Photographie générale	493
2.87m / REP36	824/825	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud REP35	494
3.27m / REP36	826	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	494

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 60** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **800 mm**	Sens de l'écoulement **REP 35 vers REP36**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP36 vers REP 35**	Longueur inspectée : **3.27 m** Longueur mesurée : **3.27 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

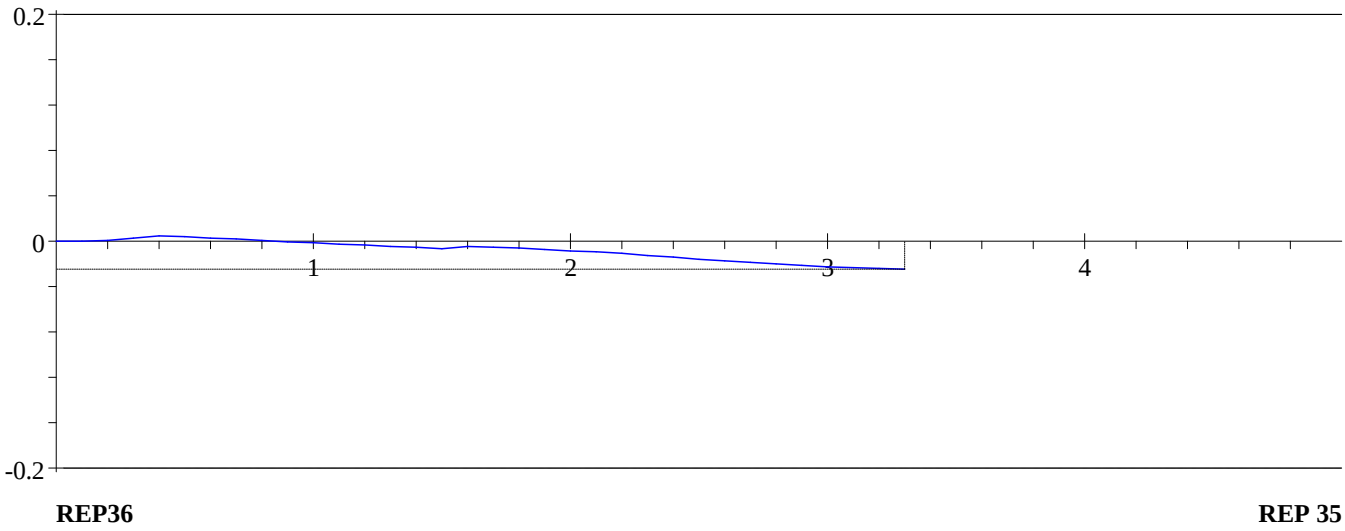

REP36 **REP 35**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**800 mm**	**REP 35 vers REP36**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **3.27 m**
Béton	**3.00 m**	**REP36 vers REP 35**	Longueur mesurée : **3.27 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **820**	VIDEO : **00:00:02**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection




DISTANCE : **0.50 m**	PHOTO : **821/822**	VIDEO : **00:00:24**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP36



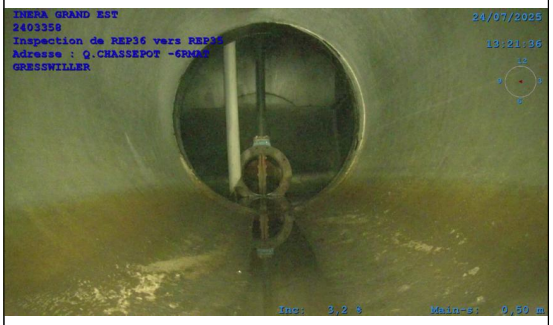

DISTANCE : **1.50 m**	PHOTO : **823**	VIDEO : **00:00:55**

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale



GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 60** Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**800 mm**	**REP 35 vers REP36**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **3.27 m**
Béton	**3.00 m**	**REP36 vers REP 35**	Longueur mesurée : **3.27 m**

DISTANCE : **2.87 m**	PHOTO : **824/825**	VIDEO : **00:01:17**

OBSERVATIONS :

BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud REP35



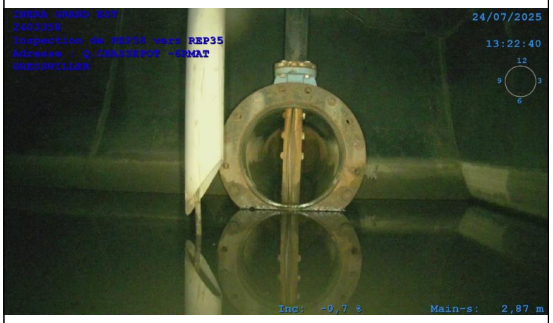

DISTANCE : **3.27 m**	PHOTO : **826**	VIDEO : **00:01:46**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - fin d'inspection



Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 61**
	Référence du noeud de départ : **REP 33**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP34**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP 33 vers REP34**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **Non mesurée**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur :
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Non**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP 33**	Référence du noeud : **REP34**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales : **séparateur**

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 61**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**mm**	**REP 33 vers REP34**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **0.00 m**
Béton	**3.00 m**	**REP 33 vers REP34**	Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU TRONÇON REP 33 VERS REP34




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP 33	827/828	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable	498

Observations générales :
séparateur

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 61** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **mm**	Sens de l'écoulement **REP 33 vers REP34**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 33 vers REP34**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

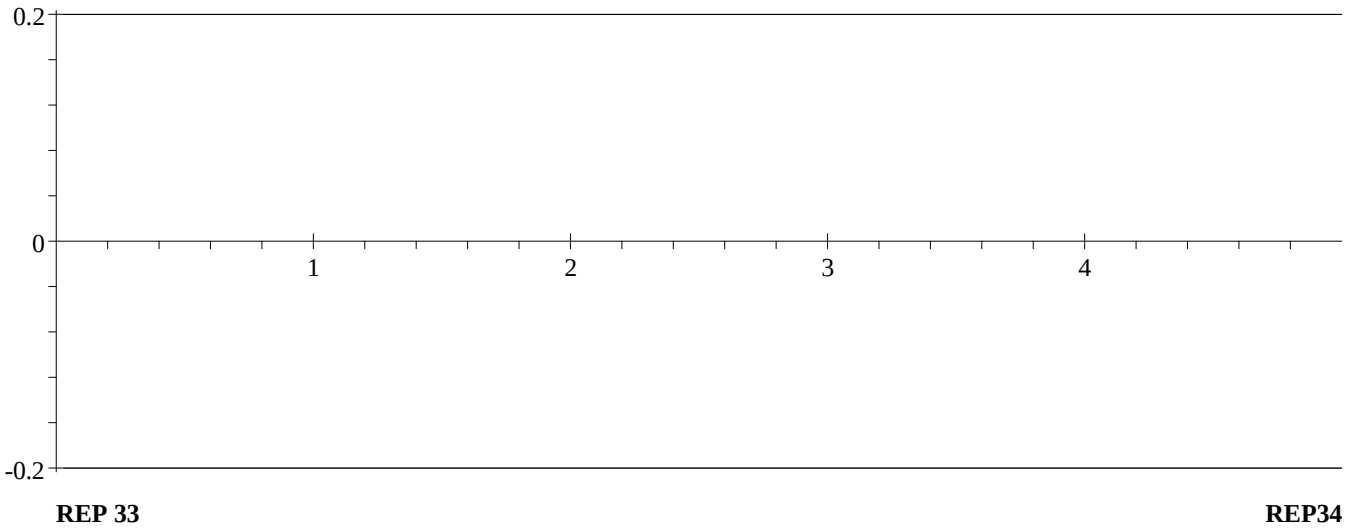

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 61** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**mm**	**REP 33 vers REP34**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **0.00 m**
Béton	**3.00 m**	**REP 33 vers REP34**	Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **827/828**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable





ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 62**
	Référence du noeud de départ : **REP34**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP 35**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP34 vers REP 35**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **Non mesurée**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur :
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Non**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP34**	Référence du noeud : **REP 35**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales : **séparateur**

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 62**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**mm**	**REP34 vers REP 35**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **0.00 m**
Béton	**3.00 m**	**REP34 vers REP 35**	Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU TRONÇON REP34 VERS REP 35




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP34	829/830	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable	502

Observations générales :
séparateur

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 62** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **mm**	Sens de l'écoulement **REP34 vers REP 35**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP34 vers REP 35**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

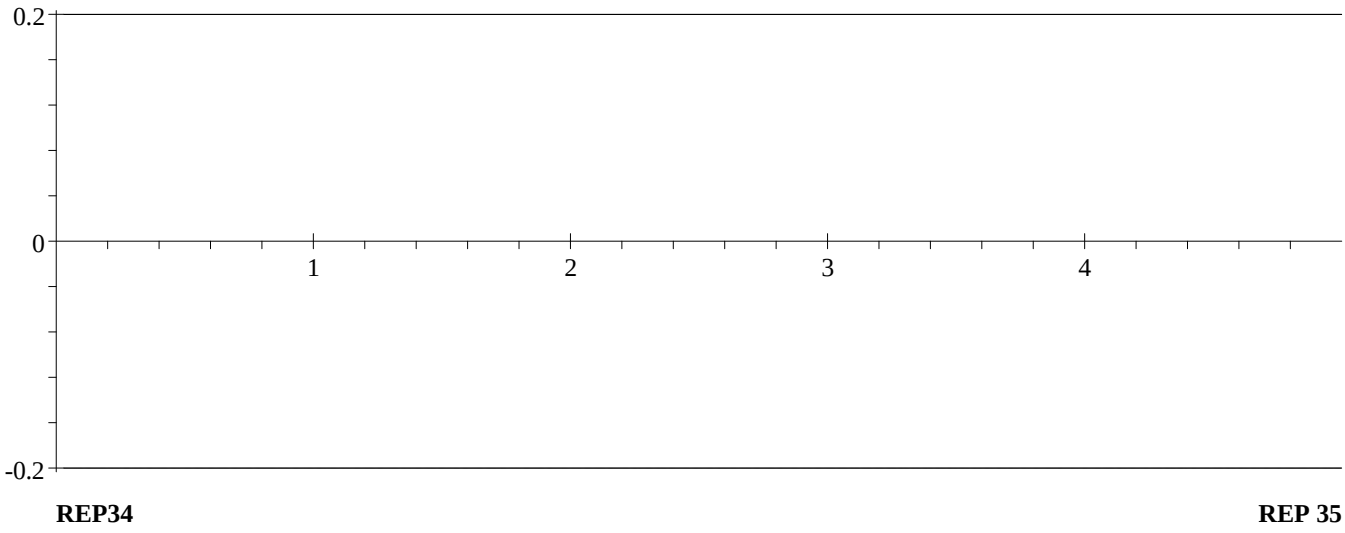

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 62** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**mm**	**REP34 vers REP 35**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **0.00 m**
Béton	**3.00 m**	**REP34 vers REP 35**	Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **829/830**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable





ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 63**
	Référence du noeud de départ : **REP 30**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP29**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP29 vers REP 30**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'amont**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **Non mesurée**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur :
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Non**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP 30**	Référence du noeud : **REP29**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard :
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 63**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**mm**	**REP29 vers REP 30**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **0.00 m**
Béton	**3.00 m**	**REP 30 vers REP29**	Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU TRONÇON REP 30 VERS REP29




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP 30	831/832	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable	506

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 63** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **mm**	Sens de l'écoulement **REP29 vers REP 30**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 30 vers REP29**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

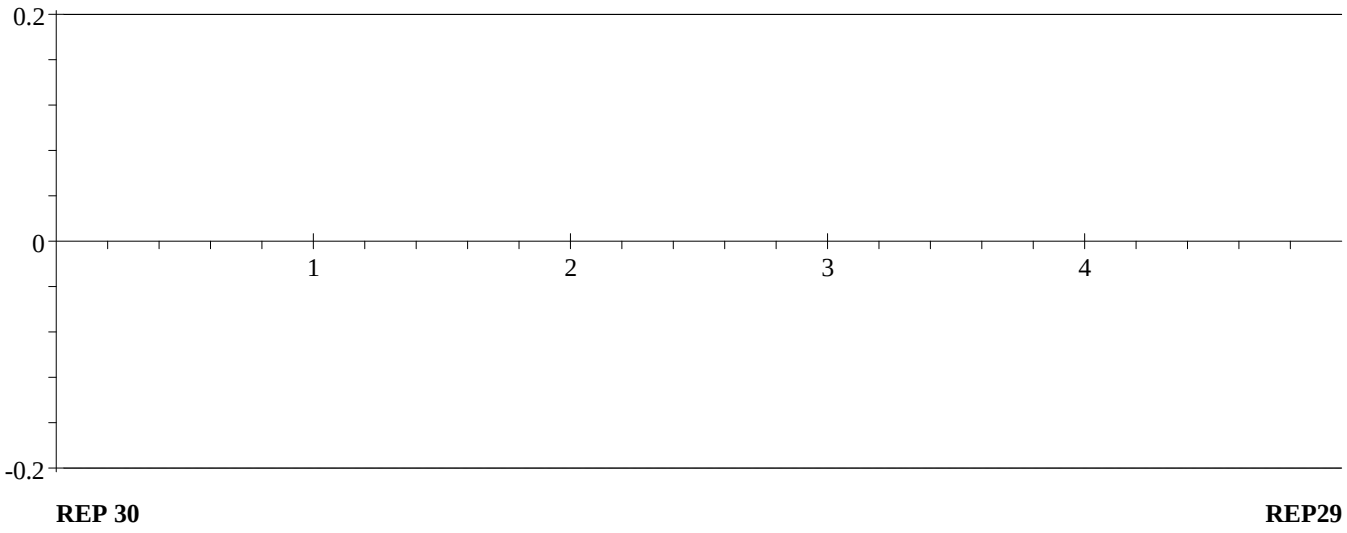

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 63** Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**mm**	**REP29 vers REP 30**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **0.00 m**
Béton	**3.00 m**	**REP 30 vers REP29**	Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **831/832**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable





ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 64**
	Référence du noeud de départ : **REP29**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP31**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP29 vers REP31**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **-9.02 m**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur :
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Non**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP29**	Référence du noeud : **REP31**
Dimensions du regard :	Dimensions du regard : **Ø1000**
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 64**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**mm**	**REP29 vers REP31**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **-9.02 m**
Béton	**3.00 m**	**REP29 vers REP31**	Longueur mesurée : **-9.02 m**

SYNTHESE DU TRONÇON REP29 VERS REP31




Distance	Photo	Observations	Page
-9.02m / REP29	833/834/835	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable, nettoyage préconisé	510

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 64** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **mm**	Sens de l'écoulement **REP29 vers REP31**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP29 vers REP31**	Longueur inspectée : **-9.02 m** Longueur mesurée : **-9.02 m**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

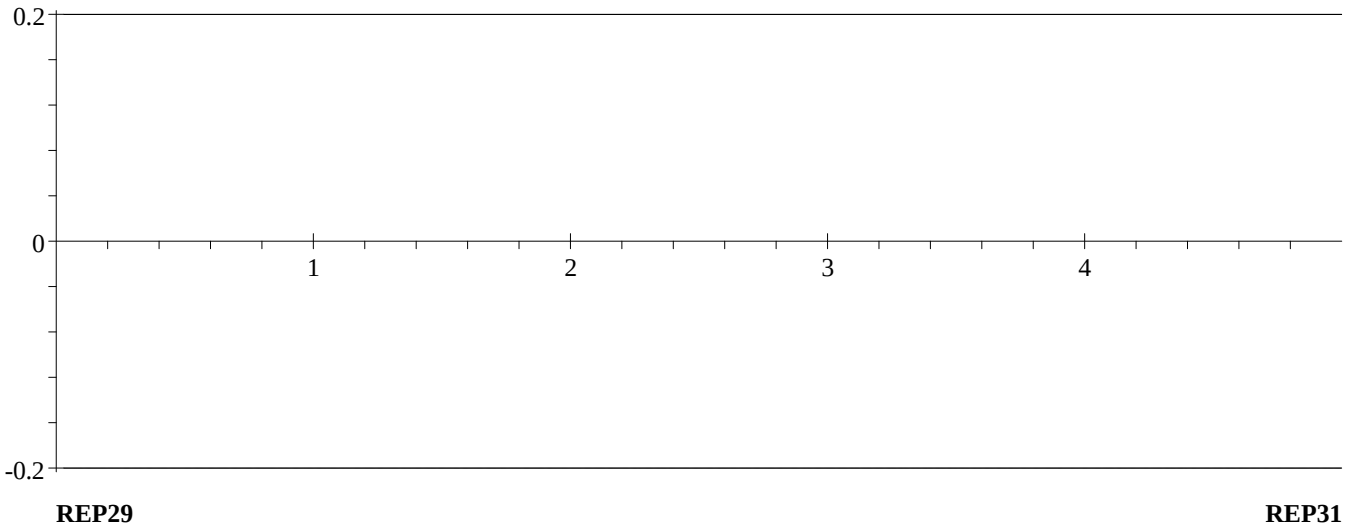

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 64** Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **mm**	Sens de l'écoulement **REP29 vers REP31**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP29 vers REP31**	Longueur inspectée : **-9.02 m** Longueur mesurée : **-9.02 m**

DISTANCE : **-9.02 m**	PHOTO : **833/834/835**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable, nettoyage préconis



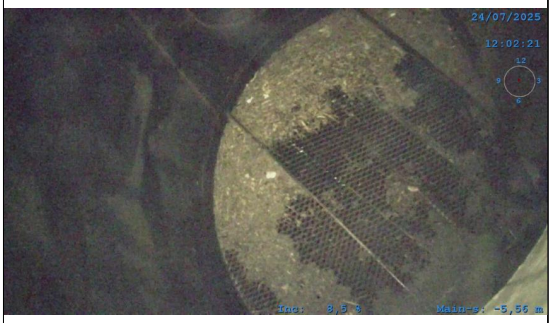



ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection	Identification du tronçon inspecté
Objectif : **Inspection de routine de l'état**	Référence du tronçon : **Tronçon n° 65**
	Référence du noeud de départ : **REP32**
Commune : **GRESSWILLER**	Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Adresse : **Q.CHASSEPOT -6RMAT**	Référence du noeud d'arrivée : **REP29**
	Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Emplacement : **Sous une route**	Sens d'écoulement : **REP32 vers REP29**
Propriété foncière : **Bien public**	Sens d'inspection : **Vers l'aval**
Autorité responsable : **MINISTERE DES ARMEES**	Type de collecteur : **Gravitaire**
Client : **NEOCONCEPT VRD**	Usage du collecteur : **Eaux pluviales**
Maître d'oeuvre : **-**	Etat, statut : **ancien, en service**
Entreprise de pose : **-**	Longueur mesurée en surface : **Non mesurée**
Date de l'inspection : **24/07/2025**	

Identification des références et supports	Identification de la canalisation inspectée
Référence norme de codage : **EN 13508-2:2003+A1:2011**	Forme de la canalisation : **Circulaire**
Point de référence longitudinal : **Centre du tampon de l'ouvrage de départ**	Diamètre ou hauteur :
	Largeur :
Réf. support vidéo : **2403358**	Matériau constitutif : **Béton**
Réf. support photo : **2403358**	Longueur unitaire : **3.00**
	Matériau de revêtement : **Aucun**
	Type de revêtement : **-**

Conditions d'intervention	
Nettoyage préalable : **Non**	Régulation du débit : **Aucune**
Précipitations : **Pas de précipitations**	Ouvrage sous nappe : **Non**
Température extérieure : **> 0**	Etat apparent du remblai : **Terminé**
Méthode d'inspection : **Télévisuelle**	Etat d'avancement de la voirie : **Voirie existante**

Identification du noeud de départ :	Identification du noeud d'arrivée :
Référence du noeud : **REP32**	Référence du noeud : **REP29**
Dimensions du regard : **Ø1000**	Dimensions du regard :
Nombre de branchements : **0**	Nombre de branchements : **0**
Dispositif de descente : **Aucun**	Dispositif de descente : **Aucun**
Cunette réalisée : **Oui**	Cunette réalisée : **Oui**
Traces d'infiltration : **Non**	Traces d'infiltration : **Non**


Identification du matériel d'inspection :	
Marque du matériel : **RAUSCH**	Modèle du chariot : **C135**
	- Numéro de série :
Modèle de l'enrouleur : **ELKA 600 HD**	Modèle de la caméra : **KS 135**
- Numéro de série : **111550064**	- Numéro de série : **111255071**

Observations particulières
Remarques générales :

GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q.CHASSEPOT -6RMAT		Tronçon : **Tronçon n° 65**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **HEIDT Jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :	Sens de l'écoulement	Date d'inspection :
Eaux pluviales	**mm**	**REP32 vers REP29**	**24 juillet 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **0.00 m**
Béton	**3.00 m**	**REP32 vers REP29**	Longueur mesurée : **N mesurée**

SYNTHESE DU TRONÇON REP32 VERS REP29




Distance	Photo	Observations	Page
0.00m / REP32	836/837	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable	514

Observations générales :

GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 65** Opérateur : **HEIDT Jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **mm**	Sens de l'écoulement **REP32 vers REP29**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP32 vers REP29**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

Allure de la dénivellation de la canalisation (en m)

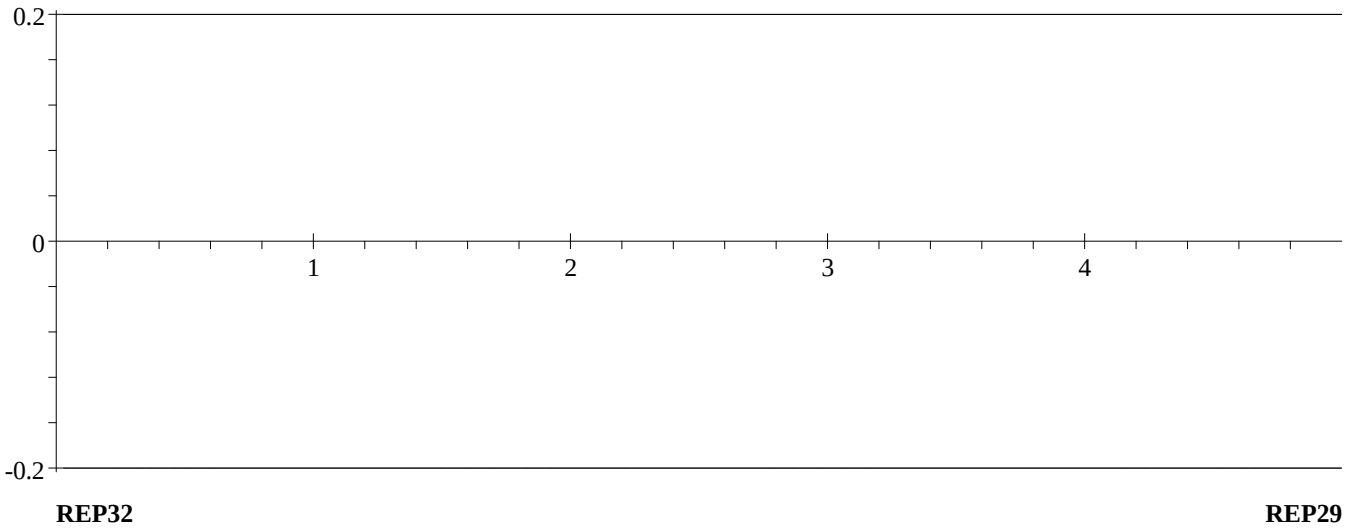

	GRESSWILLER **Q.CHASSEPOT -6RMAT** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Tronçon : **Tronçon n° 65** Opérateur : **HEIDT Jerome**


Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **mm**	Sens de l'écoulement **REP32 vers REP29**	Date d'inspection : **24 juillet 2025**
Matériau : **Béton**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP32 vers REP29**	Longueur inspectée : **0.00 m** Longueur mesurée : **N mesurée**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **836/837**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable





ABANDON INSPECTION

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q CHASSEPOT -6RMAT GRESSWILLER** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt n°REU10** Opérateur : **Heidt jerome**

Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**		Date d'inspection : **8 septembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REU 10 vers WC**	Longueur inspectée : **1.80 m** Longueur mesurée : **1.80 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT REU 10 VERS WC

Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/REU 10	838/839	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU 10	516
1.16 m/REU 10	840	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Angle 90°	516
1.80 m/REU 10	841	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - coude empêchant la progression de la caméra BDB - Remarque générale - contre sens non faisable pas d'accès	516

WC

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement :

Position : **dans**

GRESSWILLER **Q CHASSEPOT -6RMAT GRESSWILLER** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt n°REU10** Opérateur : **Heidt jerome**
Usage du réseau : **Eaux usées**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**		Date d'inspection : **8 septembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REU 10 vers WC**	Longueur inspectée : **1.80 m** Longueur mesurée : **1.80 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **838/839**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :


BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU 10



DISTANCE : **1.16 m**	PHOTO : **840**	VIDEO : **00:00:22**

OBSERVATIONS :

BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Angle 90°

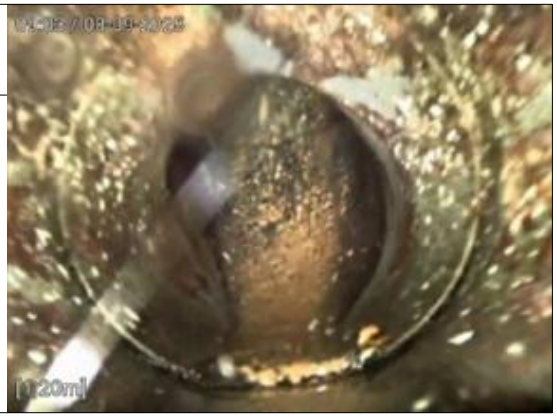

DISTANCE : **1.80 m**	PHOTO : **841**	VIDEO : **00:00:43**

OBSERVATIONS :

BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - coude empêchant la progression de la camér
BDB - Remarque générale - contre sens non faisable pas d'accès


ABANDON INSPECTION



GRESSWILLER		Dossier : **2403358-IT/02**
Q CHASSEPOT -6RMAT GRESSWILLER		Branchement : **Brt Séparateur A1**
Client : NEOCONCEPT VRD		Opérateur : **Heidt jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**150 mm**		**8 septembre 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **0.57 m**
Grès	**3.00 m**	**Séparateur vers A1**	Longueur mesurée : **0.57 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT Séparateur VERS A1



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/Séparateur	842/843	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	518
0.00 m/Séparateur	844/845	BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud Séparateur	518
0.00 m/Séparateur	846	BBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 10% BDB - Remarque générale - Séparateur hors cadre d'intervention - Photos prises sur demande du client	519
0.57 m/Séparateur	847	BACC - Effondrement total BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - contre sens non faisable	519

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement :

Position : **dans**

GRESSWILLER **Q CHASSEPOT -6RMAT GRESSWILLER** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt Séparateur A1** Opérateur : **Heidt jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**		Date d'inspection : **8 septembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Séparateur vers A1**	Longueur inspectée : **0.57 m** Longueur mesurée : **0.57 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **842/843**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection





DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **844/845**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud Séparateur





GRESSWILLER **Q CHASSEPOT -6RMAT GRESSWILLER** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt Séparateur A1** Opérateur : **Heidt jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**		Date d'inspection : **8 septembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Séparateur vers A1**	Longueur inspectée : **0.57 m** Longueur mesurée : **0.57 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **846**	VIDEO : **00:00:17**

OBSERVATIONS :

BBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 10%
BDB - Remarque générale - Séparateur hors cadre d'intervention - Photos prises sur demande du client



DISTANCE : **0.57 m**	PHOTO : **847**	VIDEO : **00:00:23**

OBSERVATIONS :

BACC - Effondrement total
BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - contre sens non faisable


ABANDON INSPECTION



GRESSWILLER **Q CHASSEPOT -6RMAT GRESSWILLER** **Client : NEOCONCEPT VRD**		Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt Séparateur A2** Opérateur : **Heidt jerome**

Usage du réseau :	Dim.(Ø ou HxL) :		Date d'inspection :
Eaux pluviales	**150 mm**		**8 septembre 2025**
Matériau :	Longueur tuyau :	Sens de l'inspection	Longueur inspectée : **2.29 m**
Grès	**3.00 m**	**Séparateur vers A2**	Longueur mesurée : **2.29 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT Séparateur VERS A2



Distance	Photo	Observations	Page
0.00 m/Séparateur	848/849	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	521
0.00 m/Séparateur	850/851	BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud Séparateur	521
2.29 m/Séparateur	852	BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - Séparateur hors cadre d'intervention - Photos p sur demande du client	522

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement :

Position : **dans**

GRESSWILLER **Q CHASSEPOT -6RMAT GRESSWILLER** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt Séparateur A2** Opérateur : **Heidt jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**		Date d'inspection : **8 septembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Séparateur vers A2**	Longueur inspectée : **2.29 m** Longueur mesurée : **2.29 m**

DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **848/849**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BDB - Remarque générale - départ d'inspection





DISTANCE : **0.00 m**	PHOTO : **850/851**	VIDEO : **00:00:00**

OBSERVATIONS :

BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud Séparateur






GRESSWILLER **Q CHASSEPOT -6RMAT GRESSWILLER** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt Séparateur A2** Opérateur : **Heidt jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **150 mm**		Date d'inspection : **8 septembre 2025**
Matériau : **Grès**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **Séparateur vers A2**	Longueur inspectée : **2.29 m** Longueur mesurée : **2.29 m**

DISTANCE : **2.29 m**	PHOTO : **852**	VIDEO : **00:01:17**

OBSERVATIONS :

BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - Séparateur hors cadre d'intervention - Photos prises sur demande du client


ABANDON INSPECTION

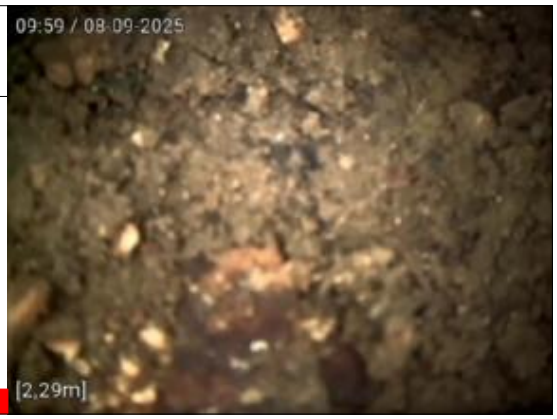

INERA GRAND EST	**GRESSWILLER** **Q CHASSEPOT -6RMAT GRESSWILLER** **Client : NEOCONCEPT VRD**	Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt 18.8** Opérateur : **Heidt jerome**

Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **8 septembre 2025**
Matériau : **Type non identifié de**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 18.8 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.77 m** Longueur mesurée : **0.77 m**

SYNTHESE DU BRANCHEMENT REP 18.8 VERS Collecteur



Distance	Photo	Observations	Page
0.13 m/REP 18.8	853/854	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.8	524
0.43 m/REP 18.8	855	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	524
0.77 m/REP 18.8	856	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 160mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	524

Observations générales :

SITUATION / POSITIONNEMENT

Surface : **sous un bâtiment permanent**	Météo : **Pas de précipitations**	I.T.V. avec obturateur ☐

Collecteur de raccordement :

Position : **dans**

GRESSWILLER **Q CHASSEPOT -6RMAT GRESSWILLER** **Client : NEOCONCEPT VRD**			Dossier : **2403358-IT/02** Branchement : **Brt 18.8** Opérateur : **Heidt jerome**
Usage du réseau : **Eaux pluviales**	Dim.(Ø ou HxL) : **160 mm**		Date d'inspection : **8 septembre 2025**
Matériau : **Type non identifié de**	Longueur tuyau : **3.00 m**	Sens de l'inspection **REP 18.8 vers Collecteur**	Longueur inspectée : **0.77 m** Longueur mesurée : **0.77 m**

DISTANCE : **0.13 m**	PHOTO : **853/854**	VIDEO : **00:00:05**

OBSERVATIONS :

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.8





DISTANCE : **0.43 m**	PHOTO : **855**	VIDEO : **00:00:21**

OBSERVATIONS :

BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas



DISTANCE : **0.77 m**	PHOTO : **856**	VIDEO : **00:00:27**

OBSERVATIONS :

BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 160mm
BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur



SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
REU1 vers REU2	200	14.90 m	Eaux usées	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	5
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU1 Niveau d'eau trouble de 20%	5
					5.70	BDA - Photographie générale - emboitement correct Niveau d'eau trouble de 20%	6
					11.19	BAJC - Déviation angulaire BAIAA - Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation Niveau d'eau trouble de 10%	6
					12.46	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente Niveau d'eau trouble de 10%	7
					14.43	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU2 Niveau d'eau trouble de 10%	7
					14.90	DCAZ - Autre type de raccordement à 9h - Conduite de raccordement 160 BAHD - La conduite de raccordement est endommagée Niveau d'eau trouble de 10%	7
					14.90	BDB - Remarque générale - fin d'inspection Niveau d'eau trouble de 10%	8
REU2 vers REU3	200	7.47 m	Eaux usées	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	12
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU2	12
					3.18	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente	12
					3.67	BALF - Trou dans le matériau de réparation - Longueur de 60mm	13
					7.23	BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut	13
					7.23	BAKGB - Détachement du revêtement intérieur situé sur la circonférence de la condu	13
					7.47	BAKGA - Revêtement intérieur détaché parallèlement à l'axe de la conduite de 11h à	13
					7.47	BDCZ- - Inspection abandonnée - Autre - Coude empêchant la progression de la caméra, reprise de l'inspection en sens inverse	14
REU3 vers REU2	200	25.71 m	Eaux usées	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - Reprise de l'inspection à contresens BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU3 - caméra poussée po cause d 'accès	17
					14.13	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente	17
					25.71	BDCZD - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale non terminée suite une inspection partielle précédente - Limite matériel atteinte - Contresens non atteint BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	17
REU3 vers Beu 1	160	4.96 m	Eaux usées	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU3	19
					4.00	BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut	19
					4.96	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspect - Référence du noeud Beu1	19
REU8 vers REU9	200	63.67 m	Eaux usées	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	23
					0.42	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU8	23
					1.49	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon Niveau d'eau trouble de 10%	23
					29.07	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon Niveau d'eau trouble de 10%	24
					60.74	BDA - Photographie générale - emboitement correct Niveau d'eau trouble de 10%	24
					63.01	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU9 Niveau d'eau trouble de 10%	25
					63.67	BDB - Remarque générale - fin d'inspection Niveau d'eau trouble de 10%	25
REU7 vers REU8	200	36.46 m	Eaux usées	Fonte			

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	29
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU7	29
					0.50	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon Niveau d'eau trouble de 5%	29
					15.55	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon Niveau d'eau trouble de 5%	30
					35.74	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU8 Niveau d'eau trouble de 5%	30
					36.46	BDB - Remarque générale - fin d'inspection Niveau d'eau trouble de 5%	30
REU7 vers REU6	200	5.54 m	Eaux usées	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	34
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU7	34
					0.50	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente	34
					1.60	BDA - Photographie générale - emboitement correct	35
					5.03	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU6	35
					5.54	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	36
REU6 vers REU5	200	10.23 m	Eaux usées	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	40
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU6	40
					10.23	BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10% BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - curage a reprenc	40
REU6 vers REU5	200	74.10 m	Eaux usées	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection BDB - Remarque générale - contre visite après curage	44
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU6	44
					1.40	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon	44
					16.54	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon	45
					28.14	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente	45
					46.10	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - réseau en charge	45
					66.16	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon	45
					73.45	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REU5	46
					74.10	DACA - Rupture de 6h à 9h - Longueur de 100mm	46
					74.10	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	46
REU5 vers REU4	200	3.33 m	Eaux usées	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU5 - caméra poussée po cause d 'accès BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 15% - poste de relevage en charge	49
					2.50	BDGA - Perte de visibilité par immersion de la caméra BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 30%	49
					3.33	BDCBZ - Inspection abandonnée à cause d'un niveau d'eau trop élevé - Autre - réseau en charge BDB - Remarque générale - contre sens non faisable poste en charge BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	50
REU10 vers REU11	150	25.38 m	Eaux usées	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU10	53
					8.12	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon	53
					18.67	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - début	53
					19.58	BDGA - Perte de visibilité par immersion de la caméra BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 50% - point bas flache	54
					24.79	BDDC - Niveau d'eaux troubles - fin	54
					25.38	BDCZ- - Inspection abandonnée - Autre - limite matériel atteint, reprise de l'inspectio en sens inverse	54

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
REU11 vers REU10	150	4.75 m	Eaux usées	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - Reprise de l'inspection à contresens	57
						BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU11	
					3.16	BAFBE - Dégradation de surface, écaillage sans cause évidente - sur l 'ensemble du tronçon	57
					4.75	BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à un inspection partielle précédente - Contresens atteint	57
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	
REP1 vers REP2	200	25.26 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	61
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP1	61
					5.86	BAIAA - Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation à 9h	62
						BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	
					6.02	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	62
					6.39	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	63
						BAJA - Deboîtement (longitudinal) à 9h	
						BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 15%	
					7.97	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 3h - Largeur de 1mm	63
					24.10	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	64
						BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 20%	
					24.45	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	64
						BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 50%	
					25.26	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP2	65
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	
G4 vers Collecteur	200	6.59 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G4	67
					5.59	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	67
						BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10%	
					6.59	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	67
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G4 vers Collecteur	200	6.21 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G4 - contre visite aprè curage	69
					5.78	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	69
					6.21	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	69
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G3 vers Collecteur	200	5.88 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G3	71
					4.79	BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 70%	71
					5.88	BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - dépots empêcha la progression de la caméra	71
G3 vers Collecteur	200	5.97 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G3 - contre visite aprè curage	73
					0.40	BAJA - Deboîtement (longitudinal)	73
					5.94	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	73
					5.97	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	74
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G2 vers Collecteur	200	6.31 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G2	76
					5.72	BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	76
					5.95	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	76
					6.31	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	77
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G2 vers Collecteur	200	6.02 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G2 - contre visite aprè curage	79
					5.49	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	79
					6.02	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	79
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G1 vers Collecteur	200	6.57 m	Eaux pluviales	Grès			

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G1	81
					6.10	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	81
					6.57	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	81
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G1 vers Collecteur	200	6.53 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G1 - contre visite aprè curage	83
					6.20	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	83
					6.53	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	83
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
REP1 vers REP3	200	15.01 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	87
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 1	87
					8.01	BAIAA - Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation	88
					9.14	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	88
						BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	
					9.46	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	89
						BBCA - Dépôt de matériau fin à 3h - Epaisseur du dépôt de 30%	
					14.58	BACB - Effondrement partiel	89
					15.01	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - effondrement partiel risquant de bloquer l caméra	90
						BDB - Remarque générale - contre sens non faisable ,regard bloqué	
G6 vers Collecteur	200	6.52 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G6	92
					0.00	BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 30%	92
					5.97	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	93
					6.52	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	93
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G6 vers Collecteur	200	6.29 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G6 - contre visite aprè curage	95
					4.50	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	95
					5.91	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	95
					6.29	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	96
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G5 vers Collecteur	200	6.32 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G5	98
					5.59	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	98
					6.32	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	98
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G8 vers Collecteur	200	0.00 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Inaccessible	100
G7 vers Collecteur	200	6.73 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G7	102
					6.06	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	102
					6.73	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	102
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
REP1 vers REP4	250	27.60 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	106
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP1	106
					5.80	BABCA - Fissure longitudinale ouverte - Largeur de 1mm - 5h,6h	107
					6.86	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 6h - Largeur de 1mm - fin	107
					17.13	BDA - Photographie générale - emboitement correct	108
					22.56	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 5% - Début de flache	108
					24.31	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - point bas flache	108
					27.20	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP4	109
					27.60	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	109
REP4 vers REP 5	200	25.75 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	113
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 4	113
					5.89	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	114

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
						BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	
					6.80	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	114
						BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 30%	
					24.09	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	115
						BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	
					24.90	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	115
						BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	
					25.20	BAJB - Décentrage (radial) - Distance de 3mm	116
					25.25	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 5 - visible à 0.5	116
					25.75	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	116
G12 vers Collecteur	200	6.15 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G12	118
					5.55	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	118
					6.15	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	118
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G11 vers Collecteur	200	6.22 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G11	120
					0.00	BACA - Rupture	120
					5.30	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	120
					6.22	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	121
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G10 vers Collecteur	200	6.55 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G10	123
					3.81	BABCC - Fissure complexe ouverte - Largeur de 2mm	123
					5.96	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	123
					6.55	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	124
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G9 vers Collecteur	200	6.39 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G9	126
						BDB - Remarque générale - erreur d 'incrustation distance	
					5.71	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	126
					6.39	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	126
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
REP4 vers REP 6	200	29.02 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	130
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP4	130
					9.16	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	131
						BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	
					9.72	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	131
						BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	
					14.36	BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert à 3h - Hauteur 150mm	132
						BAHD - La conduite de raccordement est endommagée	
					26.32	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	132
						BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	
					26.84	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	133
						BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 30%	
					28.10	BABCC - Fissure complexe ouverte de 4h à 6h - Largeur de 2mm	133
					28.62	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP6	134
					29.02	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	134
G13 vers Collecteur	200	0.00 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Inaccessible	136
G16 vers Collecteur	200	0.00 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Inaccessible	138
G15 vers Collecteur	200	6.78 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G15	140
					4.15	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 11h - Largeur de 1mm	140
					5.15	BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 5% - Début	140
					5.31	BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 10% - point bas flache	141
					6.23	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	141
					6.78	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	141
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G14 vers Collecteur	200	0.00 m	Eaux pluviales	Grès			

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Inaccessible	143
REP7 vers REP8	200	26.54 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	147
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP7	147
					5.28	BAJB - Décentrage (radial)	148
					6.41	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	148
					7.04	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm BAJA - Deboîtement (longitudinal)	149
					24.61	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	149
					24.99	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm BAJA - Deboîtement (longitudinal)	150
					26.32	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 8	150
					26.54	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	151
G17 vers Collecteur	200	6.01 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G17	153
					5.59	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas BAJA - Deboîtement (longitudinal)	153
					6.01	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	153
G18 vers Collecteur	200	0.30 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G18	155
					0.30	BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 70% BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - dépots empêcha la progression de la caméra	155
G18 vers Collecteur	200	6.66 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G18 - contre visite ap curage	157
					0.80	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - Début de flache	157
					2.28	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 30% - point bas flache BDGA - Perte de visibilité par immersion de la caméra	157
					4.05	BDDC - Niveau d'eaux troubles - fin de flache	158
					6.13	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	158
					6.66	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	158
G19 vers Collecteur	200	6.56 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G19	160
					6.02	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	160
					6.56	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	160
G20 vers Collecteur	200	6.99 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G20	162
					5.83	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas BACA - Rupture à 9h - Longueur de 50mm	162
					6.99	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	162
REP7 vers REP9	200	28.77 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	166
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP7	166
					1.89	BAIAD - Anneau d'étanchéité pénétrant et rompu à 10h	167
					8.96	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	167
					9.54	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	168
					24.91	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	168
					25.70	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	169
					28.52	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP9	169
					28.77	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	170
G21 vers Collecteur	200	6.63 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G21	172
					2.06	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	172
					6.03	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	172
					6.63	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	173

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G22 vers Collecteur	200	1.04 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G22	175
					1.04	BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 40%	175
						BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - effondrement empêchant la progression de la caméra	
G22 vers Collecteur	200	7.14 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G22 - contre visite ap curage	177
					5.09	BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 5% - Début	177
					5.88	BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 10% - point bas flache	177
					6.52	BDDA - Niveau d'eaux claires - fin	178
					6.60	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	178
					7.14	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	178
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G24 vers Collecteur	200	6.38 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G24	180
					5.88	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	180
					6.38	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	180
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G23 vers Collecteur	200	6.91 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G23	182
					0.64	BAJA - Deboîtement (longitudinal)	182
					1.16	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - début	182
					1.30	BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 15% - point bas flache	183
					2.04	BDDC - Niveau d'eaux troubles - fin de flache	183
					6.43	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	183
					6.91	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	183
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
REP7 vers REP4	250	27.76 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	187
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP7	187
					8.31	BDA - Photographie générale - emboitement correct	188
					22.29	BAJB - Décentrage (radial)	188
					27.33	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP4	189
					27.76	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	189
REP7 vers REP10	300	12.93 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	193
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP7	193
					9.71	BDA - Photographie générale - emboitement correct	194
					12.46	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	194
					12.93	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - coude empêchant la progression de la cam	194
REP10 vers REP7	300	5.38 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP10 - reprise de l inspection après curage en contresens	197
					4.82	BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut	197
					5.38	BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à un inspection partielle précédente - Contresens atteint	197
						BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection	
REP 11 vers REP12	250	24.97 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	201
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP11	201
					3.98	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	202
					4.53	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	202
					14.71	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 2mm	203
					22.85	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	203
					23.67	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	204
					24.65	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP12	204
					24.97	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	205
G25 vers Collecteur	200	7.55 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G25	207

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					6.94	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	207
					7.48	BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 20%	207
					7.55	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	208
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G25 vers Collecteur	200	6.37 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G25 - contre visite apr curage	210
						BDB - Remarque générale - erreur d 'incrustation distance	
					4.95	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	210
					6.37	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	210
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G27 vers Collecteur	200	7.48 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G27	212
					1.75	BABCC - Fissure complexe ouverte à 11h - Largeur de 1mm	212
					6.69	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	212
					7.48	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	213
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G26 vers Collecteur	200	4.89 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G26	215
					4.18	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	215
					4.89	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	215
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G28 vers Collecteur	200	5.32 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G28	217
					4.76	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	217
					5.10	BAJA - Deboîtement (longitudinal)	217
						BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 5%	
					5.32	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	218
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
REP 11 vers REP13	200	29.99 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	222
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 11	222
					9.51	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	223
						BBCA - Dépôt de matériau fin - Epaisseur du dépôt de 10%	
					10.09	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	223
					15.50	BAIAA - Anneau d'étanchéité visiblement déplacé mais ne dépassant pas dans la canalisation à 9h	224
					25.54	BAJB - Décentrage (radial)	224
					26.65	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	225
					27.23	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	225
					29.56	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	226
					29.71	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP13	226
					29.99	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	227
G29 vers Collecteur	200	7.34 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G29	229
					6.92	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	229
					7.34	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	229
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G31 vers Collecteur	200	8.00 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G31	231
					0.23	BAJA - Deboîtement (longitudinal) de 5h à 11h - Distance de 50mm	231
					8.00	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	231
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G30 vers Collecteur	200	5.14 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G30	233
					4.43	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	233
					5.14	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	233
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G32 vers Collecteur	200	4.96 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G32	235
					3.23	BDA - Photographie générale	235
					4.96	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	235

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
REP 11 vers REP14	250	24.02 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	239
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP11	239
					8.39	BDA - Photographie générale	239
					22.93	BAJB - Décentrage (radial)	240
					23.68	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP14	240
					24.02	DCAZ - Autre type de raccordement à 3h - Conduite de raccordement 200	241
					24.02	DCAZ - Autre type de raccordement à 9h - Conduite de raccordement 200	241
					24.02	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	241
REP14 vers REP16	200	24.28 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	245
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP14	245
					4.03	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	246
						BAJA - Deboîtement (longitudinal) à 9h	
					6.56	BABCA - Fissure longitudinale ouverte - Largeur de 1mm - 6h,7h	246
					22.62	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 200mm	247
					23.88	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	247
					24.06	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP16	248
					24.28	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	248
G34 vers Collecteur	200	4.98 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G34	250
					4.70	BCCBB - Courbure du collecteur vers la droite et vers le bas	250
					4.98	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	250
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
REP14 vers REP17	200	29.20 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	254
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP14	254
					2.80	BABCE - Fissure radiale ouverte à partir d'un point (en étoile) - Largeur de 1mm	255
					4.66	BAJB - Décentrage (radial)	255
					9.88	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	256
						BAJA - Deboîtement (longitudinal)	
					26.88	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 3h - Hauteur 200mm	256
					28.93	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP17	257
					29.20	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	257
G33 vers Collecteur	200	4.57 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G33	259
					2.24	BABCC - Fissure complexe ouverte de 9h à 3h - Largeur de 1mm	259
					4.22	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	259
					4.57	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	260
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
G35 vers Collecteur	200	5.53 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud G35	262
					4.63	BDA - Photographie générale	262
					5.53	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 200mm	262
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	
REP14 vers REP15	200	30.01 m	Eaux pluviales	Grès			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	266
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP14	266
					1.36	BAJB - Décentrage (radial) - sur l'ensemble du tronçon	266
					12.14	BAJB - Décentrage (radial) - sur l'ensemble du tronçon	267
					29.98	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP15 - en chute	267
					30.01	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	267
REP19 vers REP18	400	27.16 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	271
						BDB - Remarque générale - erreur d 'incrustation REP19-->REP18	
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP19	271
					12.26	BDA - Photographie générale - emboitement correct	272
					27.15	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18 - en chute	272
					27.16	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	273
REP19 vers AV1	160	9.73 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP19	275

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					0.00	BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut	275
					3.71	BACA - Rupture à 2h - Longueur de 300mm	275
					5.36	BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut	276
					9.73	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV1 - Grille avaloir	276
REP15 vers REP18	500	15.41 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	280
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP15	280
					0.50	BAFCZ - Dégradation de surface, granulats exposés - Autres causes à 6h	280
					1.50	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 12h - Largeur de 1mm - début	281
					9.41	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 12h - Largeur de 1mm - fin	281
					13.81	BABCB - Fissure circonférentielle ouverte - Largeur de 1mm	281
					14.58	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18	282
					15.41	DCAZ - Autre type de raccordement - Conduite de raccordement 400 - 3h,6h	282
					15.41	DCAZ - Autre type de raccordement à 6h - Conduite de raccordement 300	282
					15.41	DCAZ - Autre type de raccordement à 11h - Conduite de raccordement 200	283
					15.41	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	283
REP18 vers REP20	500	15.58 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	287
					0.46	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP18	287
					9.02	BDA - Photographie générale - emboitement correct	288
					15.11	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP20	288
					15.58	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	289
REP19.1 vers REP19	300	5.86 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 19.1	292
					2.51	BDA - Photographie générale - emboitement correct	292
					5.86	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 19	292
REP19.1 vers REP19.	160	19.88 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 19.1	295
					14.68	BDA - Photographie générale - emboitement correct	295
					19.88	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP19.2	295
REP19.2 vers REP19.	300	16.34 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 19.2	298
					10.85	BDA - Photographie générale - emboitement correct	298
					16.34	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 19.3	298
REP46 vers REP47	600	27.60 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	302
					0.00	DCAZ - Autre type de raccordement à 9h - Conduite de raccordement 300 - Emplacement : cunette	302
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP46	302
					0.45	BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation à 12h - Réduction c la section de 10%	303
					6.76	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 12h - Largeur de 1mm - début	303
					8.48	BABCA - Fissure longitudinale ouverte à 12h - Largeur de 1mm	303
					14.30	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm	304
					26.73	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP47	304
					27.60	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	305
Brt G0 vers Collecteur	160	0.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Pas d 'accès	307
Brt G0.1 vers collecteur	160	0.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - pas de sortie en aval	309
Brt G0.2 vers Collecteur	160	0.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - pas de sortie en aval	311
Brt G0.3 vers Collecteur	160	0.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Pas de sortie en aval	313
REP44 vers AV6	160	0.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Pas de piquage dans regard	315
REP45 vers AV7	160	0.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	DARE - Cadre déboîté BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - Pas de piquage dans regard	317
REP47 vers REP10	600	18.82 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	321

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					0.32	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP47	321
					2.67	BDDA - Niveau d'eaux claires - Niveau 5% - début	321
					9.90	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm	322
					13.81	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm	322
					17.37	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm	323
						BAAA - Réduction verticale de la section de la canalisation - Réduction de 8.3%	
					18.63	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP10	323
					18.82	DCAZ - Autre type de raccordement à 3h - Conduite de raccordement 300 - Emplacement : cunette	324
					18.81	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	324
REP18 vers REP18.1	400	10.97 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18 - caméra poussée pour cause d 'accès	327
					9.79	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm	327
					10.97	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18.1	327
REP 18.2 vers REP18.1	300	1.87 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.2	330
					0.85	BAFAE - Dégradation de surface, rugosité accrue sans cause évidente	330
					1.87	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 18.1	330
REP18.3 vers REP 18.2	160	16.59 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.3	333
					9.91	BDA - Photographie générale - emboitement correct	333
					16.59	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18.2	333
REP18.3 vers REP18.	300	16.58 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BCDB - Chambre d'inspection de départ - Référence du noeud REP18.3	336
					11.16	BDA - Photographie générale - emboitement correct	336
					16.58	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP18.4	336
REP 18.5 vers REP18	300	8.48 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.5	339
					2.20	BDA - Photographie générale - emboitement correct	339
					8.48	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 18 - en chute	339
REP 18.6 vers REP 18.5	160	20.98 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP18.6	342
					1.39	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	342
					1.83	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 160mm	342
					19.19	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm	343
					20.98	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 18.5	343
REP 18.7 vers REP 18.6	160	15.21 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.7	346
					0.22	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	346
					11.02	BAAB - Réduction horizontale de la section de la canalisation - Réduction de 4.2%	346
					15.21	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP 18.6	347
						BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm	
REP18 vers Amont 1	160	6.39 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP18	350
					5.64	BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut	350
					6.39	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - coude empêchant la progression de la cam	350
REP23 vers REP24	400	39.58 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	354
					0.41	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP23	354
					12.27	BDA - Photographie générale - emboitement correct	355
					39.19	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP24	355
					39.58	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	356
REP22 vers REP23	400	9.91 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	360
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP22	360
					6.07	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 9h - Hauteur 160mm	361
					9.29	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP23	361

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					9.91	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	362
REP22 vers REP20	400	35.63 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	366
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP22	366
					14.76	BDA - Photographie générale - emboitement correct	367
					35.63	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP20 - en chute	367
					35.63	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	368
REP42 vers REP21	1200	30.33 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	372
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP42	372
					9.95	BCADA - Raccordement par piquage direct carotté - Ouvert à 12h - Hauteur 160mm	373
					29.75	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP21	373
					30.33	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	374
REP21 vers REP25	1200	6.66 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	378
					0.49	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R5EP21	378
					2.32	BDA - Photographie générale - emboitement correct	379
					6.28	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP25	379
					6.66	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	380
REP20 vers REP25	600	6.53 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	384
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP20	384
					3.32	BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	384
					4.23	BDA - Photographie générale BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	385
					5.64	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP25 BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	385
					6.53	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	385
REP20 vers REP25	1200	6.13 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection BDB - Remarque générale - contre essais après curage complémentaire	389
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP20	389
					2.90	BDA - Photographie générale - emboitement correct	390
					5.95	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP25	390
					5.95	DACA - Rupture à 7h - Longueur de 200mm	391
					6.13	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	391
REP25 vers REP26	1200	34.41 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	395
					0.79	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP25	395
					13.62	BDA - Photographie générale - emboitement correct	396
					33.79	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP26	396
					34.41	DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 9h - Diam./Hauteur 400mm - Emplacement : cheminée	397
					34.41	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	397
REP26 vers REP27	1200	37.56 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	401
					0.96	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP26	401
					13.66	BDA - Photographie générale - emboitement correct	402
					30.45	BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10%	402
					37.32	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP27	403
					37.56	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	403
REP26 vers REP27	1200	37.12 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection BDB - Remarque générale - contre visite après curage complémentaire	407
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP26 Niveau d'eau claire de 5%	407
					12.10	BDA - Photographie générale - emboitement correct Niveau d'eau claire de 5%	408
					27.01	BDA - Photographie générale - emboitement correct Niveau d'eau claire de 5%	408
					36.40	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP27 Niveau d'eau claire de 5%	409

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					37.12	BDB - Remarque générale - fin d'inspection Niveau d'eau claire de 5%	409
REP26.1 vers REP26	400	22.73 m	Eaux pluviales	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	413
					0.00	DACB - Effondrement partiel à 12h - Longueur de 300mm	413
					0.00	DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 1h - Diam./Hauteur 160mm	413
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP26.1	414
					4.85	BDA - Photographie générale - emboitement correct	414
					16.89	BDA - Photographie générale - emboitement correct	415
					22.73	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP26 - en chute	415
					22.73	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	416
REP26.1 vers Br26.1	160	0.00 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 26.1	418
					0.00	BACC - Effondrement total BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - effondrement empêchant la progression de la caméra	418
REP27 vers REP28	1200	6.76 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	422
					0.53	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP27 Niveau d'eau claire de 5%	422
					3.50	BDA - Photographie générale - emboitement correct Niveau d'eau claire de 5%	423
					6.30	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP28 Niveau d'eau claire de 5%	423
					6.76	BDB - Remarque générale - fin d'inspection Niveau d'eau claire de 5%	424
Brt AV 2 vers REP 41	160	3.55 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41	426
					2.15	BCCAA - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le haut	426
					3.55	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV2 - Grille avaloir	426
Brt AV 3 vers REP 41	160	9.93 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41	428
					1.29	BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut	428
					8.49	BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut	428
					9.93	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV3 - Grille avaloir	429
Brt AV 4 vers REP 41	160	21.31 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41	431
					7.10	BCCBA - Courbure du collecteur vers la droite et vers le haut	431
					21.31	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV4 - Siphon de sol	431
REP28 vers REP29	1200	14.19 m	Eaux pluviales	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	435
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP28	435
					6.19	BDA - Photographie générale - emboitement correct	436
					14.18	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - désableure	436
					14.19	BBCB - Dépôt de matériau grossier - Epaisseur du dépôt de 10% - nettoyage de l'ouvrage préconisé	437
					14.19	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud REP 29 BDB - Remarque générale - fin d'inspection	437
REP41 vers REP43	300	21.70 m	Eaux pluviales	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	441
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41	441
					6.84	BDA - Photographie générale - emboitement correct	442
					21.63	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP43	442
					21.70	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	443
REP41 vers REP40	400	37.57 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	447
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP41	447
					18.63	BDA - Photographie générale - emboitement correct	448
					28.97	BBHZA - Présence de vermine dans la canalisation - souris	448
					36.95	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP40	449

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					37.57	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	449
REP40 vers REP39	400	5.22 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	453
					0.00	DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 3h - Diam./Hauteur 160mm	453
					0.00	DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 9h - Diam./Hauteur 400mm	453
					0.33	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP40	454
					1.92	BDA - Photographie générale - emboitement correct	454
					4.89	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP39	455
					5.22	DCGAA - Conduite de raccordement circulaire aboutissant dans le regard à 9h - Diam./Hauteur 160mm	455
					5.22	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	455
REP 40.1 vers REP40	400	6.54 m	Eaux pluviales	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	459
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP40.1	459
					4.95	BDA - Photographie générale - emboitement correct	460
					6.47	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP40 - en chute	460
					6.54	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	461
REP 39 vers Brt AV8	160	4.41 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP39	463
					2.88	BDA - Photographie générale - emboitement correct	463
					4.41	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV8 - Grille avaloir	463
REP 40 vers Brt AV5	160	0.58 m	Eaux pluviales	PVC-U			
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 40	465
					0.00	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut	465
					0.58	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud AV5 - Grille avaloir	465
REP39 vers REP38	600	21.47 m	Eaux pluviales	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	469
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 39	469
					6.10	BDA - Photographie générale - emboitement correct	470
					20.89	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP38	470
					21.47	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	471
REP38 vers REP28	600	9.22 m	Eaux pluviales	Fonte			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	475
					0.34	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP38	475
					5.95	BDA - Photographie générale - emboitement correct	476
					8.91	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP28	476
					9.22	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	477
REP31 vers Bassin	800	7.18 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	481
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP31	481
					4.38	BDA - Photographie générale - emboitement correct	482
					7.18	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud Bassin - en chute	482
					7.18	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	483
REP36 vers REP37	1200	4.58 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	487
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP36	487
					2.02	BDA - Photographie générale - emboitement correct	488
					4.55	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud REP37	488
					4.58	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	489
REP36 vers REP 35	800	3.27 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	493
					0.50	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP36	493
					1.50	BDA - Photographie générale	493
					2.87	BCEZ - Ouvrage spécial d'arrivée - Référence du noeud REP35	494
					3.27	BDB - Remarque générale - fin d'inspection	494
REP 33 vers REP34		0.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable	498
REP34 vers REP 35		0.00 m	Eaux pluviales	Béton			
					0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable	502
REP 30 vers REP29		0.00 m	Eaux pluviales	Béton			

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
					0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable	506
REP29 vers REP31		-9.02 m	Eaux pluviales	Béton	-9.02	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable, nettoyage précon	510
REP32 vers REP29		0.00 m	Eaux pluviales	Béton	0.00	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - ouvrage non inspectable	514
REU 10 vers WC	150	1.80 m	Eaux usées	Grès	0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REU 10	516
					1.16	BCC-A - Courbure du collecteur vers le haut - Angle 90°	516
					1.80	BDCZZ - Inspection abandonnée - Autre - coude empêchant la progression de la cam	516
						BDB - Remarque générale - contre sens non faisable pas d'accès	
Séparateur vers A1	150	0.57 m	Eaux pluviales	Grès	0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	518
					0.00	BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud Séparateur	518
					0.00	BBCC - Dépôt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépôt de 10%	519
						BDB - Remarque générale - Séparateur hors cadre d'intervention - Photos prises sur demande du client	
					0.57	BACC - Effondrement total	519
						BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - contre sens non faisable	
Séparateur vers A2	150	2.29 m	Eaux pluviales	Grès	0.00	BDB - Remarque générale - départ d'inspection	521
					0.00	BCDZ - Ouvrage spécial de départ - Référence du noeud Séparateur	521
					2.29	BDCAZ - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Autre - Séparateur hors cadre d'intervention - Photos prises sur demande du client	522
REP 18.8 vers Collecteur	160	0.77 m	Eaux pluviales	Type non identifié de plastique	0.13	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud REP 18.8	524
					0.43	BCCAB - Courbure du collecteur vers la gauche et vers le bas	524
					0.77	BCAAA - Raccordement par culotte - Ouvert - Hauteur 160mm	524
						BDB - Remarque générale - arrivée à la jonction du collecteur	

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	REU1 > REU2	REU2 > REU3	REU3 > REU2	REU3 > Beu 1	REU8 > REU9	REU7 > REU8	REU7 > REU6	REU6 > REU5
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø160	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	14.90 m	7.47 m	56.30 m	4.96 m	63.67 m	36.46 m	5.54 m	10.23 m
Longueur inspectée :	14.90 m	7.47 m	25.71 m	4.96 m	63.67 m	36.46 m	5.54 m	10.23 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / - / -	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement			X					
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage	1	1	1		2	2	1	
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée	1							
• BAIA Anneau d'étanchéité	1							
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								
• BAJB Décentrage (radial)								
• BAJC Déviation angulaire	1							
• BAKG Détachement du revêtement intérieur		2						
• BALF Trou dans le matériau de réparation		1						
• BBCA Dépôt de matériau fin								
• BBCB Dépôt de matériau grossier								1
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur				1				
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche				1				
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite		1						
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement	1							

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	REU6 > REU5	REU5 > REU4	REU10 > REU11	REU11 > REU10	REP1 > REP2	G4 > Collecteur	G4 > Collecteur	G3 > Collecteur
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	74.10 m	3.33 m	25.38 m	4.75 m	25.26 m	6.59 m	6.21 m	5.88 m
Longueur inspectée :	74.10 m	3.33 m	25.38 m	4.75 m	25.26 m	6.59 m	6.21 m	5.88 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	4 / 0 / 0	1 / - / -	1 / - / -	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte					2			
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage	4		1	1				
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité					1			
• BAJA Deboîtement (longitudinal)					1			
• BAJB Décentrage (radial)								
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin					3			1
• BBCB Dépôt de matériau grossier								
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite						1	1	
• DACA Rupture	1							
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	G3 > Collecteur	G2 > Collecteur	G2 > Collecteur	G1 > Collecteur	G1 > Collecteur	REP1 > REP3	G6 > Collecteur	G6 > Collecteur
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	5.97 m	6.31 m	6.02 m	6.57 m	6.53 m	29.95 m	6.52 m	6.29 m
Longueur inspectée :	5.97 m	6.31 m	6.02 m	6.57 m	6.53 m	15.01 m	6.52 m	6.29 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	1 / - / -	1 / - / -	1 / - / -	1 / - / -	1 / - / -	2 / 0 / 0	1 / - / -	1 / - / -
• Tronçon visité incomplètement						X		
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte								1
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel						1		
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité						1		
• BAJA Deboîtement (longitudinal)	1							
• BAJB Décentrage (radial)								
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin		1				2	1	
• BBCB Dépôt de matériau grossier								
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche		1	1	1	1		1	1
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1							
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	G5 > Collecteur	G8 > Collecteur	G7 > Collecteur	REP1 > REP4	REP4 > REP 5	G12 > Collecteur	G11 > Collecteur	G10 > Collecteur
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø250	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	6.32 m	0.00 m	6.73 m	27.60 m	25.75 m	6.15 m	6.22 m	6.55 m
Longueur inspectée :	6.32 m	0.00 m	6.73 m	27.60 m	25.75 m	6.15 m	6.22 m	6.55 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	1 / - / -	0 / - / -	1 / - / -	0 / 0 / 0	4 / 0 / 0	1 / - / -	1 / - / -	1 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte				2				1
• BACA Rupture							1	
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité								
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								
• BAJB Décentrage (radial)					1			
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin					1			
• BBCB Dépôt de matériau grossier					3			
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche						1	1	
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1		1					1
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	G9 > Collecteur	REP4 > REP 6	G13 > Collecteur	G16 > Collecteur	G15 > Collecteur	G14 > Collecteur	REP7 > REP8	G17 > Collecteur
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	6.39 m	29.02 m	0.00 m	0.00 m	6.78 m	0.00 m	26.54 m	6.01 m
Longueur inspectée :	6.39 m	29.02 m	0.00 m	0.00 m	6.78 m	0.00 m	26.54 m	6.01 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	1 / - / -	5 / 0 / 0	0 / - / -	0 / - / -	1 / - / -	0 / - / -	4 / 0 / 0	1 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte		1			1			
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée		1						
• BAIA Anneau d'étanchéité								
• BAJA Deboîtement (longitudinal)							2	1
• BAJB Décentrage (radial)							1	
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin		3						
• BBCB Dépôt de matériau grossier		1						
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche					1			
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1							1
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	G18 > Collecteur	G18 > Collecteur	G19 > Collecteur	G20 > Collecteur	REP7 > REP9	G21 > Collecteur	G22 > Collecteur	G22 > Collecteur
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	0.30 m	6.66 m	6.56 m	6.99 m	28.77 m	6.63 m	1.04 m	7.14 m
Longueur inspectée :	0.30 m	6.66 m	6.56 m	6.99 m	28.77 m	6.63 m	1.04 m	7.14 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	1 / - / -	1 / - / -	1 / - / -	4 / 0 / 0	1 / - / -	0 / - / -	1 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte						1		
• BACA Rupture				1				
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité					1			
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								
• BAJB Décentrage (radial)								
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin					1		1	
• BBCB Dépôt de matériau grossier	1				1			
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche		1				1		1
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite			1	1				
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	G24 > Collecteur	G23 > Collecteur	REP7 > REP4	REP7 > REP10	REP10 > REP7	REP 11 > REP12	G25 > Collecteur	G25 > Collecteur
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø250	Ø300	Ø300	Ø250	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	6.38 m	6.91 m	27.76 m	12.93 m	5.38 m	24.97 m	7.55 m	6.37 m
Longueur inspectée :	6.38 m	6.91 m	27.76 m	12.93 m	5.38 m	24.97 m	7.55 m	6.37 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	1 / - / -	1 / - / -	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	4 / 0 / 0	1 / - / -	1 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte						1		
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité								
• BAJA Deboîtement (longitudinal)		1						
• BAJB Décentrage (radial)			1					
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin								
• BBCB Dépôt de matériau grossier							1	
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche					1			
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1	1		1			1	1
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	G27 > Collecteur	G26 > Collecteur	G28 > Collecteur	REP 11 > REP13	G29 > Collecteur	G31 > Collecteur	G30 > Collecteur	G32 > Collecteur
Dimensions des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	7.48 m	4.89 m	5.32 m	29.99 m	7.34 m	8.00 m	5.14 m	4.96 m
Longueur inspectée :	7.48 m	4.89 m	5.32 m	29.99 m	7.34 m	8.00 m	5.14 m	4.96 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	1 / - / -	1 / - / -	1 / - / -	4 / 0 / 0	1 / - / -	1 / - / -	1 / - / -	1 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte	1			1				
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité				1				
• BAJA Deboîtement (longitudinal)			1			1		
• BAJB Décentrage (radial)				1				
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin				1				
• BBCB Dépôt de matériau grossier								
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche		1	1		1			
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1						1	
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	REP 11 > REP14	REP14 > REP16	G34 > Collecteur	REP14 > REP17	G33 > Collecteur	G35 > Collecteur	REP14 > REP15	REP19 > REP18
Dimensions des tuyaux :	Ø250	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø400
Longueur mesurée :	24.02 m	24.28 m	4.98 m	29.20 m	4.57 m	5.53 m	30.01 m	27.16 m
Longueur inspectée :	24.02 m	24.28 m	4.98 m	29.20 m	4.57 m	5.53 m	30.01 m	27.16 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	2 / 0 / 0	1 / - / -	2 / 0 / 0	1 / - / -	1 / - / -	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte		2		1	1			
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité								
• BAJA Deboîtement (longitudinal)		1		1				
• BAJB Décentrage (radial)	1			1			2	
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin								
• BBCB Dépôt de matériau grossier								
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche					1			
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite			1					
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement	2							

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	REP19 > AV1	REP15 > REP18	REP18 > REP20	REP19.1 > REP19	REP19.1 > REP19.2	REP19.2 > REP19.3	REP46 > REP47	Brt G0 > Collecteur
Dimensions des tuyaux :	Ø160	Ø500	Ø500	Ø300	Ø160	Ø300	Ø600	Ø160
Longueur mesurée :	9.73 m	15.41 m	15.58 m	5.86 m	19.88 m	16.34 m	27.60 m	0.00 m
Longueur inspectée :	9.73 m	15.41 m	15.58 m	5.86 m	19.88 m	16.34 m	27.60 m	0.00 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte		3					2	
• BACA Rupture	1							
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés		1						
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité								
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								
• BAJB Décentrage (radial)								
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin								
• BBCB Dépôt de matériau grossier								
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la							1	
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche	1							
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite	1							
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement		3					1	

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	Brt G0.1 > collecteur	Brt G0.2 > Collecteur	Brt G0.3 > Collecteur	REP44 > AV6	REP45 > AV7	REP47 > REP10	REP18 > REP18.1	REP 18.2 > REP18.1
Dimensions des tuyaux :	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø600	Ø400	Ø300
Longueur mesurée :	0.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	18.82 m	10.97 m	1.87 m
Longueur inspectée :	0.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	18.82 m	10.97 m	1.87 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	3 / 0 / 0	1 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation						1		
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								1
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité								
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								
• BAJB Décentrage (radial)								
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin								
• BBCB Dépôt de matériau grossier								
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté					1			
• DCAZ Autre type de raccordement						1		

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	REP18.3 > REP 18.2	REP18.3 > REP18.4	REP 18.5 > REP18	REP 18.6 > REP 18.5	REP 18.7 > REP 18.6	REP18 > Amont 1	REP23 > REP24	REP22 > REP23
Dimensions des tuyaux :	Ø160	Ø300	Ø300	Ø160	Ø160	Ø160	Ø400	Ø400
Longueur mesurée :	16.59 m	16.58 m	8.48 m	20.98 m	15.21 m	6.39 m	39.58 m	9.91 m
Longueur inspectée :	16.59 m	16.58 m	8.48 m	20.98 m	15.21 m	6.39 m	39.58 m	9.91 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	2 / 0 / 0	1 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati					1			
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité								
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								
• BAJB Décentrage (radial)								
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin								
• BBCB Dépôt de matériau grossier								
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche				1	1	1		
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	REP22 > REP20	REP42 > REP21	REP21 > REP25	REP20 > REP25	REP20 > REP25	REP25 > REP26	REP26 > REP27	REP26 > REP27
Dimensions des tuyaux :	Ø400	Ø1200	Ø1200	Ø600	Ø1200	Ø1200	Ø1200	Ø1200
Longueur mesurée :	35.63 m	30.33 m	6.66 m	6.53 m	6.13 m	34.41 m	37.56 m	37.12 m
Longueur inspectée :	35.63 m	30.33 m	6.66 m	6.53 m	6.13 m	34.41 m	37.56 m	37.12 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	1 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité								
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								
• BAJB Décentrage (radial)								
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin								
• BBCB Dépôt de matériau grossier				3			1	
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								
• DACA Rupture					1			
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	REP26.1 > REP26	REP26.1 > Br26.1	REP27 > REP28	Brt AV 2 > REP 41	Brt AV 3 > REP 41	Brt AV 4 > REP 41	REP28 > REP29	REP41 > REP43
Dimensions des tuyaux :	Ø400	Ø160	Ø1200	Ø160	Ø160	Ø160	Ø1200	Ø300
Longueur mesurée :	22.73 m	0.00 m	6.76 m	3.55 m	9.93 m	21.31 m	14.19 m	21.70 m
Longueur inspectée :	22.73 m	0.00 m	6.76 m	3.55 m	9.93 m	21.31 m	14.19 m	21.70 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / - / -	0 / 0 / 0	0 / - / -	0 / - / -	0 / - / -	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total		1						
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité								
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								
• BAJB Décentrage (radial)								
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin								
• BBCB Dépôt de matériau grossier							1	
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche				1				
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite					2	1		
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel	1							
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	REP41 > REP40	REP40 > REP39	REP 40.1 > REP40	REP 39 > Brt AV8	REP 40 > Brt AV5	REP39 > REP38	REP38 > REP28	REP31 > Bassin
Dimensions des tuyaux :	Ø400	Ø400	Ø400	Ø160	Ø160	Ø600	Ø600	Ø800
Longueur mesurée :	37.57 m	5.22 m	6.54 m	4.41 m	0.58 m	21.47 m	9.22 m	7.18 m
Longueur inspectée :	37.57 m	5.22 m	6.54 m	4.41 m	0.58 m	21.47 m	9.22 m	7.18 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / - / -	0 / - / -	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité								
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								
• BAJB Décentrage (radial)								
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin								
• BBCB Dépôt de matériau grossier								
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre	1							
• BCC Courbure du collecteur					1			
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement								

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	REP36 > REP37	REP36 > REP 35	REP 33 > REP34	REP34 > REP 35	REP 30 > REP29	REP29 > REP31	REP32 > REP29	REU 10 > WC
Dimensions des tuyaux :	Ø1200	Ø800						Ø150
Longueur mesurée :	4.58 m	3.27 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	-9.02 m	0.00 m	1.80 m
Longueur inspectée :	4.58 m	3.27 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	-9.02 m	0.00 m	1.80 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								
• BABC Fissure ouverte								
• BACA Rupture								
• BACB Effondrement partiel								
• BACC Effondrement total								
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								
• BAIA Anneau d'étanchéité								
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								
• BAJB Décentrage (radial)								
• BAJC Déviation angulaire								
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								
• BALF Trou dans le matériau de réparation								
• BBCA Dépôt de matériau fin								
• BBCB Dépôt de matériau grossier								
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté								
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								
• BBHZ Présence de vermine - Autre								
• BCC Courbure du collecteur								1
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche								
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								
• DACA Rupture								
• DACB Effondrement partiel								
• DARE Cadre déboîté								
• DCAZ Autre type de raccordement								


SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

GRESSWILLER
Q.CHASSEPOT -6RMAT

Dossier : 2403358-IT/02

Date : 15/07/2025

Caractéristiques tronçon								**Total**
Tronçon / Branchement / Noeud	Séparateur > A1	Séparateur > A2	REP 18.8 > Collecteur					
Dimensions des tuyaux :	Ø150	Ø150	Ø160					
Longueur mesurée :	0.57 m	2.29 m	0.77 m					1637.23 m
Longueur inspectée :	0.57 m	2.29 m	0.77 m					1591.70 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / - / -	0 / - / -	1 / - / -					82 / - / -
• Tronçon visité incomplètement								
• BAAA Réduction verticale de la section de la canalisation								1
• BAAB Réduction horizontale de la section de la canalisati								1
• BABC Fissure ouverte								21
• BACA Rupture								3
• BACB Effondrement partiel								1
• BACC Effondrement total	1							2
• BAFA Dégradation de surface, rugosité accrue								1
• BAFB Dégradation de surface, écaillage								14
• BAFC Dégradation de surface, granulats exposés								1
• BAHD La conduite de raccordement est endommagée								2
• BAIA Anneau d'étanchéité								5
• BAJA Deboîtement (longitudinal)								10
• BAJB Décentrage (radial)								8
• BAJC Déviation angulaire								1
• BAKG Détachement du revêtement intérieur								2
• BALF Trou dans le matériau de réparation								1
• BBCA Dépôt de matériau fin								15
• BBCB Dépôt de matériau grossier								13
• BBCC Dépôt de matériau dur ou compacté	1							1
• BBEG Conduites externes ou cables insérés dans la								1
• BBHZ Présence de vermine - Autre								1
• BCC Courbure du collecteur								3
• BCCA Courbure du collecteur vers la gauche			1					24
• BCCB Courbure du collecteur vers la droite								23
• DACA Rupture								2
• DACB Effondrement partiel								1
• DARE Cadre déboîté								1
• DCAZ Autre type de raccordement								8

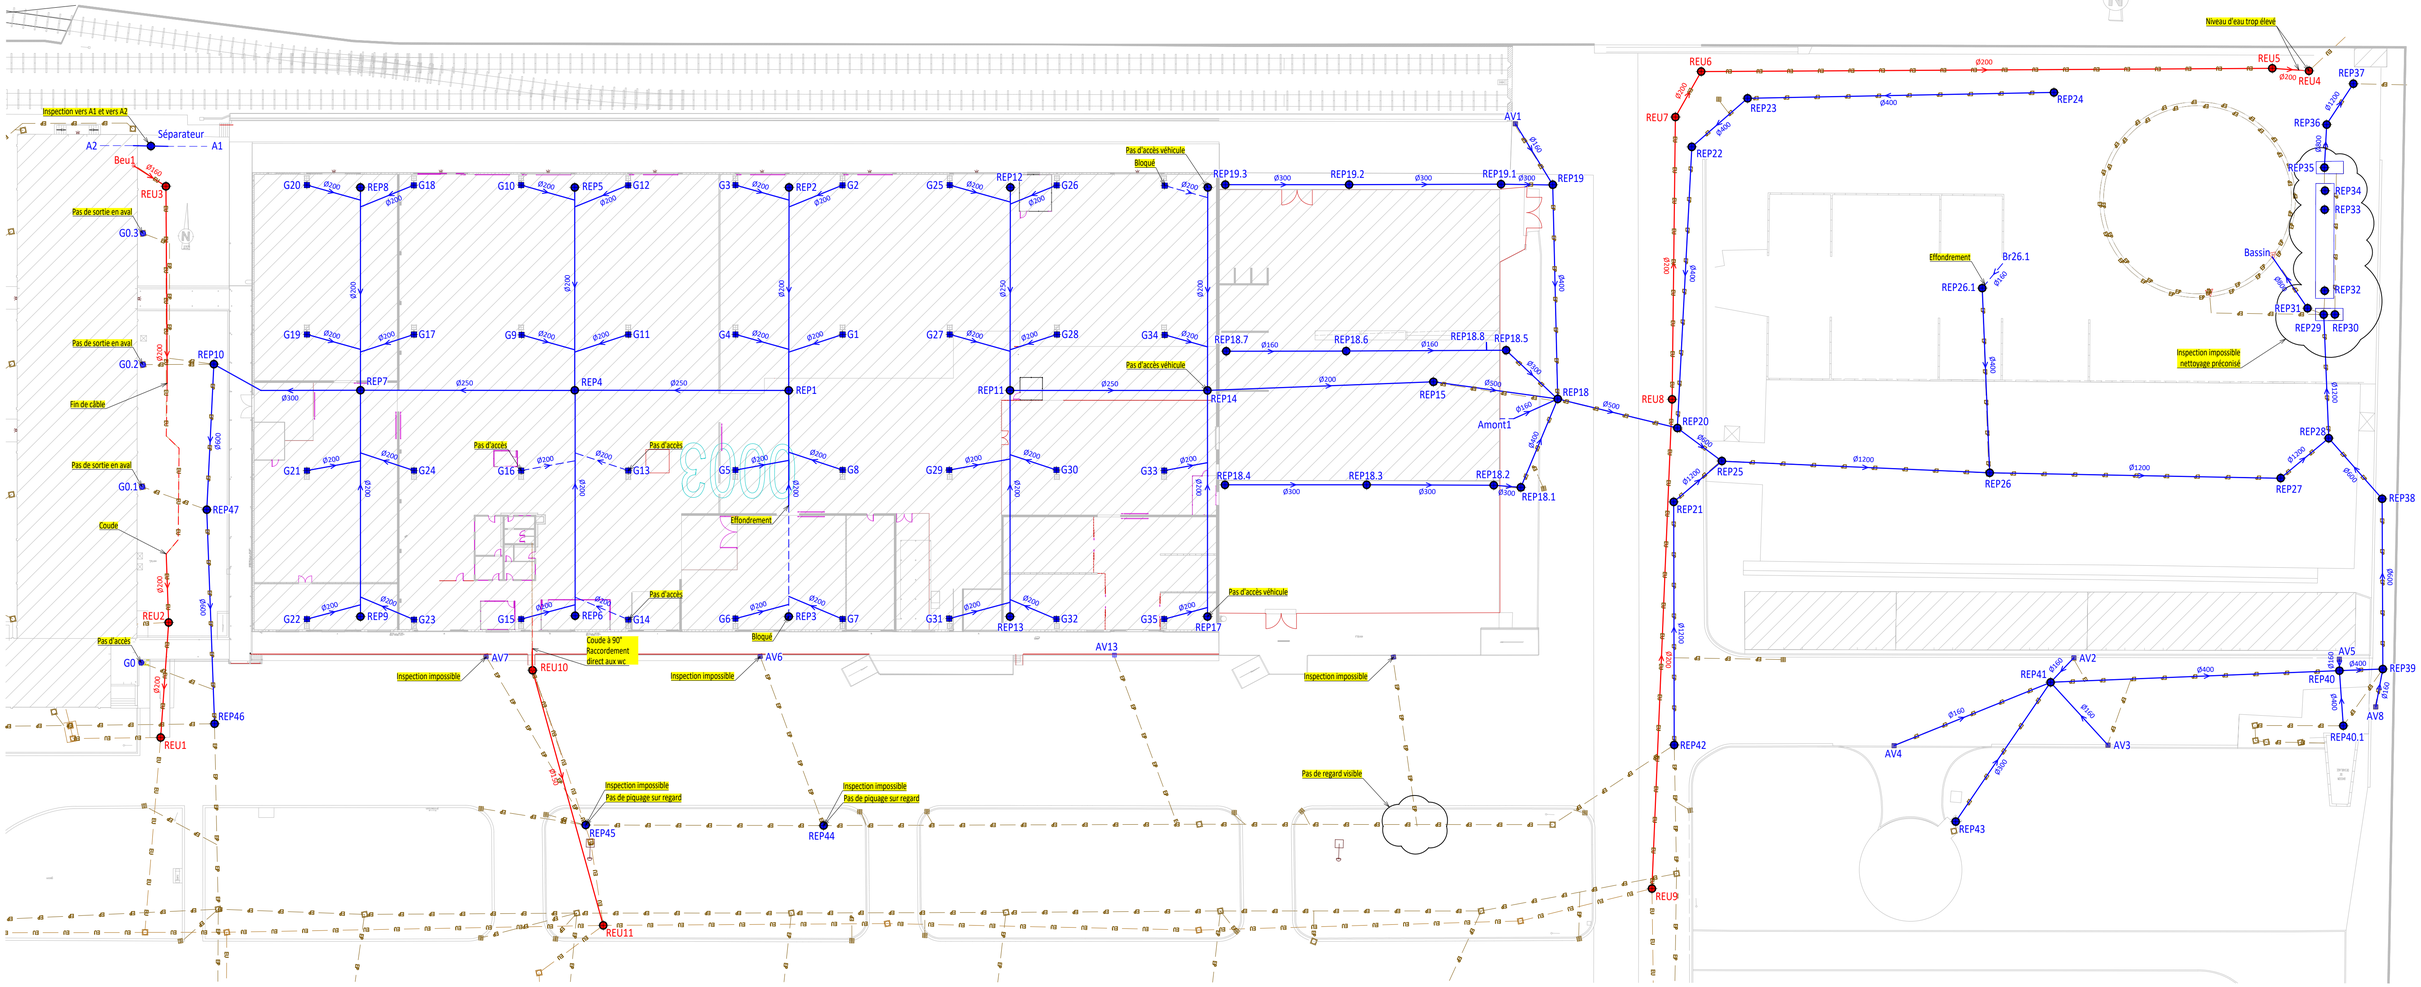

Légende:

ETAT DES CONTROLES

ITV (inspection télévisée):

- Réseau d'eaux usées inspecté
- Réseau d'eaux pluviales inspecté
- Réseau unitaire inspecté
- Réseau d'adduction en eau potable inspecté
- Drainage inspecté
- Réseau d'eaux usées non inspecté
- Réseau d'eaux pluviales non inspecté
- Réseau unitaire non inspecté
- Réseau d'adduction en eau potable non inspecté
- Drainage non inspecté

TC (test de compactage): Conforme / NON Conforme / REFUS

EP(essai à la plaque): IP Positionnement essai à la plaque

EE (essai d'étanchéité): Conforme / NON Conforme

ELEMENTS D'INVENTAIRE

- Regard de visite
- Avaloir
- Boîte d'inspection
- Siphon de sol
- Poste de refoulement
- Déversoir d'orage
- Séparateur d'hydrocarbures
- Sens d'écoulement des effluents

Glossaire des abréviations:

AEP	Adduction en eau potable	DT	Descente de toiture	PR	Poste de refoulement	RR	Refoulement
AV	Avaloir	EI	Eaux industrielles	R	Regard	SH	Séparateurs d'hydrocarbures
B	Branchement	EP	Eaux pluviales	RB	Regard borgne	U	Unitaire
BB	Boîtes de branchement(s)	EU	Eaux usées	REnt	Regard enterré	NV	Non visible
DO	Déversoir d'orage	P	Point essai de compactage	RExt	Regard existant		

ANNEXE 1: Schéma des réseaux contrôlés

INERA GRAND EST
Z.A. PATIS DES SAULES
88420 VINCEY
Tél: +33 (0) 3 29 38 11 05
E-mail: inera-lorrainesud@inera-ge.com

SCHEMA DE PRINCIPE (sans échelle)
LA POSITION DES REGARDS ET LE CHEMINEMENT DES RESEAUX SONT DONNES A TITRE PUREMENT INDICATIF

Client : NEOCONCEPT VRD
Date de réalisation : 11/09/2025
Dessiné par : BG

N° AFFAIRE: 2403358

Inspection télévisée: 2403358-IT	Planche de convenance
Essai d'étanchéité	Texte à la fumée
Test de compactage	
Essai à la plaque	

Chantier : Q.CHASSEPOT -GRMAT

Ville : GRESSWILLER
