BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Als FC (Strasbourg)
Parc des Collines
4, avenue de Bruxelles
68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 23221800/S5/8/AM-RTV_V1

Rédigé le : 23/12/2024

Référence au programme de travaux :
N°0 réalisé le 14/11/2024 par USID

DONNEUR D'ORDRE

USID

VALENTIN CAGNON
1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY
57044 METZ

SITE D'INTERVENTION

670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE
Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE -
67190 GRESSWILLER

BAT 0003



SYNTHESE DE CONCLUSION

SANS AMIANTE repéré

Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence
Thomas BOITEUX	DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER	CPDI 6076

Signataire du rapport
Thomas BOITEUX


Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 4

2. CONCLUSIONS **5**
2.1. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux 6
2.2. Obligations réglementaires 7

3. INFORMATIONS GENERALES **8**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 8
3.2. Parties prenantes 8


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **8**
4.1. Références réglementaires 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **9**
5.1. Date(s) de visite(s) 9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 9
5.3. Conditions spécifiques 9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **10**
6.1. Matériaux et produits repérés 10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 25

7. ANNEXES **25**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 25
7.2. Photos prélèvements 27
7.3. Photos sondages 36
7.4. Photos inaccessibilités 37
7.5. Attestation d'assurance 38
7.6. Certificat de compétence 40
7.7. Croquis de repérage 41
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire 72

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

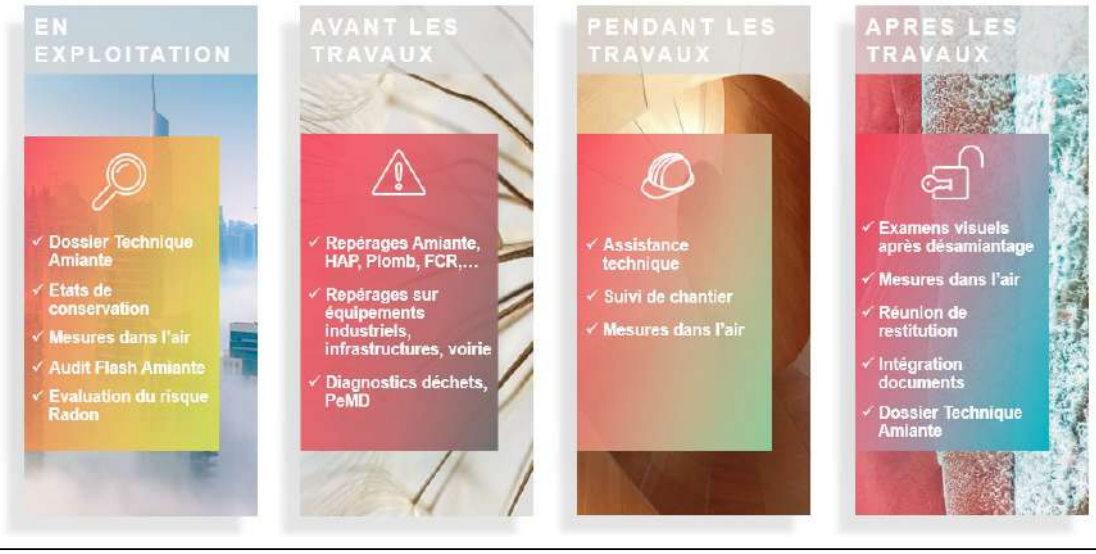

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Mise aux normes ICPE du bâtiment 3-38 au quartier CHASSEPOT à GRESSWILLER selon programme des travaux.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés , Revêtements bitumineux relevés
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés, Panneaux de cloisons
Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Flocages
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs
Portes isothermiques	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence, Colles de plinthe
04 - Plafonds et faux plafonds	
Faux plafonds	Panneaux
Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

De plus, des investigations complémentaires doivent être réalisées en cours de travaux.

2.1. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013 (IC 1)	2- Parois verticales extérieures et façades - investigation complémentaire à réaliser sur les portes intérieures coupe feu en cours de travaux	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : 670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE
Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE -
67190 GRESSWILLER

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
VALENTIN CAGNON	Donneur d'ordre	USID	1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY 57044 METZ	0390233658
VALENTIN CAGNON	Accompagnateur	USID	1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY 57044 METZ	valentin.cagnon@intradef.gouv.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 14/11/2024 au 20/11/2024
Le 16/12/2024

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Plans / PLANS	USID	14/11/2024	0	/
Programme de travaux / PROGRAMME DES TRAVAUX	USID	14/11/2024	0	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> EXT -> TOITURE	Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés	Bitumineux	Gris	28	P36* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> EXT -> TOITURE	Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés	Bitumineux	Gris	28	P37 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> EXT -> TOITURE	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Bande	Gris	29	P38* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> EXT -> TOITURE	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Bande	Gris	29	P39 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> EXT -> FACADE	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	Bitumineux	Noir	30	P40* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> EXT -> FACADE	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	Bitumineux	Noir	30	P41 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> EXT -> FACADE	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	Bitumineux	Noir	30	P42 N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> EXT -> FACADE	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	31	P43* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> EXT -> FACADE	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	31	P44 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 001	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S32	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 001	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S43	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 001	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S56	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 001	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Blanc	35	/	S122	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 002	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	25	/	S96	PN	mur agglo brut	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 002	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S31	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 002	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S44	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 002	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S58	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 002	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Blanc	35	/	S123	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 002	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Flocages	Cotonneux	Gris	32	P45* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 003	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	/	S69	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 003	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	25	/	S98	PN	mur agglo brut	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 003	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Flocages	Cotonneux	Gris	32	/	S114	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 003	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S36	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 003	Conduits	Conduits	PVC	Gris	26	/	S105	PN	conduit pvc	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 003	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S48	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 003	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S63	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 003	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Blanc	35	/	S126	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 004	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	25	/	S100	PN	mur agglo brut	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 004	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Flocages	Cotonneux	Gris	32	/	S118	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 004	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S38	AN	joint brique	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 004	Conduits	Conduits	PVC	Gris	26	/	S102	PN	conduit pvc	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 004	Portes pare-flammes	Isolants intérieurs	/	/	27	/	S109	PN	porte isolation laine de verre	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 004	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S53	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 004	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S65	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 004	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Blanc	35	/	S131	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 005	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	/	S74	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 005	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S14	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 005	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S52	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 005	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S66	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 005	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S72	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 005	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Blanc	35	/	S130	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 006	Conduits	Conduits	PVC	Gris	26	/	S101	PN	conduit pvc	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 006	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S51	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 006	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S67	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 006	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Blanc	35	/	S129	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 006	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	P12* N	/	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 006	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	P13 N	/	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 007	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	16	/	S77	PN	linoléum non collé	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 007	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S73	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 007	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	15	P20* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 007	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	15	P21 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 008	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	/	S82	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 008	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S83	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 008	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	24	P34* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 008	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	22	P30* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 008	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	23	P32* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 009	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	/	S80	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 009	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S84	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 009	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	19	P24* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 009	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	18	P22* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 010	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	/	S81	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 010	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S85	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 010	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	19	P25 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 010	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	18	P23 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 011	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	22	/	S89	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 011	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	23	/	S91	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 011	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	21	P29* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 012	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	22	/	S90	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 012	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	23	/	S92	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 012	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	21	P28 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Gris	34	P47* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Blanc	35	P48* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	P18* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	P19 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	6	/	S76	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	25	/	S94	PN	mur agglo brut	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Flocages	Cotonneux	Gris	32	/	S115	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Flocages	Cotonneux	Gris	32	/	S119	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S39	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Conduits	Conduits	PVC	Gris	26	/	S103	PN	conduit pvc	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Portes pare-flammes	Isolants intérieurs	/	/	27	/	S108	PN	porte isolation laine de verre	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S50	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S64	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 014	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Panneaux	Bois	/	3	/	S19	PN	panneaux bois	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 014	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Noir	4	/	S22	PN	joint silicone	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 014	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Blanc	7	/	S15	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 014	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S18	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 015	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Flocages	Cotonneux	Gris	32	/	S110	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 015	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S35	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 015	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S46	AN	sol béton	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 015	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S59	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 015	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	/	14	/	S68	PN	plafond plâtre brut	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	6	/	S75	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Flocages	Cotonneux	Gris	32	/	S117	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S71	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Blanc	35	/	S128	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	P14* N	/	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	P15 N	/	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	P16* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	P17 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 017	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	25	/	S95	PN	mur agglo brut	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 017	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S30	AN	joint brique	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 017	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S42	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 017	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S57	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 017	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Blanc	35	/	S124	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 018	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S29	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 018	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S41	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 018	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S55	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 018	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Blanc	35	/	S125	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 019	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Panneaux	Bois	/	3	/	S20	PN	panneaux bois	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 019	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Noir	4	/	S23	PN	joint silicone	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 019	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Blanc	7	/	S16	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 019	Faux plafonds	Panneaux	Bois	/	13	/	S25	PN	panneaux bois	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 020	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	25	/	S93	PN	mur agglo brut	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 020	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Flocages	Cotonneux	Gris	32	/	S111	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 020	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Flocages	Cotonneux	Gris	32	/	S120	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 020	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S28	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 020	Conduits	Conduits	PVC	Gris	26	/	S104	PN	conduit pvc	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 020	Portes pare-flammes	Isolants intérieurs	/	/	27	/	S107	PN	porte isolation laine de verre	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 020	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S40	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 020	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S54	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 020	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Blanc	35	/	S121	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 021	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Panneaux	Bois	/	3	/	S21	PN	panneaux bois	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 021	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Noir	4	/	S24	PN	joint silicone	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 021	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	8	/	S27	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 021	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S26	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 022	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Blanc	7	/	S17	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 023	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Flocages	Cotonneux	Gris	32	/	S112	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 023	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S33	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 023	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S45	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 023	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S60	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 024	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Beige	33	P46* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 024	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	25	/	S97	PN	mur agglo brut	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 024	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Flocages	Cotonneux	Gris	32	/	S113	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 024	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S34	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 024	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S47	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 024	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S61	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 025	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	/	S70	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 025	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	25	/	S99	PN	mur agglo brut	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 025	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S37	AN	joint brique	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 025	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	10	/	S49	AN	sol béton	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 025	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Fibreux	Gris	11	/	S62	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 025	Faux plafonds	Panneaux	Compact	Blanc	35	/	S127	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 026	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Panneaux	Bois	/	3	/	S11	PN	panneaux bois	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 026	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Noir	4	/	S12	PN	joint silicone	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 026	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S8	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 026	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Blanc	7	P8* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 026	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Blanc	7	P9 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 027	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Panneaux	Bois	/	3	/	S10	PN	panneaux bois	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 027	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Noir	4	/	S13	PN	joint silicone	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 027	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S9	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 027	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	8	P10* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 027	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Gris	8	P11 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 028	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S86	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 028	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	24	P35 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 028	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	22	P31 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 028	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	23	P33 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 029	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	22	/	S88	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 029	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S87	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 029	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	20	P26* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 029	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	20	P27 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0038 -> 001	Toitures	Bardeaux bitumineux	/	/	17	/	S79	PN	toiture bac acier récent	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 001	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S3	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 001	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	5	P4* N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 001	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	5	P5 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 001	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	6	P6* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 001	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	6	P7 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 002	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	6	/	S6	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 002	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	5	/	S5	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 002	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	/	S4	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 005	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	1	P1* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 005	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	P2* N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 005	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	P3 N	/	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 005	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Panneaux	Bois	/	3	/	S1	PN	panneaux bois	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 005	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	6	/	S7	AN	/	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 005	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone	Noir	4	/	S2	PN	joint silicone	Non
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 005	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	16	/	S78	PN	linoléum non collé	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BAT 0003-0038	/
BAT 0003-0038 -> EXT	/
BAT 0003-0038 -> EXT -> TOITURE	/
BAT 0003-0038 -> EXT -> FACADE	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 001	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 002	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 003	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 004	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 005	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 006	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 007	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 008	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 009	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 010	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 011	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 012	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 014	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 015	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 017	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 018	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 019	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 020	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 021	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 022	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 023	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 024	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 025	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 026	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 027	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 028	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 029	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 030	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 031	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 032	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 033	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 034	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 035	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 036	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0038	/
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0038 -> 001	/
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003	/
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 001	/
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 002	/
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 003	/
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 004	/
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 005	/
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 006	/

7.2. Photos prélèvements

P36	ZPSO 28
BAT 0003-0038 -> EXT -> TOITURE	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Complexes asphaltés	

P37	ZPSO 28
BAT 0003-0038 -> EXT -> TOITURE	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Complexes asphaltés	

P38	ZPSO 29
BAT 0003-0038 -> EXT -> TOITURE	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P39	ZPSO 29
BAT 0003-0038 -> EXT -> TOITURE	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P40	ZPSO 30
BAT 0003-0038 -> EXT -> FACADE	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	

P41	ZPSO 30
BAT 0003-0038 -> EXT -> FACADE	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	

P42	ZPSO 30
BAT 0003-0038 -> EXT -> FACADE	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	

P43	ZPSO 31
BAT 0003-0038 -> EXT -> FACADE	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P44	ZPSO 31
BAT 0003-0038 -> EXT -> FACADE	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P45	ZPSO 32
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 002	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Flocages (Liste A)	

P12	ZPSO 9
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 006	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'assemblage	

P13	ZPSO 9
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 006	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'assemblage	

P20	ZPSO 15

BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 007



Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

P21	ZPSO 15

BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 007



Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

P34	ZPSO 24

BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 008



Revêtements de sol -> Colles de carrelage

P30	ZPSO 22

BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 008



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence

P32	ZPSO 23

BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 008



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe

P24	ZPSO 19

BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 009



Revêtements de sol -> Colles de carrelage

P22	ZPSO 18
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 009	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P25	ZPSO 19
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 010	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P23	ZPSO 18
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 010	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P29	ZPSO 21
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 011	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P28	ZPSO 21
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 012	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P47	ZPSO 34
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P48	ZPSO 35
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P18	ZPSO 12
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P19	ZPSO 12
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P14	ZPSO 10
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P15	ZPSO 10
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P16	ZPSO 11
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P17	ZPSO 11
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 016	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

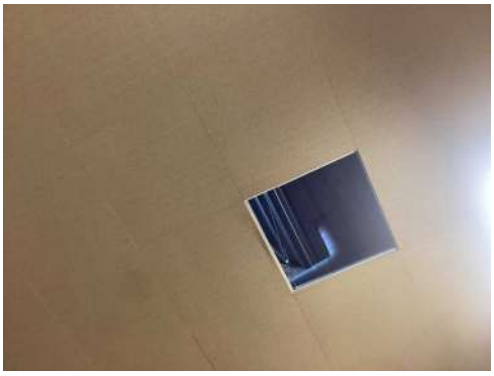P46	ZPSO 33
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 024	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P8	ZPSO 7
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 026	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P9	ZPSO 7
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 026	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P10	ZPSO 8
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 027	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P11	ZPSO 8
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 027	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P35	ZPSO 24
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 028	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P31	ZPSO 22
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 028	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P33	ZPSO 23
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 028	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P33	ZPSO 23
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 028	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P26	ZPSO 20
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 029	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P27	ZPSO 20
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 029	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P4	ZPSO 5
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 001	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P5	ZPSO 5
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 001	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P6	ZPSO 6
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 001	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P7	ZPSO 6
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 001	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P1	ZPSO 1
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 005	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P2	ZPSO 2
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 005	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P3	ZPSO 2
BAT 0003-0038 -> R+1 BAT 0003 -> 005	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

7.3. Photos sondages

S79	ZPSO 17
BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0038 -> 001	
	
Toitures -> Bardeaux bitumineux (Liste B)	

BAT 0003-0038 -> RDC BAT 0003 -> 013	IC 1
2- Parois verticales extérieures et façades	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :** investigation complémentaire à réaliser sur les portes intérieures coupe feu en cours de travaux Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4

7.5. Attestation d'assurance

MSIG
Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) **Diagnostic amiante**
- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
  Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) **Autres diagnostics**
- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- ERP
- Neuf

- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
  - En cas de location / vente
  - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**

4) **Conseil en performance énergétique.**

5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.**

6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**

7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :

   - De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.

   - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.


Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.6. Certificat de compétence



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6076 Version 002

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BOITEUX Thomas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 13/07/2021 - Date d'expiration : 12/07/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 13/07/2021 - Date d'expiration : 12/07/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

7.7. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > EXT	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	1 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

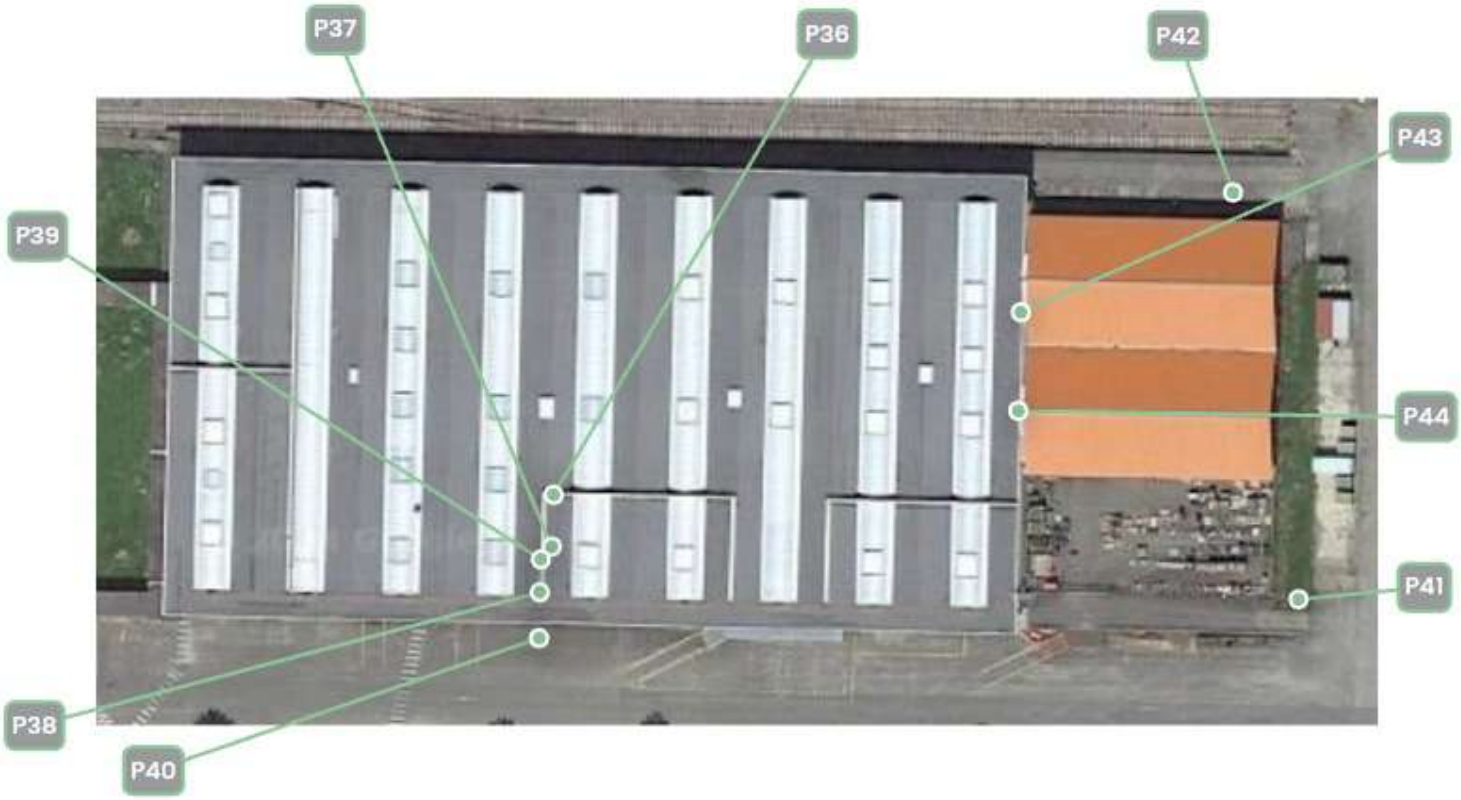

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	2 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

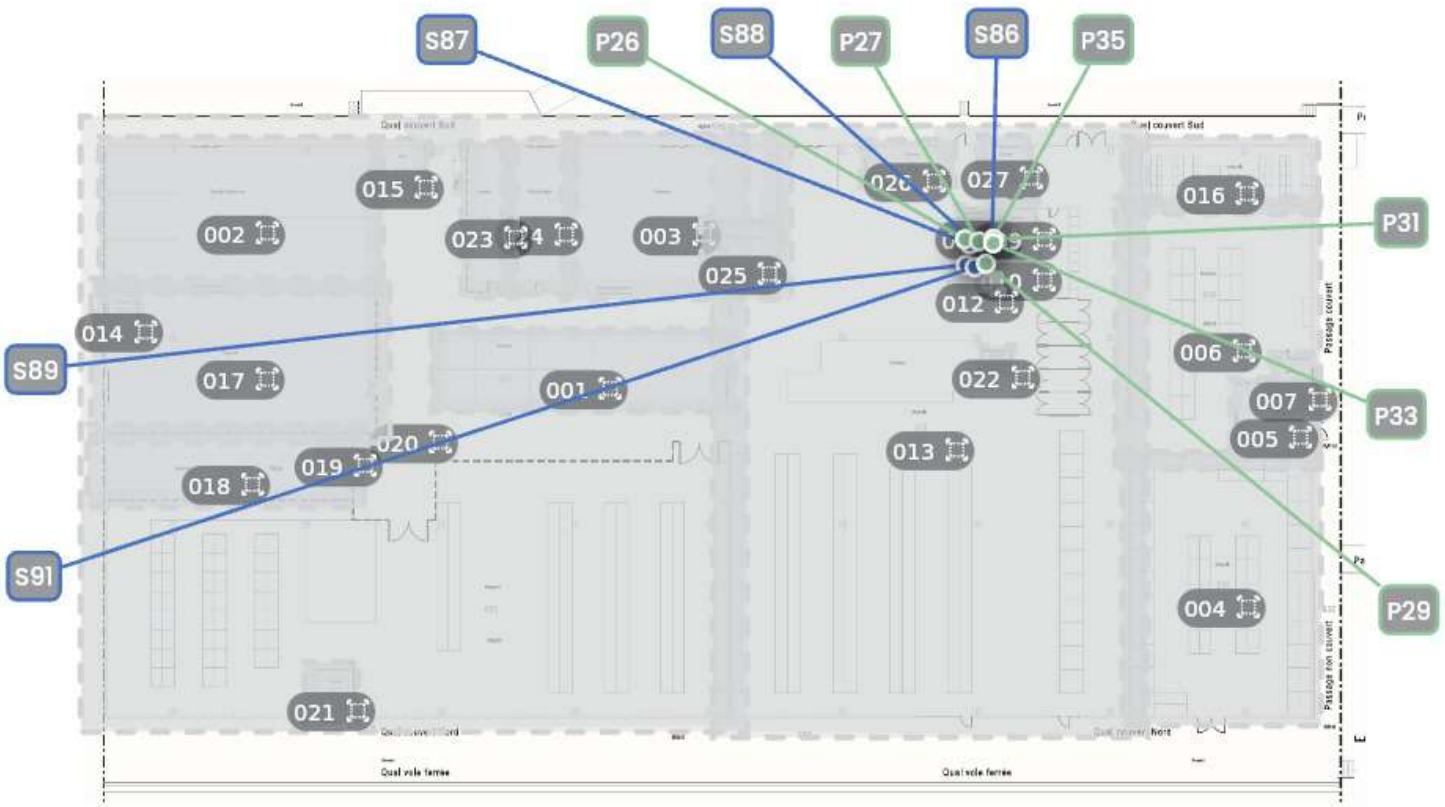


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	3 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



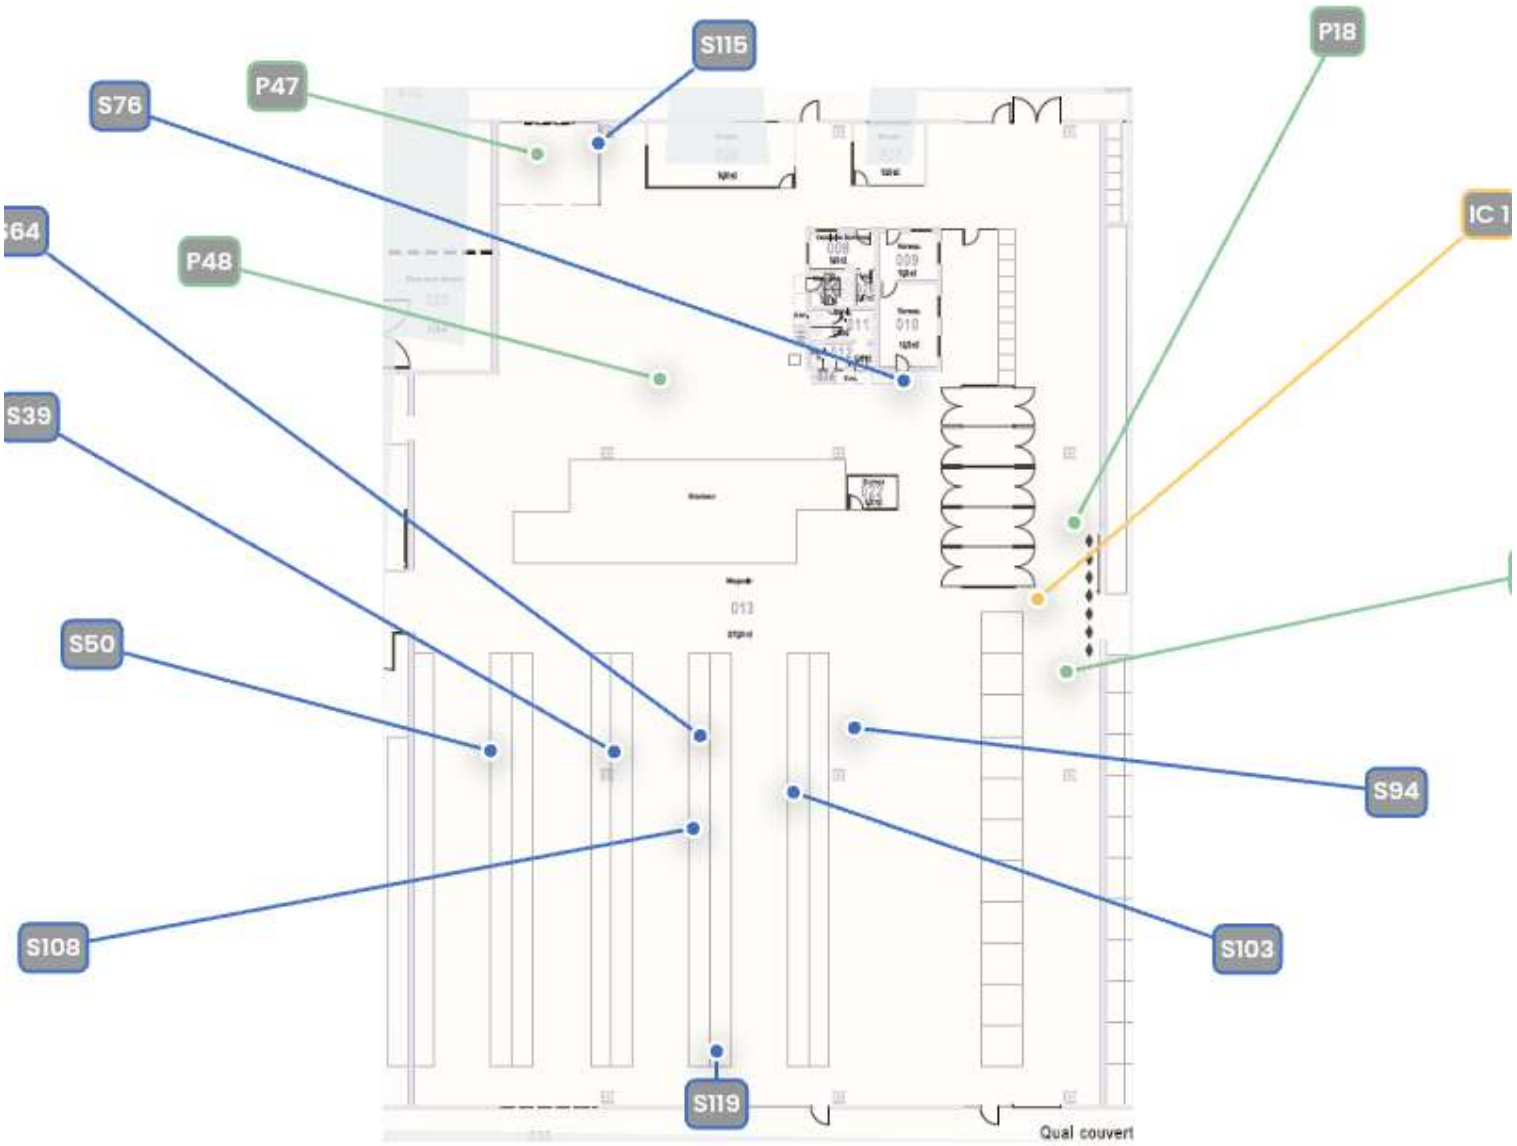

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	4 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



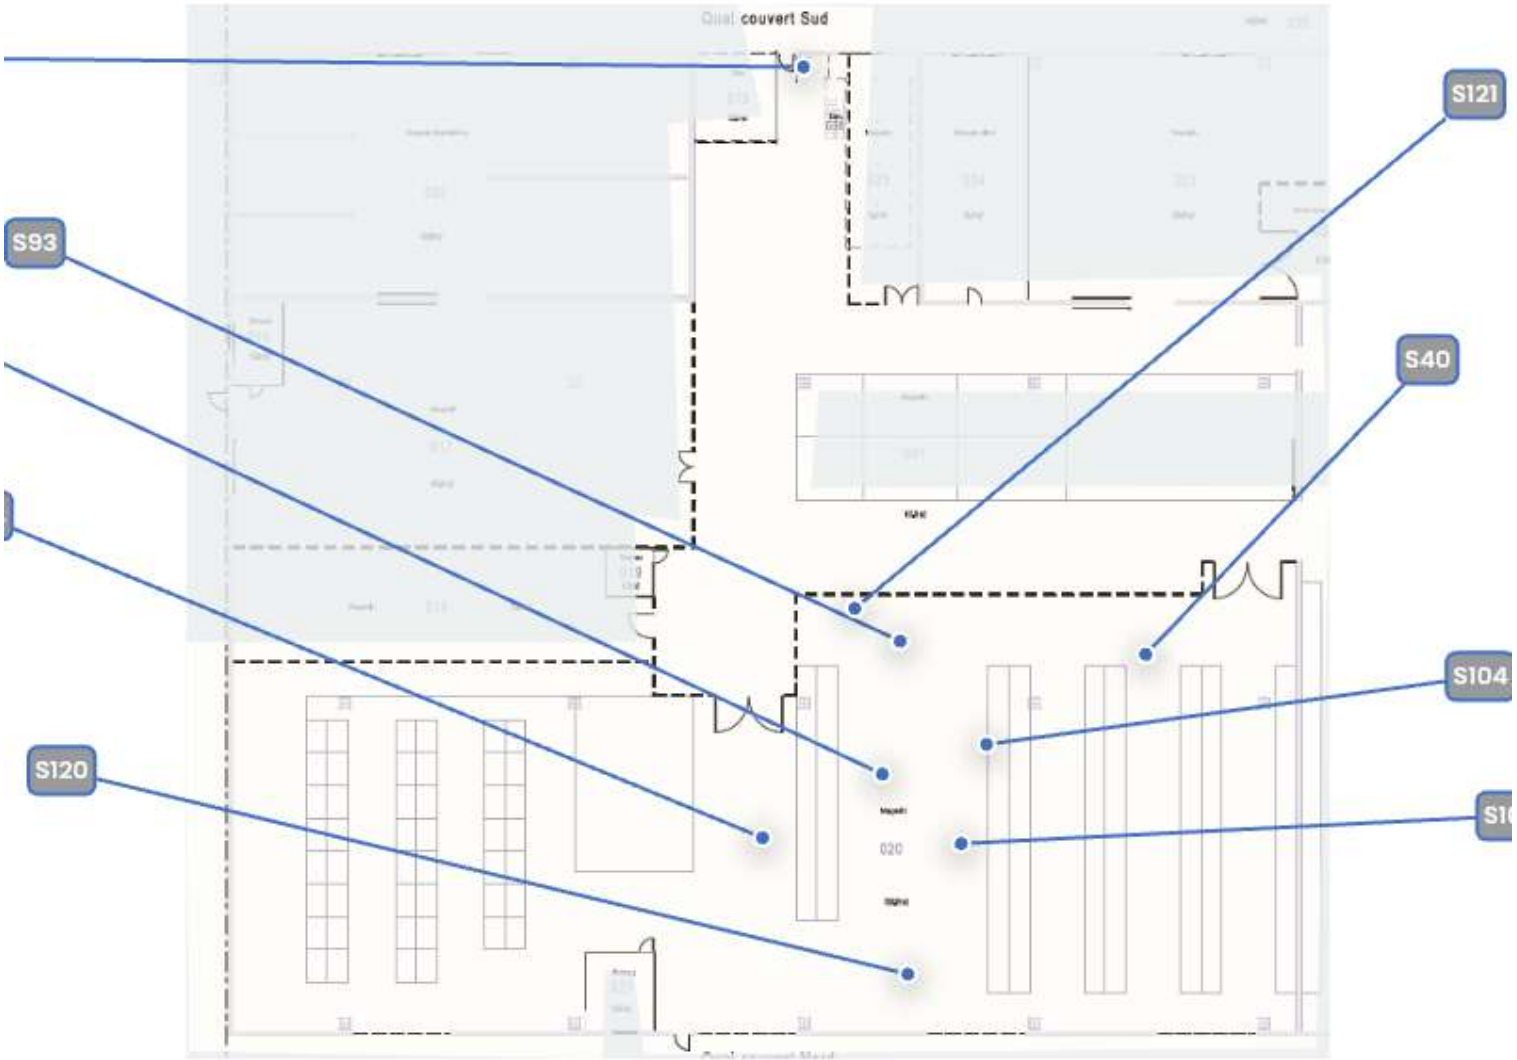

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	5 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



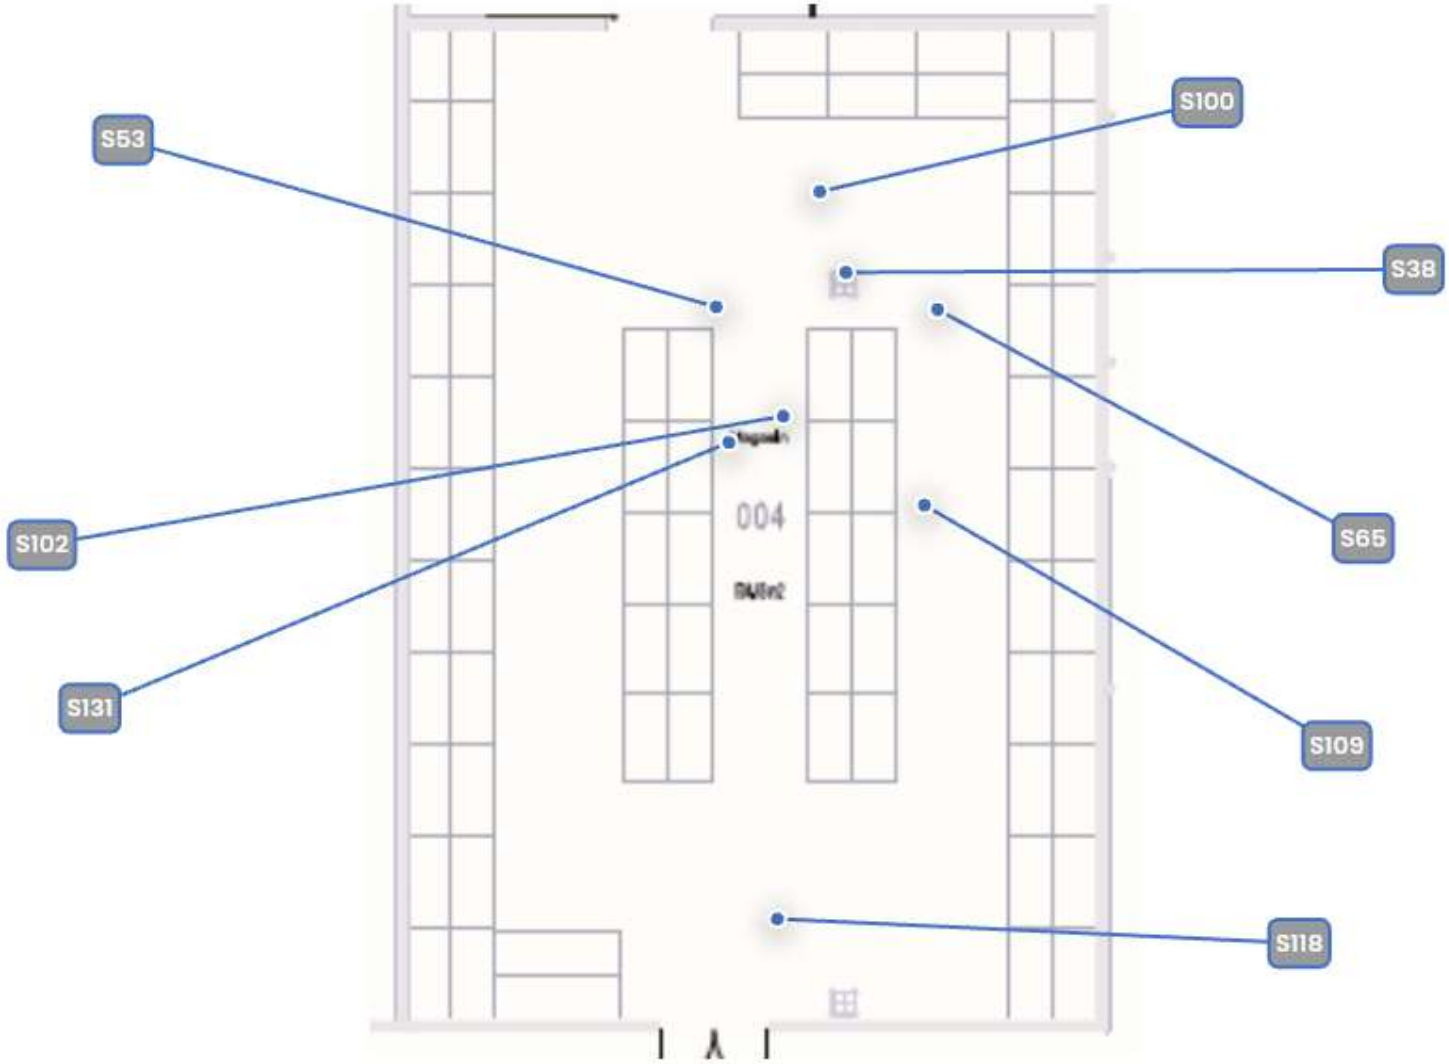

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	6 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



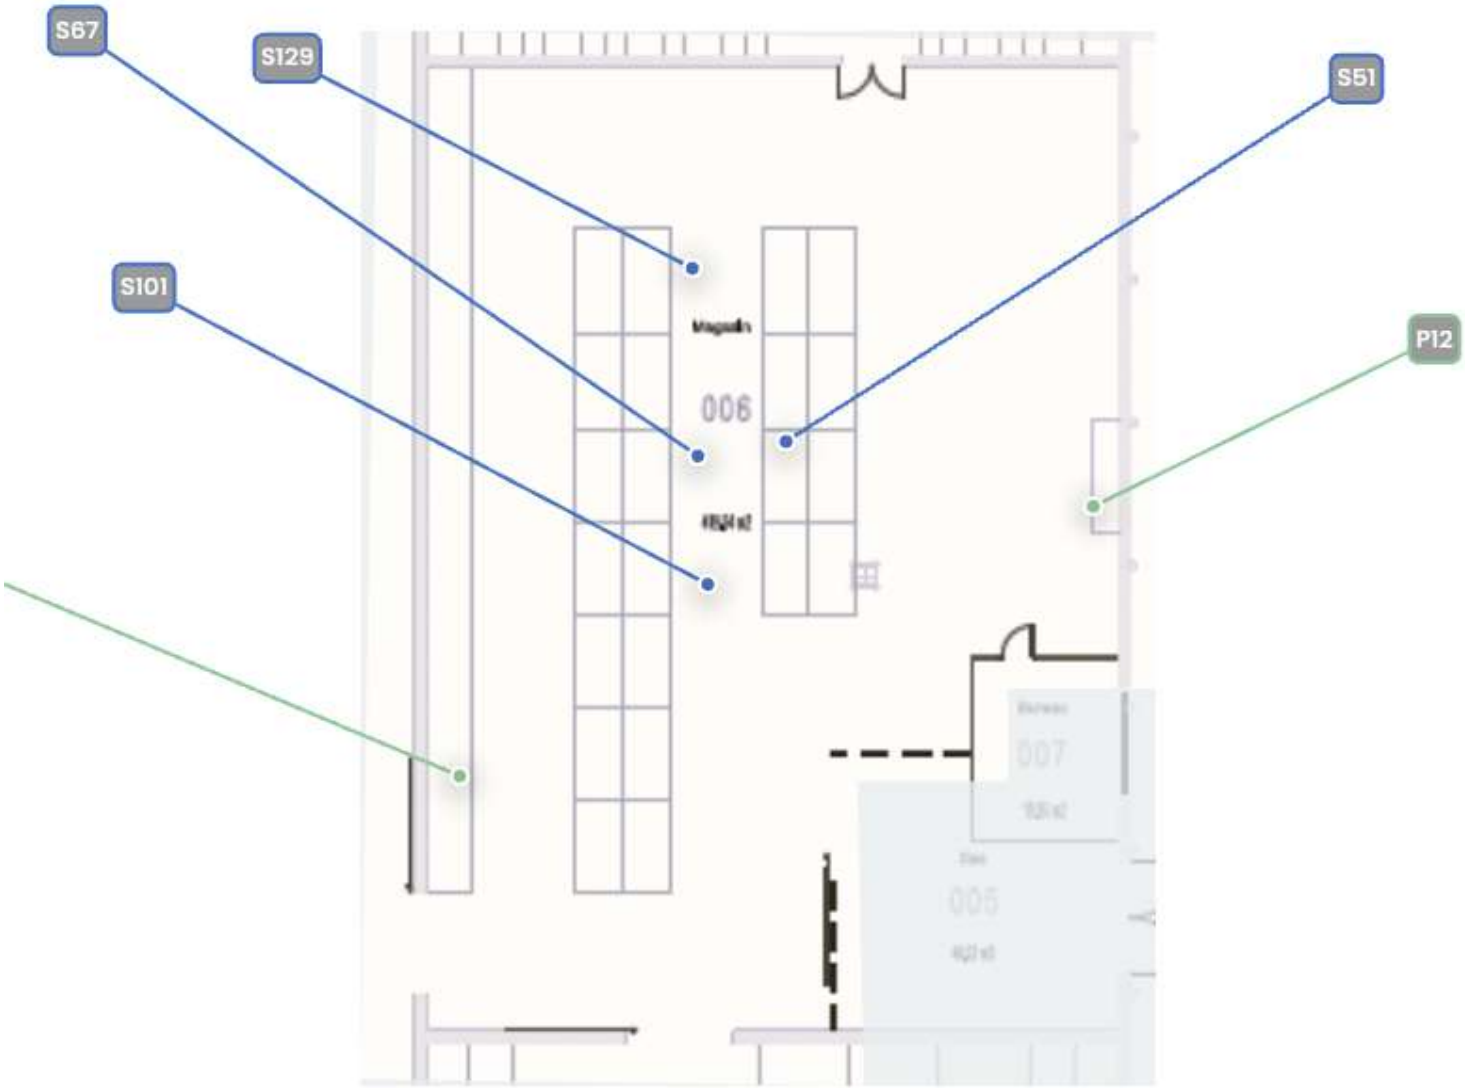

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	7 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



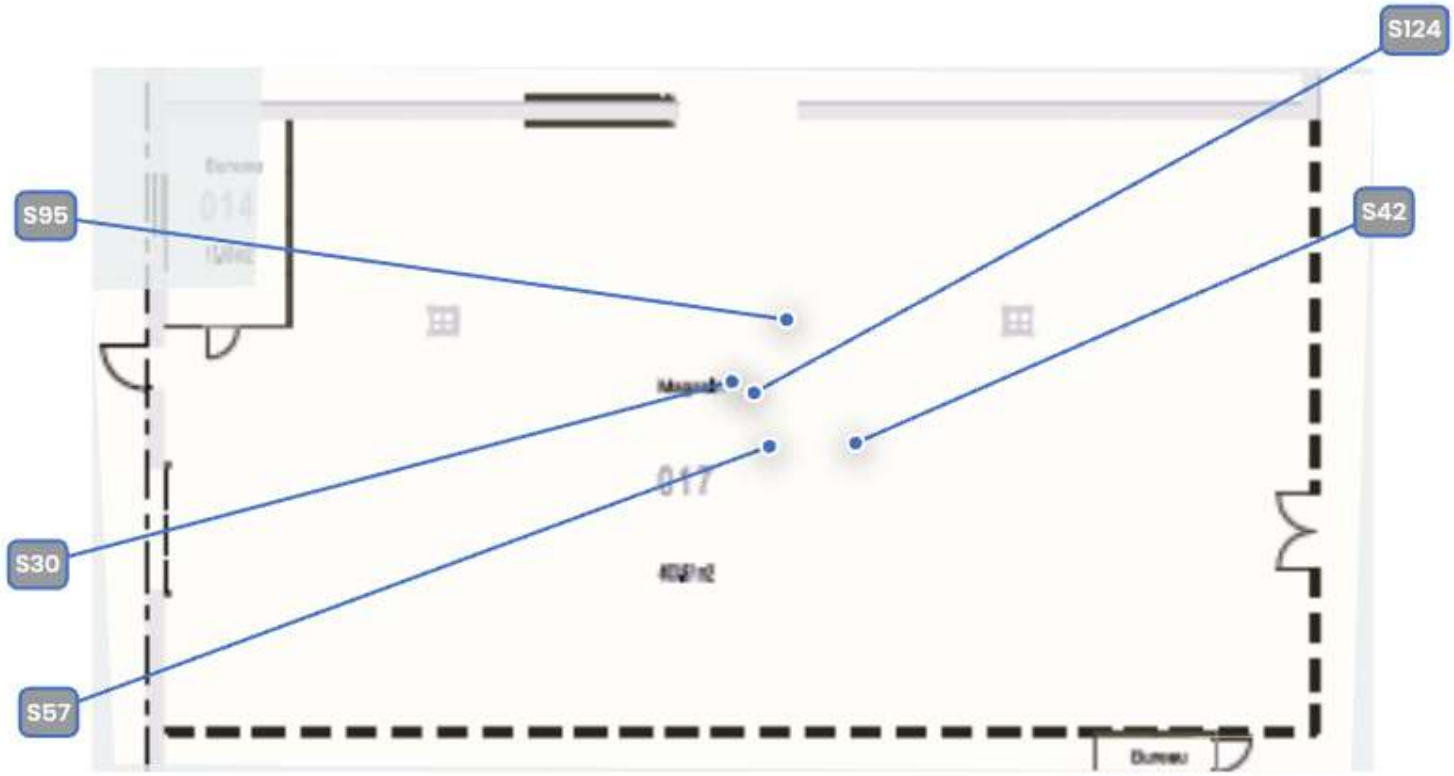

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	8 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



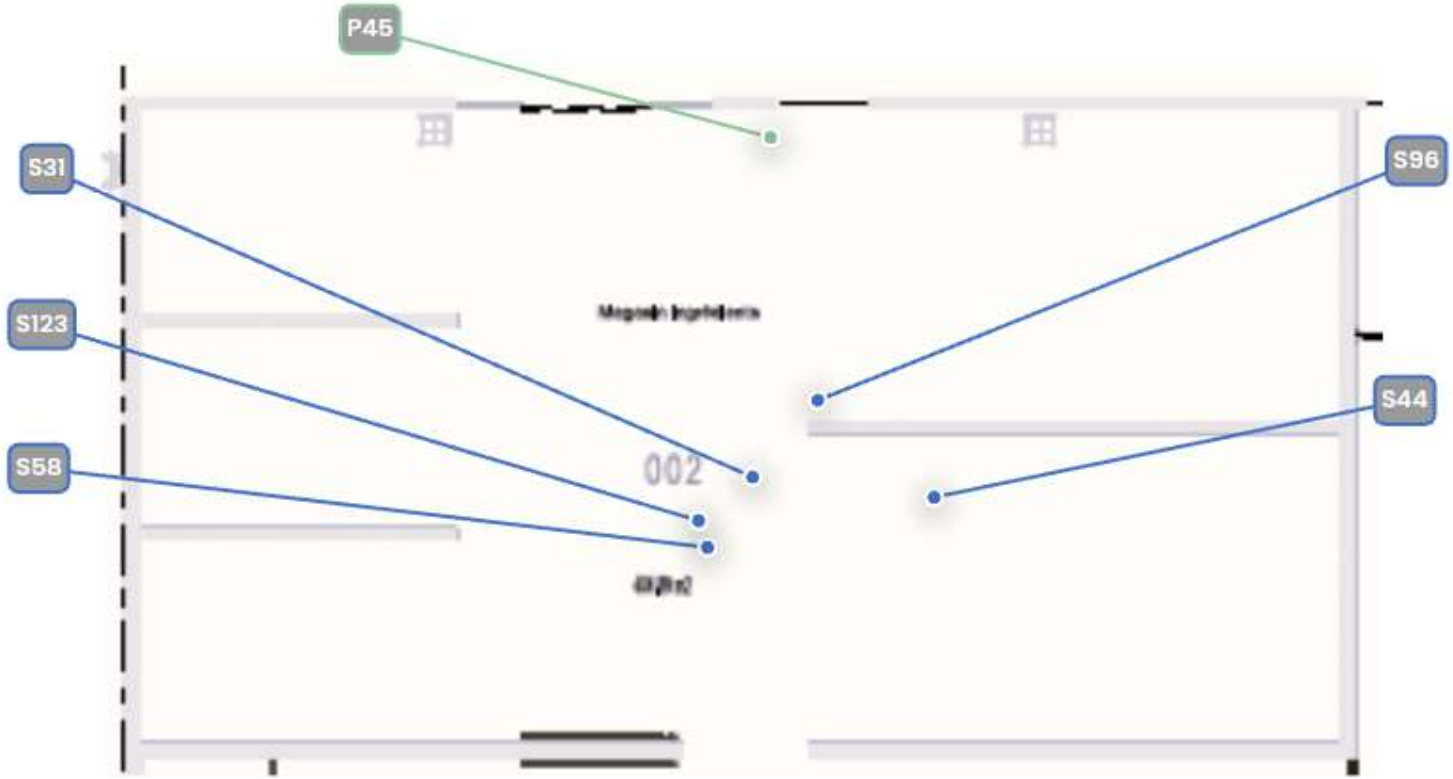

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	9 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



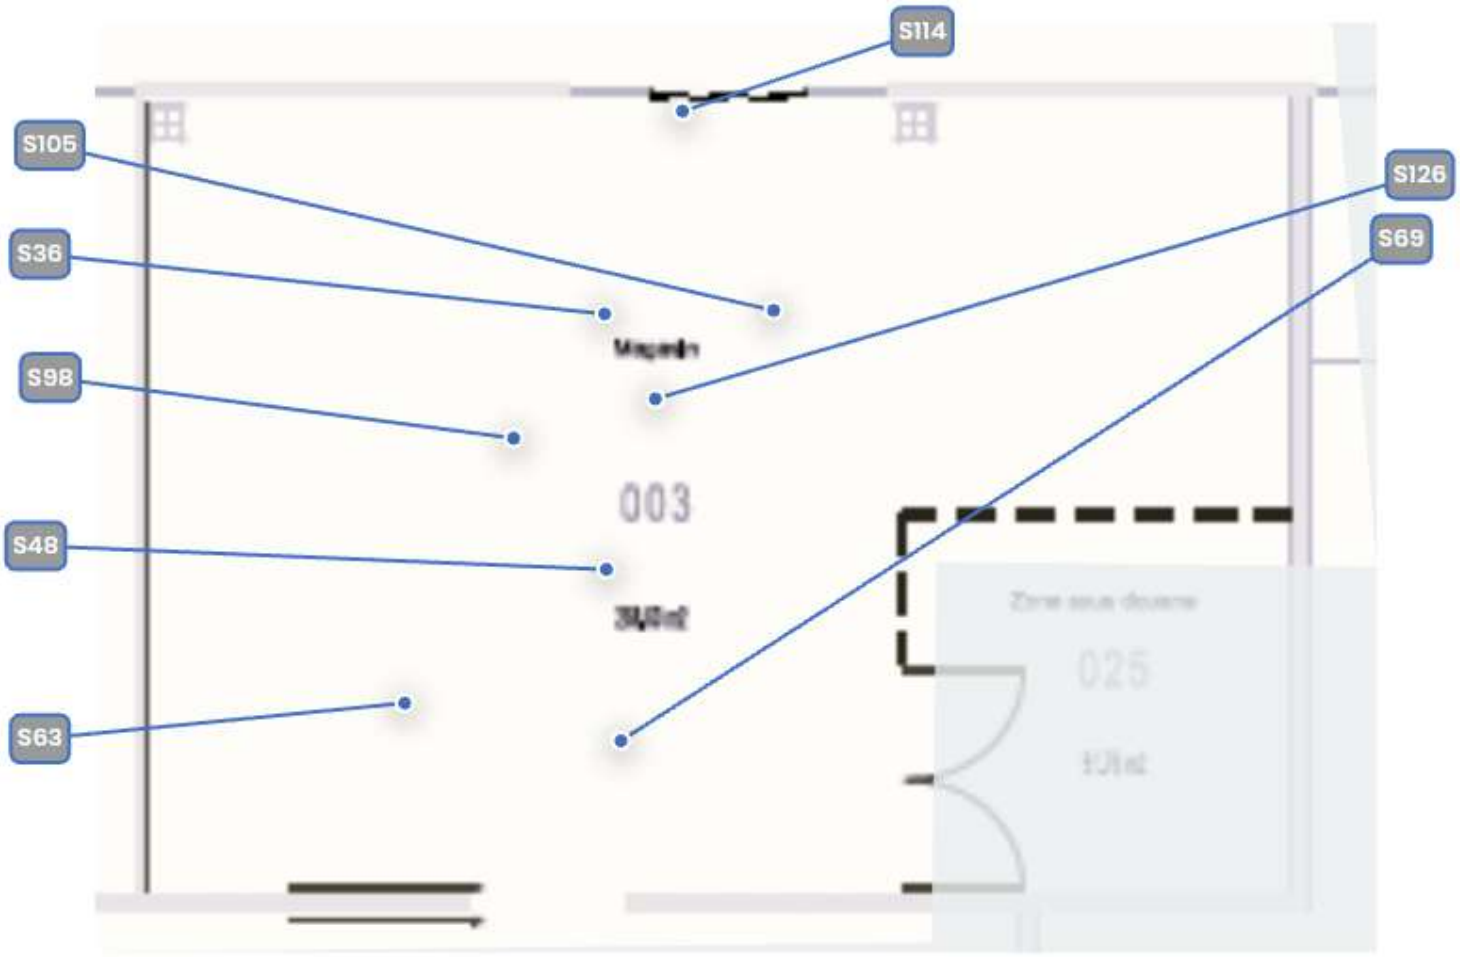

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	10 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



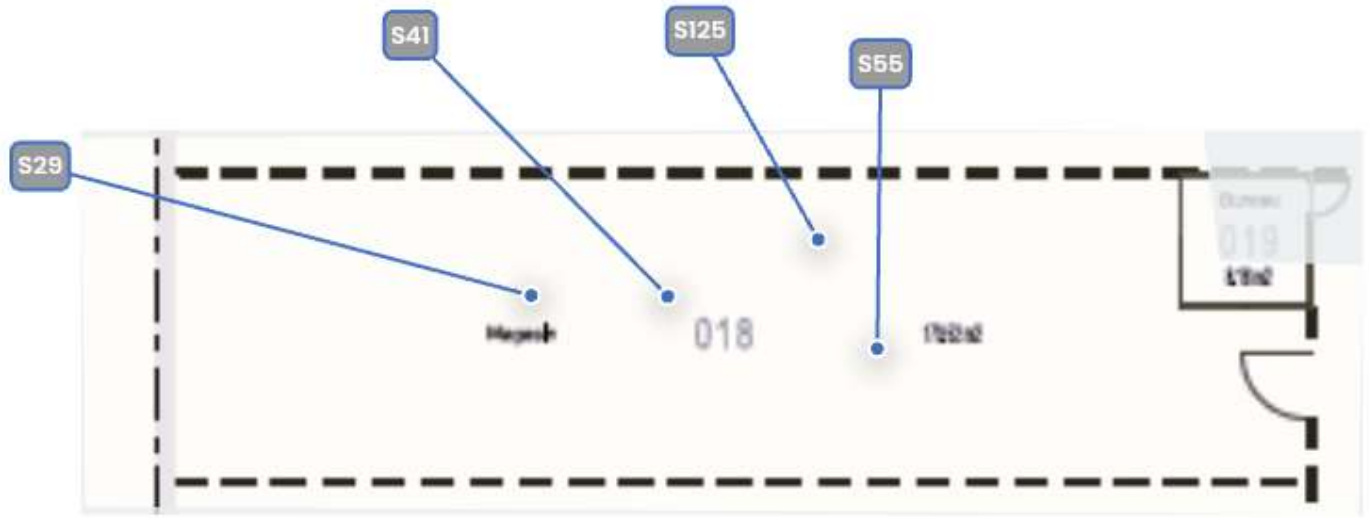

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	11 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



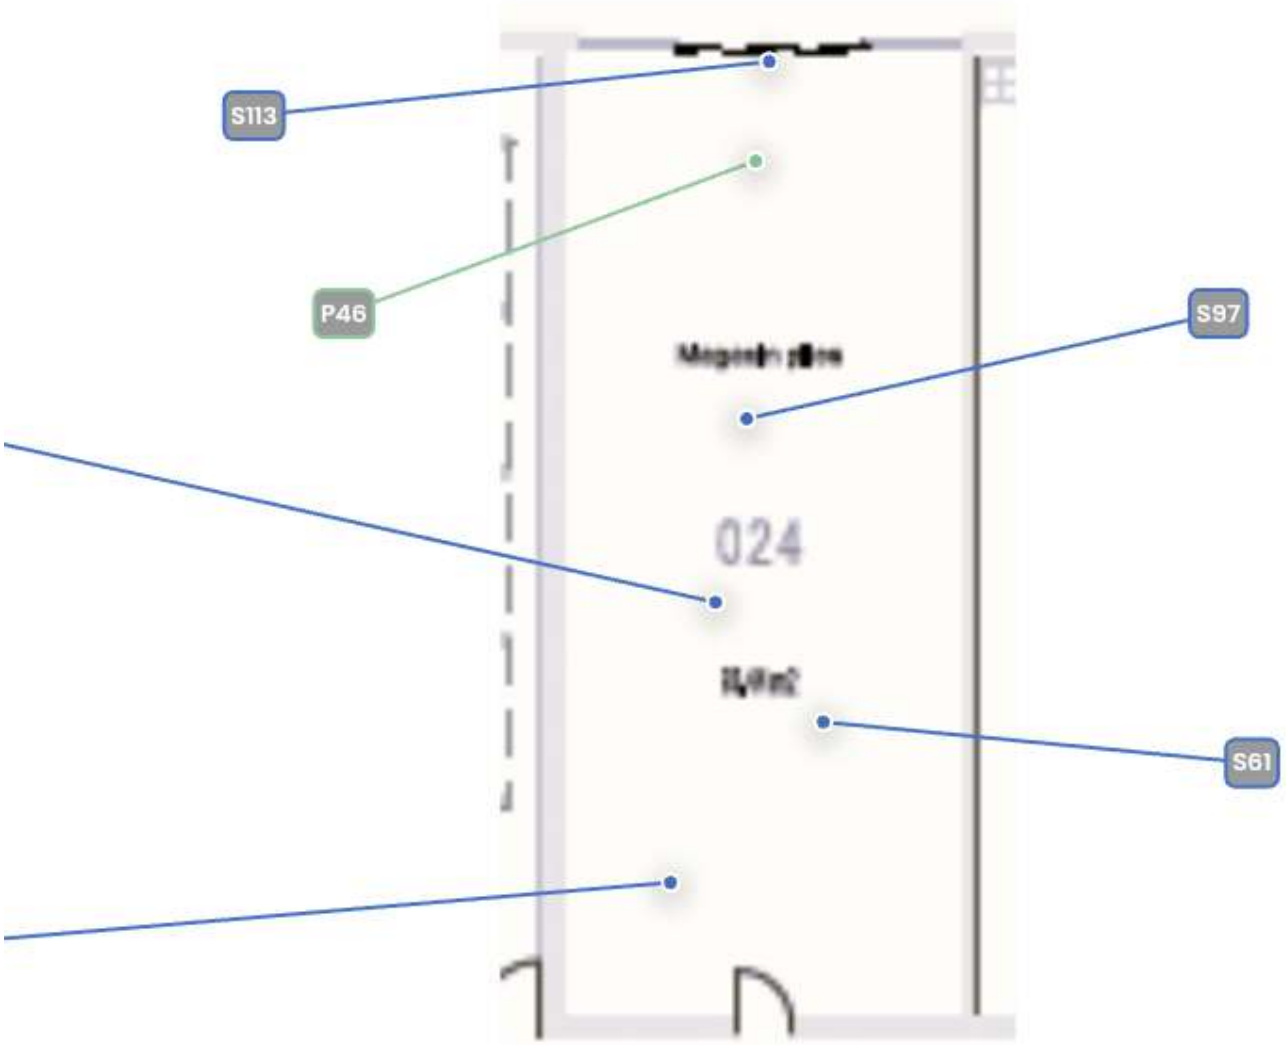

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	12 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



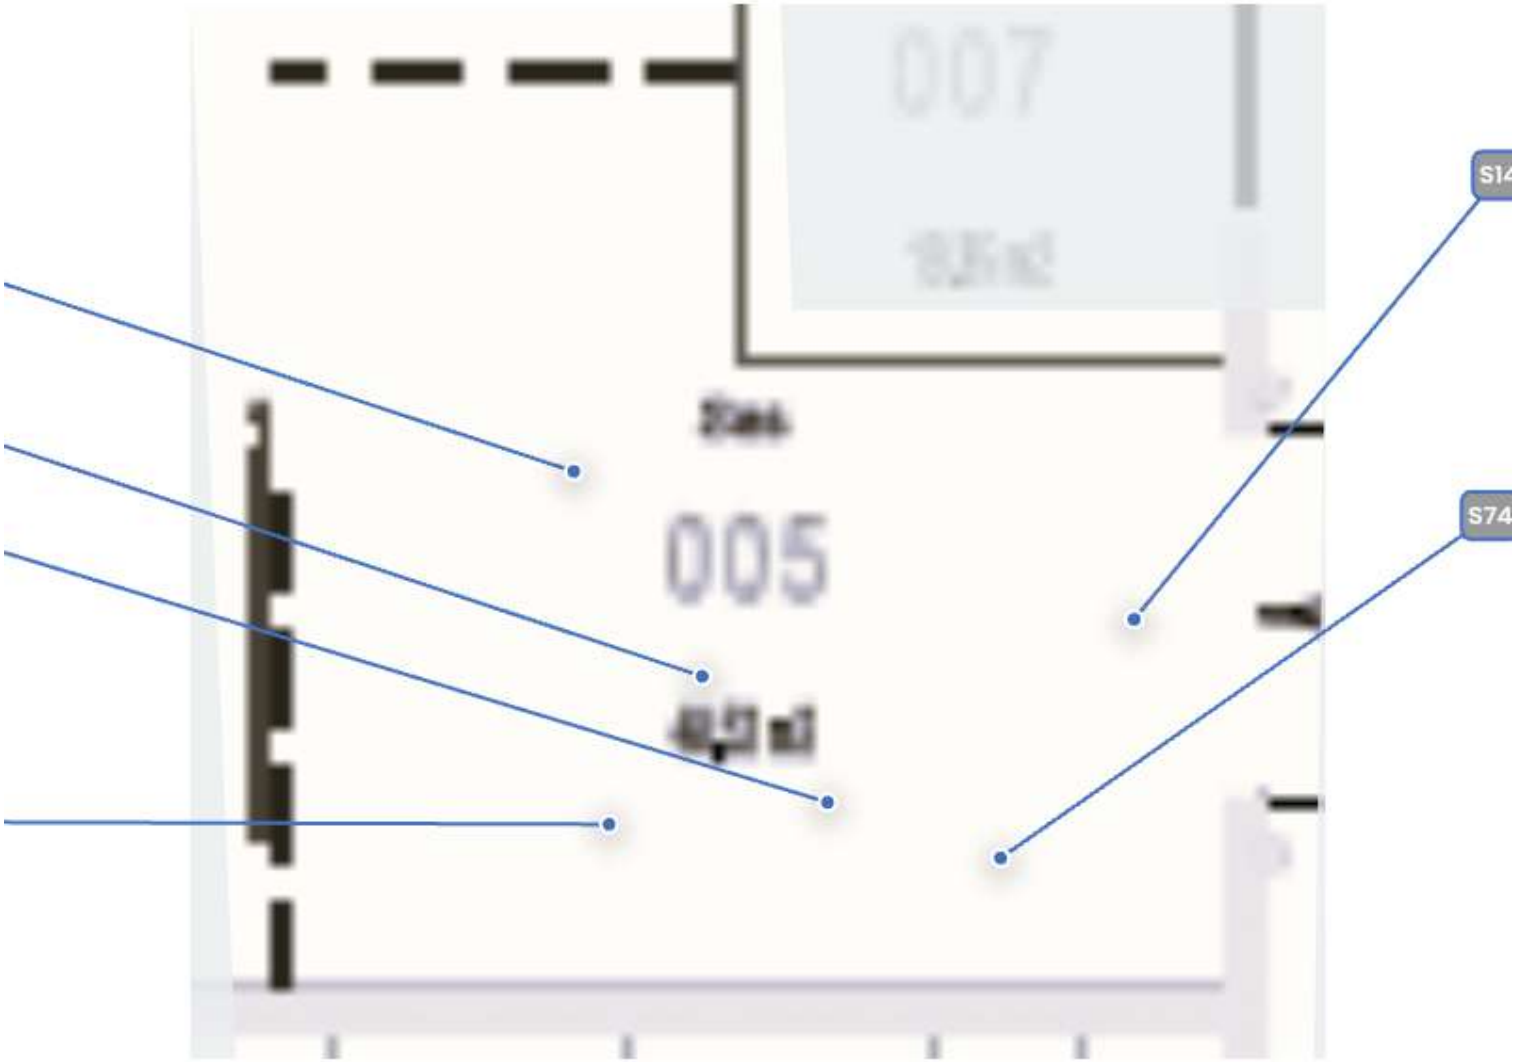

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	13 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



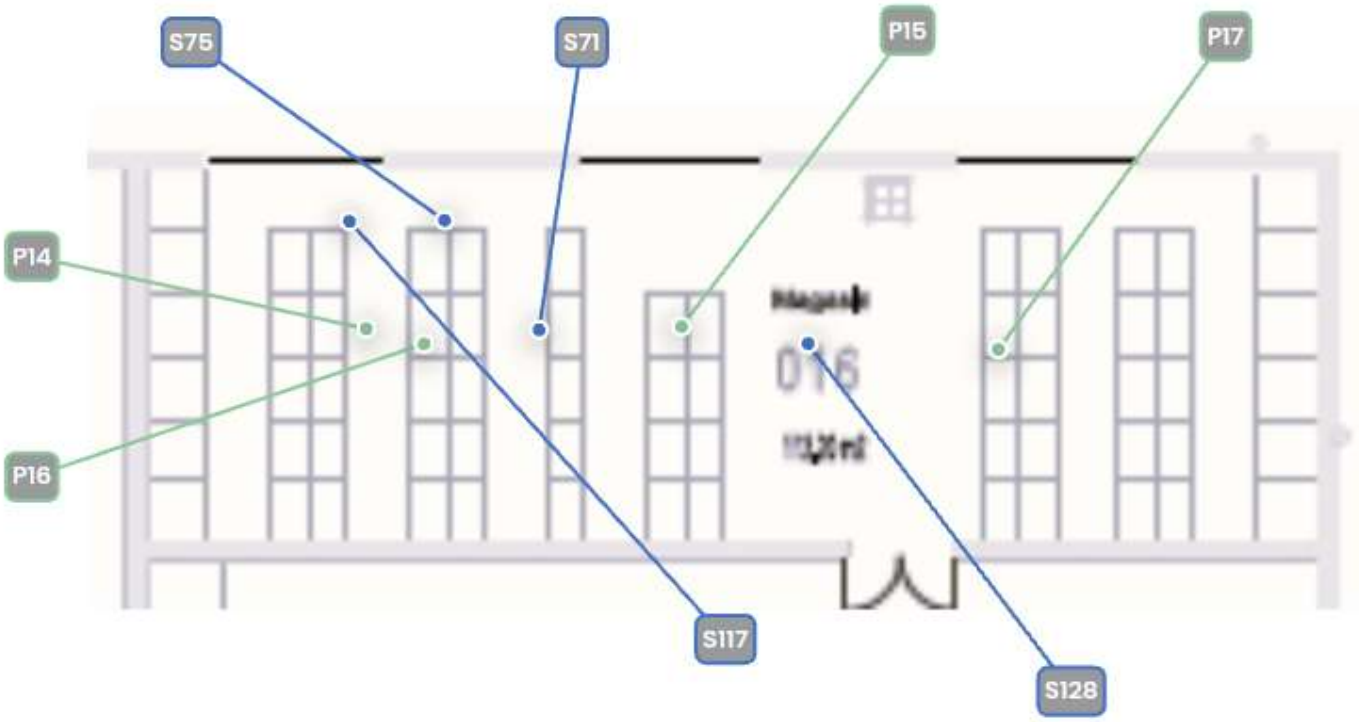

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	14 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



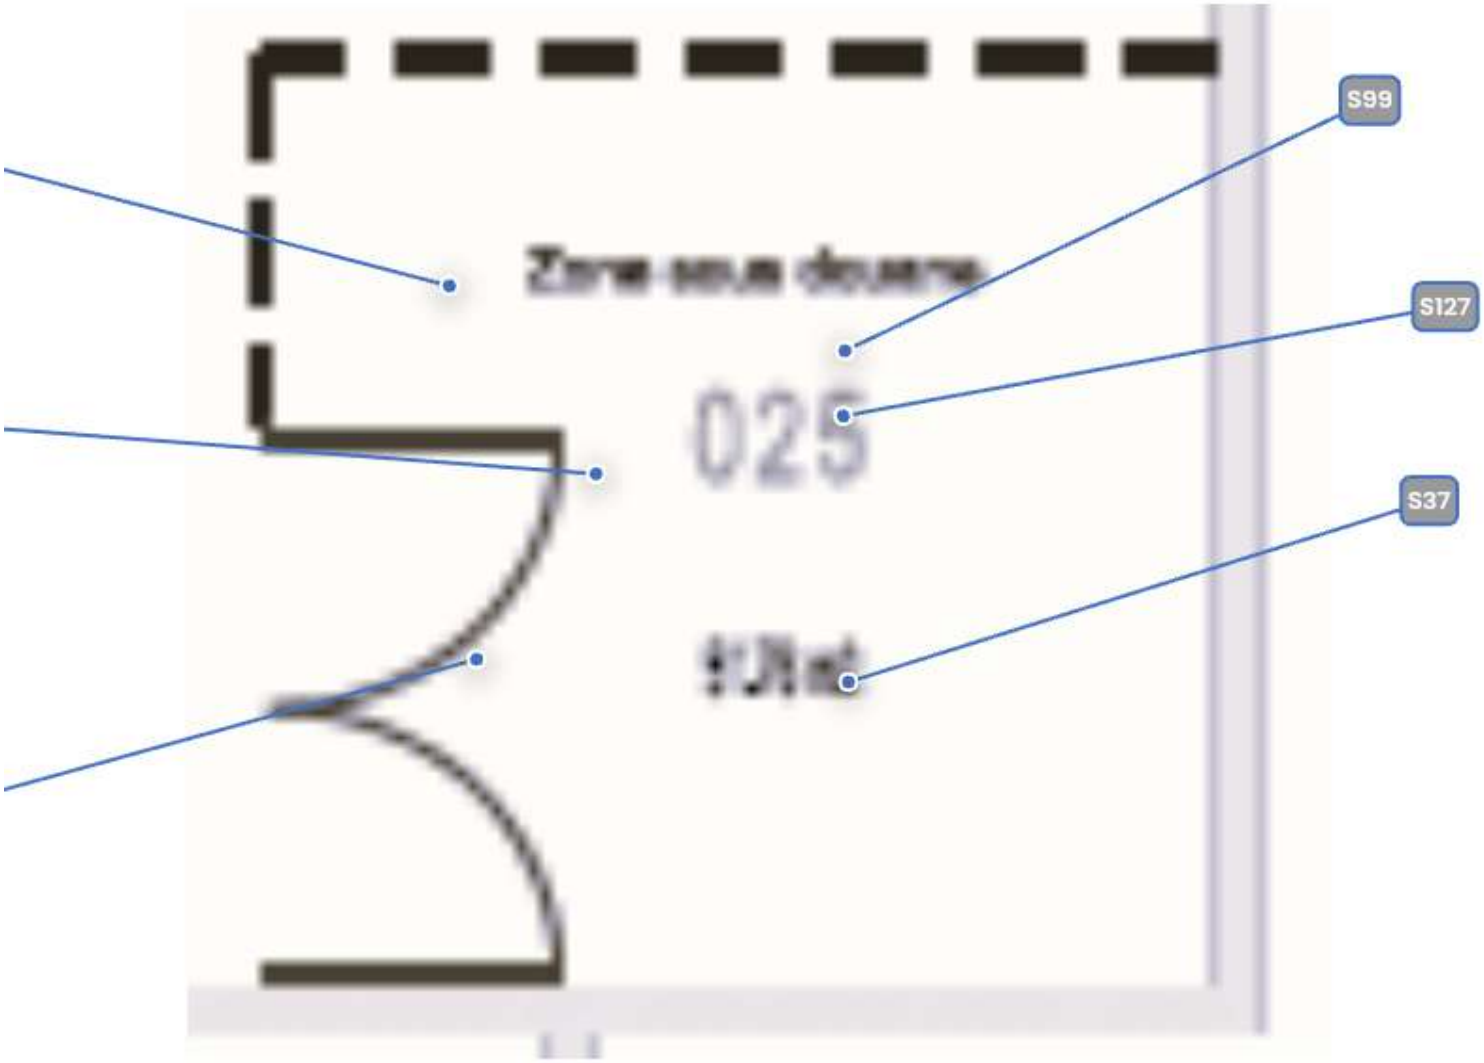

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	15 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



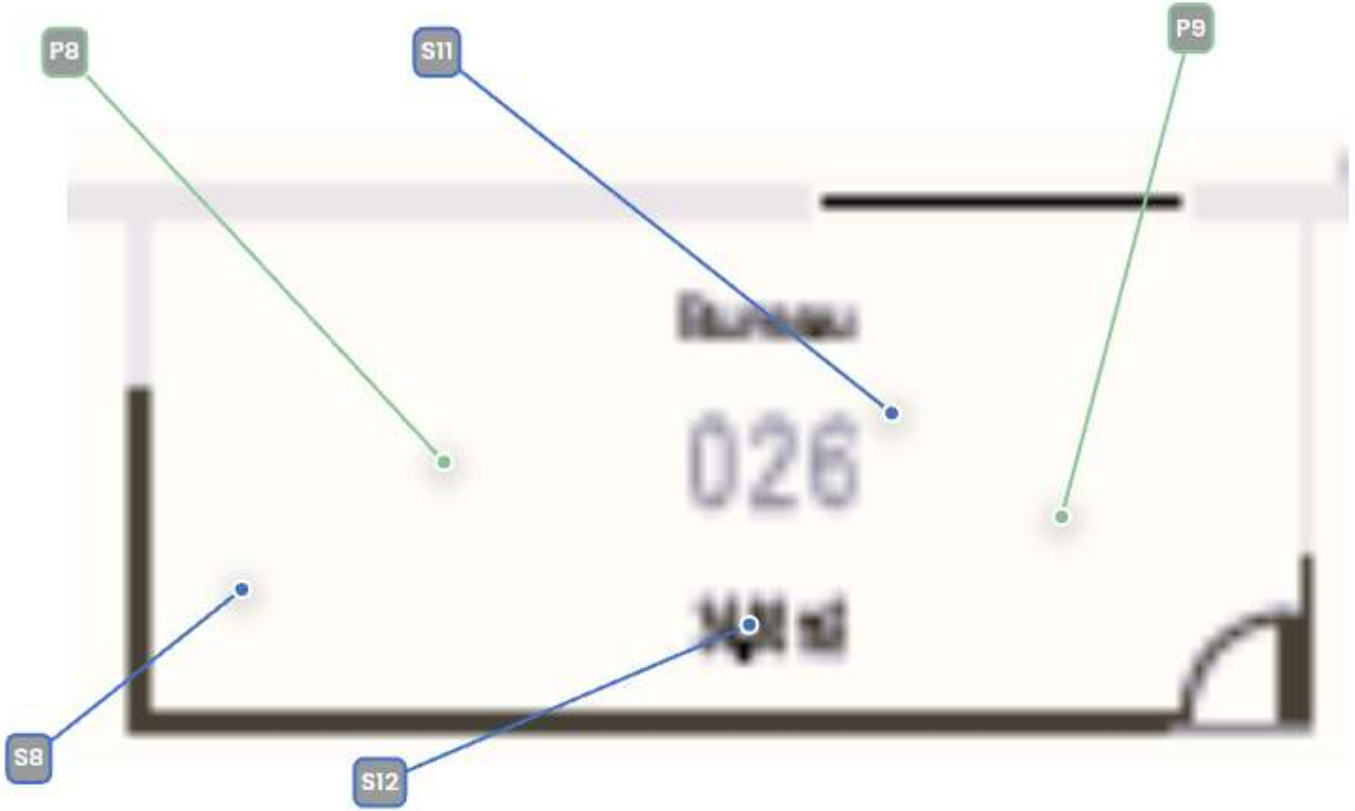

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	16 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



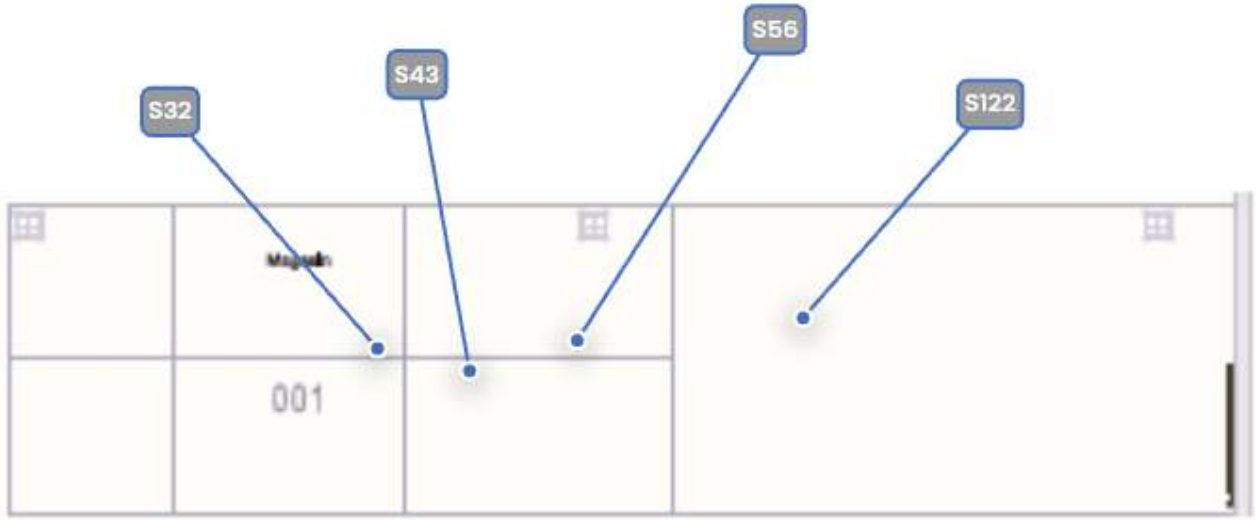

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	17 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



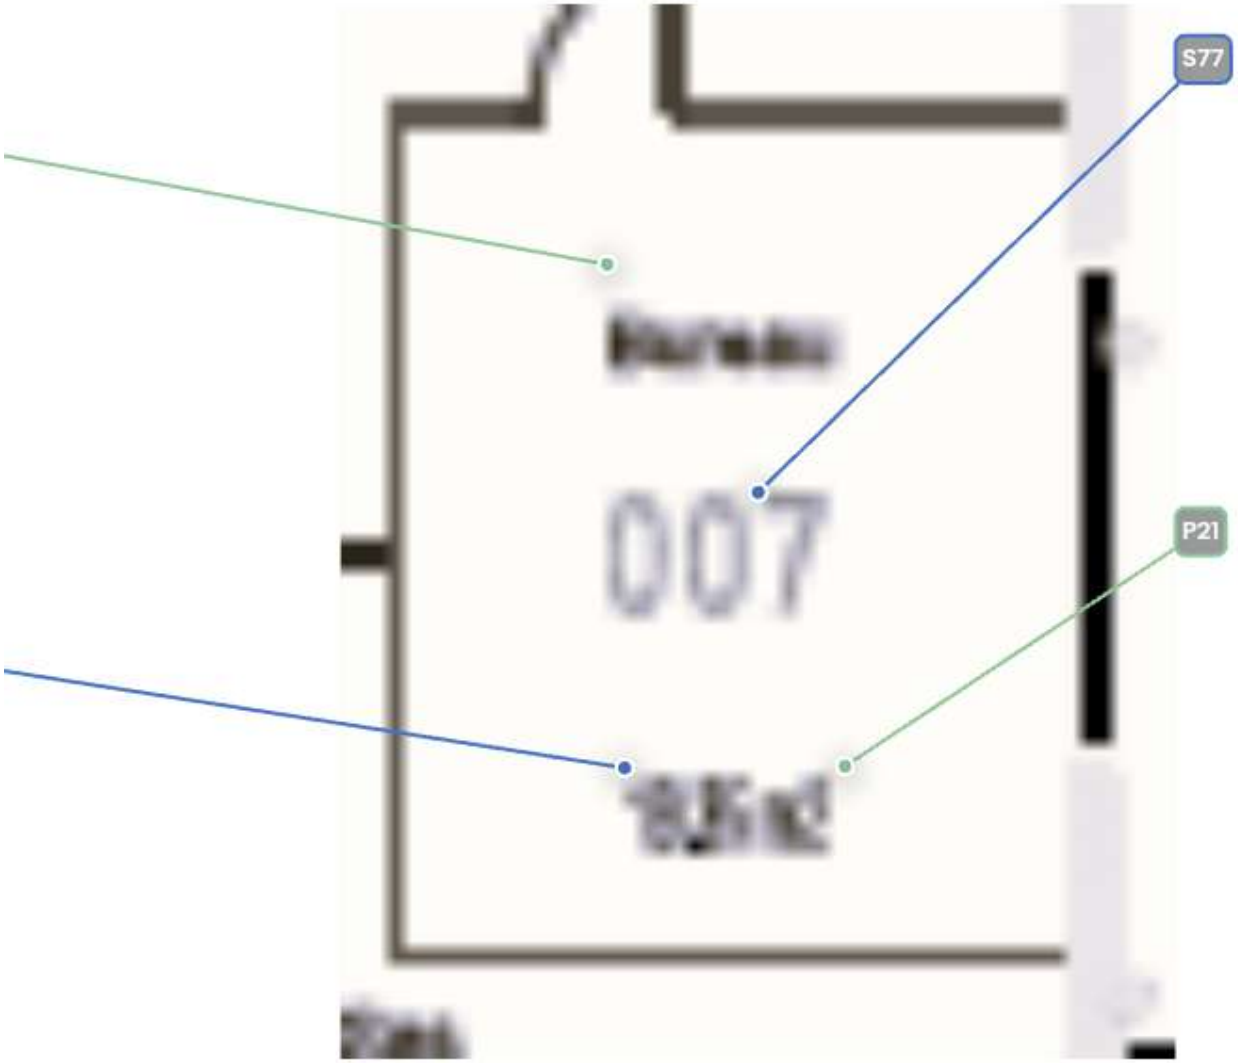

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	18 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



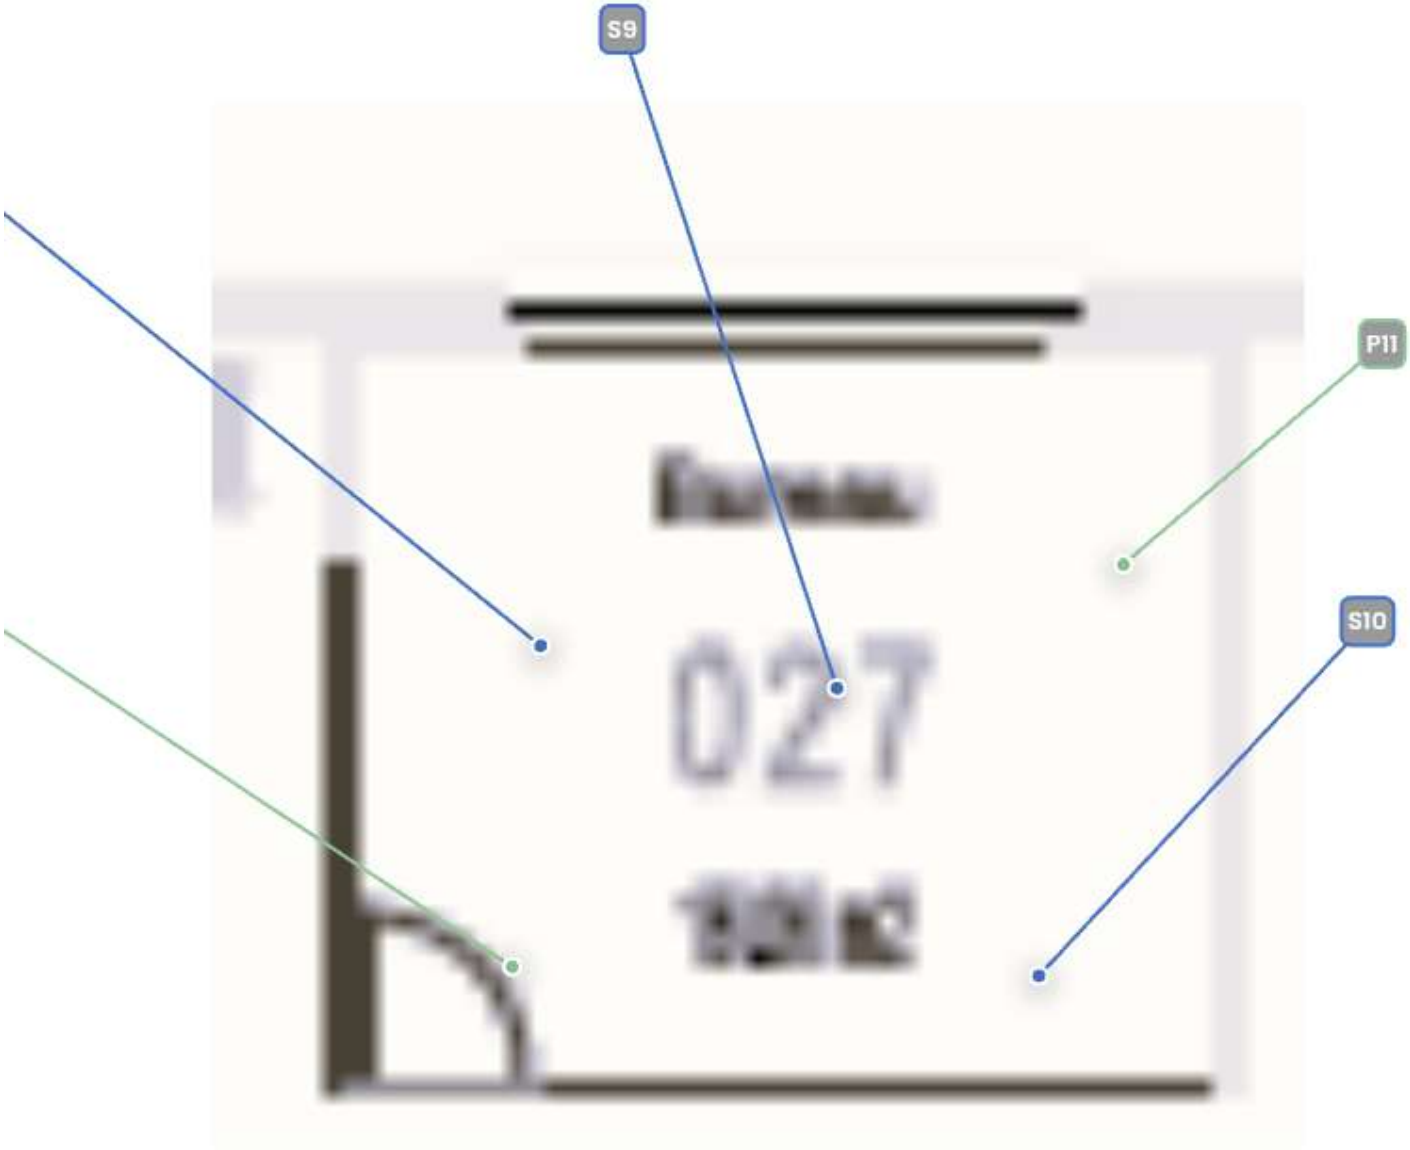

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	19 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



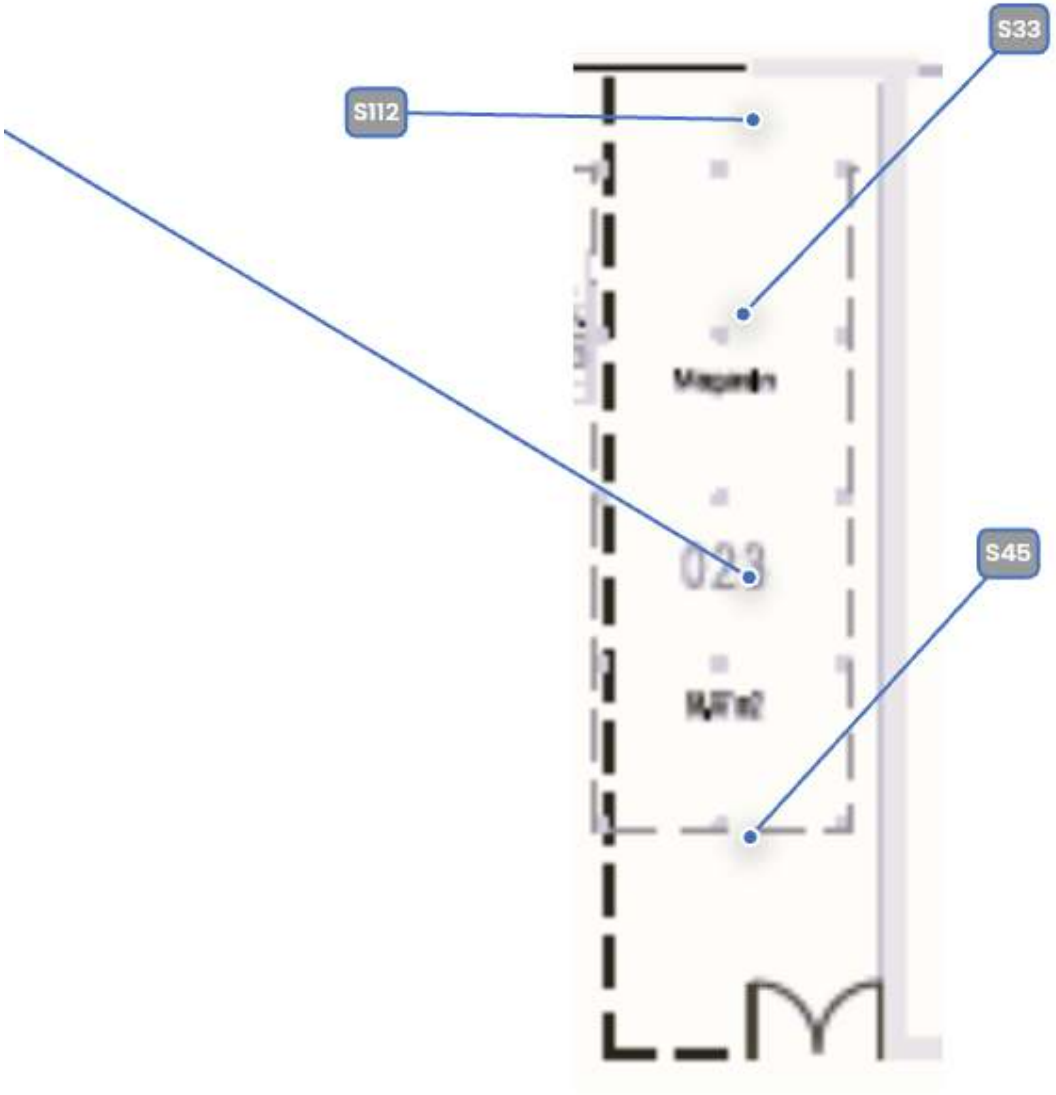

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	20 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



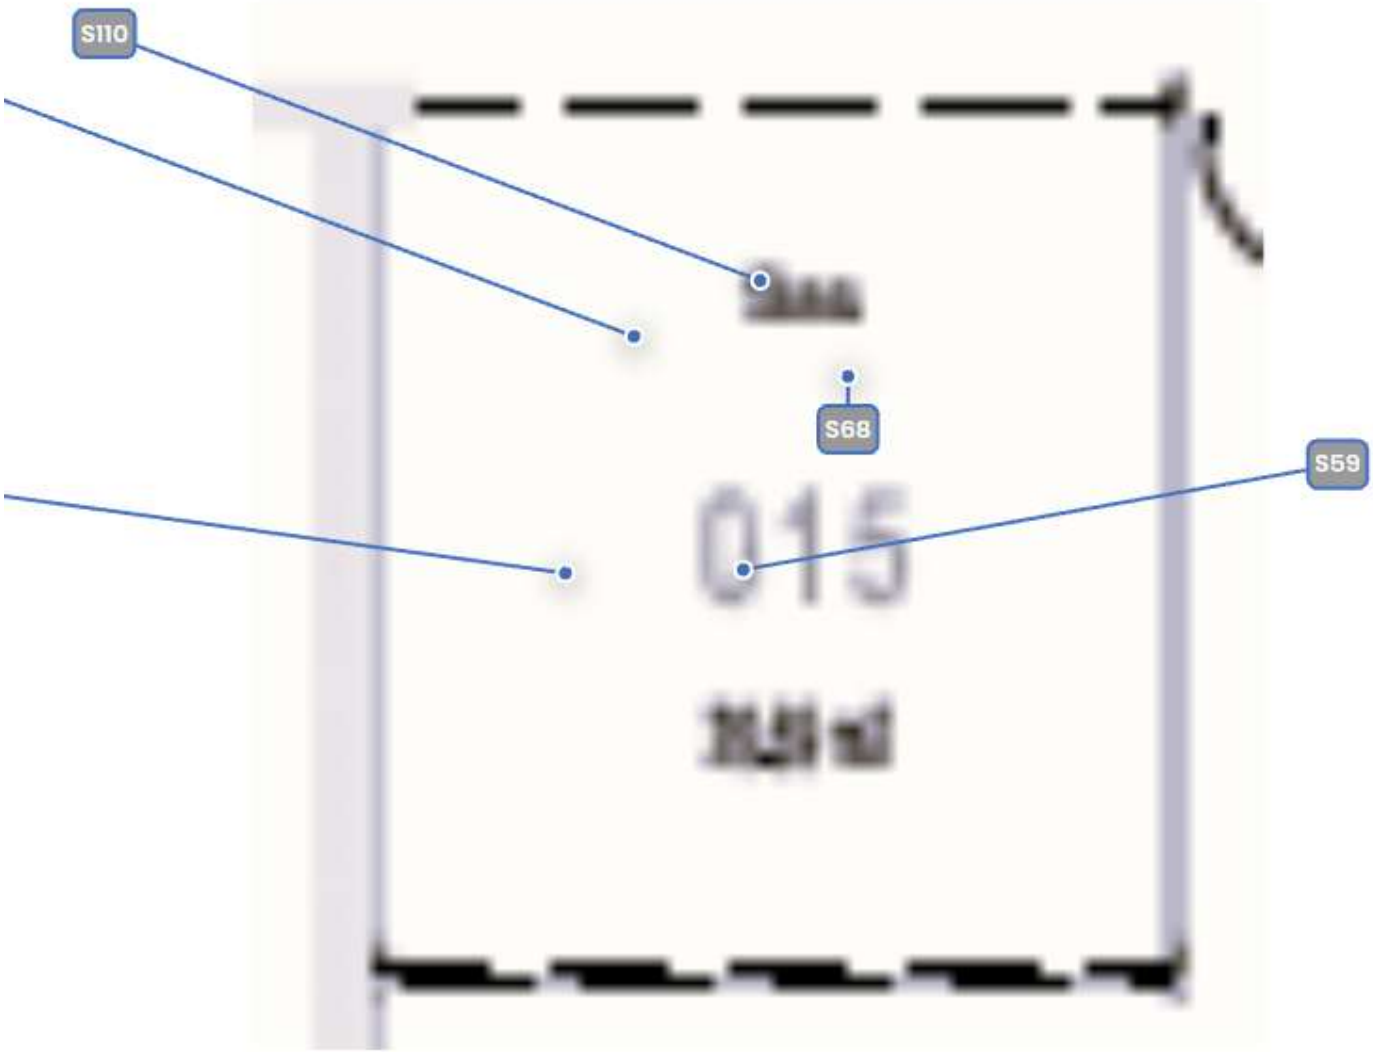

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	21 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



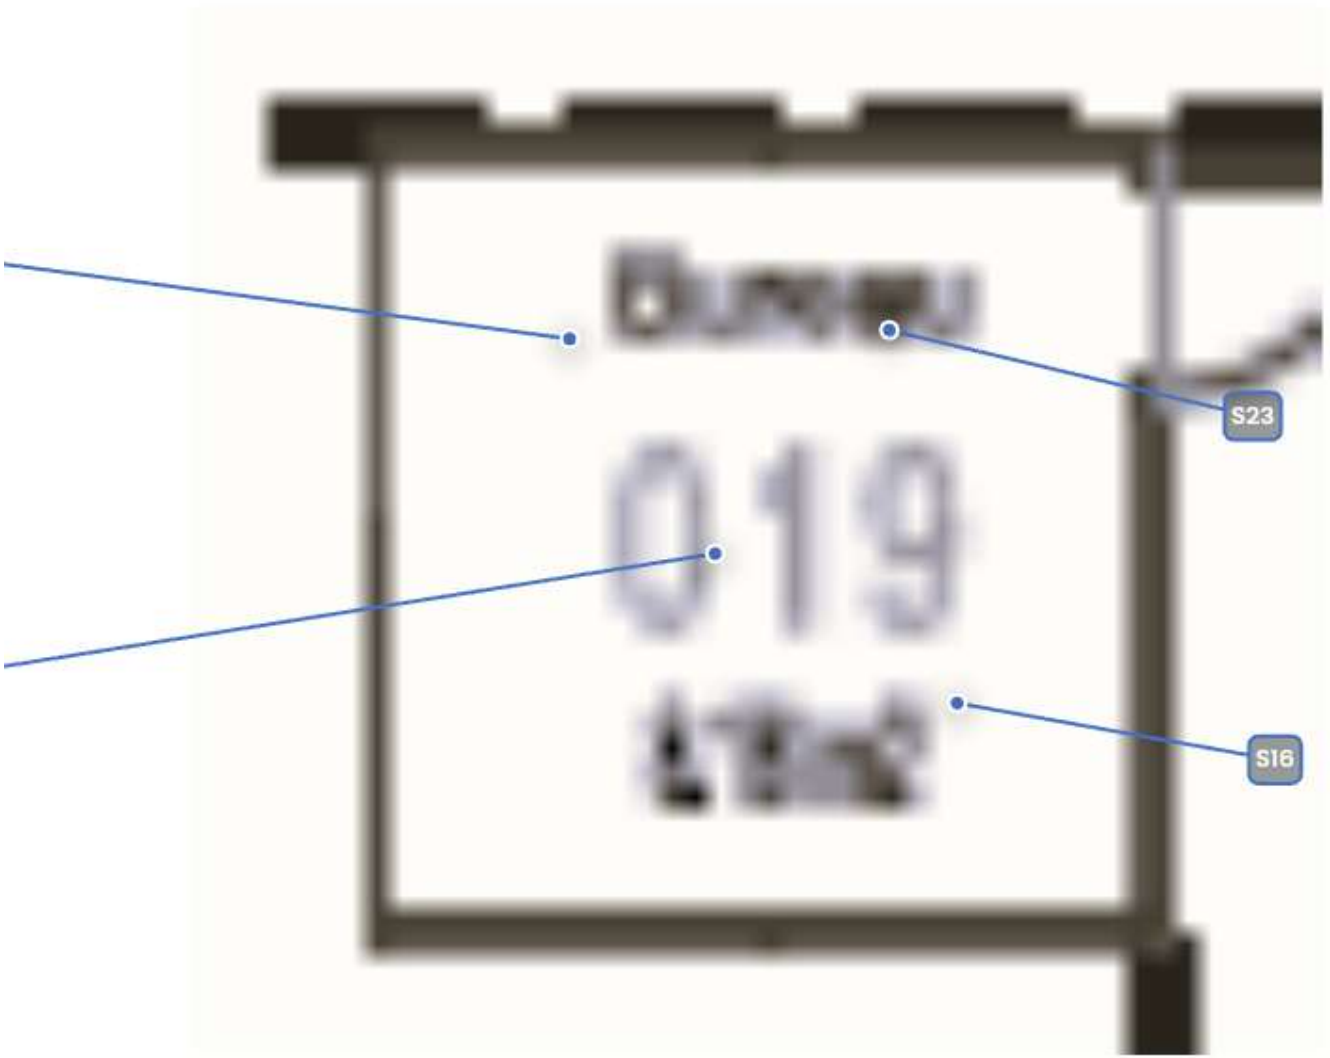

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	22 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



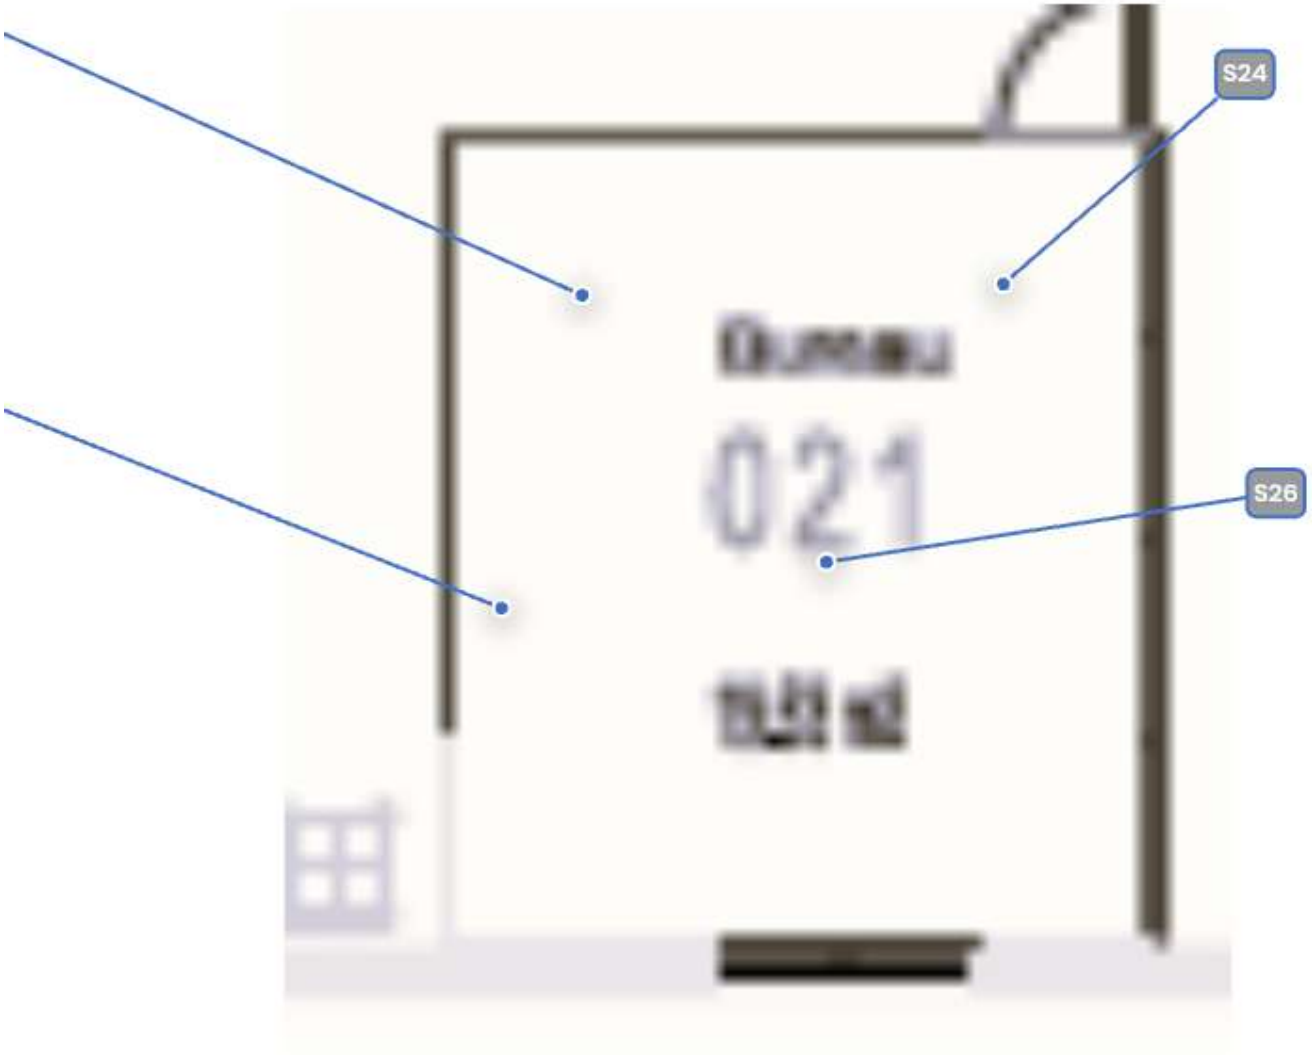

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	23 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



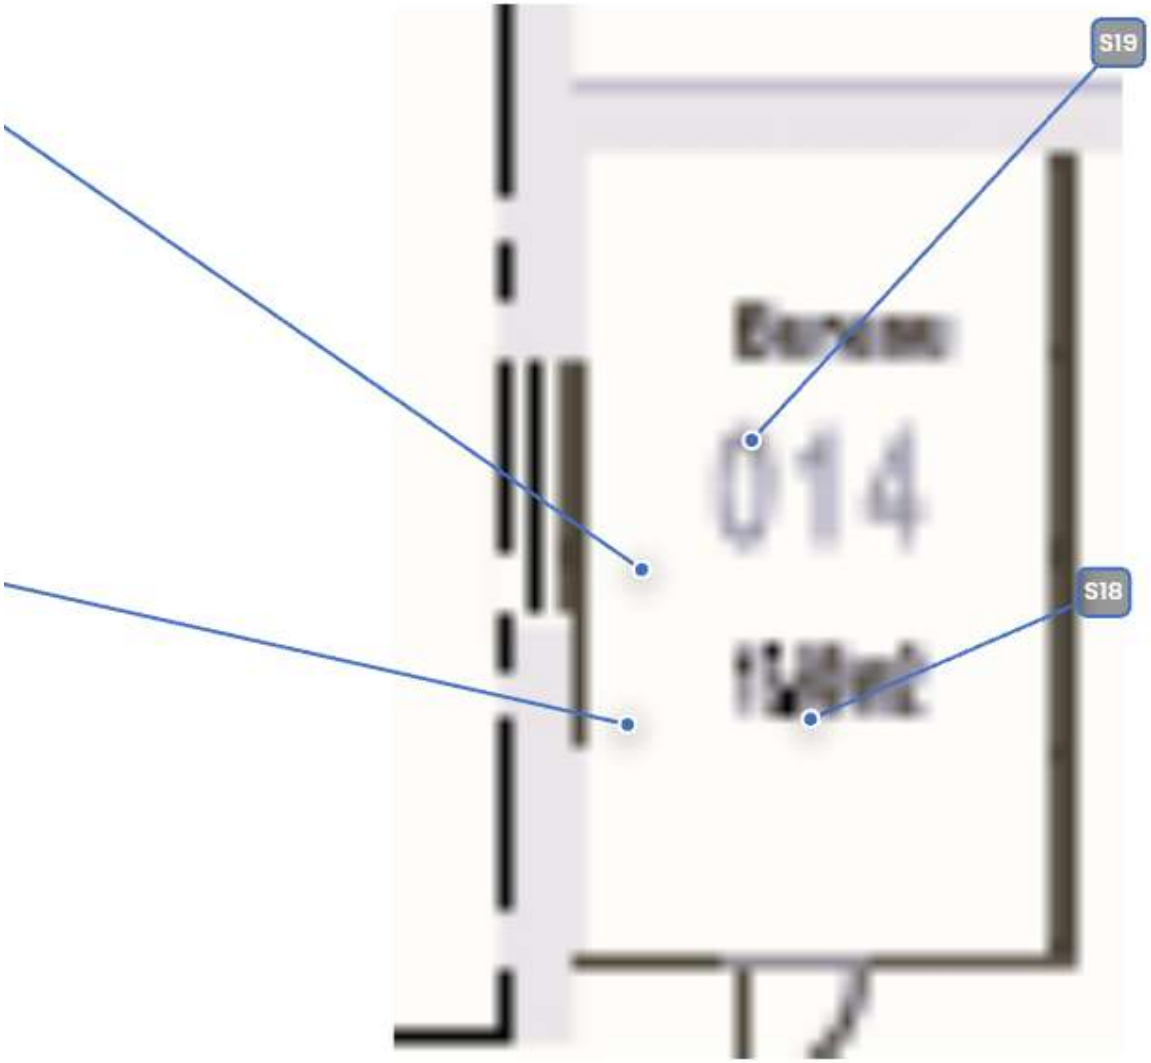

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	24 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



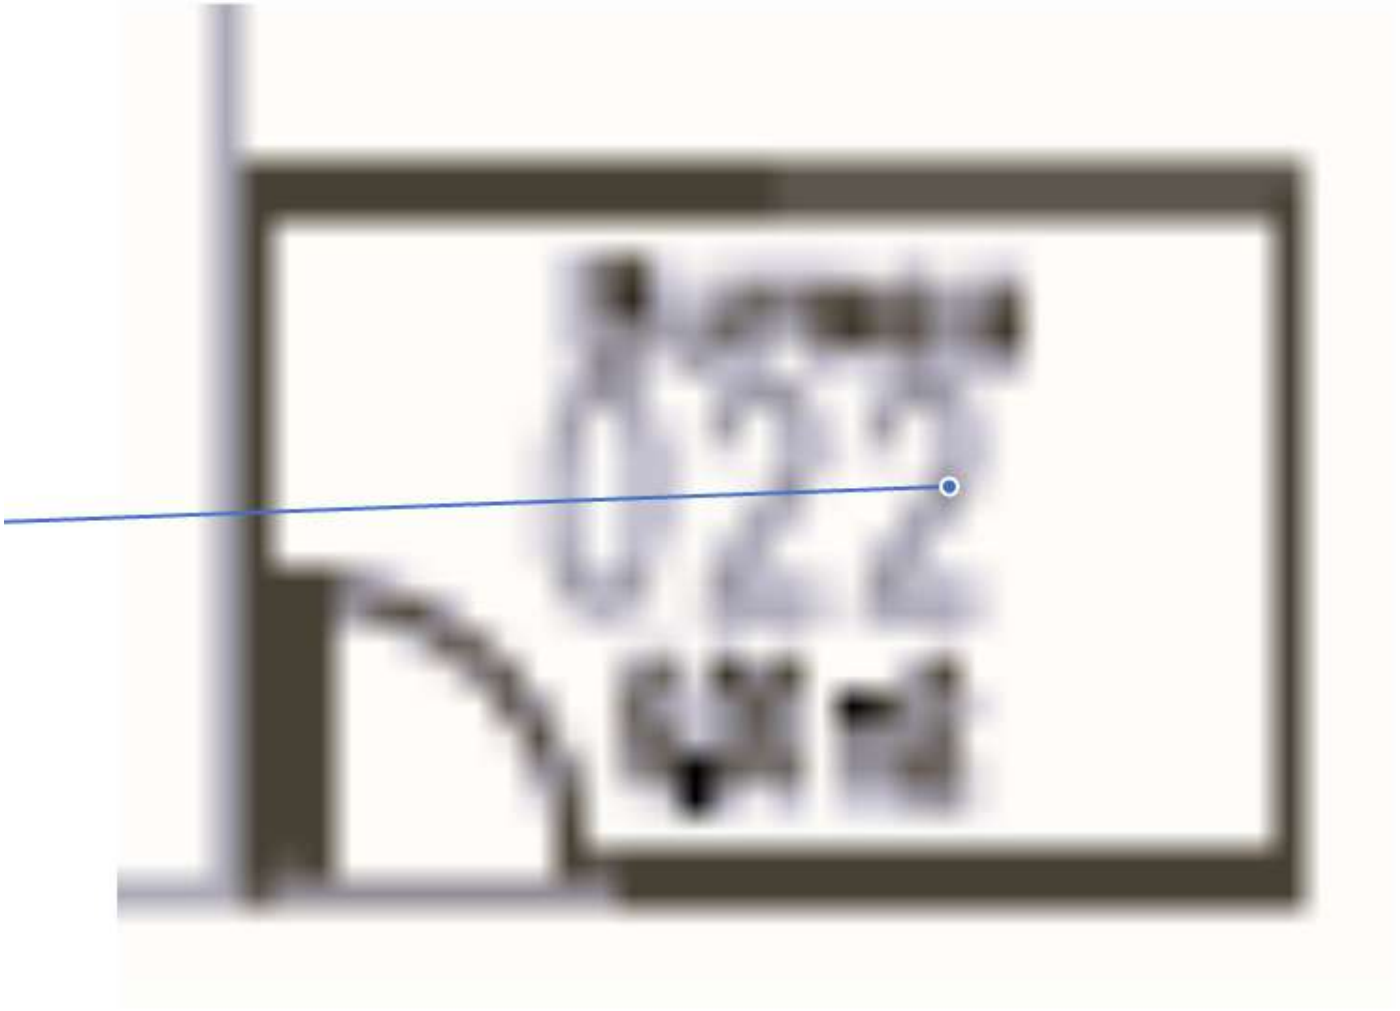

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	25 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



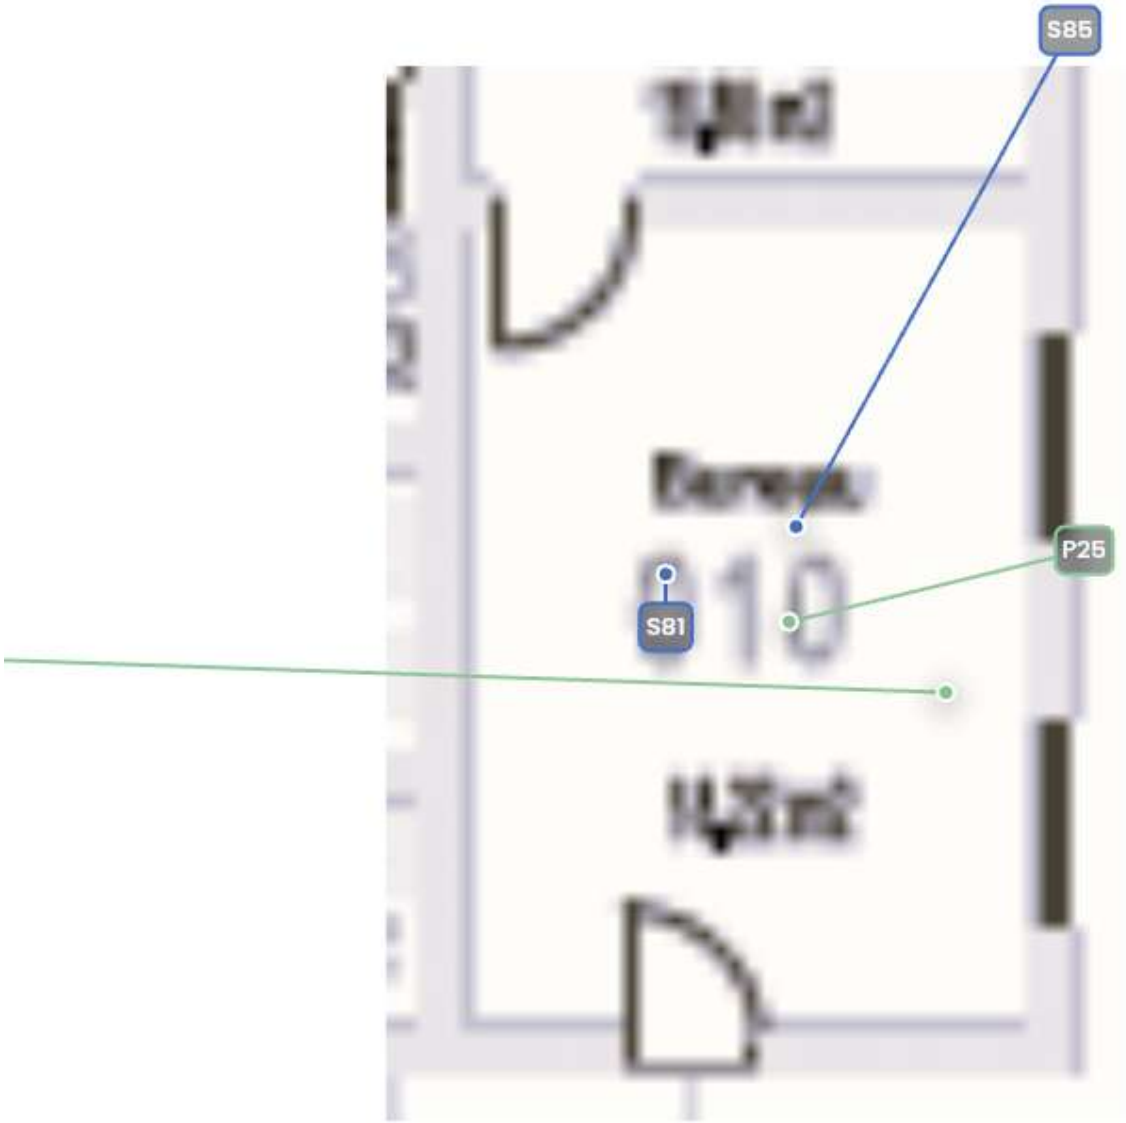

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	26 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



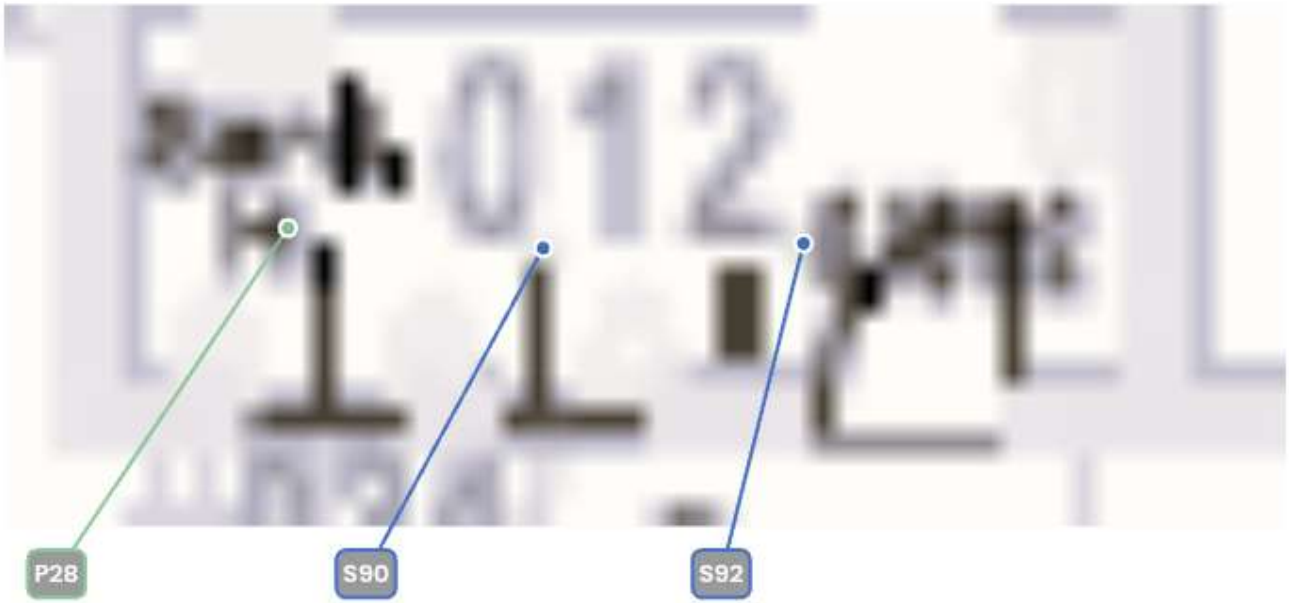

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	27 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



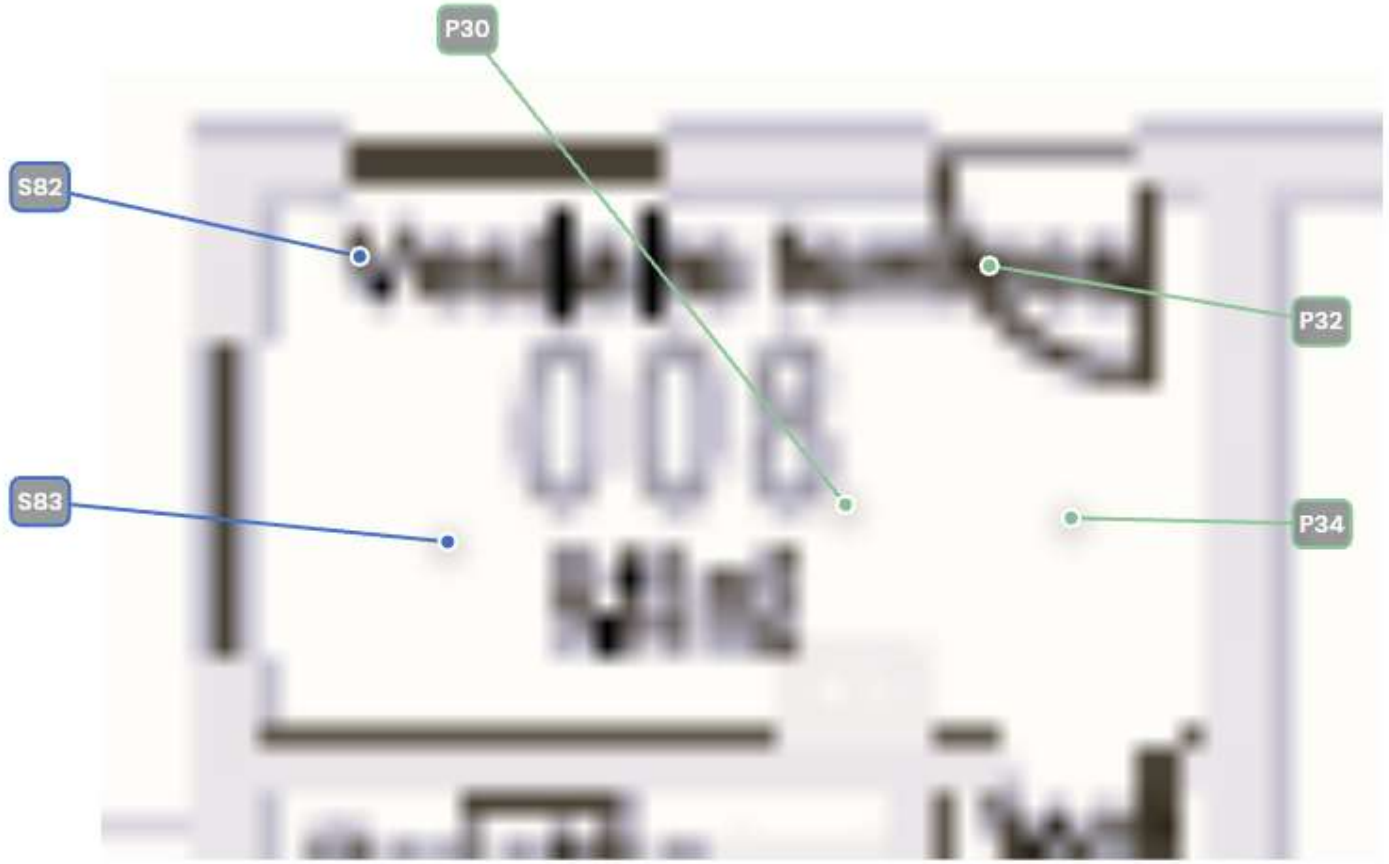

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	28 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Localisation de la zone isolée



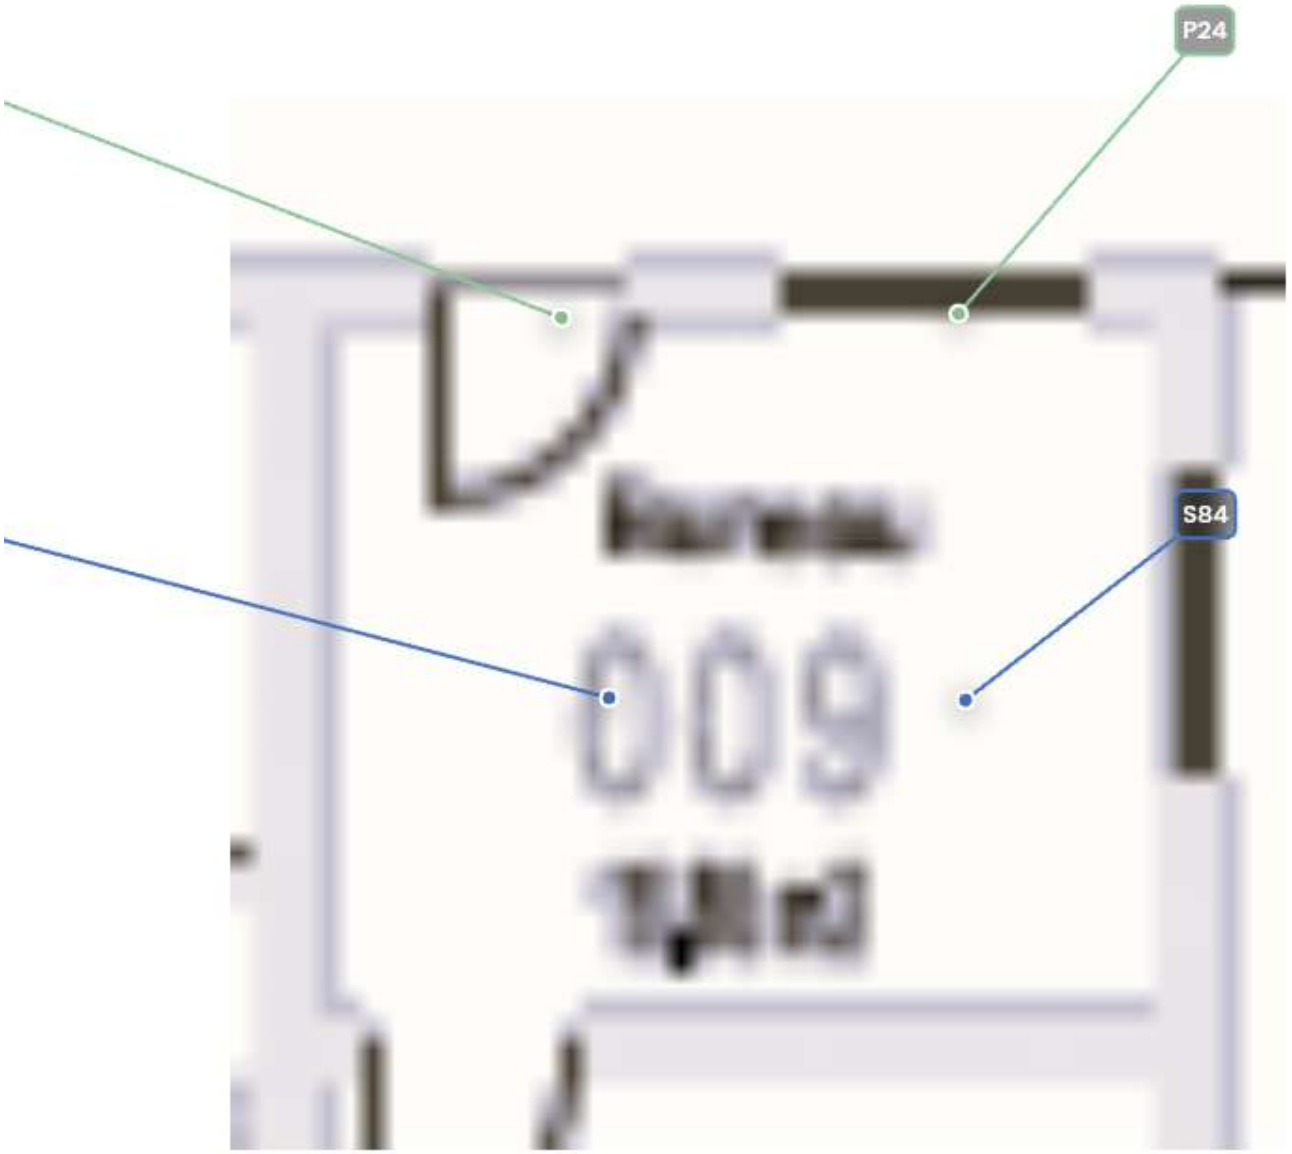

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > RDC BAT 0038	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	29 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

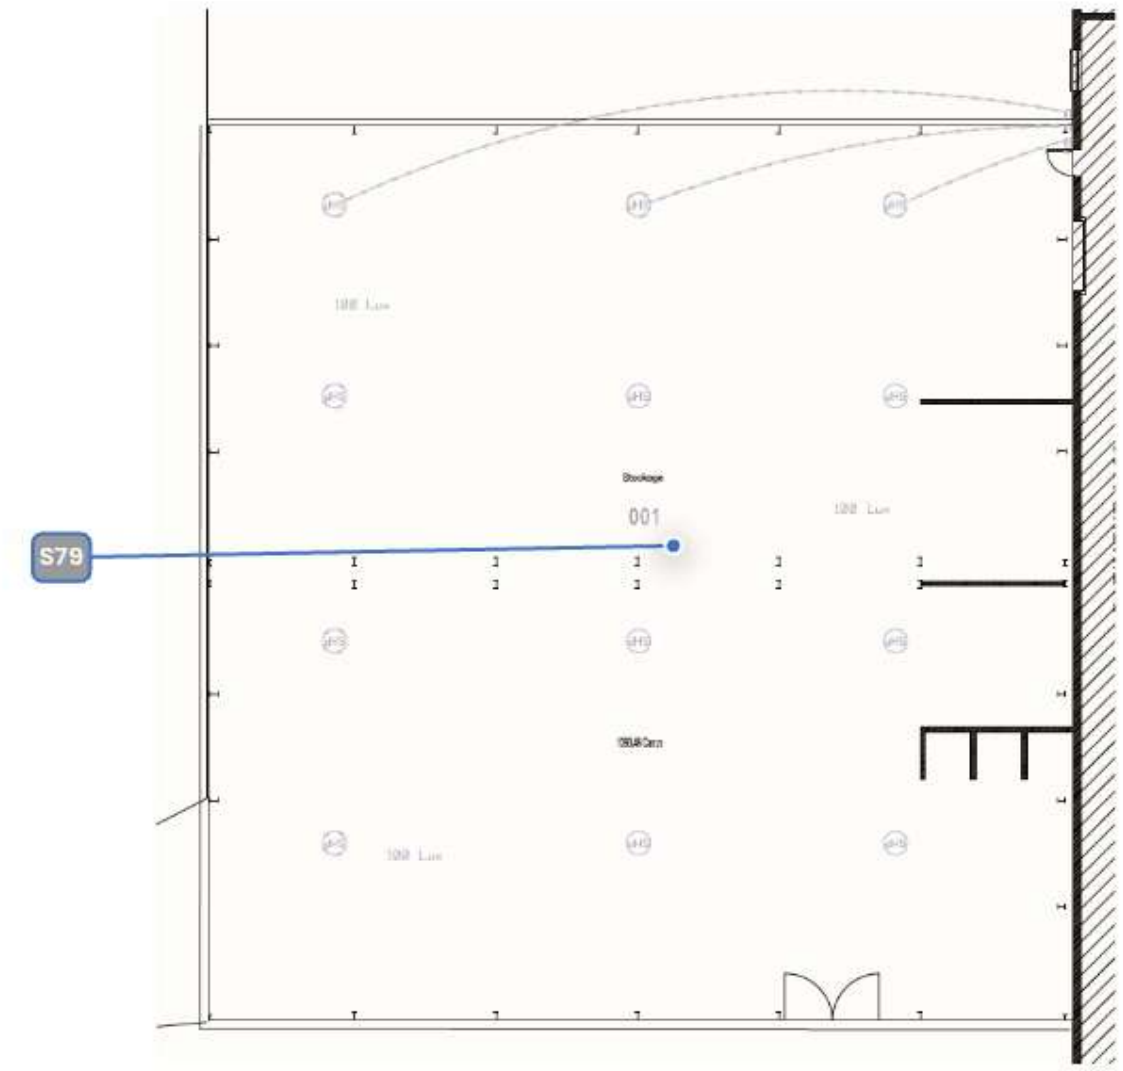

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	670313008O QUARTIER CHASSEPOT GE Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE - 67190 GRESSWILLER	
Localisation BAT 0003-0038 > R+1 BAT 0003	Date visite	Du 14/11/2024 au 20/11/2024
	Auteur	Thomas BOITEUX
	N° dossier	23221800/S5/8
	Planche	30 / 30
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

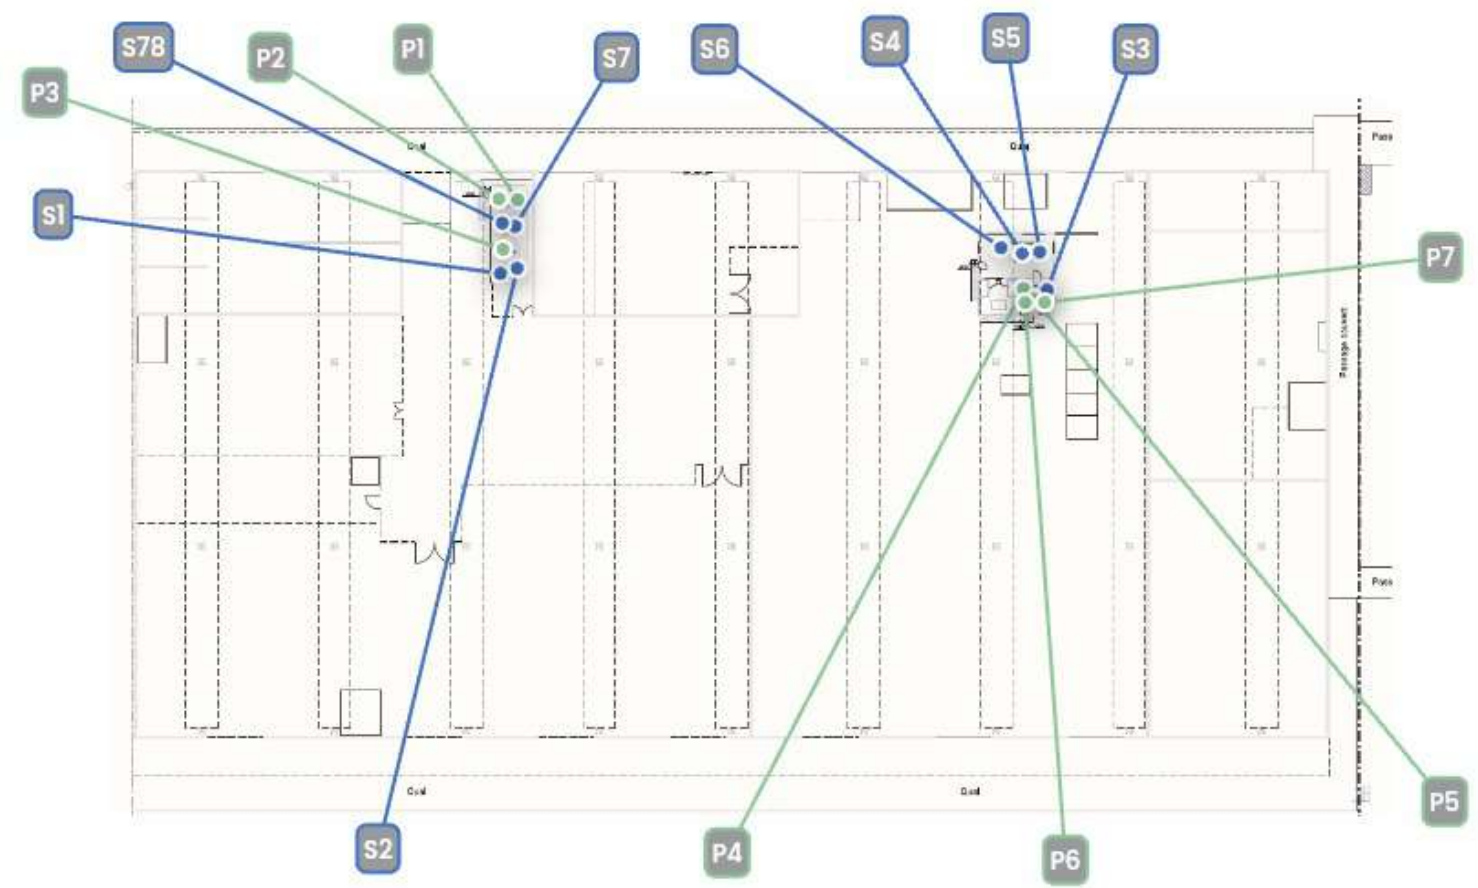

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Thomas BOITEUX
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-24-LE-132555-01

Numéro de dossier : 24A034389
Référence de dossier : 1510797887/23221800/S5/8/1_23221800/11/15

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A034389-001 - Référence *BV3GC1449 Réf. Prel : P1 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 005/Faux plafonds - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-002 - Référence *BV3KG7924 Réf. Prel : P2 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 005/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-003 - Référence *BV3KG7912 Réf. Prel : P3 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 005/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-004 - Référence *BV3KG7923 Réf. Prel : P4 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 001/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-005 - Référence *BV3KG7922 Réf. Prel : P5 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 001/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-006 - Référence *BV3KG7900 Réf. Prel : P6 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-007 - Référence *BV3KG7921 Réf. Prel : P7 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-008 - Référence *BV3GC1478 Réf. Prel : P8 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 026/Revêtements de sol - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-009 - Référence *BV3KG7916 Réf. Prel : P9 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 026/Revêtements de sol - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-010 - Référence *BV3KG7919 Réf. Prel : P10 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 027/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-011 - Référence *BV3KG7920 Réf. Prel : P11 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 027/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-012 - Référence *BV3KG7917 Réf. Prel : P12 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 006/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-013 - Référence *BV3KG7918 Réf. Prel : P13 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 006/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-014 - Référence *BV3GC1433 Réf. Prel : P14 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 016/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-015 - Référence *BV3GC1432 Réf. Prel : P15 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 016/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-016 - Référence *BV3KG7913 Réf. Prel : P16 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 016/Revêtements de sol - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-017 - Référence *BV3KG7914 Réf. Prel : P17 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 016/Revêtements de sol - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-018 - Référence *BV3GC1427 Réf. Prel : P18 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-019 - Référence *BV3GC1426 Réf. Prel : P19 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-020 - Référence *BV3GC1428 Réf. Prel : P20 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 007/Menuiseries intérieures - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-021 - Référence *BV3GC1429 Réf. Prel : P21 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 007/Menuiseries intérieures - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-022 - Référence *BV3GC1430 Réf. Prel : P22 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 009/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-023 - Référence *BV3GC1431 Réf. Prel : P23 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 010/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-024 - Référence *BV3GC1425 Réf. Prel : P24 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 009/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-025 - Référence *BV3GC1424 Réf. Prel : P25 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 010/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-026 - Référence *BV3KG7910 Réf. Prel : P26 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 029/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-027 - Référence *BV3KG7911 Réf. Prel : P27 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 029/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-028 - Référence *BV3GC1422 Réf. Prel : P28 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 012/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-029 - Référence *BV3GC1423 Réf. Prel : P29 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 011/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-030 - Référence *BV3GC1415 Réf. Prel : P30 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 008/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-031 - Référence *BV3GC1412 Réf. Prel : P31 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 028/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-032 - Référence *BV3GC1421 Réf. Prel : P32 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 008/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-033 - Référence *BV3GC1420 Réf. Prel : P33 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 028/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-034 - Référence *BV3KG7908 Réf. Prel : P34 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 008/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-035 - Référence *BV3KG7909 Réf. Prel : P35 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 028/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-036 - Référence *BV3GC1451 Réf. Prel : P36 BAT 0003-0038 - EXT - TOITURE/Etanchéité de toiture terrasse - (Bitumineux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-037 - Référence *BV3GC1419 Réf. Prel : P37 BAT 0003-0038 - EXT - TOITURE/Etanchéité de toiture terrasse - (Bitumineux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-038 - Référence *BV3GC1414 Réf. Prel : P38 BAT 0003-0038 - EXT - TOITURE/Etanchéité de toiture terrasse - (Bande/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-039 - Référence *BV3GC1417 Réf. Prel : P39 BAT 0003-0038 - EXT - TOITURE/Etanchéité de toiture terrasse - (Bande/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-040 - Référence *BV3KG7832 Réf. Prel : P43 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A034389-041 - Référence *BV3KG7873 Réf. Prel : P44 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-039796-01
Référence laboratoire N° : 24RB036677
Reçu au laboratoire le : 21/11/2024
Date d'analyse : 22/11/2024
Date d'émission de rapport : 25/11/2024 12:05
Référence de suivi du dossier N° : 24A034389
Date de réception :19/11/2024

Référence dossier Client:24A034389 - 1510797887/23221800/S5/8/1_23221800/11/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A034389-001 - BV3GC1449 Réf. Prel : P1 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 005/Faux plafonds - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	24A034389-002 - BV3KG7924 Réf. Prel : P2 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 005/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	24A034389-003 - BV3KG7912 Réf. Prel : P3 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 005/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24A034389-004 - BV3KG7923 Réf. Prel : P4 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 001/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-039796-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2024 12:05 | Page2/11
Référence laboratoire N° : 24RB036677 | Référence de suivi du dossier N° : 24A034389
Reçu au laboratoire le : 21/11/2024 | Date de réception :19/11/2024
Date d'analyse : 22/11/2024
Référence dossier Client:24A034389 - 1510797887/23221800/S5/8/1_23221800/11/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24A034389-005 - BV3KG7922 Réf. Prel : P5 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 001/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24A034389-006 - BV3KG7900 Réf. Prel : P6 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24A034389-007 - BV3KG7921 Réf. Prel : P7 BAT 0003-0038 - R+1 BAT 0003 - 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24A034389-008 - BV3GC1478 Réf. Prel : P8 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 026/Revêtements de sol - (Dur/Blanc)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)(i)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-039796-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2024 12:05 | Page3/11
Référence laboratoire N° : 24RB036677 | Référence de suivi du dossier N° : 24A034389
Reçu au laboratoire le : 21/11/2024 | Date de réception :19/11/2024
Date d'analyse : 22/11/2024
Référence dossier Client:24A034389 - 1510797887/23221800/S5/8/1_23221800/11/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	24A034389-009 - BV3KG7916 Réf. Prel : P9 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 026/Revêtements de sol - (Dur/Blanc)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24A034389-010 - BV3KG7919 Réf. Prel : P10 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 027/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	**MET** / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24A034389-011 - BV3KG7920 Réf. Prel : P11 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 027/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24A034389-012 - BV3KG7917 Réf. Prel : P12 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 006/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-039796-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2024 12:05 |
Référence laboratoire N° : 24RB036677 | Référence de suivi du dossier N° : 24A034389
Reçu au laboratoire le : 21/11/2024 | Date de réception :19/11/2024
Date d'analyse : 22/11/2024
Référence dossier Client:24A034389 - 1510797887/23221800/S5/8/1_23221800/11/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	24A034389-013 - BV3KG7918 Réf. Prel : P13 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 006/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (marron)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24A034389-014 - BV3GC1433 Réf. Prel : P14 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 016/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24A034389-015 - BV3GC1432 Réf. Prel : P15 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 016/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24A034389-016 - BV3KG7913 Réf. Prel : P16 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 016/Revêtements de sol - (Fibreux/Gris)	Matériau (fibreux) (noir)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24A034389-017 - BV3KG7914 Réf. Prel : P17 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 016/Revêtements de sol - (Fibreux/Gris)	Matériau (fibreux) (noir)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-039796-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2024 12:05 | Page5/11
Référence laboratoire N° : 24RB036677 | Référence de suivi du dossier N° : 24A034389
Reçu au laboratoire le : 21/11/2024 | Date de réception :19/11/2024
Date d'analyse : 22/11/2024
Référence dossier Client:24A034389 - 1510797887/23221800/S5/8/1_23221800/11/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	24A034389-018 - BV3GC1427 Réf. Prel : P18 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (marron)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24A034389-019 - BV3GC1426 Réf. Prel : P19 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (marron)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24A034389-020 - BV3GC1428 Réf. Prel : P20 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 007/Menuiseries intérieures - (Dur/Blanc)	Matériau semi-dur (beige)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24A034389-021 - BV3GC1429 Réf. Prel : P21 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 007/Menuiseries intérieures - (Dur/Blanc)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau de type peinture (rouge) en traces	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-039796-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2024 12:05 |
Référence laboratoire N° : 24RB036677 | Référence de suivi du dossier N° : 24A034389
Reçu au laboratoire le : 21/11/2024 | Date de réception :19/11/2024
Date d'analyse : 22/11/2024
Référence dossier Client:24A034389 - 1510797887/23221800/S5/8/1_23221800/11/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	24A034389-022 - BV3GC1430 Réf. Prel : P22 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 009/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (marron)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24A034389-023 - BV3GC1431 Réf. Prel : P23 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 010/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (marron)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24A034389-024 - BV3GC1425 Réf. Prel : P24 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 009/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24A034389-025 - BV3GC1424 Réf. Prel : P25 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 010/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (marron) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (gris) ; matériau de type peinture (rouge)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24A034389-026 - BV3KG7910 Réf. Prel : P26 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 029/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-039796-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2024 12:05 |
Référence laboratoire N° : 24RB036677 | Référence de suivi du dossier N° : 24A034389
Reçu au laboratoire le : 21/11/2024 | Date de réception :19/11/2024
Date d'analyse : 22/11/2024
Référence dossier Client:24A034389 - 1510797887/23221800/S5/8/1_23221800/11/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	24A034389-027 - BV3KG7911 Réf. Prel : P27 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 029/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24A034389-028 - BV3GC1422 Réf. Prel : P28 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 012/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24A034389-029 - BV3GC1423 Réf. Prel : P29 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 011/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24A034389-030 - BV3GC1415 Réf. Prel : P30 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 008/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau souple (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24A034389-031 - BV3GC1412 Réf. Prel : P31 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 028/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau souple (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-039796-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2024 12:05 |
Référence laboratoire N° : 24RB036677 | Référence de suivi du dossier N° : 24A034389
Reçu au laboratoire le : 21/11/2024 | Date de réception :19/11/2024
Date d'analyse : 22/11/2024
Référence dossier Client:24A034389 - 1510797887/23221800/S5/8/1_23221800/11/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	24A034389-032 - BV3GC1421 Réf. Prel : P32 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 008/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24A034389-033 - BV3GC1420 Réf. Prel : P33 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 028/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034 (2)	24A034389-034 - BV3KG7908 Réf. Prel : P34 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 008/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035 (2)	24A034389-035 - BV3KG7909 Réf. Prel : P35 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 028/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-039796-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2024 12:05 | Page9/11
Référence laboratoire N° : 24RB036677 | Référence de suivi du dossier N° : 24A034389
Reçu au laboratoire le : 21/11/2024 | Date de réception :19/11/2024
Date d'analyse : 22/11/2024
Référence dossier Client:24A034389 - 1510797887/23221800/S5/8/1_23221800/11/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	24A034389-036 - BV3GC1451 Réf. Prel : P36 BAT 0003-0038 - EXT - TOITURE/Etanchéité de toiture terrasse - (Bitumineux/Gris)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / FR9N	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
037	24A034389-037 - BV3GC1419 Réf. Prel : P37 BAT 0003-0038 - EXT - TOITURE/Etanchéité de toiture terrasse - (Bitumineux/Gris)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / FR9N	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
038	24A034389-038 - BV3GC1414 Réf. Prel : P38 BAT 0003-0038 - EXT - TOITURE/Etanchéité de toiture terrasse - (Bande/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24A034389-039 - BV3GC1417 Réf. Prel : P39 BAT 0003-0038 - EXT - TOITURE/Etanchéité de toiture terrasse - (Bande/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-039796-01
Référence laboratoire N° : 24RB036677
Reçu au laboratoire le : 21/11/2024
Date d'analyse : 22/11/2024
Référence dossier Client:24A034389 - 1510797887/23221800/S5/8/1_23221800/11/15

Date d'émission de rapport : 25/11/2024 12:05
Référence de suivi du dossier N° : 24A034389
Date de réception :19/11/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040 (2)	24A034389-040 - BV3KG7832 Réf. Prel : P43 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24A034389-041 - BV3KG7873 Réf. Prel : P44 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

(2) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-039796-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2024 12:05 | Page11/11
Référence laboratoire N° : 24RB036677 | Référence de suivi du dossier N° : 24A034389
Reçu au laboratoire le : 21/11/2024 | Date de réception :19/11/2024
Date d'analyse : 22/11/2024
Référence dossier Client:24A034389 - 1510797887/23221800/S5/8/1_23221800/11/15

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Ana Maria Spataru
Sef serviciu CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Thomas BOITEUX
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-132975-01 Date d'émission de rapport : 28/11/2024 9:02

Annule et remplace la version AR-24-LE-131575-01 ayant pour date d'émission le 20/11/2024 à 23:01, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 24A034397 Date de réception : 19/11/2024 Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client:1510797887/23221800/S5/8/2_23221800/11/15

Les résultats d'analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), réalisée par Eurofins Analyses pour l'Environnement France sont joints en annexe à ce rapport.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3KG7835 Réf. Prel : P40 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Voiries - (Bitumineux/Noir)	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris) (beige) ; (foncé), (marron)	**MOLP** * / BTS2	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris) (beige) ; (foncé), (marron)	**MET** * / FHTU	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3KG7834 Réf. Prel : P41 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Voiries - (Bitumineux/Noir)	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) ; (gris) (beige), (gris), (marron)	**MOLP** * / BTS2	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-132975-01 Date d'émission de rapport : 28/11/2024 9:02

Annule et remplace la version AR-24-LE-131575-01 ayant pour date d'émission le 20/11/2024 à 23:01, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 24A034397 Date de réception : 19/11/2024 Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client:1510797887/23221800/S5/8/2_23221800/11/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) ; (gris) (beige), (gris), (marron)	**MET** * / FHTU	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3KG7833 Réf. Prel : P42 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Voiries - (Bitumineux/Noir)	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (gris), (gris) ; (marron),	**MOLP** * / BTS2	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (gris), (gris) ; (marron),	**MET** * / FHTU	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-132975-01 Date d'émission de rapport : 28/11/2024 9:02

Annule et remplace la version AR-24-LE-131575-01 ayant pour date d'émission le 20/11/2024 à 23:01, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.


Dossier N° : 24A034397 Date de réception : 19/11/2024 Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client:1510797887/23221800/S5/8/2_23221800/11/15

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.
Le « -» indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante



Cindy Barth
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 24E219995

Version du : 25/11/2024

N° de rapport d'analyse : AR-24-LK-253860-01

Date de réception technique : 22/11/2024
Première date de réception physique : 22/11/2024

Référence Dossier :
Référence Commande : EULESA00013985

Coordinateur de Projets Clients : Elisa Gitzhofer / ElisaGitzhofer@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11

N° Ech	Matrice		Référence échantillon
001	Matériaux routiers	(ROU)	24A034397-001 - BV3KG7835 Réf. Prel : P40 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Voiries - (Bitumineux/Noir)
002	Matériaux routiers	(ROU)	24A034397-002 - BV3KG7834 Réf. Prel : P41 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Voiries - (Bitumineux/Noir)
003	Matériaux routiers	(ROU)	24A034397-003 - BV3KG7833 Réf. Prel : P42 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Voiries - (Bitumineux/Noir)

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 24E219995

Version du : 25/11/2024

N° de rapport d'analyse : AR-24-LK-253860-01

Date de réception technique : 22/11/2024

Première date de réception physique : 22/11/2024

Référence Dossier :

Référence Commande : EULESA00013985

N° Echantillon		001	002	003
Référence client :		24A034397-001	24A034397-002	24A034397-003
Matrice :		ROU	ROU	ROU
Date de prélèvement :				
Date de début d'analyse :		22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
Température de l'air de l'enceinte :		18.2°C	18.2°C	18.2°C
Préparation Physico-Chimique				
ZS0QG : **Matière sèche**	% P.B.	* 99.7 ±4.99	* 99.4 ±4.97	* 99.6 ±4.98
LS6XB : **Prétraitement de l'échantillon**				
Concassage		* Fait	* Fait	* Fait
Homogeneisation		* Fait	* Fait	* Fait
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)				
LS6XV : **HAP 16 composés - potentiellement amianté**				
Benzo(a)pyrène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Fluorène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Phénanthrène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* 2.36 ±0.826
Anthracène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* 1.11 ±0.444
Fluoranthène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* 1.92 ±1.056
Pyrène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* 1.30 ±0.715
Benzo-(a)-anthracène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* 0.74 ±0.333
Chrysène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* 0.80 ±0.320
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* 0.80 ±0.280
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Naphtalène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Acénaphthylène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Acénaphtène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Benzo(ghi)Pérylène	mg/kg M.S.	* <0.50	* <0.50	* <0.50
Somme des HAP	mg/kg M.S.	<0.50	<0.50	9.03

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 24E219995

N° de rapport d'analyse : AR-24-LK-253860-01

Version du : 25/11/2024

Date de réception technique : 22/11/2024
Première date de réception physique : 22/11/2024

Référence Dossier :
Référence Commande : EULESA00013985



Olivier Lesieur
Technicien Référent

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement – Détail disponible sur demande

Le résultat d'une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des paramètres sommés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° :24E219995

N° de rapport d'analyse : AR-24-LK-253860-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande : EULESA00013985

Matériaux routiers

Code	Analyse	Principe et référence de la méthode	LQI	Incertitude à la LQ	Unité	Prestation réalisée sur le site de :
LS6XB	Prétraitement de l'échantillon	Broyage [Broyage et homogénéisation] - NF EN 15002				Eurofins Analyses pour l'Environnemen France
	Concassage					
	Homogeneisation					
LS6XV	HAP 16 composés - potentiellement amianté	GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - Méthode interne				
	Benzo(a)pyrène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Fluorène		0.5	50%	mg/kg M.S.	
	Phénanthrène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Anthracène		0.5	40%	mg/kg M.S.	
	Fluoranthène		0.5	55%	mg/kg M.S.	
	Pyrène		0.5	55%	mg/kg M.S.	
	Benzo-(a)-anthracène		0.5	45%	mg/kg M.S.	
	Chrysène		0.5	40%	mg/kg M.S.	
	Benzo(b)fluoranthène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Benzo(k)fluoranthène		0.5	60%	mg/kg M.S.	
	Indeno (1,2,3-cd) Pyrène		0.5	50%	mg/kg M.S.	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0.5	33%	mg/kg M.S.	
	Naphtalène		0.5	30%	mg/kg M.S.	
	Acénaphthylène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Acénaphtène		0.5	30%	mg/kg M.S.	
	Benzo(ghi)Pérylène		0.5	50%	mg/kg M.S.	
	Somme des HAP				mg/kg M.S.	
ZS0QG	Matière sèche	Gravimétrie [Séchage à 105°C par balance thermogravimétrique (Thermocouple)] - NF EN 15934 - Méthode A	0.5	5%	% P.B.	

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons

Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 24E219995

N° de rapport d'analyse : AR-24-LK-253860-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande : EULESA00013985

Matériaux routiers

N° Ech	Référence Client	Date & Heure Prélèvement	Date de Réception Physique (1)	Date de Réception Technique (2)	Code-Barre	Nom Flacon
001	24A034397-001		22/11/2024	22/11/2024		
002	24A034397-002		22/11/2024	22/11/2024		
003	24A034397-003		22/11/2024	22/11/2024		

(1) : Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l'information n'a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Thomas BOITEUX
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-131575-01 | Date d'émission de rapport : 20/11/2024 23:01 |
Dossier N° : 24A034397 | Date de réception : 19/11/2024 | Date d'analyse : 19/11/2024
Référence dossier Client:1510797887/23221800/S5/8/2_23221800/11/15

Une analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été également prise en compte et les résultats seront annexés lors d'un second envoi qui fera l'objet d'une version amendée et complétée du présent rapport.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3KG7835 Réf. Prel : P40 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Voiries - (Bitumineux/Noir)	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris) (beige) ; (foncé), (marron)	**MOLP** * / BTS2	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris) (beige) ; (foncé), (marron)	**MET** * / FHTU	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3KG7834 Réf. Prel : P41 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Voiries - (Bitumineux/Noir)	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) ; (gris) (beige), (gris), (marron)	**MOLP** * / BTS2	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) ; (gris) (beige), (gris), (marron)	**MET** * / FHTU	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-131575-01 | Date d'émission de rapport : 20/11/2024 23:01 |
Dossier N° : 24A034397 | Date de réception : 19/11/2024 | Date d'analyse : 19/11/2024
Référence dossier Client:1510797887/23221800/S5/8/2_23221800/11/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3KG7833 Réf. Prel : P42 BAT 0003-0038 - EXT - FACADE/Voiries - (Bitumineux/Noir)	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (gris), (gris) ; (marron),	**MOLP** * / BTS2	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (gris), (gris) ; (marron),	**MET** * / FHTU	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-131575-01 | Date d'émission de rapport : 20/11/2024 23:01 | Page3/3
Dossier N° : 24A034397 | Date de réception : 19/11/2024 | Date d'analyse : 19/11/2024
Référence dossier Client:1510797887/23221800/S5/8/2_23221800/11/15

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.
Le « -» indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante



Lucile Florczak
Cheffe de Groupe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Thomas BOITEUX
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-24-LE-147729-01

Numéro de dossier : 24A037691
Référence de dossier : 1510797887/23221800/S5/8/3_23221800/11/15

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A037691-001 - Référence *BV3KG7533 Réf. Prel : P45 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 002/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Cotonneux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037691-002 - Référence *BV3KG7532 Réf. Prel : P46 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 024/Faux plafonds - (Compact/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037691-003 - Référence *BV3KG7534 Réf. Prel : P47 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 013/Faux plafonds - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037691-004 - Référence *BV3KG7536 Réf. Prel : P48 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 013/Faux plafonds - (Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-043778-01 | Date d'émission de rapport : 21/12/2024 7:17 |
Référence laboratoire N° : 24RB040471 | Référence de suivi du dossier N° : 24A037691
Reçu au laboratoire le : 18/12/2024 | Date de réception :17/12/2024
Date d'analyse : 20/12/2024
Référence dossier Client:24A037691 - 1510797887/23221800/S5/8/3_23221800/11/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	24A037691-001 - BV3KG7533 Réf. Prel : P45 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 002/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Cotonneux/Gris)	Matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MOLP** / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	24A037691-002 - BV3KG7532 Réf. Prel : P46 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 024/Faux plafonds - (Compact/Beige)	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	24A037691-003 - BV3KG7534 Réf. Prel : P47 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 013/Faux plafonds - (Compact/Gris)	Matériau fibreux de type isolant (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (gris)	**MOLP** / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	24A037691-004 - BV3KG7536 Réf. Prel : P48 BAT 0003-0038 - RDC BAT 0003 - 013/Faux plafonds - (Compact/Blanc)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-043778-01 | Date d'émission de rapport : 21/12/2024 7:17 | Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB040471 | Référence de suivi du dossier N° : 24A037691
Reçu au laboratoire le : 18/12/2024 | Date de réception :17/12/2024
Date d'analyse : 20/12/2024
Référence dossier Client:24A037691 - 1510797887/23221800/S5/8/3_23221800/11/15

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.


Validé et approuvé par :



Andra Enescu
Sef serviciu CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

PLACE DE GRESSWILLER
QUARTIER CHASSEPOT
670.313.008.O
BATIMENT 0038

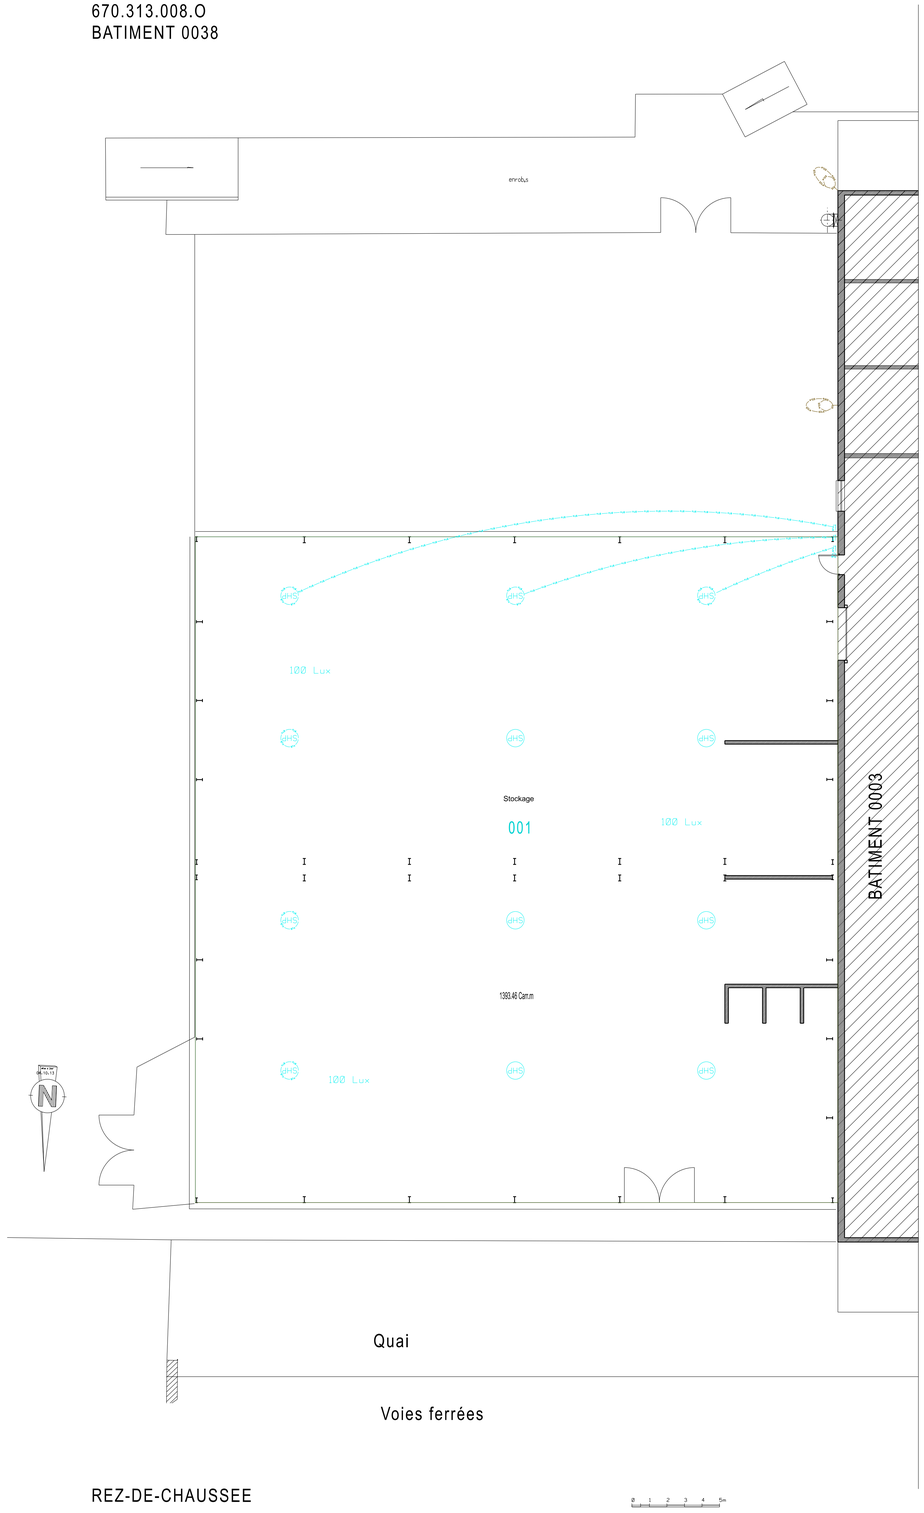

REZ-DE-CHAUSSEE

0 1 2 3 4 5m

ESID METZ

USID
de
Strasbourg

Dessiné par :
reprise.stg
phillippe weisheimer

Chef de l'USID de Strasbourg
L'ingénieur en chef de 2ème classe
Frédéric BUREAU

BAS RHIN
GRESSWILLER

QUARTIER CHASSEPOT
HANGAR OUVERT

PLAN DU REFERENTIEL

NIVEAU
REZ DE CHAUSSEE

Echelle : 1/350

SGA
Secrétariat général pour l'administration

Chorus Imm.:
160767

Chorus Comp.:
267715

Nom de la fiche :
670313008O_0038_N_00_ATL

Date création : 28/06/2010

Date indice :

Indice
1

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE
DE LA DEFENSE

PLACE DE GRESSWILLER
QUARTIER CHASSEPOT
670.313.008.O
BATIMENT 0003

BATIMENT 0002

Passage couvert

Quai

Quai

Bureau
005
45,49 m2

Vestiaire hommes
002
14,83 m2

Bureau
001
12,02 m2

Passage couvert

Passage couvert

Quai

Quai

Voies ferrées

Voies ferrées

Voies ferrées

1er ETAGE

ESID METZ USID de Strasbourg	Dessiné par : philippe weisheimer philippe weisheimer Chef de l'USID de Strasbourg L'ingénieur en chef de 2ème classe Frédéric BUREAU	BAS RHIN GRESSWILLER QUARTIER CHASSEPOT MAGASINS ARPRO PLAN DU REFERENTIEL NIVEAU 1er NIVEAU Echelle : 1/400	SGA Secrétariat général pour l'administration Chorus Imm.: 160767 Chorus Comp.: 273545 Nom de la fiche : 670313008O_0003_N_01_ATL Date création : 11/04/2014 Date indice : Indice 0	Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE LA DEFENSE
