
CMN - Palais du Tau

Planning EXE fin de travaux du 06.08.26

N°	Texte1	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**OPR et RECEPTIONS**	**50 jours**	**Lun 12/10/26**	**Ven 18/12/26**
2		**Phase 1 - R+2 et R+3**	**50 jours**	**Lun 12/10/26**	**Ven 18/12/26**
3	MOE/MOA	OPR R+2/R+3	5 jours	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
4	TCE	Levée des reserves OPR	20 jours	Lun 19/10/26	Ven 13/11/26
5	MOE/MOA	Reception R+2/R+3	5 jours	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26
6	TCE	Levée des reserves de reception	20 jours	Lun 23/11/26	Ven 18/12/26
7		**Phase 2 - R+1**	**45 jours**	**Lun 19/10/26**	**Ven 18/12/26**
8	MOE/MOA	OPR R+1	5 jours	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26
9	TCE	Levée des reserves OPR	20 jours	Lun 26/10/26	Ven 20/11/26
10	MOE/MOA	Reception R+1	5 jours	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26
11	TCE	Levée des reserves de reception	15 jours	Lun 30/11/26	Ven 18/12/26
12		**Phase 2 - RDC**	**40 jours**	**Lun 26/10/26**	**Ven 18/12/26**
13	MOE/MOA	OPR RDC	5 jours	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26
14	TCE	Levée des reserves OPR	20 jours	Lun 02/11/26	Ven 27/11/26
15	MOE/MOA	Reception RDC	5 jours	Lun 30/11/26	Ven 04/12/26
16	TCE	Levée des reserves de reception	10 jours	Lun 07/12/26	Ven 18/12/26
17		**Phase 2 - SS-1**	**40 jours**	**Lun 26/10/26**	**Ven 18/12/26**
18	MOE/MOA	OPR SS-1	5 jours	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26
19	TCE	Levée des reserves OPR	20 jours	Lun 02/11/26	Ven 27/11/26
20	MOE/MOA	Reception SS-1	5 jours	Lun 30/11/26	Ven 04/12/26
21	TCE	Levée des reserves de reception	10 jours	Lun 07/12/26	Ven 18/12/26
22		**Phase 1**	**558 jours**	**Ven 26/07/24**	**Mar 27/10/26**
23		**R+2**	**528 jours**	**Ven 26/07/24**	**Mar 15/09/26**
97		**R+3**	**465 jours**	**Mer 04/12/24**	**Mar 27/10/26**
127		**Phase 2 - Aile Sud**	**259 jours?**	**Lun 26/01/26**	**Lun 08/03/27**
128		**Sous-Sol**	**94 jours?**	**Lun 06/07/26**	**Ven 04/12/26**
129		**Circulation (de la file 5 à 16)**	**35 jours**	**Lun 14/09/26**	**Ven 30/10/26**
130	Infralec	Passage réseaux électriques Cfo-Cfa	25 jours	Lun 14/09/26	Ven 16/10/26
131	Infralec	Pose des terminaux cfo-cfa	10 jours	Lun 19/10/26	Ven 30/10/26
132		**local sous-station 4 (logement) - S(R-1)02**	**70 jours**	**Lun 06/07/26**	**Lun 02/11/26**
133	Palais du Tau	Consignation sous station existante (cis dépose matériel)	0 jour	Lun 06/07/26	Lun 06/07/26
134	Delta Instal	Equipements sous station	15 jours	Lun 06/07/26	Mar 28/07/26
135	Delta instal	Raccordement vers S(R-1)06	2 jours	Mer 29/07/26	Jeu 30/07/26
136	Delta instal	Mise en eau, test pression	2 jours	Ven 31/07/26	Lun 03/08/26
137	Delta instal	Calorifuge	3 jours	Mar 04/08/26	Jeu 06/08/26
138	Delta instal	Pose armoires CFO/CFA CVC	10 jours	Mar 04/08/26	Lun 07/09/26
139	Infralec	Installations électriques (armoires, raccord matériel)	10 jours	Lun 07/09/26	Lun 21/09/26
140		**MES, essais, réglages - Sous station 4**	**31 jours**	**Lun 21/09/26**	**Lun 02/11/26**
141	Infralec	MàD alim élec définitive par INFRALEC	0 jour	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26
142	Delta instal	Mise en service, réglages	15 jours	Lun 21/09/26	Ven 09/10/26
143	Delta instal	Essais	15 jours	Lun 12/10/26	Lun 02/11/26
144		**Local CTA 1bis Halle d'accueil - S(R-1)06**	**41 jours**	**Lun 07/09/26**	**Lun 02/11/26**
145	Delta instal	Pose armoires CFO/CFA CVC	10 jours	Lun 07/09/26	Ven 18/09/26
146		**MES, essais, réglages - CTA 1bis**	**31 jours**	**Lun 21/09/26**	**Lun 02/11/26**
147	Infralec	MàD alim élec définitive	0 jour	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26
148	Delta instal	Mise en service, réglage	20 jours	Lun 21/09/26	Ven 16/10/26
149	Delta instal	Essais	10 jours	Lun 19/10/26	Lun 02/11/26
150		**Local eau - S(R-1)09**	**10 jours**	**Lun 05/10/26**	**Lun 19/10/26**
151	Delta instal	Installation ballon d'eau chaude (yc raccordement)	5 jours	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
152	Infralec	Pose des terminaux électriques (éclairage, prise, SSI)	5 jours	Lun 12/10/26	Lun 19/10/26
153		**Local CTA 1 - S(R-1)10**	**66 jours**	**Lun 24/08/26**	**Ven 27/11/26**
154	Delta instal	Finalisation piege à son	5 jours	Lun 24/08/26	Jeu 03/09/26
155	Hchevalier	Calfeutrement réseau CVC	3 jours	Ven 04/09/26	Mar 08/09/26
156	Delta	Calorifuge	5 jours	Mer 09/09/26	Mar 15/09/26
157	Delta instal	Pose armoires CFO/CFA CVC	10 jours	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26
158	Infralec	Pose des terminaux électriques (éclairage, prise, SSI)	5 jours	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26
159		**MES, essais, réglages - CTA 1**	**30 jours**	**Lun 19/10/26**	**Ven 27/11/26**
160	Delta instal	Mise en service, réglages	20 jours	Lun 19/10/26	Ven 13/11/26
161	Delta instal	Essais	10 jours	Lun 16/11/26	Ven 27/11/26
162		**Local électrique - S(R-1)13**	**19 jours**	**Lun 03/08/26**	**Mer 16/09/26**
163	Infralec	Pose des TD élec	6 jours	Lun 03/08/26	Lun 24/08/26
164	Infralec	Raccordement TD électrique	10 jours	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26
165	Infralec	Pose des terminaux électriques (éclairage, prise, SSI)	3 jours	Lun 14/09/26	Mer 16/09/26
166		**Local VDI - S(R-1)15bis**	**60 jours?**	**Lun 14/09/26**	**Ven 04/12/26**
167	Lagarde	Revêtement de sol	5 jours	Lun 14/09/26	Lun 21/09/26
168	Lagarde	Mise en peinture	3 jours	Lun 21/09/26	Mer 23/09/26
169	Infralec	Installation baie informatique	1 jour?	Jeu 24/09/26	Jeu 24/09/26
170	ATB	fourniture et pose porte coulissante	2 jours	Jeu 24/09/26	Ven 25/09/26
171		Mise à dispo/visite pour opérateur téléphonique	0 jour	Ven 25/09/26	Ven 25/09/26
172	SFR	Délai instal de fibre	40 jours	Lun 28/09/26	Ven 20/11/26
173	SFR	Installation de la fibre	3 jours	Lun 23/11/26	Mer 25/11/26
174	Infralec	raccordement baie informatique	7 jours	Jeu 26/11/26	Ven 04/12/26
175		**local sous-station 3 - S(R-1)17**	**41 jours**	**Lun 28/09/26**	**Lun 23/11/26**
176		**MES, essais, réglages - Sous Station 3**	**41 jours**	**Lun 28/09/26**	**Lun 23/11/26**
177	Infralec	MàD alim élec définitive	0 jour	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26
178	Delta instal	Mise en service, réglages	15 jours	Lun 12/10/26	Ven 30/10/26
179	Delta instal	Essais	15 jours	Lun 02/11/26	Lun 23/11/26
180		**RDC**	**101 jours**	**Lun 03/08/26**	**Ven 22/01/27**
181		**Locaux techniques (/s escalier) - S(RDC)05,06,07**	**20 jours**	**Lun 31/08/26**	**Ven 25/09/26**
182	ATB	Pose des portes PF (x2)	3 jours	Lun 07/09/26	Mer 09/09/26
183	Agnesina	Cloison + porte CF	5 jours	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26
184	Lagarde	Peinture sol et murs	5 jours	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26
185	Infralec	Pose TD élec (Cfo, Cfa)	5 jours	Lun 31/08/26	Ven 04/09/26
186	Infralec	Raccordement électrique	12 jours	Lun 07/09/26	Mar 22/09/26
187	Infralec	Pose des appareillages et luminaires	3 jours	Mer 23/09/26	Ven 25/09/26
188		**Hall d'accueil/Boutique - S(RDC)08 + circulation rampe S(RDC)11**	**101 jours**	**Lun 03/08/26**	**Ven 22/01/27**

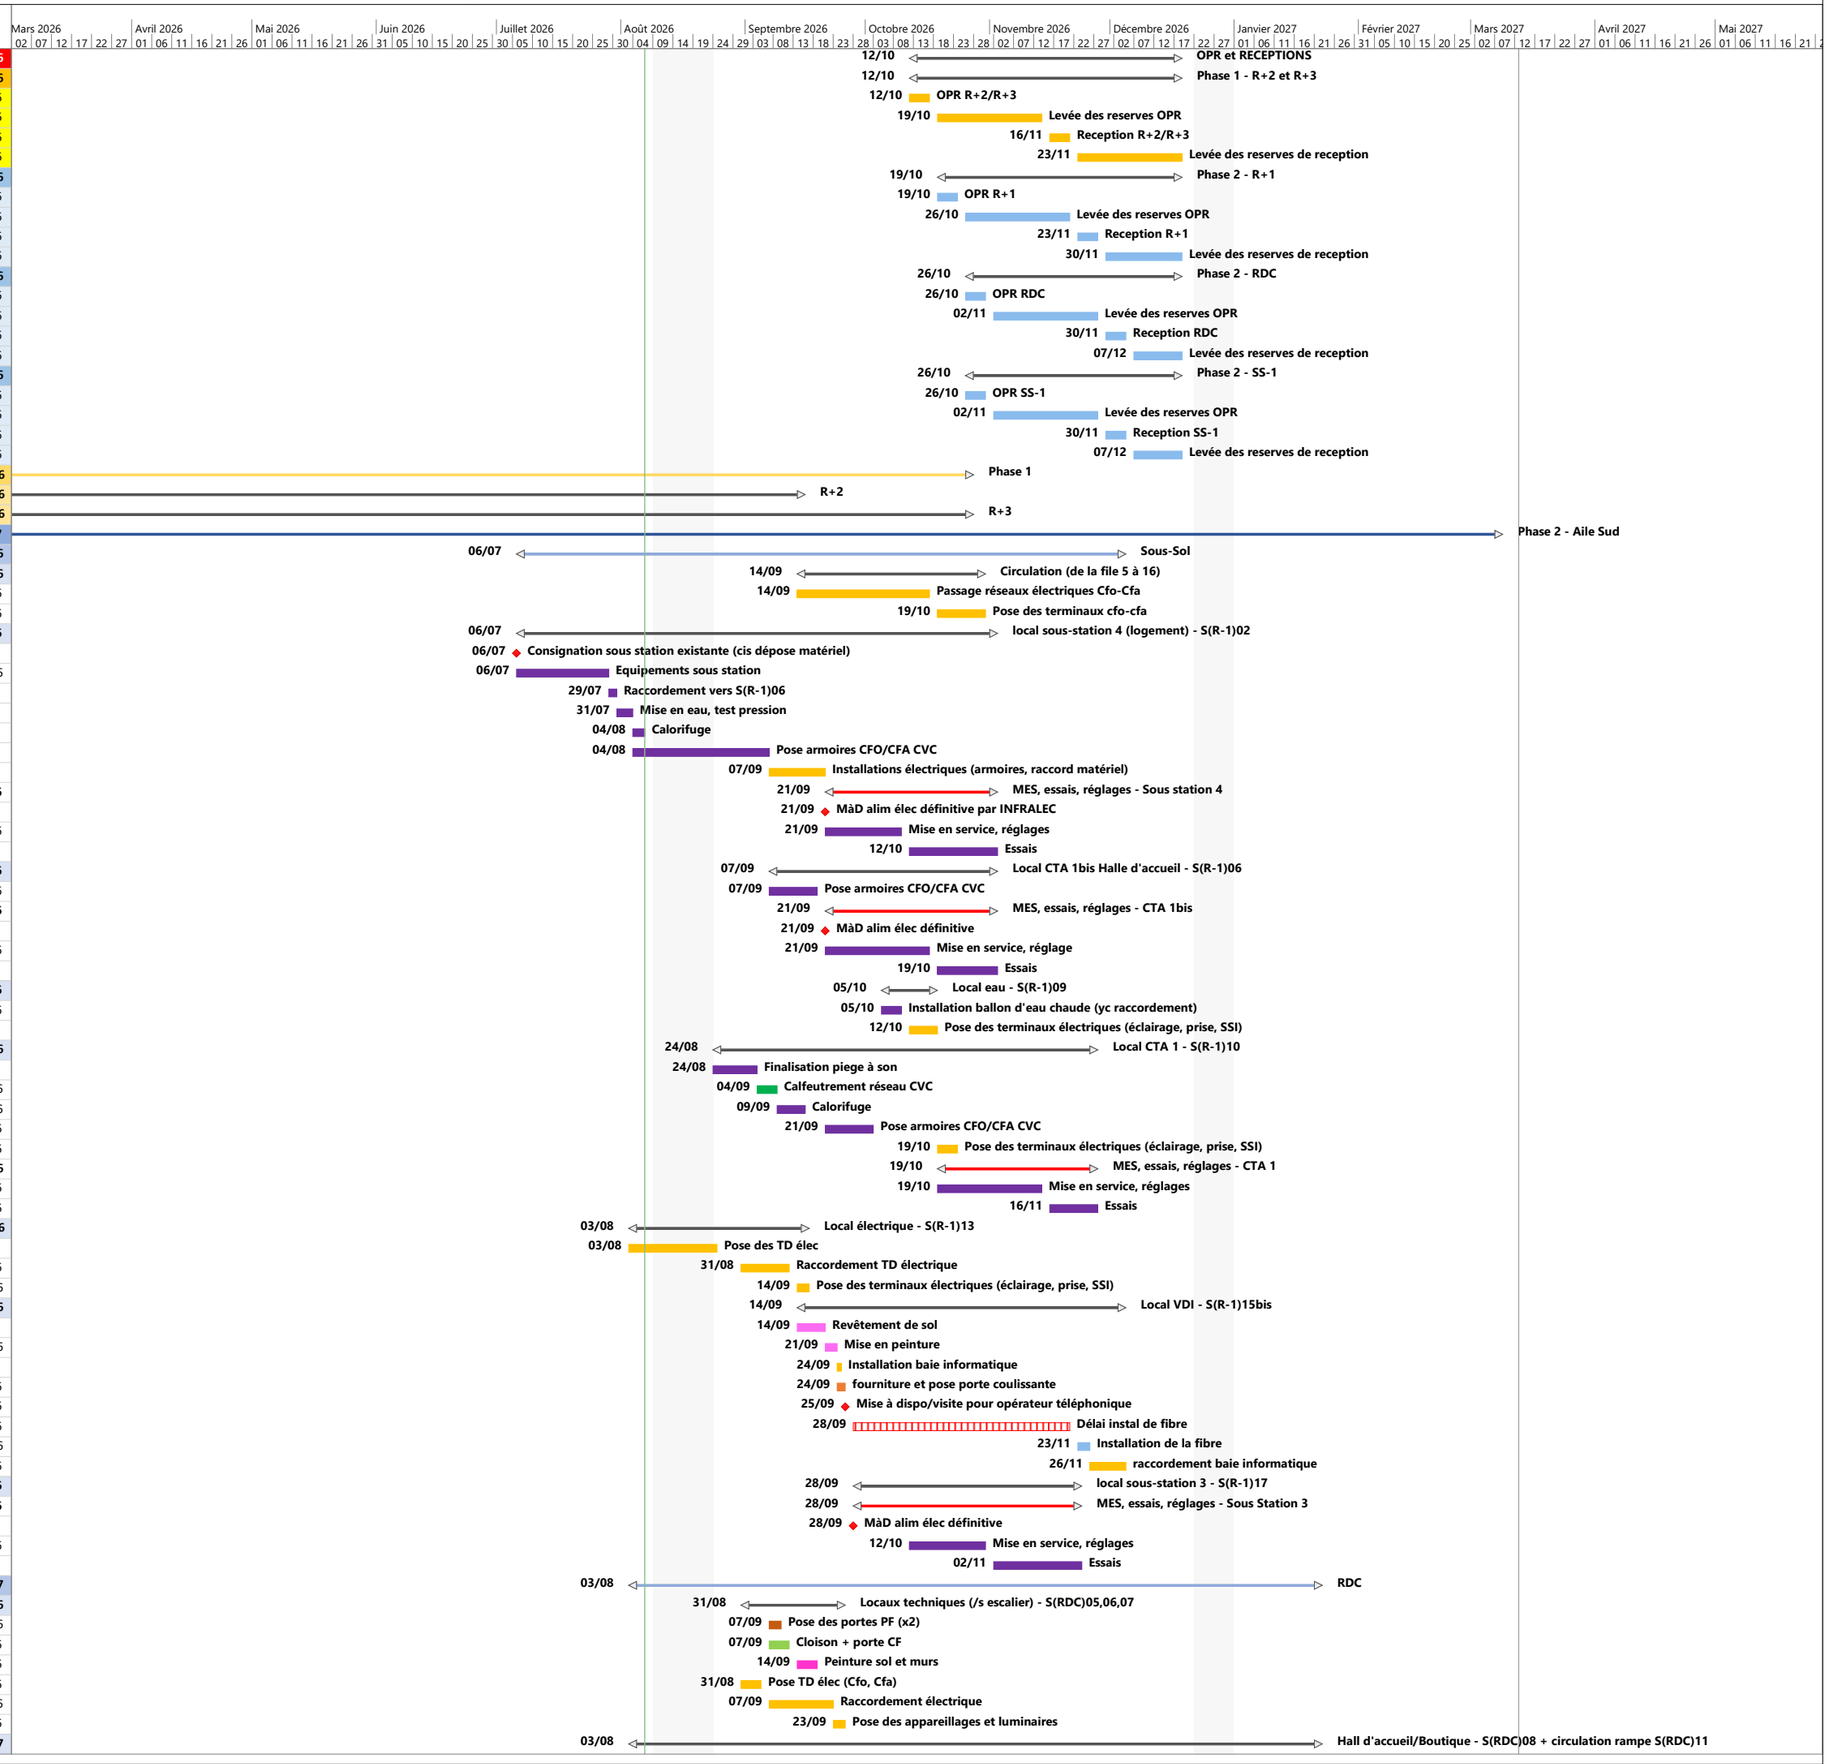

CMN - Palais du Tau

Planning EXE fin de travaux du 06.08.26


N°	Texte1	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
189	Delta instal	Pose des radiateurs et raccordement	6 jours	Lun 03/08/26	Lun 24/08/26
190	Hchevalier	Reprises badigeons voutes	5 jours	Lun 24/08/26	Jeu 03/09/26
191	Hchevalier	Fin pose dallage rampe	10 jours	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26
192	Hchevalier	Habillage trappe SII	3 jours	Mer 09/09/26	Ven 11/09/26
193	Mobidecor	Pose mobilier hors banque d'acceuil	20 jours	Lun 14/09/26	Ven 09/10/26
194	ATB	Pose portes accès sanitaires et locaux personnel	10 jours	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26
195	SII	Pose portail + main courante	15 jours	Lun 12/10/26	Ven 30/10/26
196	Infralec	Pose des luminaires et terminaux	10 jours	Lun 19/10/26	Ven 30/10/26
197	SII	Sas Accueil	15 jours	Lun 02/11/26	Ven 20/11/26
198	Delta instal	CVC et chauffage SAS acceuil	5 jours	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26
199	Lagarde	Pose tapis	2 jours	Lun 23/11/26	Mar 24/11/26
200	Mobidecor	Pose banque d'acceuil	5 jours	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26
201	Videlio (SC03	Installations vidéos	5 jours	Lun 30/11/26	Ven 04/12/26
202	MSIC	Installations réseau et materiel boutique	5 jours	Lun 07/12/26	Ven 11/12/26
203	CMN	Installation boutique	15 jours	Lun 04/01/27	Ven 22/01/27
204		**Locaux personnels (repos, sanitaire, bureau) - S(RDC)09,10**	**40 jours**	**Lun 31/08/26**	**Ven 23/10/26**
205	Lagarde	finition carrelage	5 jours	Lun 31/08/26	Ven 04/09/26
206	Lagarde	Peinture finition	5 jours	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26
207	Delta instal	Installation des radiateurs	2 jours	Jeu 24/09/26	Lun 28/09/26
208	Infralec	Pose terminaux élec Cfo-Cfa (éclairage, prises,info, SSI)	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
209	Delta instal	Installation équipements sanitaires, terminaux plomberie	5 jours	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
210	Mobidecor	Pose cuisine et meuble casiers	10 jours	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26
211	Delta instal	Pose équipement cuisine	3 jours	Mer 21/10/26	Ven 23/10/26
212	Infralec	Pose équipement cuisine	3 jours	Mer 21/10/26	Ven 23/10/26
213		**Salle Merckel, sanitaires publics - S(RDC)15**	**35 jours**	**Lun 31/08/26**	**Ven 16/10/26**
214	Lagarde	Pose carrelage + faïence	10 jours	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26
215	ATB	Pose des portes sanitaires	5 jours	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26
216	Lagarde	Peinture finition	5 jours	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
217	Infralec	Pose terminaux élec Cfo-Cfa (éclairage, prises,info, SSI)	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
218	Delta instal	Pose équipements sanitaires et radiateurs	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
219	ATB	Pose des cloisons séparatrices sanitaires	5 jours	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
220	Mobidecor	Pose des meubles vasques	5 jours	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
221	Delta instal	Pose équipement meubles vasques	2 jours	Jeu 15/10/26	Ven 16/10/26
222		**Salon de thé // Café - S(RDC)16**	**50 jours**	**Lun 31/08/26**	**Ven 06/11/26**
223	Lagarde	Peinture fintion plafond	5 jours	Lun 31/08/26	Lun 07/09/26
224	SII	Scellement/Incorporation ventilation au sol (+protection)	5 jours	Lun 07/09/26	Lun 14/09/26
225	Infralec	Pose terminaux élec Cfo-Cfa (éclairage, prises,info, SSI)	5 jours	Lun 07/09/26	Lun 14/09/26
226	ATB	Pose cadre accès cuisine PINGAT	1 jour	Ven 11/09/26	Lun 14/09/26
227	PINGAT	Travaux aménagement "café"	40 jours	Lun 14/09/26	Ven 06/11/26
228		**Passage cocher - S(RDC)19**	**66 jours**	**Lun 24/08/26**	**Ven 27/11/26**
229	Hchevalier	Reprise feuillure trappe SII	2 jours	Lun 24/08/26	Lun 31/08/26
230	SII	Pose trappe	2 jours	Mar 01/09/26	Mer 02/09/26
231	Hchevalier	Habillage trappe SII	2 jours	Jeu 03/09/26	Ven 04/09/26
232	ATB	Pose des portes DAS et raccordements CFA	5 jours	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26
233	Hchevalier	Traitement hydrofuge des sols	5 jours	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
234	Lagarde	Peinture de finition	5 jours	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26
235	Big Bang (SC0	Pose des luminaires	5 jours	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26
236	SII	Revision et remise en service porte automatique	5 jours	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26
237		**Couloir - Calvacade - S(RDC)27**	**66 jours**	**Lun 24/08/26**	**Ven 27/11/26**
238	Hchevalier	Travaux de maçonnerie préparatoire tampon de visite et portillon	2 jours	Lun 24/08/26	Lun 31/08/26
239	Hchevalier	Complément dallage, seuil, et tampon de visite pierre de taille	10 jours	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26
240	Big Bang (SC0	Pose des supports de luminaires	2 jours	Lun 14/09/26	Mar 15/09/26
241	Hchevalier	Finitions enduits suite pose supports	3 jours	Mer 16/09/26	Ven 18/09/26
242	Hchevalier	Traitement hydrofuge des sols	5 jours	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
243	ATB	F+P bâtis accès locaux cavalcades et escalier Robert de Cotte	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
244	Infralec	Pose terminaux élec Cfo-Cfa (éclairage, prises,info, SSI)	5 jours	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
245	Infralec	Pose portillon automatique	5 jours	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
246		**Scénographie Calvacade**	**3 jours**	**Mer 25/11/26**	**Ven 27/11/26**
247	Big Bang (SC0	Pose appliques décoratives up and down sur le mur	2 jours	Mer 25/11/26	Ven 27/11/26
248	Lamparredo (	Pose pupitre MB-S17-01	1 jour	Ven 27/11/26	Ven 27/11/26
249	Tactile Studio	Intégration MA-S17-01 (Plan tactile) sur pupitre MB-S17-01	1 jour	Ven 27/11/26	Ven 27/11/26
250		**Espace CMN - S(RDC)20,21**	**45 jours**	**Lun 19/10/26**	**Ven 18/12/26**
251	Hchevalier	Dépose des protections	5 jours	Lun 19/10/26	Lun 26/10/26
252	MOA	Déménagement lapidaire	5 jours	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26
253	Agnesina	Cloisonnement, doublage, faux plafond	10 jours	Lun 02/11/26	Ven 13/11/26
254	ATB	F+P bâti INT	2 jours	Lun 02/11/26	Mar 03/11/26
255	Infralec	Distribution CFO/CFA	3 jours	Lun 02/11/26	Mer 04/11/26
256	Delta instal	Distribution PLB/CVC	3 jours	Lun 02/11/26	Mer 04/11/26
257	Lagarde	Préparation support + Peinture 1ère couche	5 jours	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26
258	Infralec	Pose des appareillages CFO/CFA	2 jours	Lun 23/11/26	Mar 24/11/26
259	Lagarde	Pose carrelage	10 jours	Lun 23/11/26	Ven 04/12/26
260	Lagarde	Peintures de fintion	5 jours	Lun 07/12/26	Ven 11/12/26
261	Infralec	Pose terminaux CFO/CFA	3 jours	Lun 14/12/26	Mer 16/12/26
262	Mobidecor	Pose cuisine	2 jours	Lun 14/12/26	Mar 15/12/26
263	Delta instal	Pose équipements cuisine	2 jours	Mer 16/12/26	Jeu 17/12/26
264	Infralec	Pose équipements cuisine	2 jours	Mer 16/12/26	Jeu 17/12/26
265	Delta instal	Pose radiateurs	1 jour	Ven 18/12/26	Ven 18/12/26
266		**Local CTA 2 - entresol S(RDC)22**	**34 jours**	**Lun 21/09/26**	**Jeu 05/11/26**
267	Lagarde	Mise en peinture	5 jours	Lun 19/10/26	Lun 26/10/26
268	Agnesina	Complément doublage acoustique	5 jours	Lun 26/10/26	Lun 02/11/26
269	ATB	F+P Porte acoustique	2 jours	Mer 04/11/26	Jeu 05/11/26
270		**MES, essais, réglages - CTA 2**	**25 jours**	**Lun 21/09/26**	**Ven 23/10/26**
271	Infralec	Màd Alim élec définitive	0 jour	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26
272	Delta instal	Mise en service, réglages	15 jours	Lun 21/09/26	Ven 09/10/26
273	Delta instal	Essais	10 jours	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26
274		**S(RDC)23**	**15 jours**	**Lun 19/10/26**	**Ven 06/11/26**



CMN - Palais du Tau

Planning EXE fin de travaux du 06.08.26


N°	Texte1	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
275	Axima	Mise en service CTA et réglages	10 jours	Lun 26/10/26	Ven 06/11/26
276	Infralec	Poses terminaux CFO/CFA	2 jours	Lun 19/10/26	Mer 21/10/26
277		**R+1**	**259 jours**	**Lun 26/01/26**	**Lun 08/03/27**
278		**Escalier couronnement de la vierge**	**10 jours**	**Lun 14/09/26**	**Ven 25/09/26**
279	Lagarde	Peinture main courante	10 jours	Lun 14/09/26	Ven 25/09/26
280		**01. Sacre des rois de France - S(R+1)08**	**83 jours**	**Lun 26/01/26**	**Jeu 28/05/26**
281	Hchevalier	Repose dallage	25 jours	Lun 26/01/26	Ven 27/02/26
282	Restauratrice	Nettoyage + restauration des statues (1,2,3,4)	5 jours	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26
283	Hchevalier	Refection des joints dallage et scellement cadre SII	10 jours	Lun 09/03/26	Ven 20/03/26
284	Restauratrice	Nettoyage + restauration des statues(5,6,7)	10 jours	Lun 23/03/26	Ven 03/04/26
285	Infralec	Pose des appareillages élec (Cfo/Cfa/SSI)	4 jours	Mar 07/04/26	Ven 10/04/26
286	A-G-net	Nettoyage des murs/vôutes/sols	5 jours	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26
287	Lagarde	Reprises peinture et fintions	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
288	Infralec	Pose des terminaux élec (Cfo/Cfa/SSI)	2 jours	Jeu 23/04/26	Ven 24/04/26
289	Hchevalier	Poncage à l'eau des sols	2 jours	Mar 12/05/26	Mer 13/05/26
290	Hchevalier	Vernis + Sechage	2 jours	Lun 18/05/26	Mar 19/05/26
291	Restauratrice	Nettoyage LASER Statues	6 jours	Lun 18/05/26	Mar 26/05/26
292	SII	Pose des trappes métalliques	2 jours	Mer 27/05/26	Jeu 28/05/26
293		**Scénographie Salle 01**	**120 jours**	**Lun 22/06/26**	**Lun 11/01/27**
294	Lamparredo (	Pose supports tapisserie MB-S01-09	3 jours	Lun 22/06/26	Mer 24/06/26
295	Lamparredo (	Pose plinthes inclinées MB-S01-01/02/03	4 jours	Jeu 25/06/26	Mar 30/06/26
296	Big Bang (SC0	Passage de câbles pour mini projecteurs SP4 + panneaux lumineux	1 jour	Mer 01/07/26	Mer 01/07/26
297	Sequoia (SC0	Pose panneau de salle autoportant MB-S01-07	1 jour	Lun 29/06/26	Lun 29/06/26
298	Peintre (SC01	Peinture du panneau de salle MB-S01-07	2 jours	Mer 01/07/26	Jeu 02/07/26
299	Peintre (SC01	Peinture des plintes inclinées MB-S01-01/02/03	5 jours	Jeu 02/07/26	Mer 08/07/26
300	Lamparredo (	Pose pupitre MB-S01-05	1 jour	Mar 22/09/26	Mar 22/09/26
301	Lamparredo (	Pose mobilier spécifique pour maquette MB-S01-06	1 jour	Mer 23/09/26	Mer 23/09/26
302	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S01-01	2 jours	Jeu 24/09/26	Ven 25/09/26
303	Lamparredo (	Pose pupitre cental spécifique MB-S01-08 (appuyé partiellement su	1 jour	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26
304	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S01-01 (écran 24", player) sur pupitre I	1 jour	Mar 29/09/26	Mar 29/09/26
305	Big Bang (SC0	Intégration mini projecteurs SP4 sur plinthes inclinées MB-S01-01/0	2 jours	Lun 07/09/26	Mar 08/09/26
306	Big Bang (SC0	Intégration panneaux lumineux PL sur plinthes inclinées MB-S01-01	2 jours	Mer 09/09/26	Jeu 10/09/26
307	Big Bang (SC0	Pose profilé avec ruban led Couronnement de la Vierge	1 jour	Ven 11/09/26	Ven 11/09/26
308	Big Bang (SC0	Pose rails en applique sur l'épaisseur de la dalle du R+1	1 jour	Lun 14/09/26	Lun 14/09/26
309	Big Bang (SC0	Intégration spots R-SP1 sur rails épaisseur dalle du R+1	1 jour	Lun 14/09/26	Lun 14/09/26
310	Big Bang (SC0	Pose éclairage gobo sur l'épaisseur de la dalle du R+1	1 jour	Mar 15/09/26	Mar 15/09/26
311	Videlio (SC03	Intégration AV-S01-01 (écran 24", player) sur pupitre MB-S01-08	2 jours	Lun 26/10/26	Mar 27/10/26
312	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels PVC baclight) sur panneaux lumineu	1 jour	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26
313	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel aimanté) sur pupitre MB-S01-05	1 jour	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26
314	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels aimantés + PLA) sur pupitre MB-S01	1 jour	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26
315	Boscher (SC0	Intégration graphisme (sérigraphie) sur panneau de salle MB-S01-0	1 jour	Mar 27/10/26	Mar 27/10/26
316	Tactile Studio	Intégration MA-S01-04 (Symboles royaux pivotants) + MA-S01-03 (	1 jour	Ven 27/11/26	Ven 27/11/26
317	Tactile Studio	Intégration MA-S01-01 (Plan tactile) + MA-S01-02 (Maquettes tacti	1 jour	Ven 27/11/26	Ven 27/11/26
318	CMN	Arrivée des collections	0 jour	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
319	CMN	Pose des 9 tapisseries en salle S01	5 jours	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26
320	CMN	Protection tapisseries (polyane)	1 jour	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26
321	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (spots sur rails) dans vitrine VI-S01-01	1 jour	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26
322	Big Bang (SC0	Intégration spots R-SP1/R-CA1 sur rails	5 jours	Mar 03/11/26	Lun 09/11/26
323	Big Bang (SC0	Réglage des éclairages avec la MOE	5 jours	Mar 10/11/26	Lun 16/11/26
324	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S01-01	1 jour	Lun 11/01/27	Lun 11/01/27
325	Lamparredo (	Pose soclage primaire dans vitrine VI-S01-01	1 jour	Lun 11/01/27	Lun 11/01/27
326	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel sur tige) dans vitrine VI-S01-01	1 jour	Lun 11/01/27	Lun 11/01/27
327		**02. Baptême de Clovis - S(R+1)09**	**44 jours**	**Lun 30/03/26**	**Ven 05/06/26**
328	Restauratrice	Nettoyage + restauration des statues	5 jours	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26
329	A-G-net	Nettoyage des élévations	5 jours	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26
330	Infralec	Pose des appareillages élec (Cfo/Cfa/SSI)	2 jours	Lun 20/04/26	Mar 21/04/26
331	Lagarde	Finitions peinture	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
332	Infralec	Pose des terminaux élec (Cfo/Cfa/SSI)	5 jours	Lun 27/04/26	Lun 04/05/26
333	Hchevalier	Vernissage des sols	2 jours	Mar 19/05/26	Mer 20/05/26
334	Restauratrice	Nettoyage LASER Statues	3 jours	Mer 27/05/26	Ven 29/05/26
335	SII	Scellement, incorporation ventilation au sol	2 jours	Lun 01/06/26	Mar 02/06/26
336	SII	Fermeture caniveau réseau chauffage	2 jours	Mer 03/06/26	Jeu 04/06/26
337	Delta instal	Pose radiateurs	1 jour	Ven 05/06/26	Ven 05/06/26
338		**Scénographie Salle 02**	**168 jours**	**Lun 04/05/26**	**Mer 03/02/27**
339	Sequoia (SC0	Pose habillage cage ascenseur MB-S02-05	2 jours	Lun 04/05/26	Mar 05/05/26
340	Sequoia (SC0	Pose micro-architecture MB-S02-01	3 jours	Mer 06/05/26	Lun 11/05/26
341	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S02-01 (VP, player et senseur) en parti	1 jour	Mar 12/05/26	Mar 12/05/26
342	Peintre (SC01	Peinture micro-architecture MB-S02-01	5 jours	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26
343	Peintre (SC01	Peinture impression habillage cage ascenseur MB-S02-05	5 jours	Lun 08/06/26	Ven 12/06/26
344	Peintre (SC01	Peinture finition habillage cage ascenseur MB-S02-05	3 jours	Lun 15/06/26	Mer 17/06/26
345	Lamparredo (	Pose plinthes inclinées MB-S02-03/04	2 jours	Mer 01/07/26	Jeu 02/07/26
346	Big Bang (SC0	Passage de câbles pour panneaux lumineux PL sur plinthes inclinée	1 jour	Ven 03/07/26	Ven 03/07/26
347	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S02-02 (écrans, players, switch, ampli..	1 jour	Ven 03/07/26	Ven 03/07/26
348	Peintre (SC01	Peinture plinthes inclinées MB-S02-03/04	2 jours	Lun 06/07/26	Mar 07/07/26
349	Lamparredo (	Pose plinthe horizontale MB-S02-02	1 jour	Ven 03/07/26	Ven 03/07/26
350	Big Bang (SC0	Passage de câbles pour panneaux lumineux PL sur plinthe horizonta	1 jour	Ven 03/07/26	Ven 03/07/26
351	Sequoia (SC0	Pose panneau de salle MB-S02-07	1 jour	Lun 06/07/26	Lun 06/07/26
352	Sequoia (SC0	Pose mur de projection MB-S02-09 (en raccord avec la plinthe incli	1 jour	Mer 08/07/26	Mer 08/07/26
353	Peintre (SC01	Peinture plinthe horizontale MB-S02-02	2 jours	Mer 08/07/26	Jeu 09/07/26
354	Peintre (SC01	Peinture panneau de salle MB-S02-07	1 jour	Ven 10/07/26	Ven 10/07/26
355	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S02-01	2 jours	Mar 29/09/26	Mer 30/09/26
356	Sequoia (SC0	Pose du banc coffre MB-S02-08 (contre le mur entre micro-architec	1 jour	Jeu 01/10/26	Jeu 01/10/26
357	Sequoia (SC0	Pose banc MB-S02-06	1 jour	Jeu 01/10/26	Jeu 01/10/26
358	Big Bang (SC0	Intégration panneaux lumineux PL sur plinthes inclinées MB-S02-0	1 jour	Mer 16/09/26	Mer 16/09/26
359	Big Bang (SC0	Intégration panneaux lumineux PL sur plinthe horizontale MB-S02-(	1 jour	Mer 16/09/26	Mer 16/09/26
360	Videlio (SC03	Intégration AV-S02-01 (VP, player et senseur) en partie haute micr	1 jour	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26

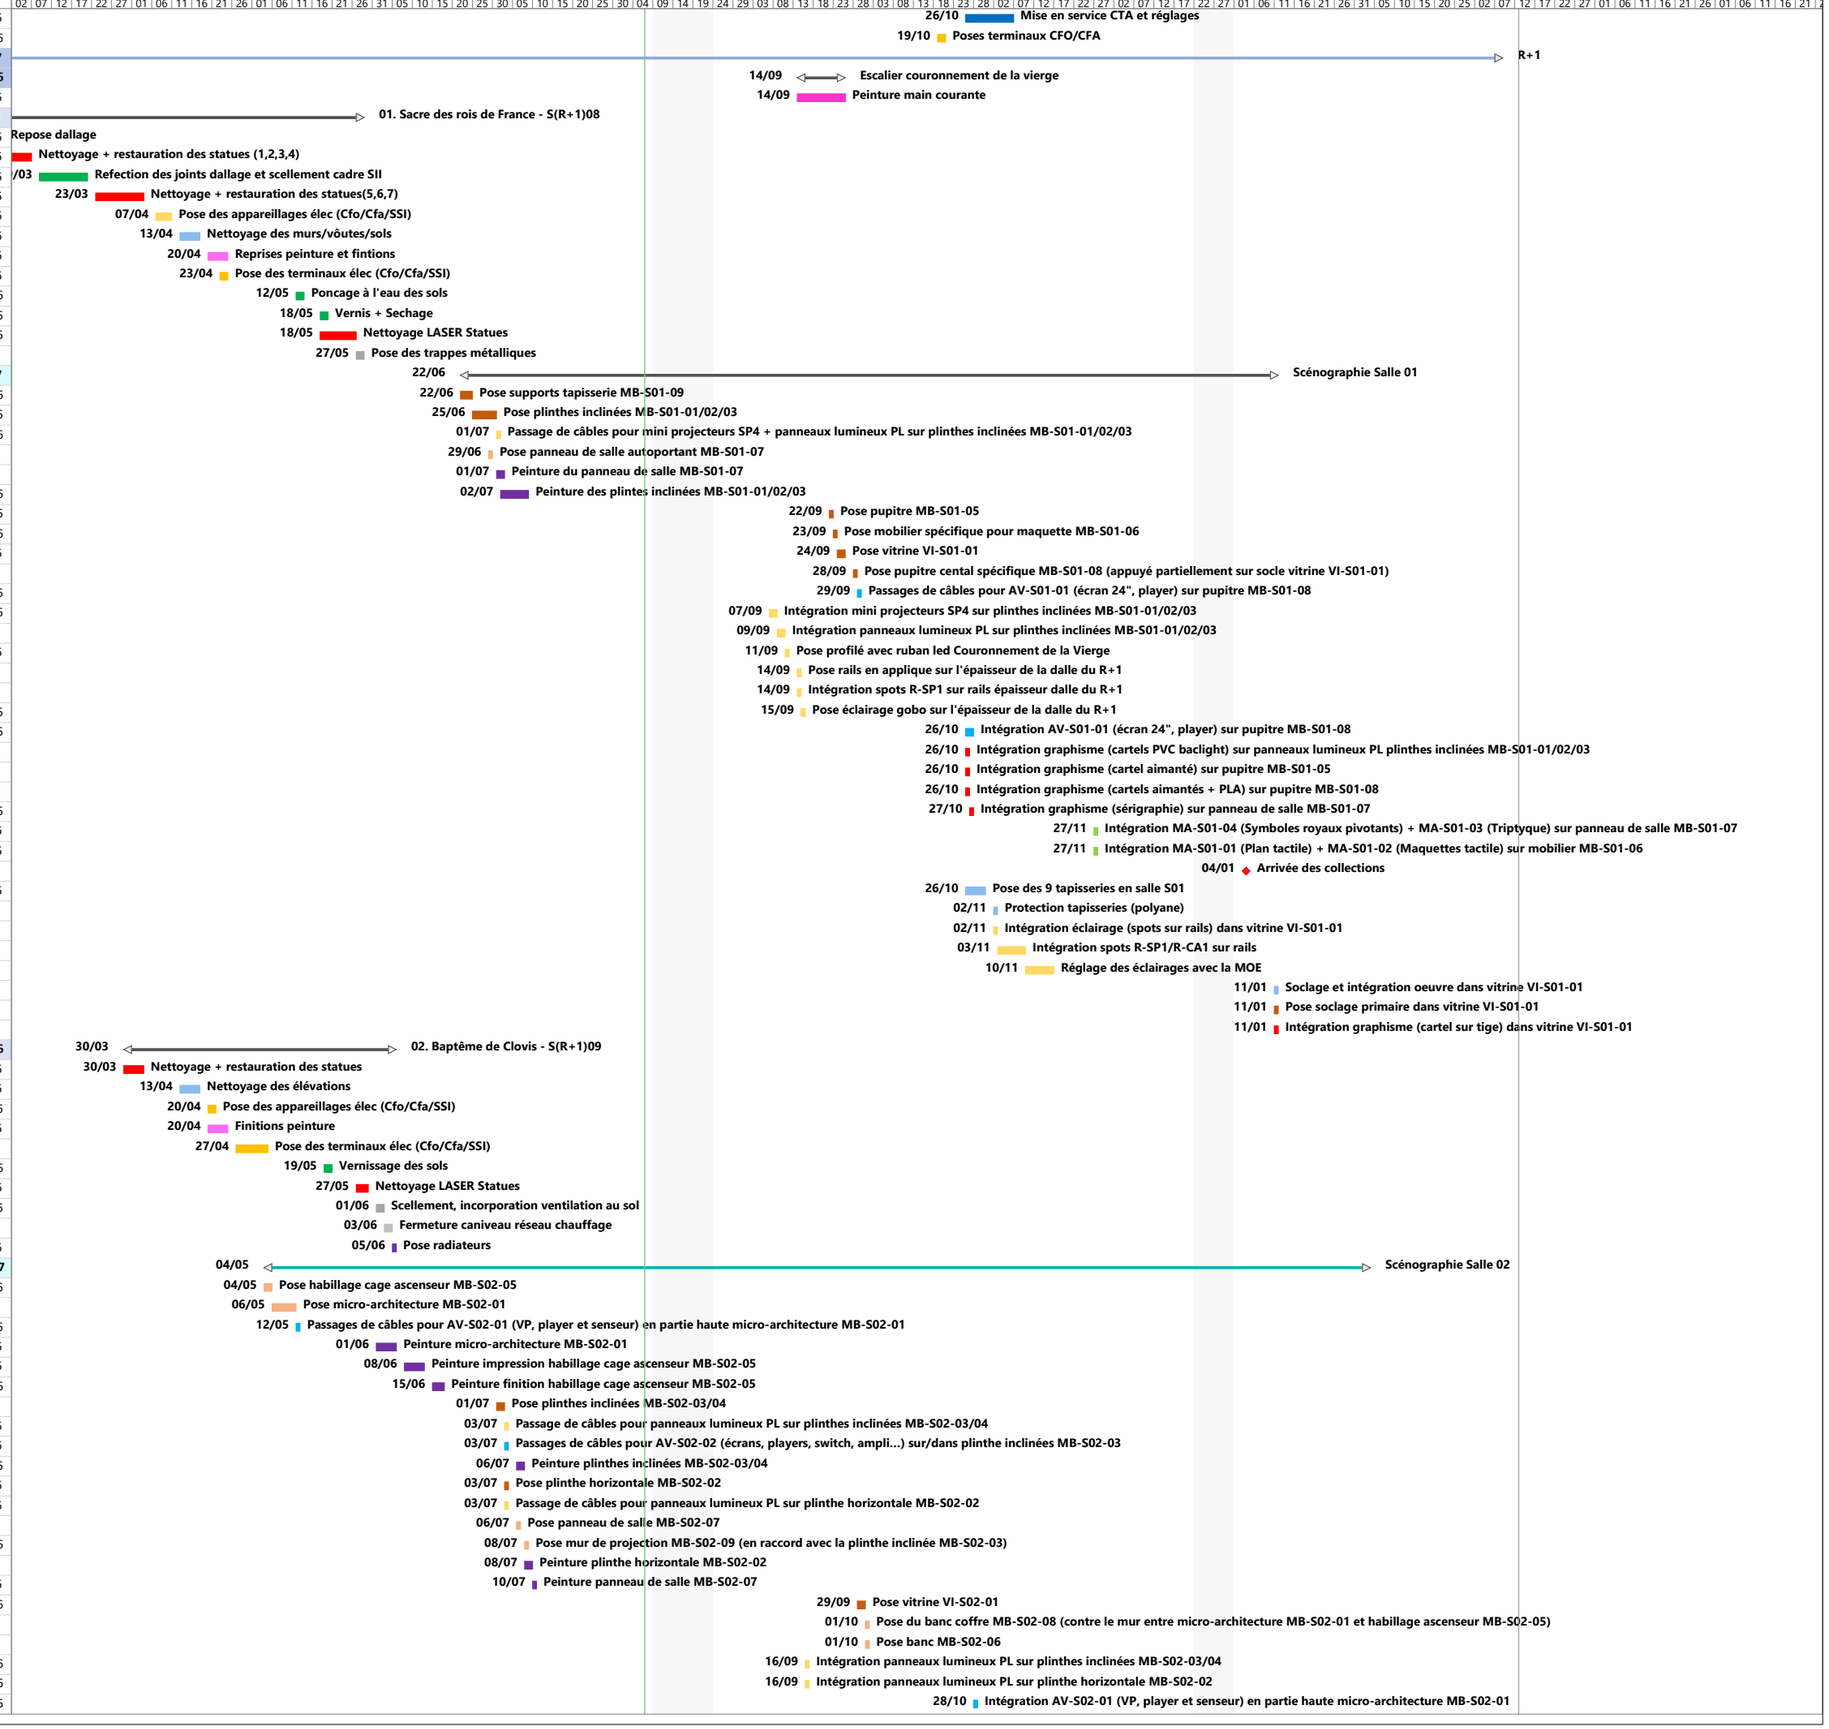

CMN - Palais du Tau

Planning EXE fin de travaux du 06.08.26


N°	Texte1	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
361	Videlio (SC03	Intégration AV-S02-02 (HP Vanco) sur mur de projection MB-S02-0	1 jour	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26
362	Videlio (SC03	Intégration AV-S02-02 (écrans, players, switch, ampli...) sur/dans pl	2 jours	Jeu 29/10/26	Ven 30/10/26
363	Boscher (SC0	Pose graphisme (vinyl) sur portes ascenseur	1 jour	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26
364	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels PVC baclight) sur panneaux lumineu	1 jour	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26
365	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels PVC baclight) sur panneaux lumineu	1 jour	Mer 28/10/26	Mer 28/10/26
366	Boscher (SC0	Intégration graphisme (sérigraphie) sur panneau de salle MB-S02-0	1 jour	Jeu 29/10/26	Jeu 29/10/26
367	Tactile Studio	Intégration MA-S02-01 (Triptyque) sur panneau de salle MB-S02-07	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
368	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S02-01	3 jours	Mer 27/01/27	Ven 29/01/27
369	Lamparredo (	Pose soclage primaire dans vitrine VI-S02-01	1 jour	Mer 27/01/27	Mer 27/01/27
370	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel sur tige) dans vitrine VI-S02-01	1 jour	Lun 01/02/27	Lun 01/02/27
371	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (spots sur mats) dans vitrine VI-S02-01	1 jour	Lun 01/02/27	Lun 01/02/27
372	Big Bang (SC0	Intégration spots R-SP1/R-CA1 sur rails	2 jours	Mar 02/02/27	Mer 03/02/27
373		**03. Royauté de droit divin - S(R+1)10**	**59 jours**	**Lun 09/03/26**	**Ven 05/06/26**
374	ATB	F + P bâti	3 jours	Lun 09/03/26	Mer 11/03/26
375	Delta instal	Pose réseau Ec	2 jours	Lun 23/03/26	Mar 24/03/26
376	Hchevalier	Reprise des sols, ouvertures des joints, réagréages	10 jours	Jeu 02/04/26	Jeu 16/04/26
377	Agnesina	Fermeture des coffres radiateurs cpris bandes	3 jours	Mer 15/04/26	Ven 17/04/26
378	A-G-net	Dépoussiérage, nettoyage	1 jour	Ven 17/04/26	Ven 17/04/26
379	Restauratrice	Nettoyage + restauration des statues	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
380	Lagarde	Reprise peinture plafond et finitions	5 jours	Lun 27/04/26	Lun 04/05/26
381	Hchevalier	Poncage à l'eau	1 jour	Lun 11/05/26	Lun 11/05/26
382	Hchevalier	Vernis Sol	4 jours	Mar 26/05/26	Ven 29/05/26
383	Delta instal	Pose des radiateurs	1 jour	Lun 01/06/26	Lun 01/06/26
384	Delata instal	Pose des réseaux aérauliques	5 jours	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26
385	Infralec	Pose & raccordements TD S (08 à 10)	5 jours	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26
386	Infralec	Pose des terminaux élec (Cfo/Cfa)	2 jours	Jeu 04/06/26	Ven 05/06/26
387		**Scénographie Salle 03**	**185 jours**	**Mar 12/05/26**	**Ven 05/03/27**
388	Sequoia (SC0	Pose cimaise courbe MB-S03-06	4 jours	Mar 12/05/26	Mar 19/05/26
389	Sequoia (SC0	Pose plinthe horizontale courbe MB-S03-04/05	2 jours	Mer 20/05/26	Jeu 21/05/26
390	Big Bang (SC0	Passages de câbles pour L6 + GR1 + PL sur plinthe horizontale cour	1 jour	Ven 22/05/26	Ven 22/05/26
391	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S03-02/03 (écrans 24" + amplificateur	1 jour	Mar 26/05/26	Mar 26/05/26
392	Sequoia (SC0	Pose micro-architecture MB-S03-02	3 jours	Ven 22/05/26	Mer 27/05/26
393	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S03-01 (support push-pull et écran 43"	1 jour	Jeu 28/05/26	Jeu 28/05/26
394	Sequoia (SC0	Pose doublage et portes sous tenture MB-S03-01/03	2 jours	Jeu 28/05/26	Ven 29/05/26
395	Peintre (SC01	Peinture cimaise courbe MB-S03-06	3 jours	Lun 01/06/26	Mer 03/06/26
396	Peintre (SC01	Impression plinthe horizontale courbe MB-S03-04/05	2 jours	Jeu 04/06/26	Ven 05/06/26
397	Peintre (SC01	Peinture micro-architecture MB-S03-02	2 jours	Lun 08/06/26	Mar 09/06/26
398	Peintre (SC01	Peinture doublage et portes sous tenture MB-S03-01/03	3 jours	Mer 10/06/26	Ven 12/06/26
399	Artiste H. Le (	Pose "Arbre"	15 jours	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26
400	Lamparredo (	Pose pupitre double MB-S03-07	1 jour	Jeu 01/10/26	Jeu 01/10/26
401	Lamparredo (	Pose table MB-S03-08	1 jour	Jeu 01/10/26	Jeu 01/10/26
402	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S03-02	2 jours	Ven 02/10/26	Lun 05/10/26
403	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S03-01	2 jours	Mar 06/10/26	Mer 07/10/26
404	Axima (SC01)	Intégration MiniClima dans vitrine VI-S03-01	1 jour	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
405	Axima (SC01)	Intégration MiniClima dans vitrine VI-S03-02	1 jour	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
406	Videlio (SC03	Intégration AV-S03-02/03 (écrans 24" + amplificateur et HP ?) sur p	1 jour	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26
407	Videlio (SC03	Intégration AV-S03-01 (support push-pull et écran 43") sur micro-a	1 jour	Mar 03/11/26	Mar 03/11/26
408	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels PVC backlight) sur panneaux lumine	1 jour	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26
409	Boscher (SC0	Intégration graphisme (PLA) sur pupitre double MB-S03-07	1 jour	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26
410	Boscher (SC0	Intégration graphisme (sérigraphie + PLA) sur micro-architecture M	1 jour	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26
411	Tactile Studio	Intégration MA-S03-03 (Triptyque) sur mur de la salle	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
412	Tactile Studio	Intégration MA-S03-01 (Tactile du Calice) + MA-S03-02 (Tactile de l	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
413	CMN	Pose des tapisseries en salle S03 (sur la grande cimaise courbe MB-	3 jours	Jeu 14/01/27	Lun 18/01/27
414	CMN	Protection des tapisseries hors poussières (polyane)	1 jour	Lun 18/01/27	Lun 18/01/27
415	Big Bang (SC0	Intégration éclairage L6 + GR1 + PL sur plinthe horizontale courbe M	3 jours	Jeu 14/01/27	Lun 18/01/27
416	Big Bang (SC0	Intégration spots R-SP1/R-CA1 sur rails	1 jour	Mar 19/01/27	Mar 19/01/27
417	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S03-02	2 jours	Mer 03/03/27	Jeu 04/03/27
418	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S03-01	2 jours	Mer 03/03/27	Jeu 04/03/27
419	Lamparredo (	Pose soclage primaire dans vitrine VI-S03-02	1 jour	Mer 03/03/27	Mer 03/03/27
420	Lamparredo (	Pose soclage primaire dans vitrine VI-S03-01	1 jour	Mer 03/03/27	Mer 03/03/27
421	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel sur tige) dans vitrine VI-S03-02	1 jour	Jeu 04/03/27	Jeu 04/03/27
422	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel sur tige) dans vitrine VI-S03-01	1 jour	Jeu 04/03/27	Jeu 04/03/27
423	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (spots sur rails) dans vitrine VI-S03-02	1 jour	Jeu 04/03/27	Jeu 04/03/27
424	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (spots sur mats) dans vitrine VI-S03-01	1 jour	Jeu 04/03/27	Jeu 04/03/27
425	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (LED L6) sur plafond vitrine VI-S03-02	1 jour	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
426		**05. Cérémonie du sacre - S(R+1)12**	**78 jours**	**Lun 02/03/26**	**Jeu 25/06/26**
427	Delta Instal	Passage réseau Ec	3 jours	Lun 02/03/26	Mer 04/03/26
428		Bon à fermer lots tech	0 jour	Jeu 05/03/26	Jeu 05/03/26
429	Videlio (SC03	Pose potences vidéoprojecteurs au plafond (traversant le faux-plaf	2 jours	Lun 09/03/26	Mar 10/03/26
430	Agnesina	Doublages BA13	10 jours	Jeu 05/03/26	Mer 18/03/26
431	ATB	F+P bâti	2 jours	Lun 16/03/26	Mar 17/03/26
432	Infralec	Connection des câbles pour portes DAS +	2 jours	Jeu 26/03/26	Lun 30/03/26
433	Agnesina	Complément doublages BA13 cpris bandes	5 jours	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26
434	Agnesina	Pose des doublages REGITONE	10 jours	Mar 07/04/26	Lun 20/04/26
435	LAGARDE	Peinture des trous des plaques de REGITONE	10 jours	Mar 07/04/26	Lun 20/04/26
436	ATB	Plinthes à poser	2 jours	Lun 20/04/26	Mar 21/04/26
437	LAGARDE	Préparation supports et 1ere couche	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
438	Hchevalier	Reprises des dallages et traitement de surface	3 jours	Lun 18/05/26	Mer 20/05/26
439	Infralec	Pose des appareillages CFO/CFA	3 jours	Jeu 21/05/26	Mar 26/05/26
440	Big Bang (SC0	Pose rails au plafond (encastré dans faux-plafond acoustique)	2 jours	Mer 27/05/26	Jeu 28/05/26
441	LAGARDE	Peinture finition 2eme couche	5 jours	Ven 29/05/26	Jeu 04/06/26
442	Infralec	Pose des terminaux élec (Cfo/Cfa/SSI)	5 jours	Ven 05/06/26	Jeu 11/06/26
443	Delta Instal	Pose des radiateurs	2 jours	Lun 15/06/26	Mar 16/06/26
444	ATB	Pose portes et habillages	2 jours	Mer 24/06/26	Jeu 25/06/26
445		**Scénographie Salle 05**	**110 jours**	**Lun 01/06/26**	**Lun 23/11/26**
446	Sequoia (SC0	Pose micro-architecture MB-S05-01	3 jours	Lun 01/06/26	Mer 03/06/26

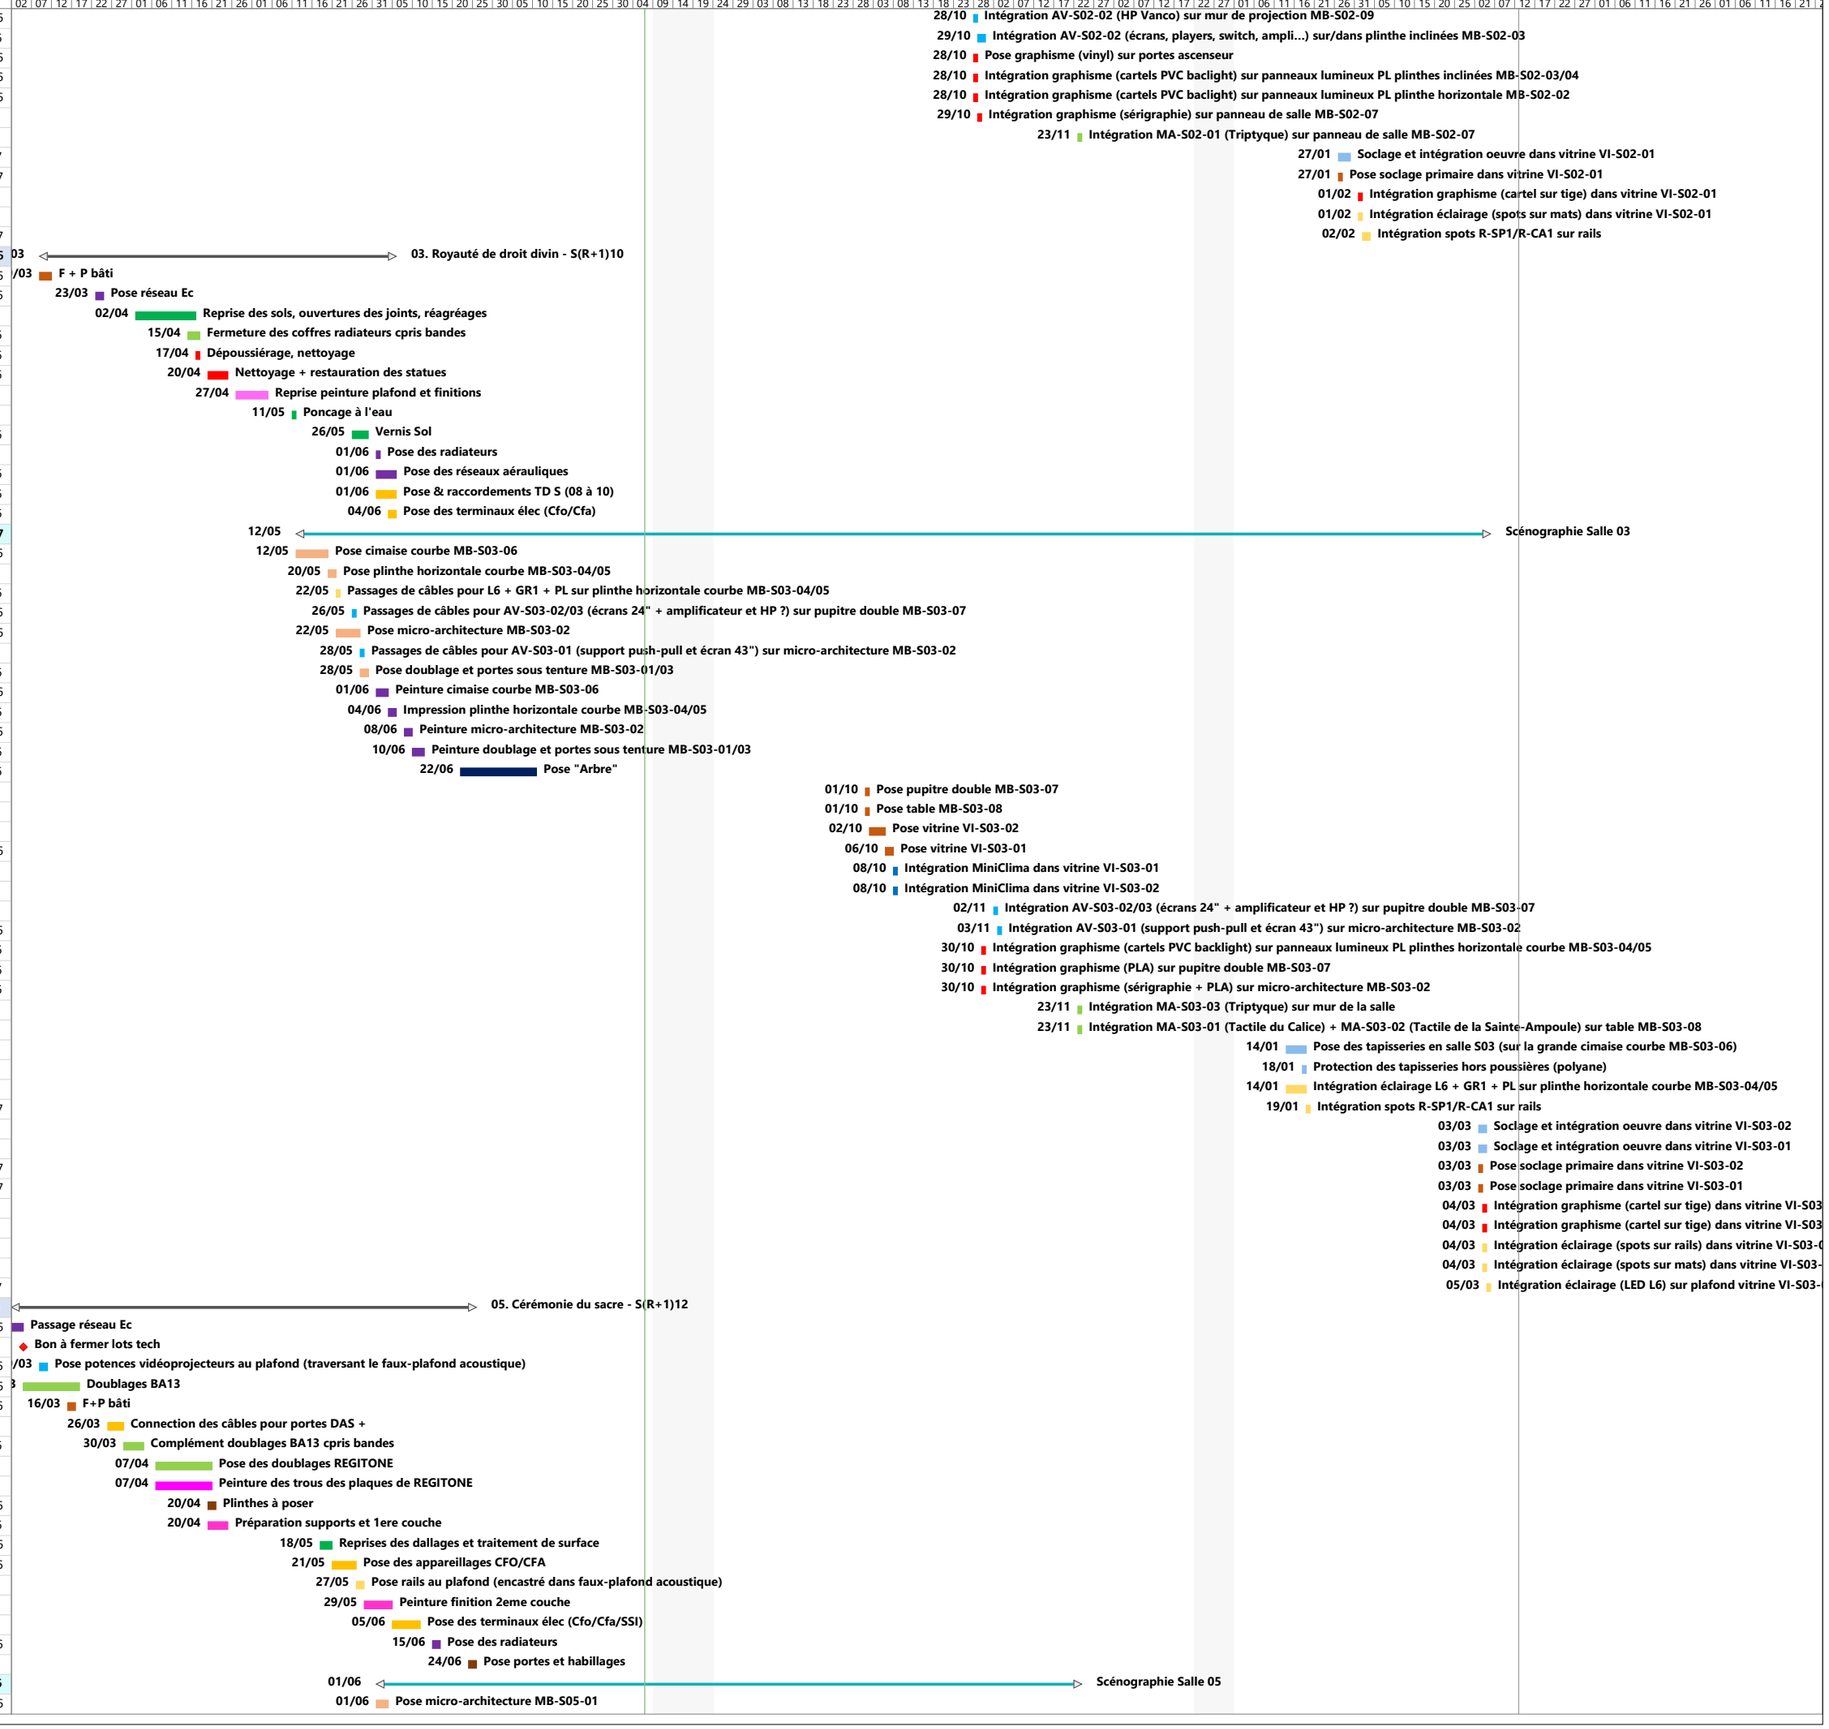

CMN - Palais du Tau

Planning EXE fin de travaux du 06.08.26


N°	Texte1	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
447	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S05-01 dans micro-architecture MB-S0	1 jour	Jeu 04/06/26	Jeu 04/06/26
448	Big Bang (SC0	Passage de câbles pour éclairage dans micro-architecture MB-S05-(	1 jour	Jeu 04/06/26	Jeu 04/06/26
449	Peintre (SC01	Peinture micro-architecture MB-S05-01	10 jours	Ven 05/06/26	Jeu 18/06/26
450	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (PL?) dans micro-architecture MB-S01-05	1 jour	Jeu 17/09/26	Jeu 17/09/26
451	Big Bang (SC0	Intégration spots R-SP1/R-CA1 sur rails	2 jours	Ven 18/09/26	Lun 21/09/26
452	Videlio (SC03	Pose du vidéoprojecteur et réglages	2 jours	Mer 04/11/26	Jeu 05/11/26
453	Videlio (SC03	Intégration AV-S05-01 dans micro-architecture MB-S05-01	3 jours	Mer 04/11/26	Ven 06/11/26
454	Boscher (SC0	Intégration graphisme (sérigraphies + cartels PVC backlight) sur mic	1 jour	Lun 02/11/26	Lun 02/11/26
455	Tactile Studio	Intégration MA-S05-01 (Triptyque) sur micro-architecture MB-S05-(	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
456		**06. Les insignes - S(R+1)13**	**55 jours**	**Jeu 12/03/26**	**Jeu 04/06/26**
457	Infralec/MOE	Validation schéma TD / Mise en commande	0 jour	Jeu 12/03/26	Jeu 12/03/26
458		Délai d'appro TD	36 jours	Jeu 12/03/26	Lun 04/05/26
459	Hchevalier	Changement dallage	5 jours	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26
460	Agnesina	Complément doublages et placard technique cpris bandes	5 jours	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26
461	Restauratrice	Restauration des statues	3 jours	Mer 01/04/26	Ven 03/04/26
462	Lagarde	Prépa support + impression	4 jours	Mar 07/04/26	Ven 10/04/26
463	Infralec	Pose des appareillages CFO/CFA	2 jours	Lun 13/04/26	Mar 14/04/26
464	Lagarde	Peinture finition	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
465	Infralec	Pose & raccordements TD S (12 à 13)	5 jours	Mar 26/05/26	Lun 01/06/26
466	Infralec	Pose des terminaux élec (Cfo/Cfa/SSI)	2 jours	Mar 02/06/26	Mer 03/06/26
467	Hchevalier	Reprises des dallages et traitement de surface	2 jours	Mar 02/06/26	Jeu 04/06/26
468	SII	Pose des grilles plénums au sol	1 jour	Jeu 04/06/26	Jeu 04/06/26
469		**Scénographie Salle 06**	**172 jours**	**Jeu 04/06/26**	**Lun 08/03/27**
470	Sequoia (SC0	Pose doublages et portes sous tenture MB-S06-04/05	3 jours	Jeu 04/06/26	Lun 08/06/26
471	Sequoia (SC0	Pose mises à distance MB-S06-11/12	1 jour	Mar 09/06/26	Mar 09/06/26
472	Sequoia (SC0	Pose cimaise centrale MB-S06-02	2 jours	Mer 10/06/26	Jeu 11/06/26
473	Sequoia (SC0	Pose mises à distance MB-S06-13	1 jour	Ven 12/06/26	Ven 12/06/26
474	Peintre (SC01	Peinture (couche de fond) doublages et portes sous tenture MB-S0	5 jours	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26
475	Peintre (SC01	Peinture (couche de fond) mises à distance MB-S06-11/12	5 jours	Lun 22/06/26	Ven 26/06/26
476	Peintre (SC01	Peinture cimaise centrale MB-S06-02	2 jours	Lun 29/06/26	Mar 30/06/26
477	Peintre (SC01	Peinture mises à distance MB-S06-13	1 jour	Mer 01/07/26	Mer 01/07/26
478	Artiste A. Fon	Décor doublage et portes sous tenture MB-S06-04/05	5 jours	Lun 06/07/26	Ven 10/07/26
479	Artiste A. Fon	Décor mises à distance MB-S06-11/12	5 jours	Mer 15/07/26	Mar 21/07/26
480	Lamparredo (	Pose borne audiovisuelle MB-S06-03	1 jour	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
481	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S06-05 (écrans, mini PC, ampli, HP...) d	1 jour	Ven 09/10/26	Ven 09/10/26
482	Lamparredo (	Pose podium central MB-S06-18	2 jours	Ven 09/10/26	Lun 12/10/26
483	Lamparredo (	Pose caissons MB-S06-06/07/10	1 jour	Lun 12/10/26	Lun 12/10/26
484	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S06-01/02/03 (écrans 15") dans caisso	1 jour	Mar 13/10/26	Mar 13/10/26
485	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S06-04 (contre le podium central MB-S06-18)	2 jours	Mar 13/10/26	Mer 14/10/26
486	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S06-05	2 jours	Jeu 15/10/26	Ven 16/10/26
487	Axima (SC01)	Intégration MiniClima dans vitrine VI-S06-05	1 jour	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26
488	Axima (SC01)	Intégration MiniClima dans vitrine VI-S06-04	1 jour	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26
489	Lamparredo (	Pose table/pupitre MB-S06-08/09	1 jour	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26
490	Boscher (SC0	Pose graphisme (cartels barre z) sur mur de la salle	1 jour	Mar 03/11/26	Mar 03/11/26
491	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels barre z) sur doublages MB-S06-04/0	1 jour	Mar 03/11/26	Mar 03/11/26
492	Boscher (SC0	Intégration graphisme (PLA) sur borne audiovisuelle MB-S06-03	1 jour	Mar 03/11/26	Mar 03/11/26
493	Boscher (SC0	Intégration graphisme (PLA) sur caissons MB-S06-06/07/10	1 jour	Mar 03/11/26	Mar 03/11/26
494	Boscher (SC0	Intégration graphisme (sérigraphie, cartel barre z) sur cimaise MB-S	1 jour	Mer 04/11/26	Mer 04/11/26
495	Boscher (SC0	Intégration graphisme (sérigraphie) de part et d'autre de borne au	1 jour	Jeu 05/11/26	Jeu 05/11/26
496	Videlio (SC03	Intégration AV-S06-05 (écrans, mini PC, ampli, HP...) dans borne au	1 jour	Lun 09/11/26	Lun 09/11/26
497	Videlio (SC03	Intégration AV-S06-01/02/03 (écrans 15") dans caissons MB-S06-0(	1 jour	Mar 10/11/26	Mar 10/11/26
498	Tactile Studio	Intégration MA-S06-03 (Triptyque) sur cimaise centrale MB-S06-02	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
499	Tactile Studio	Intégration MA-S06-01 (Comparer le poids...) + MA-S06-02 (Portrai	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
500	CMN	Installation tableaux	3 jours	Mar 19/01/27	Jeu 21/01/27
501	CMN	Installation factices	3 jours	Ven 22/01/27	Mar 26/01/27
502	CMN	Soclage et intégration oeuvre sur podium MB-S06-18	1 jour	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
503	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels sur tige) sur podium MB-S06-18	1 jour	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
504	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S06-04	1 jour	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
505	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S06-05	1 jour	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
506	Lamparredo (	Pose soclage primaire dans vitrine VI-S06-04	1 jour	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
507	Lamparredo (	Pose soclage primaire dans vitrine VI-S06-05	1 jour	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
508	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel sur tige) dans vitrine VI-S06-04	1 jour	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
509	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel sur tige) dans vitrine VI-S06-05	1 jour	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
510	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (spots sur mats) dans vitrine VI-S06-04	1 jour	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
511	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (spots sur rails) dans vitrine VI-S06-05	1 jour	Ven 05/03/27	Ven 05/03/27
512	Big Bang (SC0	Intégration spots R-SP1/R-CA2/R-WW sur rails	1 jour	Lun 08/03/27	Lun 08/03/27
513		**07. Le cortège - S(R+1)14**	**149 jours**	**Ven 27/03/26**	**Ven 20/11/26**
514	Hchevalier	Dépose des protections de sol et nettoyage	4 jours	Mar 07/04/26	Ven 10/04/26
515	Hchevalier	Etat sanitaire dallage	5 jours	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26
516	Hchevalier	Finition escalier et reprise reservation	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
517	Altempo	Déplacement TD et SSI	5 jours	Lun 27/04/26	Lun 04/05/26
518	MOA	Nettoyage + restauration Christ et St Thomas	20 jours	Lun 13/04/26	Mar 12/05/26
519	MOA	Nettoyage + restauration des statues	30 jours	Ven 27/03/26	Mar 12/05/26
520	Hchevalier	Solde repose dallage et reprises de sol	10 jours	Mer 13/05/26	Ven 29/05/26
521	Lagarde	Dépoussiérage, nettoyage	5 jours	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26
522	Lagarde	Peinture finitions	15 jours	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26
523	SII	Création structure rampe + escalier	6 jours	Lun 03/08/26	Lun 24/08/26
524	ATB	Pose plancher provisoire + main courantes (avec protection)	5 jours	Mar 04/08/26	Lun 24/08/26
525	Delta Instal	Pose radiateurs	5 jours	Lun 03/08/26	Ven 07/08/26
526	Delta Instal	Passage des gaines chauffages sous la rampe	5 jours	Lun 31/08/26	Ven 04/09/26
527	Infralec	Passage gaines CFO/CFA et TD	10 jours	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26
528	Infralec	Pose TD S14	5 jours	Lun 09/11/26	Ven 13/11/26
529	Infralec	Cablage TD	5 jours	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26
530	ATB	Création plancher rampe définitif	10 jours	Lun 26/10/26	Lun 09/11/26
531	ATB	Habillage de la rampe	10 jours	Lun 09/11/26	Ven 20/11/26
532		**Scénographie Salle 07**	**106 jours**	**Lun 31/08/26**	**Lun 08/02/27**

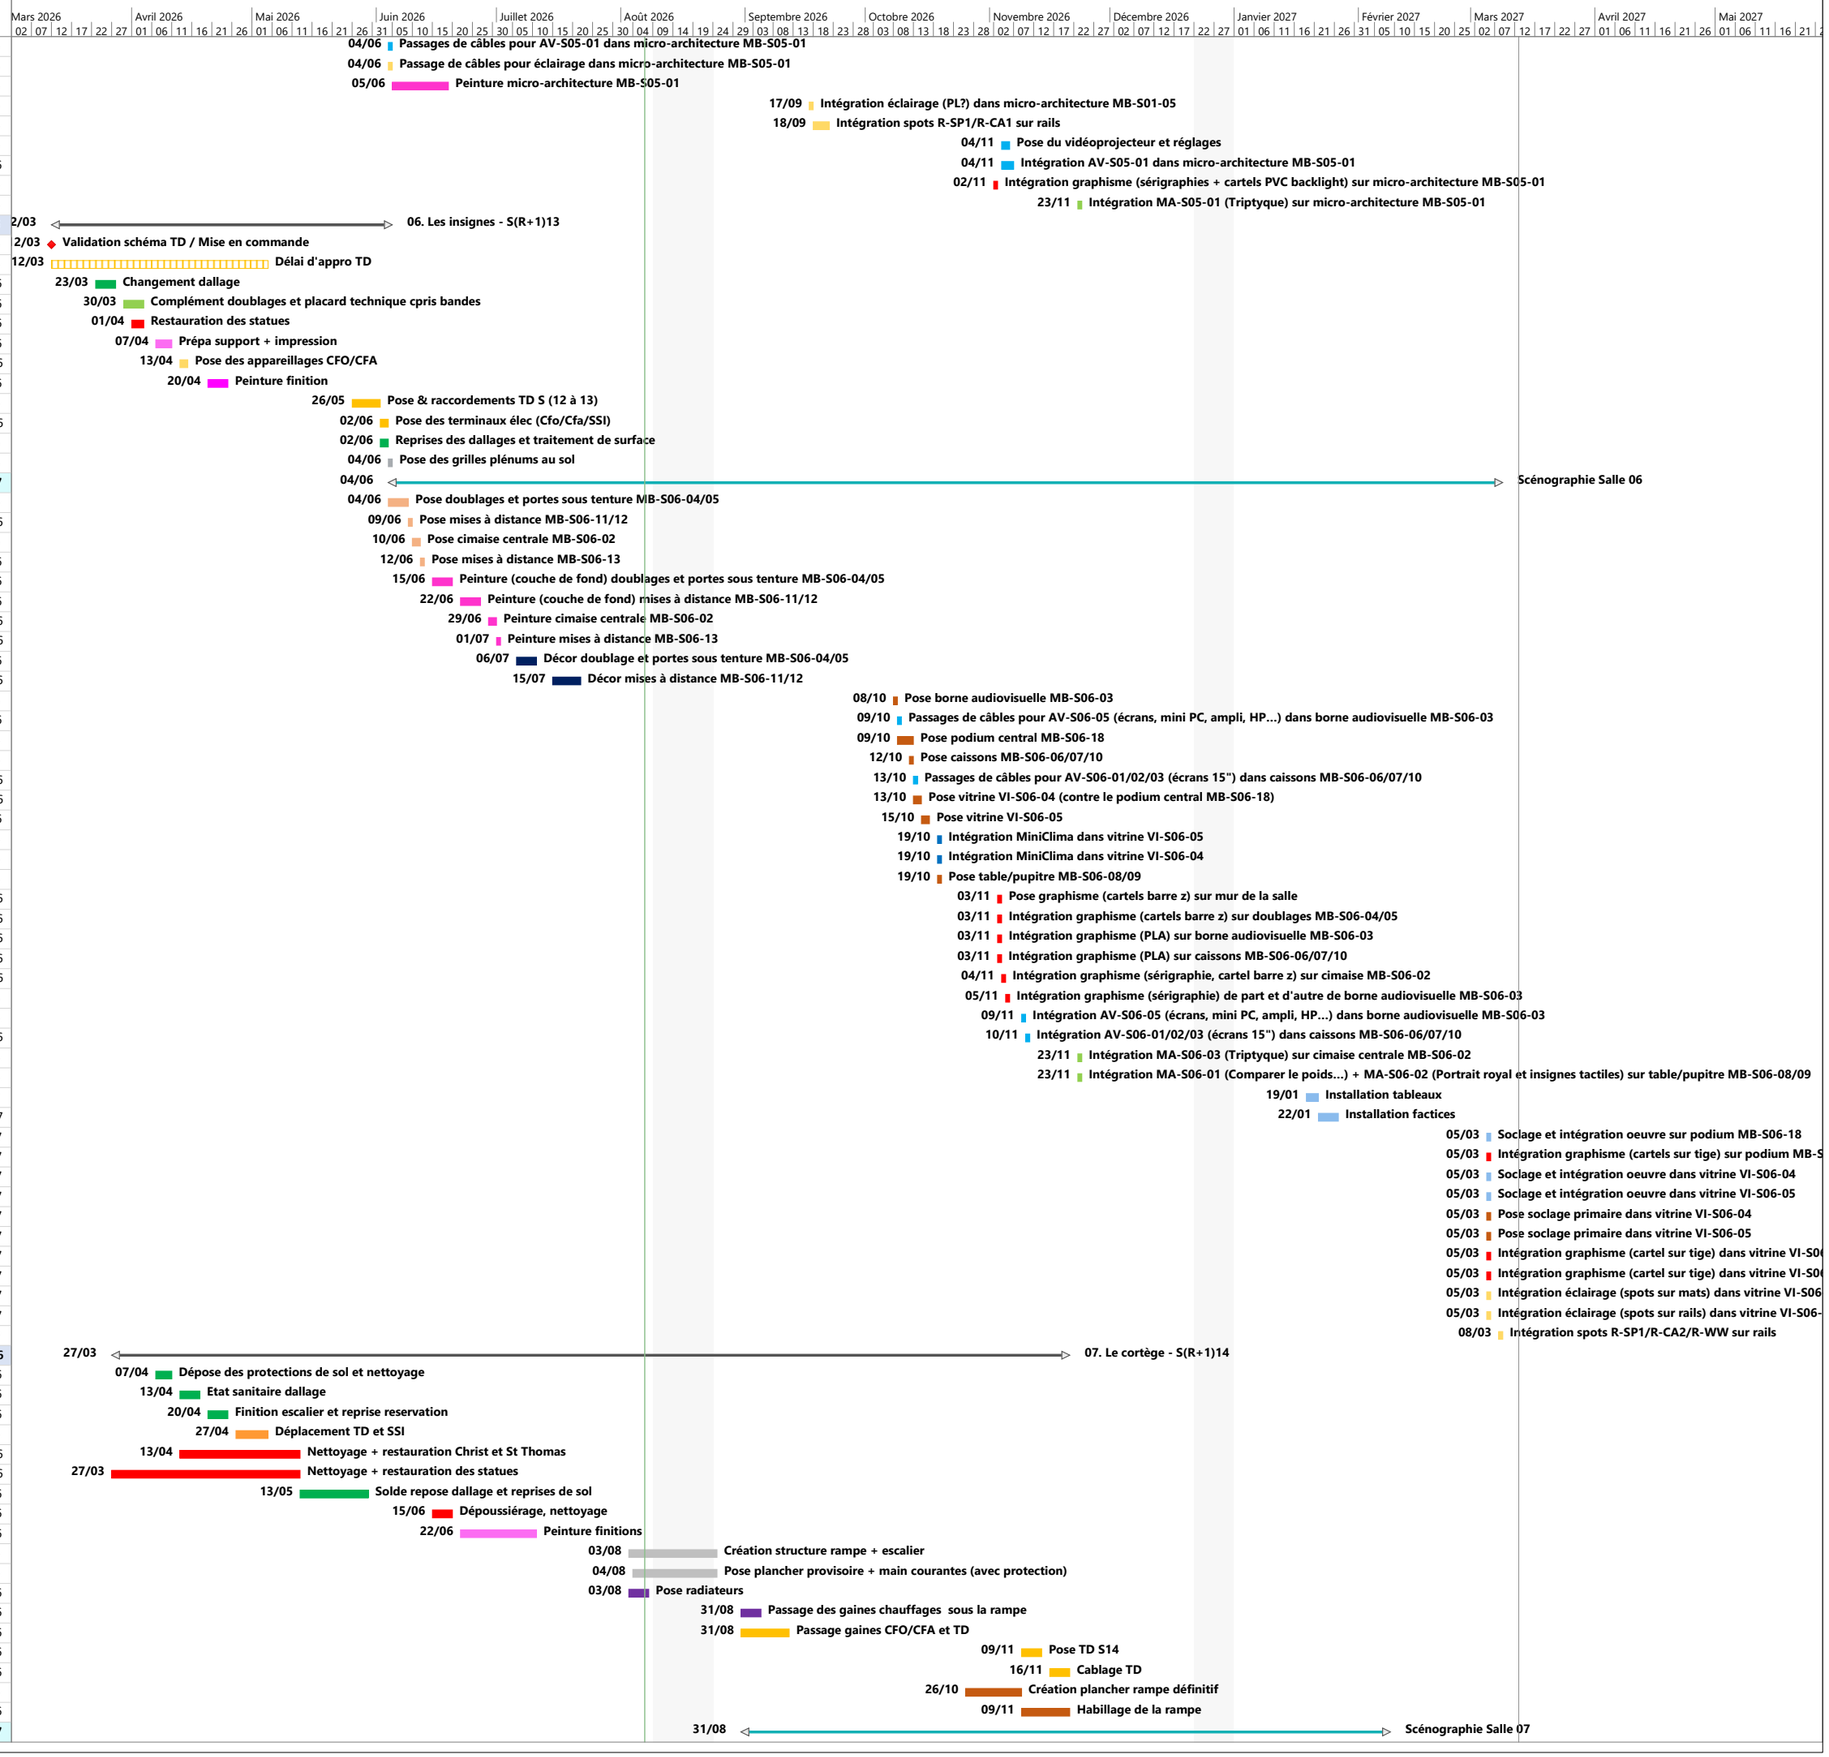

CMN - Palais du Tau

Planning EXE fin de travaux du 06.08.26


N°	Texte1	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
533	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S07-01	25 jours	Lun 31/08/26	Ven 02/10/26
534	Boscher (SC0	impression motif sur vitrage VI-S07-01	2 jours	Jeu 01/10/26	Ven 02/10/26
535	Axima (SC01)	Intégration climatisation dans vitrine VI-S07-01 et raccord CTA	15 jours	Lun 05/10/26	Ven 23/10/26
536	Big Bang (SC0	Passages de câbles + intégration éclairage (rails + torchères + L8 su	10 jours	Lun 26/10/26	Ven 06/11/26
537	Lamparredo (	Intégration soclage primaire dans vitrine VI-S07-01	5 jours	Lun 09/11/26	Ven 13/11/26
538	Axima, Lampa	Marche à blanc et régulation du climat	25 jours	Lun 16/11/26	Ven 18/12/26
539	Lamparredo (	Pose plinthes horizontales MB-S07-04 et MB-S07-05	1 jour	Lun 05/10/26	Lun 05/10/26
540	Lamparredo (	Pose table double MB-S07-08	1 jour	Mar 06/10/26	Mar 06/10/26
541	Lamparredo (	Pose embase MB-S07-07	1 jour	Mer 07/10/26	Mer 07/10/26
542	Sequoia (SC0	Pose panneau de salle MB-S07-09	1 jour	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
543	Sequoia (SC0	Pose banc coffre MB-S07-10	1 jour	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
544	Lamparredo (	Pose pupitre double MB-S07-06	1 jour	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
545	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S07-02 (écran 43" + PC) dans pupitre M	1 jour	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26
546	Videlio (SC03	Intégration AV-S07-02 (écran 43" + PC) dans pupitre MB-S07-06	1 jour	Mer 11/11/26	Mer 11/11/26
547	Videlio (SC03	Intégration AV-S07-03/04 dans visionneuses MA-S07-02/03 sur tab	1 jour	Jeu 12/11/26	Jeu 12/11/26
548	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels sur main courante) sur rampe	1 jour	Ven 06/11/26	Ven 06/11/26
549	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels sur tige) sur plinthes horizontales M	1 jour	Ven 06/11/26	Ven 06/11/26
550	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel sur tige) sur embase MB-S07-07	1 jour	Ven 06/11/26	Ven 06/11/26
551	Boscher (SC0	Intégration graphisme (PLA) sur pupitre double MB-S07-06	1 jour	Ven 06/11/26	Ven 06/11/26
552	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels collés) sur table double MB-S07-08	1 jour	Ven 06/11/26	Ven 06/11/26
553	Boscher (SC0	Intégration graphisme (sérigraphie) sur panneau de salle MB-S07-0	1 jour	Lun 09/11/26	Lun 09/11/26
554	Tactile Studio	Intégration MA-S07-05 (Triptyque) sur panneau de salle MB-S07-0	1 jour	Mar 24/11/26	Mar 24/11/26
555	Tactile Studio	Intégration MA-S07-02 (Illustration haut-relief du cortège) sur pupi	1 jour	Mar 24/11/26	Mar 24/11/26
556	Tactile Studio	Intégration MA-S07-01 (Diorama) + MB-S07-02/03 (Visionneuses) s	1 jour	Mar 24/11/26	Mar 24/11/26
557	CMN	Soclage et intégration oeuvres dans vitrine VI-S07-01	15 jours	Mar 12/01/27	Lun 01/02/27
558	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels sur tige) dans vitrine VI-S07-01	2 jours	Mar 02/02/27	Mer 03/02/27
559	Big Bang (SC0	Intégration spots R-SP1/R-CA1/R-WW sur rails	5 jours	Jeu 28/01/27	Mer 03/02/27
560	Big Bang (SC0	Réglage des éclairages avec la MOE	3 jours	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27
561		**Phase 2 - Aile Robert de Cotte**	**528 jours?**	**Lun 20/01/25**	**Ven 12/03/27**
562		**Sous-Sol**	**507 jours**	**Lun 20/01/25**	**Jeu 11/02/27**
563		**Calorifère**	**125 jours**	**Lun 01/06/26**	**Lun 14/12/26**
564	Delta instal	Installation et raccordement équipements calorifère	20 jours	Lun 01/06/26	Ven 26/06/26
565	Hchevalier	Travaux GO	10 jours	Mer 15/07/26	Mar 28/07/26
566	Infralec	électricité calorifère	15 jours	Mer 29/07/26	Lun 07/09/26
567	Lagarde	Mise en peinture Calorifère	5 jours	Mer 05/08/26	Lun 31/08/26
568	Infralec	Pose terminaux élec Cfo-Cfa (éclairage, prises,info, SSI)	10 jours	Mar 01/09/26	Lun 14/09/26
569	Delta Instal	Installation équipements, plateforme silot	20 jours	Lun 07/09/26	Ven 02/10/26
570		**MES,réglages, essais - Calorifère**	**61 jours**	**Lun 21/09/26**	**Lun 14/12/26**
571	Infralec	Mise à disposition alimentation définitive	0 jour	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26
572	Delta instal	Mise en service, réglages	40 jours	Lun 21/09/26	Ven 13/11/26
573	Delta instal	Essais	20 jours	Lun 16/11/26	Lun 14/12/26
574		**Espace technique - P(R-1)02bis**	**12 jours**	**Lun 14/09/26**	**Mar 29/09/26**
575	Hchevalier	Calfeutrement des réseaux	5 jours	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26
576	Infralec	Pose des teminaux CFO/CFA	5 jours	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
577	ATB	Pose des batis	2 jours	Lun 28/09/26	Mar 29/09/26
578		**14. SAS Chapelle basse - P(R-1)02**	**139 jours**	**Lun 27/10/25**	**Mar 12/05/26**
579	Hchevalier	Enduits	15 jours	Lun 27/10/25	Ven 14/11/25
580	Hchevalier	Réservation (élec vers TD Chapelle)	3 jours	Lun 17/11/25	Mer 19/11/25
581	Hchevalier	Création enduits sur maçonnerie LT (P(R-1)02	20 jours	Jeu 20/11/25	Mer 17/12/25
582	Infralec	Passage cheminement élec (alim TD salles du trésor + chapelle)	5 jours	Jeu 11/12/25	Mer 17/12/25
583	Infralec	Passage câbles Cfo/Cfa	5 jours	Jeu 18/12/25	Mar 17/02/26
584	Hchevalier	Encoffrement CDC + finitions enduits (cis dépose échafaudage)	10 jours	Lun 12/01/26	Ven 23/01/26
585		Bon à fermer faux plafond	0 jour	Mar 28/04/26	Mar 28/04/26
586	Agnesina	Faux plafond	5 jours	Mar 28/04/26	Mar 05/05/26
587	Hchevalier	Nettoyage escalier béton	3 jours	Mar 28/04/26	Lun 04/05/26
588	Lagarde	Préparation enduit plafond et impression	3 jours	Lun 04/05/26	Mer 06/05/26
589	Big Bang (SC0	Pose rails au plafond	3 jours	Jeu 07/05/26	Mar 12/05/26
590	SII	Pose porte vitrée	3 jours	Jeu 07/05/26	Mar 12/05/26
591	Restauratrice	Restauration des statues	5 jours	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26
592		**Scénographie Salle 14**	**44 jours**	**Jeu 19/11/26**	**Mar 02/02/27**
593	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel) sur support statue MB-S15-03	1 jour	Ven 20/11/26	Ven 20/11/26
594	Boscher (SC0	Pose graphisme (sérigraphie + cartels barre z) sur mur de la salle	1 jour	Ven 20/11/26	Ven 20/11/26
595	Tactile Studio	Intégration MA-S14-01 (Triptyque) sur mur de la salle	1 jour	Jeu 19/11/26	Jeu 19/11/26
596	Big Bang (SC0	Intégration spots R-SP1/R-CA1 sur rails	2 jours	Lun 01/02/27	Mar 02/02/27
597		**15. Salle basse (Cathédrale et Palais du Tau) - T(R-1)01**	**12 jours**	**Lun 08/06/26**	**Mar 23/06/26**
598	Hchevalier	Préparation feuillure pour grille ventil de sol	10 jours	Lun 08/06/26	Ven 19/06/26
599	SII	Pose de la grille SOL	2 jours	Lun 22/06/26	Mar 23/06/26
600	Delta instal	Pose plénum de ventilation (depuis P(R-1)02bis)	2 jours	Lun 22/06/26	Mar 23/06/26
601		**Scénographie Salle 15**	**104 jours**	**Lun 07/09/26**	**Jeu 11/02/27**
602	Lamparredo (	Pose châssis de présentation des voussures MB-S15-01	2 jours	Lun 07/09/26	Mar 08/09/26
603	Big Bang (SC0	Passages de câbles + intégration éclairage (...) sur châssis de préser	1 jour	Mer 09/09/26	Mer 09/09/26
604	Lamparredo (	Pose pupitre MB-S15-04	1 jour	Mer 09/09/26	Mer 09/09/26
605	Lamparredo (	Pose support statue MB-S15-03	1 jour	Mer 09/09/26	Mer 09/09/26
606	Big Bang (SC0	Passages de câbles + intégration éclairage (...) sur support statue M	1 jour	Jeu 10/09/26	Jeu 10/09/26
607	Lamparredo (	Pose support statue MB-S15-02	1 jour	Jeu 10/09/26	Jeu 10/09/26
608	Big Bang (SC0	Passages de câbles + intégration éclairage (...) sur support statue M	1 jour	Jeu 10/09/26	Jeu 10/09/26
609	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels cornière?) sur châssis de présentatic	1 jour	Ven 20/11/26	Ven 20/11/26
610	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel) sur support statue MB-S15-02	1 jour	Ven 20/11/26	Ven 20/11/26
611	Tactile Studio	Intégration MA-S16-03 (Élément lapidaire tactile) sur pupitre MB-S	1 jour	Jeu 19/11/26	Jeu 19/11/26
612	CMN	Installation des voussures	5 jours	Lun 01/02/27	Ven 05/02/27
613	CMN	Installation des sculptures (Sirène, Ange, Gargouille)	4 jours	Lun 08/02/27	Jeu 11/02/27
614		**16. Salle basse (Cathédrale et Palais du Tau) - T(R-1)01**	**44 jours**	**Lun 06/07/26**	**Ven 25/09/26**
615	Hchevalier	Reprises de maçonnerie de dallage	23 jours	Lun 06/07/26	Ven 07/08/26
616	Hchevalier	Intégration des nouveaux boitiers de luminaires	10 jours	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26
617	infralec	Alimentation des boitiers de désenfumage	5 jours	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26
618	ATB	Pose des portes restaurées	5 jours	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26

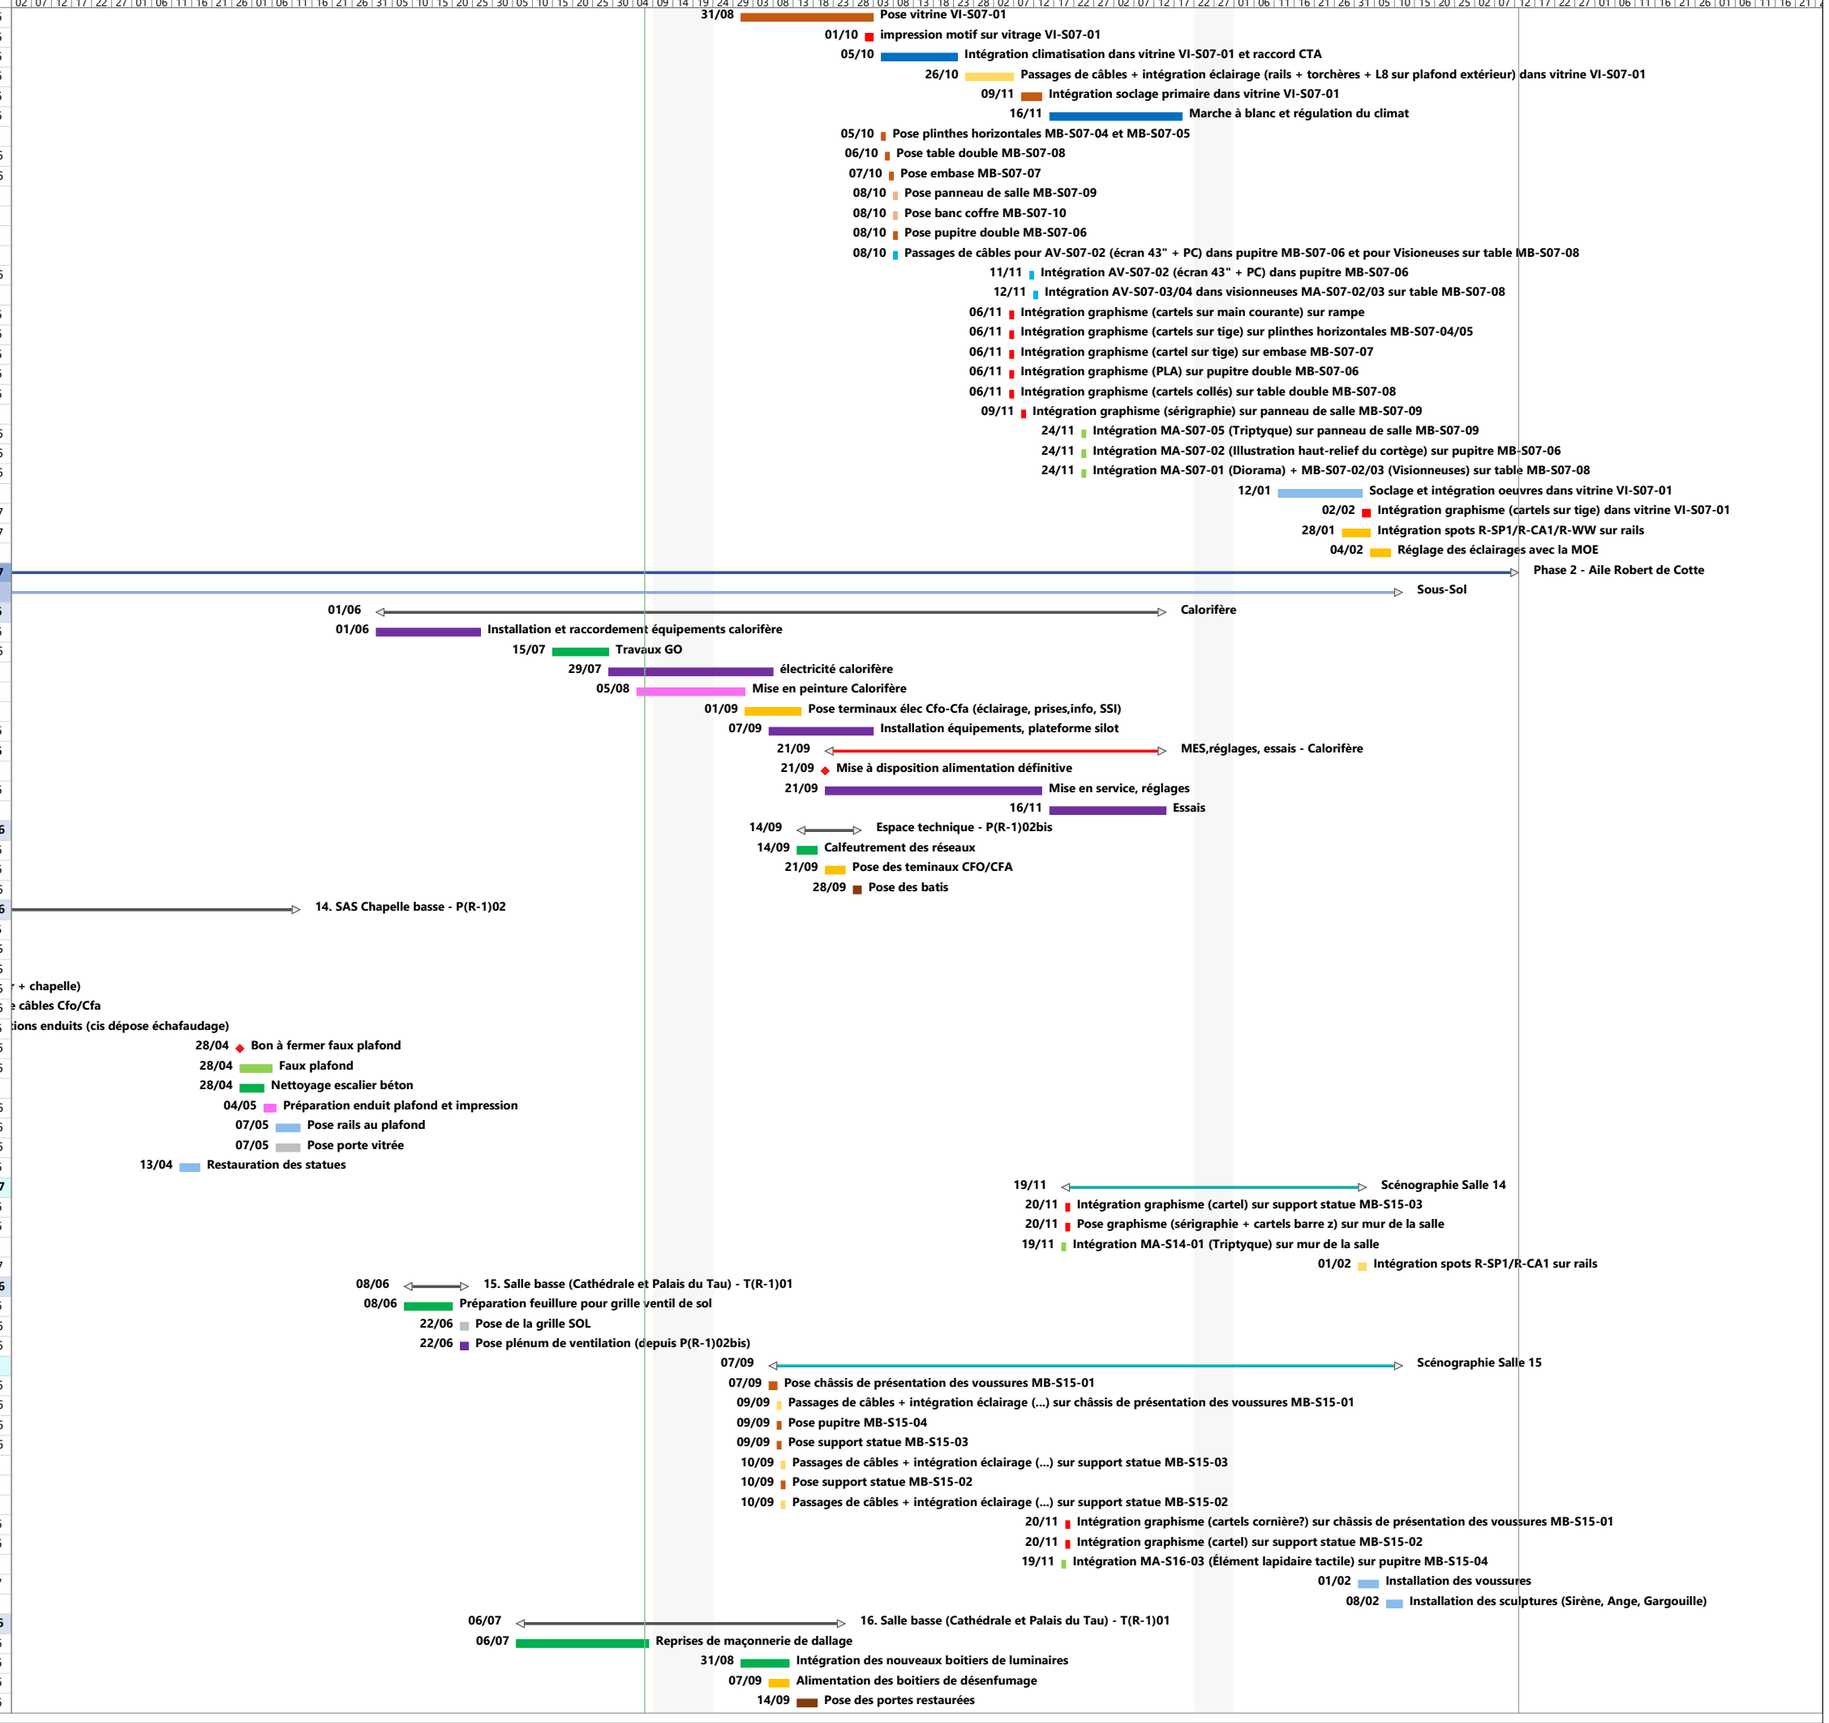

CMN - Palais du Tau

Planning EXE fin de travaux du 06.08.26


N°	Texte1	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
619	infralec	Pose des terminaux CFO/CFA	5 jours	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
620		**Scénographie Salle 16**	**91 jours**	**Ven 11/09/26**	**Ven 29/01/27**
621	Lamparredo (	Pose ensemble de projection MB-S16-26	2 jours	Ven 11/09/26	Lun 14/09/26
622	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S16-04 (VP + équipements + BIM?) dar	2 jours	Mar 15/09/26	Mer 16/09/26
623	Lamparredo (	Pose table de présentation avec pupitre MB-S16-22	2 jours	Mar 15/09/26	Mer 16/09/26
624	Big Bang (SC0	Passage de câbles pour panneau lumineux PL + éclairage gargouille	1 jour	Jeu 17/09/26	Jeu 17/09/26
625	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S16-01/02 dans visionneuses MA-S16-(	1 jour	Jeu 17/09/26	Jeu 17/09/26
626	Lamparredo (	Pose pupitre MB-S16-21	1 jour	Jeu 17/09/26	Jeu 17/09/26
627	Big Bang (SC0	Passage de câbles pour panneau lumineux PL sur pupitre MB-S16-2	1 jour	Jeu 17/09/26	Jeu 17/09/26
628	Lamparredo (	Pose bancs béton MB-S16-25a/25b	1 jour	Ven 18/09/26	Ven 18/09/26
629	Lamparredo (	Pose pupitre MB-S16-24	1 jour	Ven 18/09/26	Ven 18/09/26
630	Big Bang (SC0	Passage de câbles pour panneau lumineux PL sur pupitre MB-S16-2	1 jour	Ven 18/09/26	Ven 18/09/26
631	Lamparredo (	Pose pupitre MB-S16-23	1 jour	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26
632	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S16-02	2 jours	Jeu 22/10/26	Ven 23/10/26
633	Big Bang (SC0	Intégration panneau lumineux PL dans pupitre MB-S16-21	1 jour	Ven 18/09/26	Ven 18/09/26
634	Big Bang (SC0	Intégration panneau lumineux PL dans pupitre MB-S16-22	1 jour	Ven 18/09/26	Ven 18/09/26
635	Big Bang (SC0	Intégration éclairage gargouilles dans pupitre MB-S16-22	2 jours	Lun 21/09/26	Mar 22/09/26
636	Big Bang (SC0	Intégration panneau lumineux PL dans pupitre MB-S16-24	1 jour	Mar 22/09/26	Mar 22/09/26
637	Big Bang (SC0	Pose appliques sur le mur	2 jours	Mer 23/09/26	Jeu 24/09/26
638	Videlio (SC03	Intégration AV-S16-04 (VP + équipements + BIM?) dans ensemble c	2 jours	Jeu 19/11/26	Ven 20/11/26
639	Videlio (SC03	Intégration AV-S16-01/02 dans visionneuses MA-S16-07/08 sur tab	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
640	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel PVC backlight) sur pupitre MB-S16-21	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
641	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel PVC backlight) sur pupitre MB-S16-22	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
642	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel PVC backlight) sur pupitre MB-S16-24	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
643	Boscher (SC0	Intégration graphisme sur table de présentation MB-S16-22	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
644	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartel collé) sur banc béton MB-S16-25 - ba	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
645	Boscher (SC0	Intégration graphisme (sérigraphie) sur panneaux arche pupitre MI	1 jour	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26
646	Boscher (SC0	Intégration graphisme (sérigraphie) sur panneaux arche pupitre MI	1 jour	Mar 24/11/26	Mar 24/11/26
647	Boscher (SC0	Intégration graphisme (sérigraphie) sur panneaux arche pupitre MI	1 jour	Mer 25/11/26	Mer 25/11/26
648	Tactile Studio	Intégration MA-S16-09 (Triptyque) sur mur de la salle	1 jour	Jeu 19/11/26	Jeu 19/11/26
649	Tactile Studio	Intégration MA-S16-04/05 (Maquettes tactiles de la cathédrale) sur	1 jour	Jeu 19/11/26	Jeu 19/11/26
650	Tactile Studio	Intégration MA-S16-07/08 (Visionneuses) sur table de présentation	1 jour	Jeu 19/11/26	Jeu 19/11/26
651	Tactile Studio	Intégration MA-S16-01 (Plan tactile) sur pupitre MB-S16-23	1 jour	Jeu 19/11/26	Jeu 19/11/26
652	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S16-02	3 jours	Mer 27/01/27	Ven 29/01/27
653	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels sur tige) dans vitrine VI-S16-02	1 jour	Ven 29/01/27	Ven 29/01/27
654	Big Bang (SC0	Intégration éclairage dans vitrine VI-S16-02	1 jour	Ven 29/01/27	Ven 29/01/27
655		**Salle basse T(R-1)02**	**15 jours**	**Lun 20/01/25**	**Ven 07/02/25**
656	Hchevalier	Agrandissement carneau pour accès tuyau à raccorder	15 jours	Lun 20/01/25	Ven 07/02/25
657		**Circulation - C(R-1)02,04**	**10 jours**	**Lun 05/10/26**	**Ven 16/10/26**
658	Infralec	Passage de câbles (Cfo, Cfa) et pose terminaux	10 jours	Lun 05/10/26	Ven 16/10/26
659		**Réserves lapidaires - C(R-1)01,03**	**18 jours**	**Mer 30/09/26**	**Ven 23/10/26**
660	Delta instal	Passage réseau Ec	8 jours	Mer 30/09/26	Lun 12/10/26
661	Infralec	Passage de câbles (Cfo, Cfa)	5 jours	Lun 12/10/26	Lun 19/10/26
662	Infralec	Pose TD et raccordements	5 jours	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26
663		**local sous-station 2 - C(R-1)06**	**109 jours**	**Lun 08/06/26**	**Ven 27/11/26**
664	Delta instal	F+ P matériel sous station	2 jours	Lun 08/06/26	Mar 09/06/26
665	Delta instal	Equipement sous-station 2	15 jours	Lun 08/06/26	Ven 26/06/26
666	Delta instal	Raccordement sur verticalités GT + distrib sanitaire scolaire	5 jours	Lun 29/06/26	Ven 03/07/26
667	Delta instal	Mise en eau, test pression	3 jours	Lun 06/07/26	Mer 08/07/26
668	Delta instal	Calorifuge	2 jours	Jeu 09/07/26	Ven 10/07/26
669	Infralec	Cheminement élec	3 jours	Mer 15/07/26	Ven 17/07/26
670	Infralec	Passage de câbles (Cfo, Cfa)	3 jours	Lun 20/07/26	Mer 22/07/26
671		**MES, réglages, essais - Sous station 2**	**55 jours**	**Lun 14/09/26**	**Ven 27/11/26**
672	Infralec	Màd alim élec définitive	0 jour	Lun 14/09/26	Lun 14/09/26
673	Delta instal	Mise en service, réglages	10 jours	Lun 02/11/26	Ven 13/11/26
674	Delta instal	Essais	10 jours	Lun 16/11/26	Ven 27/11/26
675		**RDC**	**128 jours**	**Mar 07/04/26**	**Ven 30/10/26**
676		**Local CTA 3 - P(RDC)01**	**118 jours**	**Mar 07/04/26**	**Ven 16/10/26**
677	Delta instal	Livraison + pose CTA 3	2 jours	Mar 07/04/26	Mer 08/04/26
678	Delta instal	Pose réseaux aérauliques et hydrauliques + raccordements	10 jours	Mar 07/04/26	Lun 20/04/26
679	Agnesina	Doublage	5 jours	Mar 21/04/26	Lun 27/04/26
680	Lagarde	Mise en peinture	5 jours	Ven 24/04/26	Jeu 30/04/26
681	Infralec	Cheminement + passage de câbles	5 jours	Mar 28/04/26	Mar 05/05/26
682	SII	Pose escalier	5 jours	Mer 06/05/26	Mer 13/05/26
683	Hchevalier	Complément Seuil Pierre de taille	2 jours	Jeu 03/09/26	Lun 07/09/26
684	ATB	Pose bâtis et portes	1 jour	Lun 07/09/26	Lun 07/09/26
685	Infralec	Pose terminaux élec CFO/CFA et curage anciens terminaux	2 jours	Mar 08/09/26	Mer 09/09/26
686	Hchevalier	Calfeutrements restants	2 jours	Jeu 10/09/26	Ven 11/09/26
687		**MES, réglages, essais - CTA 3**	**20 jours**	**Lun 21/09/26**	**Ven 16/10/26**
688	Infralec	Màd alim élec définitive	0 jour	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26
689	Delta instal	Mise en service, réglages	10 jours	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26
690	Delta instal	Essais	10 jours	Lun 05/10/26	Ven 16/10/26
691		**Atelier pédagogique - C(RDC)01**	**29 jours**	**Mar 08/09/26**	**Ven 16/10/26**
692	Infralec	Pose terminaux élec (Cfo, Cfa, SSI)	3 jours	Mar 08/09/26	Jeu 10/09/26
693	Delta instal	Installation et raccordement des radiateurs	10 jours	Ven 11/09/26	Jeu 24/09/26
694	Hchevalier	Traitement hydrofuge des sols	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
695	Lagarde	Peinture finition des fenetres	10 jours	Lun 05/10/26	Ven 16/10/26
696		**Circulation RDC vers salle basse - C(RDC)02**	**25 jours**	**Lun 28/09/26**	**Ven 30/10/26**
697	Hchevalier	Nettoyage escalier béton	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
698	Infralec	Pose terminaux élec (Cfo, Cfa, SSI)	5 jours	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
699	Big Bang (SC0	Pose des eclairages	5 jours	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
700	Lagarde	Peinture finition MEX	10 jours	Lun 19/10/26	Ven 30/10/26
701		**Local Transfo - C(RDC)07**	**38 jours**	**Lun 20/07/26**	**Mar 29/09/26**
702	Infralec	Livraison TGBT, TGS	3 jours	Lun 20/07/26	Mer 22/07/26
703	Infralec	Raccordement transfo-TGBT/HT/S	17 jours	Lun 27/07/26	Lun 07/09/26
704		**MES, réglages, essais - locaux élec (transfo, tgbt, tgs)**	**11 jours**	**Lun 24/08/26**	**Lun 14/09/26**

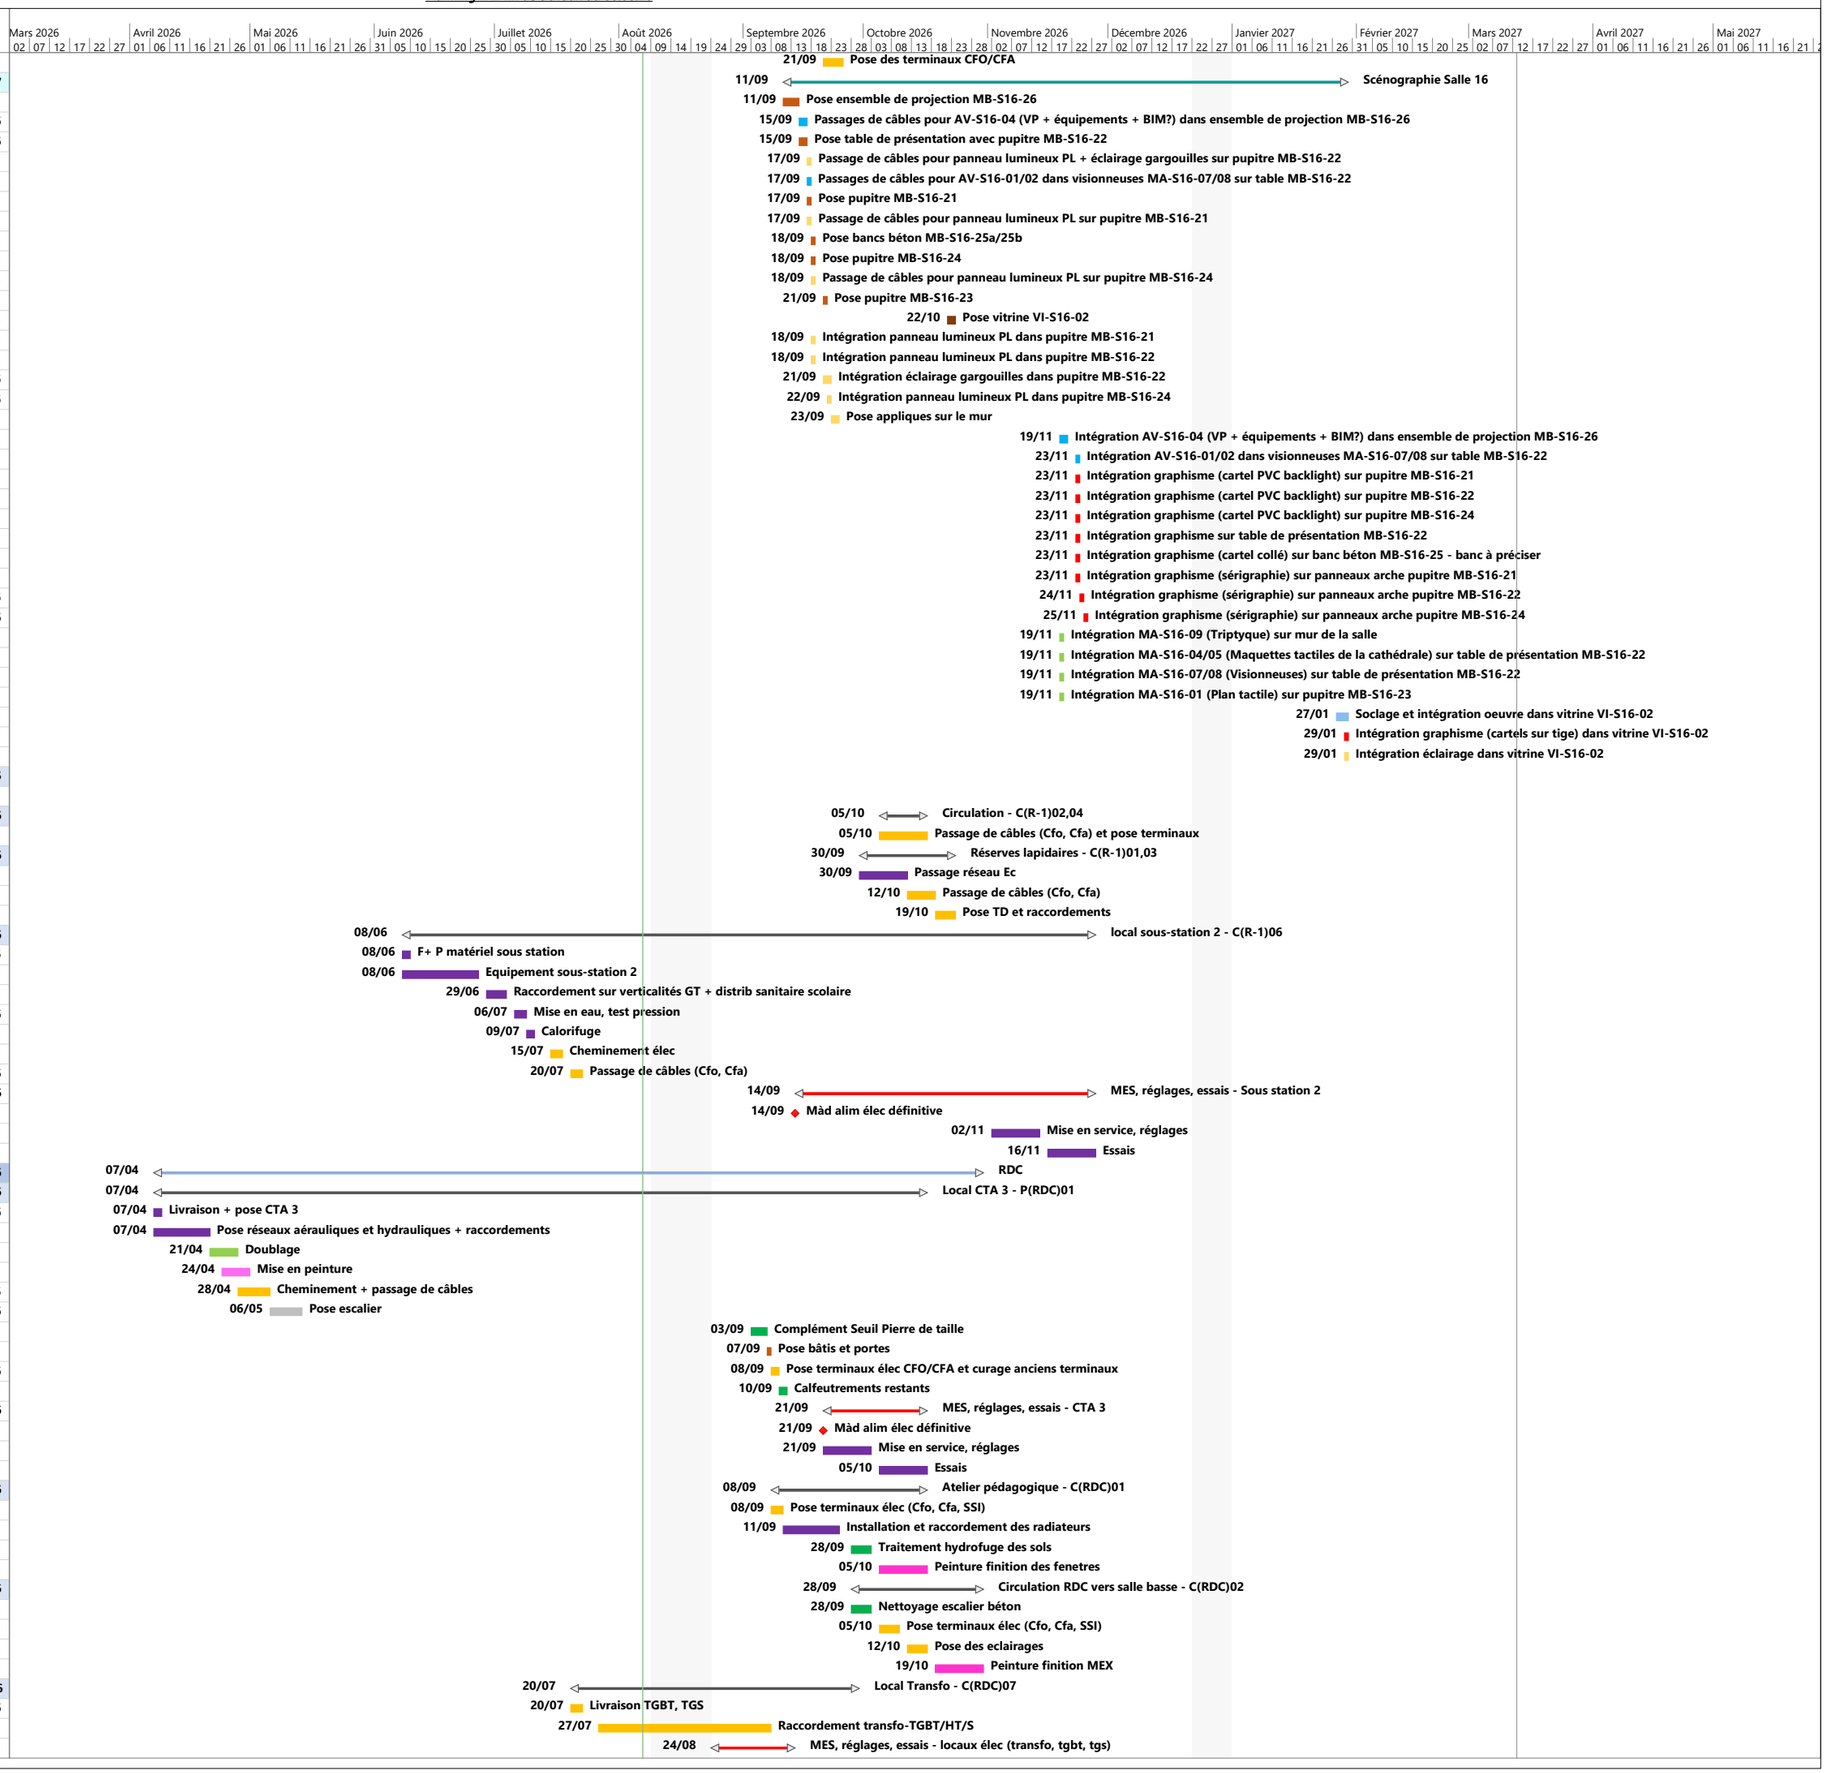

CMN - Palais du Tau

Planning EXE fin de travaux du 06.08.26


N°	Texte1	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
705	Infralec	Essais	10 jours	Lun 24/08/26	Jeu 10/09/26
706	Infralec	Mise à dispo énergie par INFRALEC	0 jour	Lun 14/09/26	Lun 14/09/26
707	ATB	F + P bâtis INT	3 jours	Lun 14/09/26	Mer 16/09/26
708	Lagarde	Peinture de sol	5 jours	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
709	Infralec	Pose terminaux CFO/CFA	2 jours	Lun 28/09/26	Mar 29/09/26
710		**Sanitaires scolaires et festin - C(RDC)08 + circul° C(RDC)06**	**35 jours**	**Lun 14/09/26**	**Ven 30/10/26**
711	Lagarde	Carrelage et faience	15 jours	Lun 14/09/26	Ven 02/10/26
712	ATB	Pose portes INT	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
713	Lagarde	Peinture de fintion compris peinture de sol placard technique	5 jours	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
714	Delta instal	Equipements sanitaires	5 jours	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
715	Delta instal	Pose radiateurs	2 jours	Lun 19/10/26	Mar 20/10/26
716	ATB	Aménagements sanitaires	10 jours	Lun 19/10/26	Ven 30/10/26
717	Infralec	Pose terminaux élec Cfo-Cfa (éclairages, PC, info, SSI)	3 jours	Mer 28/10/26	Ven 30/10/26
718	Mobidecor	Pose meubles vasques	3 jours	Mer 28/10/26	Ven 30/10/26
719		**Dégagement Ascenceur C(RDC)05**	**22 jours**	**Lun 07/09/26**	**Mar 06/10/26**
720	SII	Création cailliboti	5 jours	Lun 07/09/26	Ven 11/09/26
721	Hchevalier	Calfeutrements CF	2 jours	Lun 14/09/26	Mar 15/09/26
722	Delta instal	Pose ballon EC	3 jours	Mer 16/09/26	Ven 18/09/26
723	Infralec	Tirage cables phase 1 vers TGBT	3 jours	Mer 16/09/26	Ven 18/09/26
724	Hchevalier	Montage maçonnerie parpaing	5 jours	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
725	SII	Pose porte accès	3 jours	Lun 21/09/26	Mer 23/09/26
726	Hchevalier	Enduits	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
727	SII	Pose habillage seuil	2 jours	Lun 05/10/26	Mar 06/10/26
728		**R+1**	**243 jours?**	**Lun 23/02/26**	**Ven 12/03/27**
729		**08. Le Festin - T(R+1)01**	**188 jours**	**Lun 16/03/26**	**Ven 15/01/27**
730	Infralec	Cheminement réseaux élec	10 jours	Lun 16/03/26	Ven 27/03/26
731	Infralec	Passage de câbles Cfo-Cfa	20 jours	Lun 16/03/26	Lun 13/04/26
732	Hchevalier	Nettoyage des parements, reprise d'enduits (murs ouest, sud, nord	15 jours	Lun 13/04/26	Lun 04/05/26
733	Hchevalier	Restauration de la frise	15 jours	Lun 13/04/26	Lun 04/05/26
734	Hchevalier	Restauration de la cheminée	16 jours	Lun 04/05/26	Ven 29/05/26
735	MOE	VSO Enduit acoustique	0 jour	Lun 27/04/26	Lun 27/04/26
736	Agnesina	Approvisonnement enduit acoustique	15 jours	Mar 05/05/26	Ven 29/05/26
737	ATB	Pose précadre tableau/chambranle manquant /trait lambris bas fin	4 jours	Mar 26/05/26	Ven 29/05/26
738	Agnesina	Création enduit acoustique	30 jours	Lun 01/06/26	Ven 10/07/26
739	SII	Pose grille ventilation	2 jours	Mer 15/07/26	Jeu 16/07/26
740	Big Bang (SCO	Pose Profilé carré avec ruban led L3 (disposé sur la partie supérieur	3 jours	Mer 15/07/26	Ven 17/07/26
741	MOE/Infralec	Validation études et mise en commande TD élec	0 jour	Lun 31/08/26	Lun 31/08/26
742	Infralec	Fabrication recalée TD	20 jours	Lun 31/08/26	Lun 28/09/26
743	Infralec	Pose TD + raccordement	5 jours	Lun 28/09/26	Lun 05/10/26
744	Hchevalier	Pose revêtement de sol	40 jours	Lun 05/10/26	Ven 27/11/26
745	Delta instal	Installation des radiateurs	3 jours	Lun 30/11/26	Mer 02/12/26
746	Infralec	Pose des terminaux CFO/CFA	5 jours	Lun 30/11/26	Ven 04/12/26
747	ATB	F + P bâti + portes INT	5 jours	Lun 07/12/26	Ven 11/12/26
748	ATB	Pose des lambris bas	5 jours	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26
749	ATB	Habillage radiateurs	5 jours	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27
750	Altempo	Dépose des protections	2 jours	Lun 11/01/27	Mar 12/01/27
751	ATB	Repose de la porte	3 jours	Mer 13/01/27	Ven 15/01/27
752		**Scénographie Salle 08**	**104 jours**	**Lun 05/10/26**	**Jeu 11/03/27**
753	Sequoia (SCO	Pose mur scénographique MB-S08-01	3 jours	Lun 05/10/26	Mer 07/10/26
754	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S08-01 + vitrine VI-S08-02 + vitrine VI-S08-03 (dans	2 jours	Ven 09/10/26	Lun 12/10/26
755	Axima (SC01)	Intégration MiniClima dans vitrine VI-S08-01/02/03	1 jour	Mar 13/10/26	Mar 13/10/26
756	Boscher (SCO	Intégration graphisme (sérigraphie + cartels barre z) sur mur scéno	1 jour	Mar 10/11/26	Mar 10/11/26
757	Boscher (SCO	Intégration graphismes non liés au lot SC01 (mur, rail de MAD, aut	1 jour	Mer 11/11/26	Mer 11/11/26
758	Tactile Studio	Intégration MA-S08-01 (Triptyque) sur mur scénographique MB-S0	1 jour	Mar 17/11/26	Mar 17/11/26
759	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S08-01/02/03	2 jours	Mar 12/01/27	Mer 13/01/27
760	Lamparredo (	Pose soclage primaire dans vitrine VI-S08-01	1 jour	Mar 12/01/27	Mar 12/01/27
761	Boscher (SCO	Intégration graphisme (cartel sur tige) dans vitrine VI-S08-01	1 jour	Mar 12/01/27	Mar 12/01/27
762	Big Bang (SCO	Intégration éclairage (IED L5) dans vitrine VI-S08-01/02/03	1 jour	Mer 13/01/27	Mer 13/01/27
763	CMN	Installation Gérard	7 jours	Mar 23/02/27	Mer 03/03/27
764	CMN	Installation des deux autres grands formats	4 jours	Jeu 04/03/27	Mar 09/03/27
765	SII	Livraison + pose de la mise à distance	2 jours	Mer 10/03/27	Jeu 11/03/27
766	Big Bang (SCO	Intégration spots R-CA1 sur rails	1 jour	Mer 10/03/27	Mer 10/03/27
767		**09. Le trésor - P(R+1)04**	**47 jours**	**Lun 23/02/26**	**Mer 29/04/26**
768	Infralec	Cheminement élec	5 jours	Lun 23/02/26	Lun 02/03/26
769		Bon à fermer	0 jour	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26
770	Agnesina	Doublage	5 jours	Lun 02/03/26	Ven 06/03/26
771	Agnesina	Structure faux plafond	1 jour	Lun 09/03/26	Lun 09/03/26
772	Infralec	Passage de câbles Cfo-Cfa	5 jours	Mar 10/03/26	Lun 16/03/26
773	Agnesina	Pose faux plafond (yc bandes)	10 jours	Lun 16/03/26	Ven 27/03/26
774	Infralec	Accompagnement implantation passage terminaux élec	3 jours	Lun 16/03/26	Mer 18/03/26
775	Lagarde	Prépa support + impression	5 jours	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26
776	Big Bang (SCO	Pose rails au plafond (encastré dans faux-plafond placo)	1 jour	Lun 27/04/26	Lun 27/04/26
777	Infralec	Pose des appareillages CFO/CFA	1 jour	Lun 27/04/26	Lun 27/04/26
778	ATB	Repose du parquet	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
779	Lagarde	Couche de finition peinture	3 jours	Lun 27/04/26	Mer 29/04/26
780		**Scénographie Salle 09**	**76 jours**	**Lun 26/10/26**	**Lun 22/02/27**
781	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S09-01	3 jours	Lun 26/10/26	Mer 28/10/26
782	Axima (SC01)	Intégration MiniClima dans vitrine VI-S09-01	1 jour	Jeu 29/10/26	Jeu 29/10/26
783	Lamparredo (	Pose soclage primaire dans vitrine VI-S09-01	1 jour	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26
784	Boscher (SCO	Pose graphisme (sérigraphie) sur mur de la salle	1 jour	Jeu 12/11/26	Jeu 12/11/26
785	Tactile Studio	Intégration MA-S09-01 (Triptyque) sur mur de la salle	1 jour	Mar 17/11/26	Mar 17/11/26
786	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S09-01	7 jours	Ven 12/02/27	Lun 22/02/27
787	Boscher (SCO	Intégration graphisme (cartels bande velcro) dans vitrine VI-S09-01	1 jour	Lun 22/02/27	Lun 22/02/27
788	Big Bang (SCO	Intégration éclairage (spots sur rails + LED L2/L5) dans vitrine VI-S0	1 jour	Lun 22/02/27	Lun 22/02/27
789	Big Bang (SCO	Intégration spots R-SP1/R-CA2 sur rails	1 jour	Lun 22/02/27	Lun 22/02/27
790		**10.SAS accès chapelle haute - P(R+1)05**	**128 jours**	**Lun 09/03/26**	**Ven 02/10/26**

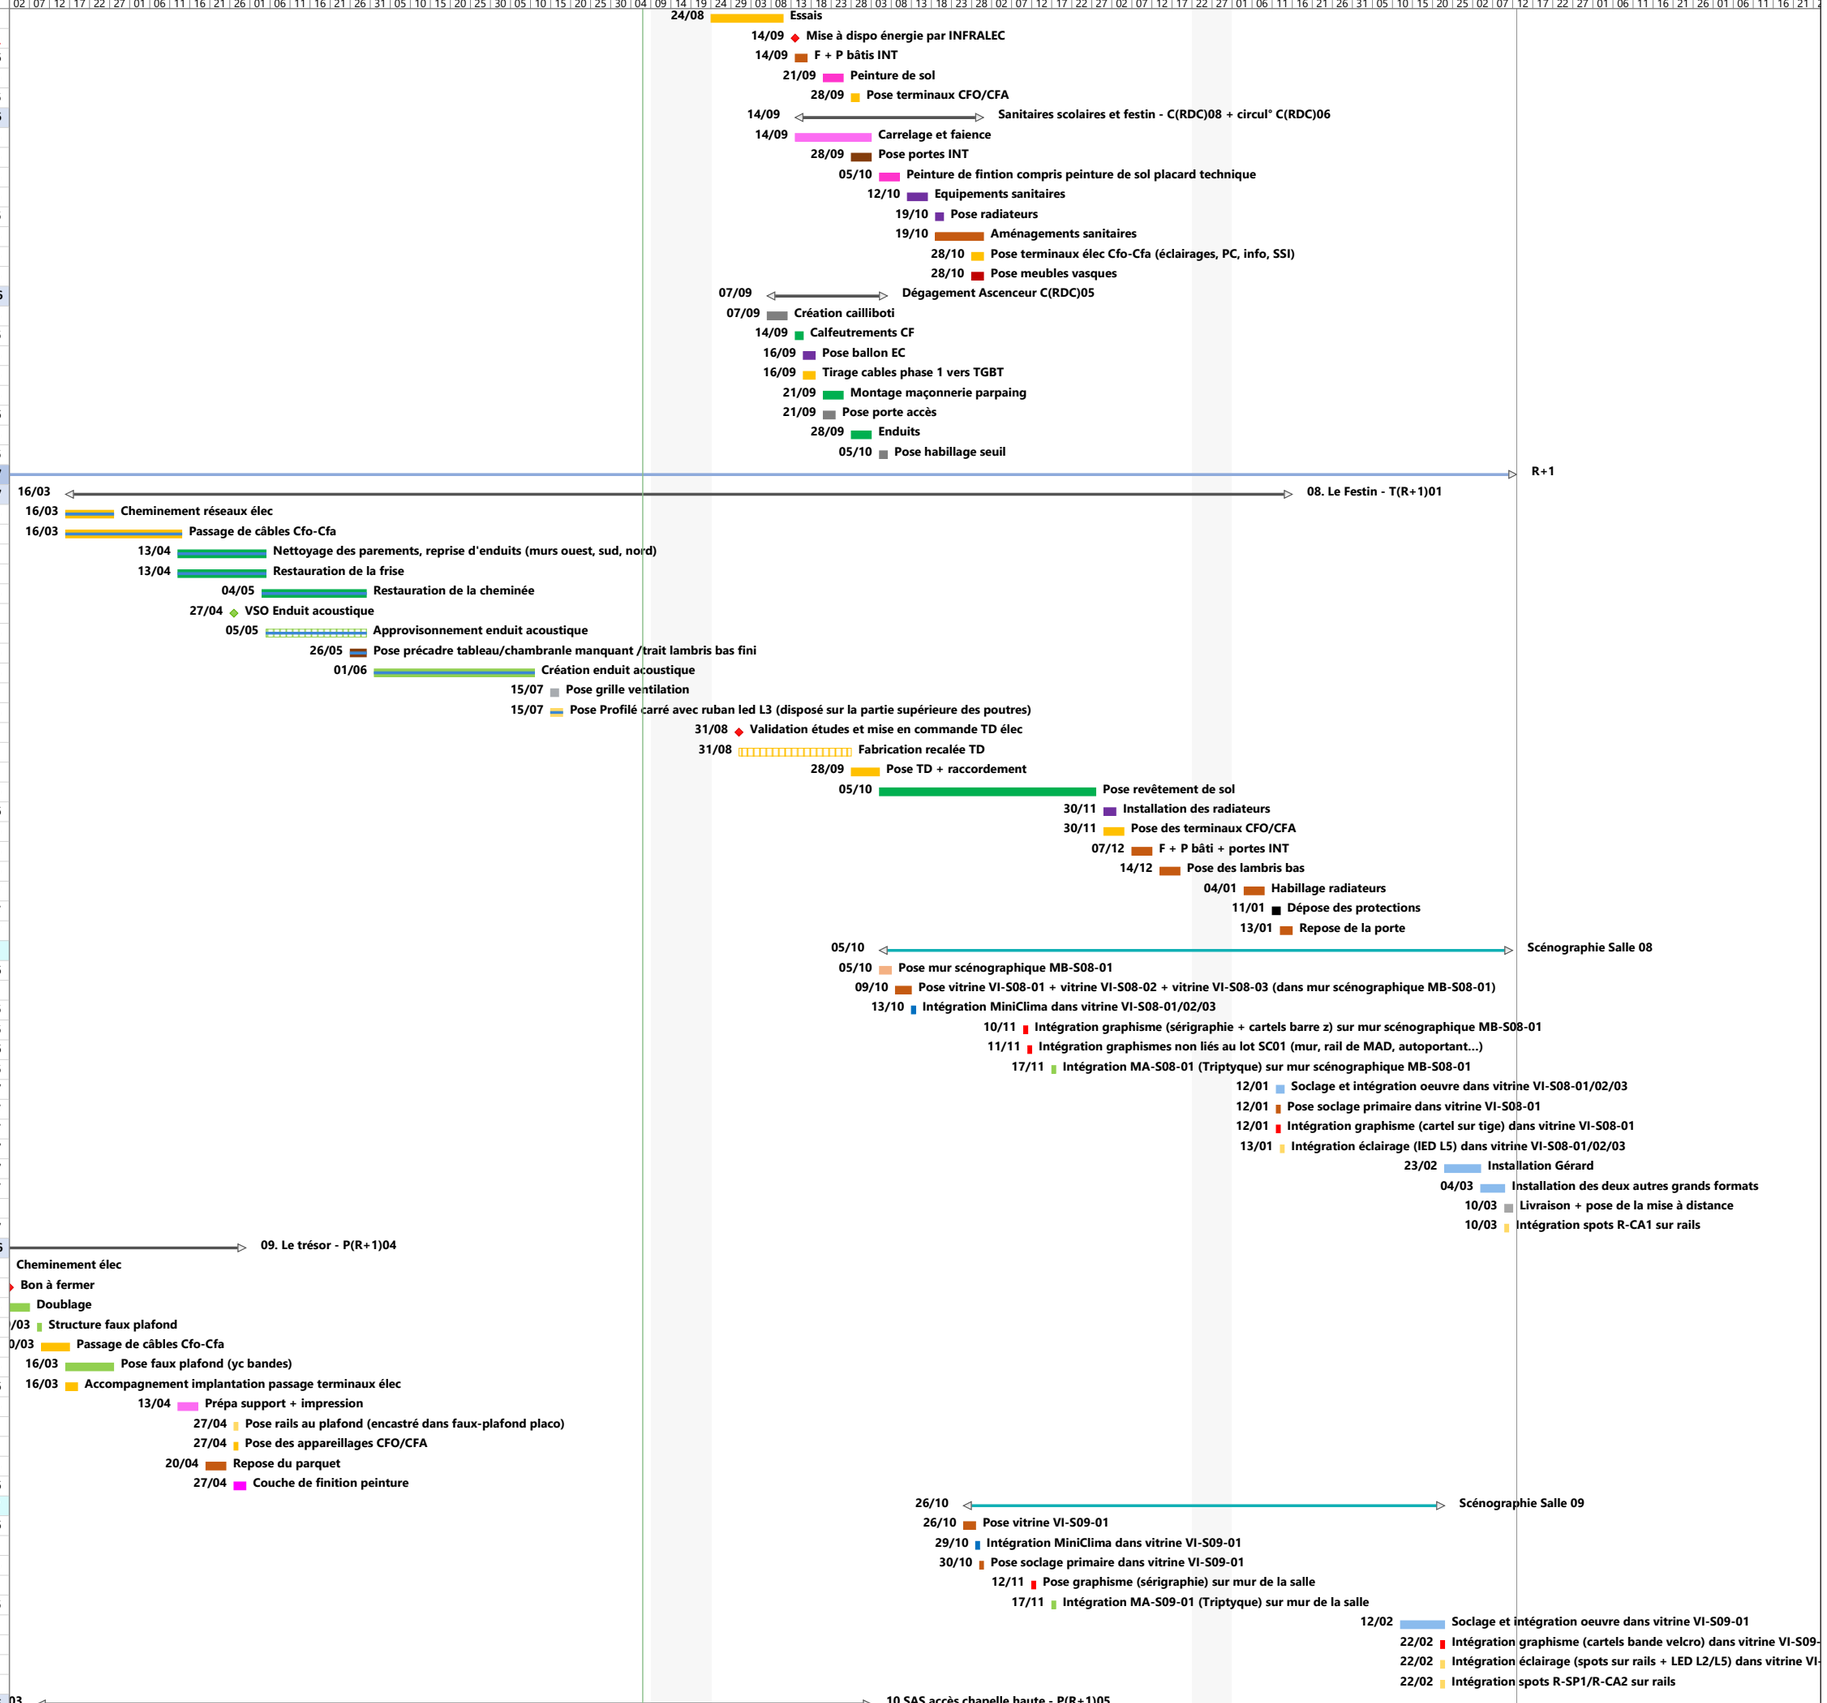

CMN - Palais du Tau

Planning EXE fin de travaux du 06.08.26

N°	Texte1	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
791	ATB	Dépose partielle de la façade menuisée	2 jours	Mar 12/05/26	Mer 13/05/26
792	Infralec	Dépose du TD existant	1 jour	Lun 18/05/26	Lun 18/05/26
793		Validation études et mise en commande TD élec	0 jour	Lun 09/03/26	Lun 09/03/26
794		Fabrication recalée TD	45 jours	Lun 09/03/26	Mer 13/05/26
795	Infralec	Pose TD et raccordements	7 jours	Lun 03/08/26	Lun 31/08/26
796	HChevalier	Restauration décors sculptés/chapiteaux	10 jours	Lun 07/09/26	Ven 18/09/26
797	ATB	Repose de la façade menuisée	5 jours	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
798	SII	Pose de la porte chapelle haute	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
799		**Scénographie Salle 10**	**18 jours**	**Jeu 29/10/26**	**Lun 23/11/26**
800	Lamparredo (	Pose mobilier MB-S10-02 (dans le couloir vers la Chappelle)	1 jour	Jeu 29/10/26	Jeu 29/10/26
801	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S10-01 dans mobilier MB-S10-02	1 jour	Jeu 29/10/26	Jeu 29/10/26
802	Videlio (SC03	Intégration AV-S10-01 dans mobilier MB-S10-02	1 jour	Ven 13/11/26	Ven 13/11/26
803	Boscher (SC0	Intégration graphisme (PLA) sur mobilier MB-S10-02	1 jour	Ven 13/11/26	Ven 13/11/26
804	Big Bang (SC0	Pose éclairage couloir vers la Chapelle	2 jours	Lun 16/11/26	Mar 17/11/26
805	CMN	Insallation/soclage œuvre Creten	4 jours	Mer 18/11/26	Lun 23/11/26
806		**11. Le trésor l'orfèvrerie - P(R+1)06**	**42 jours**	**Lun 16/03/26**	**Mar 19/05/26**
807		Bon à fermer	0 jour	Lun 16/03/26	Lun 16/03/26
808	Agnesina	Pose faux plafond (yc bandes et trappes)	5 jours	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26
809	Delta instal	Accompagnement pose terminaux soufflage	2 jours	Jeu 19/03/26	Ven 20/03/26
810	Infralec	Accompagnement implantation passage terminaux élec	5 jours	Jeu 19/03/26	Mer 25/03/26
811	Lagarde	Prépa support + Peinture 1ere couche	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26
812	ATB	Repose du parquet	5 jours	Lun 27/04/26	Lun 04/05/26
813	Big Bang (SC0	Pose rails au plafond (encastré dans faux-plafond placo)	1 jour	Mar 05/05/26	Mar 05/05/26
814	Infralec	Pose appareillages CFO/CFA	2 jours	Mar 05/05/26	Mer 06/05/26
815	Lagarde	Peinture 2eme couche finition	4 jours	Mar 12/05/26	Mar 19/05/26
816		**Scénographie Salle 11**	**76 jours**	**Ven 30/10/26**	**Ven 26/02/27**
817	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S11-01	3 jours	Ven 30/10/26	Mar 03/11/26
818	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S11-02	3 jours	Mer 04/11/26	Ven 06/11/26
819	Axima (SC01)	Intégration MiniClima dans vitrine VI-S11-01	1 jour	Lun 09/11/26	Lun 09/11/26
820	Axima (SC01)	Intégration MiniClima dans vitrine VI-S11-02	1 jour	Lun 09/11/26	Lun 09/11/26
821	Lamparredo (	Pose cimaise MB-S11-01	3 jours	Lun 09/11/26	Mer 11/11/26
822	Lamparredo (	Pose alcove MB-S11-03 et console MB-S11-02	1 jour	Jeu 12/11/26	Jeu 12/11/26
823	Boscher (SC0	Intégration graphisme (sérigraphie) sur cimaise MB-S11-01	1 jour	Lun 16/11/26	Lun 16/11/26
824	Tactile Studio	Intégration MA-S11-01 (Triptyque) sur cimaise MB-S11-01	1 jour	Mer 18/11/26	Mer 18/11/26
825	Tactile Studio	Intégration MA-S11-02 (Diffuseur d'odeur) sur table MB-S11-02	1 jour	Mer 18/11/26	Mer 18/11/26
826	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S11-01	8 jours	Mar 16/02/27	Jeu 25/02/27
827	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S11-02	8 jours	Mar 16/02/27	Jeu 25/02/27
828	Lamparredo (	Mise à dispo : Pose soclage primaire dans vitrine VI-S11-01	1 jour	Mar 16/02/27	Mar 16/02/27
829	Lamparredo (	Pose soclage primaire dans vitrine VI-S11-02	1 jour	Mar 16/02/27	Mar 16/02/27
830	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels bande velcro) dans vitrine VI-S11-01	1 jour	Jeu 25/02/27	Jeu 25/02/27
831	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels bande velcro) dans vitrine VI-S11-02	1 jour	Jeu 25/02/27	Jeu 25/02/27
832	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (spots sur rails + LED L5) dans vitrine VI-S11-0	1 jour	Jeu 25/02/27	Jeu 25/02/27
833	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (spots sur rails + LED L5) dans vitrine VI-S11-0	1 jour	Jeu 25/02/27	Jeu 25/02/27
834	Big Bang (SC0	Intégration spots R-SP1/R-CA2 sur rails	1 jour	Ven 26/02/27	Ven 26/02/27
835		**12. Le trésor les chefs d'oeuvres - C(R+1)01**	**158 jours**	**Lun 16/03/26**	**Ven 20/11/26**
836		Bon à fermer	0 jour	Lun 16/03/26	Lun 16/03/26
837	Agnesina	Pose faux plafond (yc bandes)	24 jours	Lun 16/03/26	Ven 17/04/26
838	Delta instal	Pose réseau hydrauliques + raccordement CTA 5	3 jours	Lun 30/03/26	Mer 01/04/26
839	Infralec	Pose des machines à brouillard et stroboscope	3 jours	Lun 13/04/26	Mer 15/04/26
840	Lagarde	Prépa support + peinture 1ere couche	5 jours	Lun 27/04/26	Lun 04/05/26
841	Infralec	Pose appareillages CFO/CFA	2 jours	Jeu 30/04/26	Lun 04/05/26
842	Big Bang (SC0	Pose rails au plafond (encastré dans faux-plafond placo)	3 jours	Mar 05/05/26	Jeu 07/05/26
843	Delta instal	Pose des grilles CVC	2 jours	Lun 11/05/26	Mar 12/05/26
844	Lagarde	Finition plafond	7 jours	Mer 13/05/26	Mar 26/05/26
845	Infralec	Pose TD et raccordement	5 jours	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
846	Lamparredo (	Pose socles pour vitrines	1 jour	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26
847	ATB	Reprise parquet selon nouvelle cloison	10 jours	Lun 28/09/26	Ven 09/10/26
848	ATB	Finitions parquet	5 jours	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
849	Lagarde	Finitions peinture murs	5 jours	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26
850	ATB	Pose des batis de portes cpris porte cloison sécurité	3 jours	Lun 02/11/26	Mer 04/11/26
851	Agnesina	Compléments de doublages	3 jours	Jeu 05/11/26	Lun 09/11/26
852	Lagarde	Complément peinture	3 jours	Mar 10/11/26	Jeu 12/11/26
853		**Mise en service et essais CTA 5**	**45 jours**	**Lun 21/09/26**	**Ven 20/11/26**
854	Infralec	MàD alim élec par INFRALEC	0 jour	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26
855	Delta instal	Mise en service, réglages	10 jours	Lun 02/11/26	Ven 13/11/26
856	Delta instal	Essais	5 jours	Lun 16/11/26	Ven 20/11/26
857		**Scénographie Salle 13A**	**135 jours**	**Lun 06/07/26**	**Lun 15/02/27**
858	Lamparredo (	Pose supports tapisserie MB-S12-11	2 jours	Lun 06/07/26	Mar 07/07/26
859	Sequoia (SC0	Pose cloison de division S12/S13A	10 jours	Lun 07/09/26	Ven 18/09/26
860	Videlio (SC03	Passage de câbles pour AV-S13-01 (écran 43" + PC) dans cloison de	1 jour	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26
861	Sequoia (SC0	Pose doublage scénographique MB-S13A-01/02/03/04	5 jours	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
862	Peintre (SC01	Peinture cloison de division S12/S13A (côté salle S12)	3 jours	Lun 28/09/26	Mer 30/09/26
863	Lamparredo (	Pose vitrine VI-S13A01 (intégrée dans cloison de division S12/S13A	2 jours	Mar 20/10/26	Mer 21/10/26
864	Axima (SC01)	Intégration MiniClima dans vitrine VI-S13A-01	1 jour	Jeu 22/10/26	Jeu 22/10/26
865	Videlio (SC03	Intégration AV-S13-01 (écran 43" + PC) dans cloison de division S12	1 jour	Jeu 19/11/26	Jeu 19/11/26
866	Boscher (SC0	Intégration graphisme sur porte paroi anti-effraction et sur mur de	3 jours	Mar 17/11/26	Jeu 19/11/26
867	Boscher (SC0	Intégration graphisme (PLA) sur cloison à côté de l'écran	1 jour	Jeu 19/11/26	Jeu 19/11/26
868	Tactile Studio	Intégration MA-S13-02 (tiroir) dans le support graphique du lot SC0	1 jour	Mer 18/11/26	Mer 18/11/26
869	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S13A-01	1 jour	Lun 15/02/27	Lun 15/02/27
870	Lamparredo (	Pose soclage primaire dans vitrine VI-S13A-01	1 jour	Lun 15/02/27	Lun 15/02/27
871	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels sur tige) dans vitrine VI-S13A-01	1 jour	Lun 15/02/27	Lun 15/02/27
872	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (spots sur rails + LED L5) dans vitrine VI-S13A-	1 jour	Lun 15/02/27	Lun 15/02/27
873		**Scénographie Salle 12**	**76 jours?**	**Ven 13/11/26**	**Ven 12/03/27**
874	Lamparredo (	Pose vitrine Vi-S12-03	3 jours	Ven 13/11/26	Mar 17/11/26
875	Lamparredo (	Pose vitrine Vi-S12-01/02	6 jours	Mer 18/11/26	Mer 25/11/26
876	Axima (SC01)	Intégration MiniClima dans vitrine VI-S12-03	1 jour	Jeu 26/11/26	Jeu 26/11/26

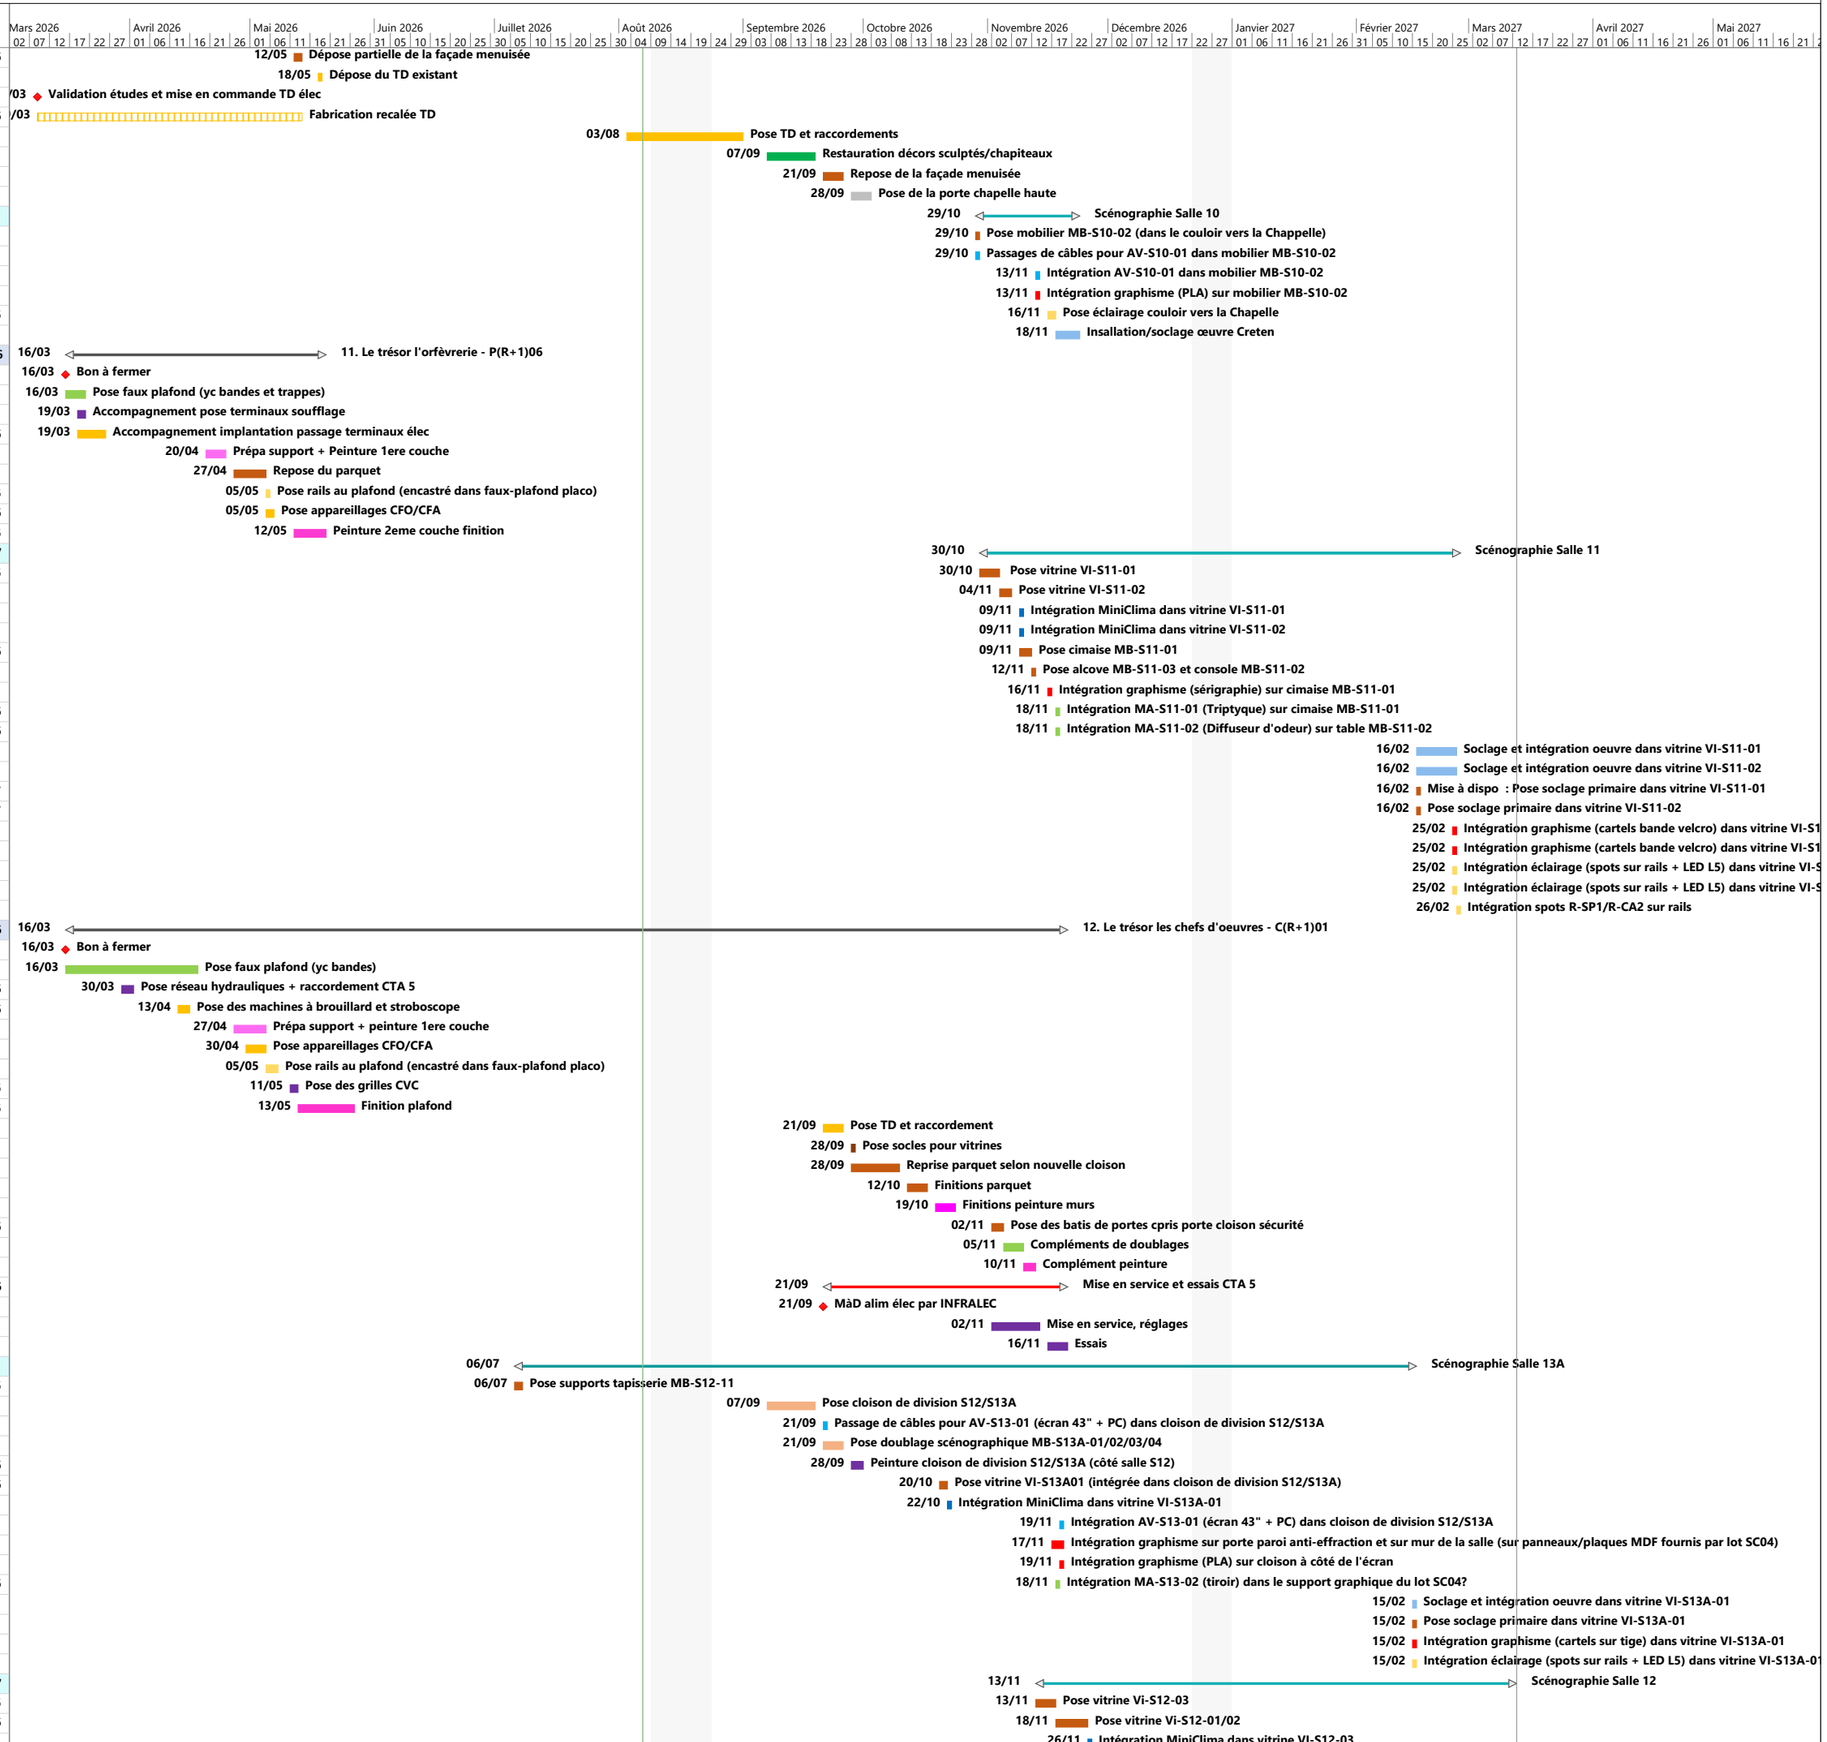

CMN - Palais du Tau

Planning EXE fin de travaux du 06.08.26

N°	Texte1	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
877	Axima (SC01)	Intégration MiniClima dans vitrine VI-S12-01/02	1 jour	Jeu 26/11/26	Jeu 26/11/26
878	Sequoia (SC0	Pose mises à distance MB-S12-02/03	1 jour	Jeu 26/11/26	Jeu 26/11/26
879	Lamparredo (	Pose pupitre MB-S12-12	1 jour	Ven 27/11/26	Ven 27/11/26
880	Lamparredo (	Pose caissons MB-S12-05/06/07	1 jour	Ven 27/11/26	Ven 27/11/26
881	Videlio (SC03	Passages de câbles pour AV-S12-01/02/03 (écrans 15") dans caisso	1 jour	Lun 30/11/26	Lun 30/11/26
882	Videlio (SC03	Intégration AV-S12-01/02/03 (écrans 15") dans caissons MB-S12-05	1 jour	Mar 01/12/26	Mar 01/12/26
883	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels sur tige) sur mise à distance MB-S12	1 jour	Lun 30/11/26	Lun 30/11/26
884	Boscher (SC0	Intégration graphisme (PLA) sur caissons MB-S12-05/06/07	1 jour	Lun 30/11/26	Lun 30/11/26
885	Boscher (SC0	Pose graphisme (sérigraphie) sur mur de la salle	1 jour	Mar 01/12/26	Mar 01/12/26
886	Tactile Studio	Intégration MA-S12-01 (Triptyque) sur mur de la salle	1 jour	Ven 27/11/26	Ven 27/11/26
887	Tactile Studio	Intégration MA-S12-02 (Comparer les reliquaires) sur pupitre MB-S	1 jour	Ven 27/11/26	Ven 27/11/26
888	CMN	Installation des tapisserie	2 jours	Ven 12/02/27	Lun 15/02/27
889	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S12-03	3 jours	Ven 26/02/27	Mar 02/03/27
890	CMN	Pose fantome pour régalage des eclairages	1 jour?	Mar 02/03/27	Mar 02/03/27
891	CMN	Soclage et intégration oeuvre dans vitrine VI-S12-01/02	7 jours	Mar 02/03/27	Mer 10/03/27
892	Lamparredo (	Pose soclage primaire dans vitrine VI-S12-03	1 jour	Ven 26/02/27	Ven 26/02/27
893	Lamparredo (	Pose soclage primaire dans vitrine VI-S12-01/02	1 jour	Mar 02/03/27	Mar 02/03/27
894	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels sur tige) dans vitrine VI-S12-03	1 jour	Mar 02/03/27	Mar 02/03/27
895	Boscher (SC0	Intégration graphisme (cartels sur tige) dans vitrine VI-S12-01/02	1 jour	Mer 10/03/27	Mer 10/03/27
896	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (spots sur rails + LED L5) dans vitrine VI-S12-0	1 jour	Mar 02/03/27	Mar 02/03/27
897	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (spots sur rails + LED L5) dans vitrine VI-S12-0	1 jour	Mer 10/03/27	Mer 10/03/27
898	Big Bang (SC0	Intégration spots R-SP1/R-CA1/R-WW sur rails	2 jours	Jeu 11/03/27	Ven 12/03/27
899		**13. le dernier sacre - C(R+1)02**	**70 jours**	**Lun 16/03/26**	**Lun 29/06/26**
900	Delta instal	Pose plénums CVC	5 jours	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26
901	Agnesina	Faux plafond, trappes cpris bandes	15 jours	Lun 23/03/26	Lun 13/04/26
902	Lagarde	Prépa support + impression	5 jours	Mar 05/05/26	Mar 12/05/26
903	Big Bang (SC0	Pose rails au plafond (encastré dans faux-plafond placo)	2 jours	Mer 13/05/26	Lun 18/05/26
904	Infralec	Pose des appareillages CFO/CFA	2 jours	Mer 13/05/26	Lun 18/05/26
905	ATB	Pose des batis de portes	3 jours	Lun 15/06/26	Mer 17/06/26
906	Agnesina	Compléments de doublages	3 jours	Jeu 18/06/26	Lun 22/06/26
907	Lagarde	Peinture finition	5 jours	Mar 23/06/26	Lun 29/06/26
908		**Scénographie Salle 13**	**143 jours**	**Lun 29/06/26**	**Jeu 18/02/27**
909	Sequoia (SC0	Pose doublage scénographique MB-S13-10	5 jours	Lun 29/06/26	Ven 03/07/26
910	Videlio (SC03	Passage de câbles pour AV-S13-02/03 (3 écrans 55" + 1 écran 19" +	1 jour	Lun 06/07/26	Lun 06/07/26
911	Sequoia (SC0	Pose micro-architecture MB-S13-06	5 jours	Lun 06/07/26	Ven 10/07/26
912	Big Bang (SC0	Passages de câbles pour éclairage (rails + L4 + torchères) sur micro-	2 jours	Mer 15/07/26	Jeu 16/07/26
913	Artiste A. Fon	Décor micro-architecture MB-S13-06	5 jours	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26
914	Sequoia (SC0	Pose banc coffre MB-S13-07	1 jour	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26
915	Sequoia (SC0	Pose banc spécifique MB-S13-12	1 jour	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26
916	Videlio (SC03	Intégration AV-S13-02/03 (3 écrans 55" + 1 écran 19" + équipemen	3 jours	Lun 16/11/26	Mer 18/11/26
917	Tactile Studio	Intégration MA-S13-03 (Triptyque) sur mur de la salle	1 jour	Mer 18/11/26	Mer 18/11/26
918	Boscher (SC0	Intégration graphisme (sérigraphie, cartel barre z) sur micro-archite	1 jour	Mer 02/12/26	Mer 02/12/26
919	Boscher (SC0	Pose graphisme (sérigraphie) sur mur de la salle	1 jour	Jeu 03/12/26	Jeu 03/12/26
920	CMN	Installation de la réplique du fauteuil Charles X	1 jour	Lun 15/02/27	Lun 15/02/27
921	Big Bang (SC0	Intégration éclairage (rails + L4 + torchères) sur micro-architecture	2 jours	Mar 16/02/27	Mer 17/02/27
922	Big Bang (SC0	Intégration spots R-SP1/R-CA1/R-WW sur rails	1 jour	Jeu 18/02/27	Jeu 18/02/27
923		**Circulation/Sanitaires - C(R+1)04, 05**	**84 jours**	**Lun 04/05/26**	**Jeu 24/09/26**
924	Infralec	Pose TD + raccordements	5 jours	Lun 11/05/26	Mar 19/05/26
925	Infralec	Pose des apparreillages CFO/CFA	5 jours	Mer 20/05/26	Mer 27/05/26
926	Delta instal	Livraison + pose CTA 4	5 jours	Lun 04/05/26	Lun 11/05/26
927	Delta instal	Pose réseaux aérauliques + hydrauliques SS2	20 jours	Mar 12/05/26	Jeu 11/06/26
928	Delta instal	Mise en eau + test pression	2 jours	Ven 12/06/26	Lun 15/06/26
929	Delta instal	Calorifuge/Calfeutrement	3 jours	Mar 16/06/26	Jeu 18/06/26
930	XX/Infralec	Bon à fermer faux plafond	0 jour	Jeu 18/06/26	Jeu 18/06/26
931	Agnesina	Pose structure faux plafond	5 jours	Jeu 18/06/26	Mer 24/06/26
932	Agnesina	Pose faux plafond (yc bandes)	5 jours	Lun 03/08/26	Ven 07/08/26
933	Lagarde	Prépa support + Peinture 1ère couche	5 jours	Lun 24/08/26	Jeu 03/09/26
934	Delta instal	Pose des radiateurs	2 jours	Ven 04/09/26	Lun 07/09/26
935	Lagarde	Pose carrelage + faïence	5 jours	Ven 04/09/26	Jeu 10/09/26
936	Lagarde	Finitions 2eme couche	5 jours	Ven 11/09/26	Jeu 17/09/26
937	Delta instal	Installation appareils sanitaires	5 jours	Ven 18/09/26	Jeu 24/09/26
938	Infralec	Pose des terminaux CFO/CFA	5 jours	Ven 18/09/26	Jeu 24/09/26
939		**Logistique de proximité - C(R+1)07/08**	**36 jours**	**Lun 03/08/26**	**Ven 09/10/26**
940	ATB	F + P bâti Ci.107a	1 jour	Lun 03/08/26	Lun 03/08/26
941	Agnesina	Retour doublage sur bâti Ci.107a yc bandes	3 jours	Mar 04/08/26	Jeu 06/08/26
942	Lagarde	Prépa des supports + Peinture 1ère couche	1 jour	Ven 07/08/26	Ven 07/08/26
943	Lagarde	Pose carrelage	16 jours	Lun 24/08/26	Ven 18/09/26
944	Infralec	Pose appareillages CFO/CFA	3 jours	Lun 21/09/26	Mer 23/09/26
945	Delta Instal	Pose terminaux CVC/PLB yc radiateurs et ballon EC	5 jours	Lun 21/09/26	Ven 25/09/26
946	Lagarde	Finitions peinture 2eme couche	5 jours	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
947	Infralec	Pose des terminaux CFO/CFA	5 jours	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
948		**Escalier Robert de Cotte**	**118 jours?**	**Lun 09/03/26**	**Ven 18/09/26**
949	Agnesina	Création faux plafond	10 jours	Lun 09/03/26	Lun 23/03/26
950	Lagarde	Préparation support et impression	3 jours	Lun 23/03/26	Mer 25/03/26
951	Big Bang (SC0	Pose support lustres	2 jours	Jeu 26/03/26	Ven 27/03/26
952	Hchevalier	Création saignées	2 jours	Lun 23/03/26	Mar 24/03/26
953	Infralec	Incorpo élec	3 jours	Mer 25/03/26	Ven 27/03/26
954	Hchevalier	Rebouchage saignées	3 jours	Ven 27/03/26	Mar 31/03/26
955	ATB	Pose des bâtis Ci.103a et Ci.103b	1 jour?	Mer 01/04/26	Mer 01/04/26
956	ATB	Révisions menuiseries et rallongement des câbles	3 jours	Jeu 02/04/26	Mar 07/04/26
957	Lagarde	Peinture finition plafond	3 jours	Lun 11/05/26	Mer 13/05/26
958	Big Bang (SC0	Pose des lustres	2 jours	Lun 18/05/26	Mar 19/05/26
959	Hchevalier	Bouchardage des marches	5 jours	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26
960		**Phase 2 - EXTERIEURES**	**648 jours**	**Mer 24/07/24**	**Ven 12/03/27**

