BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
DBE CENTRE VAL DE LOIRE
110, boulevard de La Salle

45760 BOIGNY-SUR-BIONNE

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 32519473/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 07/07/2026

Référence au programme de travaux :
dossier de plans ADP transmis en date du 10/03/2026 Mail : Demande de devis diagnostic technique amiante avant travaux CAF Indre réalisé le 22/05/2026 par Emilie GARRAULT

DONNEUR D'ORDRE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Emilie GARRAULT
193 AVENUE DE LA CHATRE
36009 CHATEAUROUX CEDEX

SITE D'INTERVENTION

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

193 AVENUE DE LA CHATRE
36000 CHATEAUROUX

Code site : F36A001A

Latitude : 46.804800 / Longitude : 1.713300

Date(s) d'intervention(s) :
Le 15/06/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Sébastien Garban	Chargé d'Affaires	Certification N° 13738397	Sébastien Garban
Charley PILLON	Diagnostiqueur	Certification N° 19-1988	

Le présent rapport comporte 63 pages, dont 40 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION 3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 6

2. CONCLUSIONS 7
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 7
2.2. Remarque(s) complémentaire(s) 7
2.3. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre 8
2.4. Obligations réglementaires 9

3. INFORMATIONS GENERALES 10
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 10
3.2. Parties prenantes 10


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE 10
4.1. Références réglementaires 10

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 11
5.1. Date(s) de visite(s) 11
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 11
5.3. Conditions spécifiques 11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 11

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 12
6.1. Matériaux et produits repérés 12
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 23

7. ANNEXES 24
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 24
7.2. Photos prélèvements 29
7.3. Photos sondages 35
7.4. Photos inaccessibilités 36
7.5. Attestation d'assurance 37
7.6. Certificat de compétence 39
7.7. Croquis de repérage 40
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire 46

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

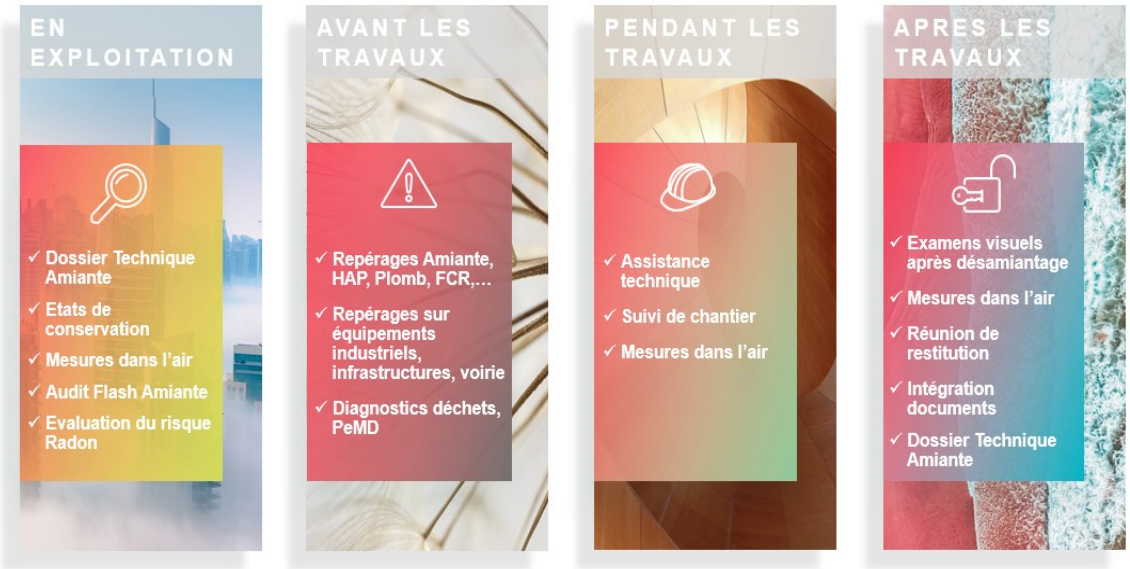

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Descriptif des travaux : RENOVATION ENERGETIQUE DU SIEGE SOCIAL Suivant dossier de plans ADP transmis en date du 10/03/2026 En toiture : Pose d'un polycarbonate en sous face de l'ouvrant du skydome pour gérer la thermique En R+2 : Ventilation double flux Remplacement des faux plafonds des couloirs qui n'ont pas encore été remplacés Remplacement des faux plafonds des bureaux qui n'ont pas encore été remplacés Ventilation simple flux compris remplacement des faux-plafonds des sanitaires, salles des commissions et conseil d'administration Suppression des murs mobiles Clapet CF à créer ou remplacer dans cage d'escaliers En R+1 : VENTILATION DOUBLE FLUX remplacement systématique des faux plafonds des couloirs remplacements des faux plafonds des bureaux qui n'ont pas encore été remplacés 2 VENTILATION SIMPLE FLUX compris remplacement des faux-plafonds Clapet CF à créer ou remplacer dans cage d'escaliers RDC : VENTILATION DOUBLE FLUX remplacement systématique des faux plafonds des couloirs remplacements des faux plafonds des bureaux qui n'ont pas encore été remplacés CHAUFFAGE Création d'un circuit de chauffage indépendant pour cette zone VENTILATION SIMPLE FLUX compris remplacement des faux-plafonds MENUISERIES EXTERIEURES SAS Remplacement des 2 menuiseries extérieures existantes du SAS et Accueil encore en simple vitrage et dormant bois capotés alu. Occultations neuves à prévoir sur les 2 ensembles neufs Plafond SAS Remplacement du plafond du SAS en lames métalliques suite à la dépose de l'ensemble fixe de menuiserie remplacée. Luminaires remplacés Clapet CF à créer ou remplacer dans cage d'escaliers Sous-sol : ISOLATION Parking remplacement de l'isolant en sous du plancher haut très dégradé ARCHIVES regroupement de l'ensemble des archives dans un seul local VENTILATION SIMPLE FLUX compris remplacement des faux-plafonds CHAUFFERIE mise aux normes création d'un SAS suppression de la cloison existante suppression des éléments du groupe de ventilation PASSAGE GAINES création trémie pour passage gaines 180x180 cm Côté "chaufferie" les gaines seront englobées dans un ouvrage en Promat posé sur des cadres métalliques fixés au sol VENTILATION création d'un local spécifique dans les archives actuelles porte à remplacer trous de ventilation dans mur à boucher

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs
Plinthes	Peintures plinthes
Portes	Peintures
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs portes, Joints bandes portes, Joints portes, Joints tresses portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits projetés charpente, Enduits projetés/talochés charpente, Flocages charpente, Joints charpentes, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures charpente, Peintures intumescentes charpente, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions entre panneaux, Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds
Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres, Enduits projetés poutres, Enduits projetés/talochés poutres, Entourages de poutres, Flocages poutres, Joints poutres, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures poutres, Revêtements bitumineux poutres
Suspentes et contrevents	Flocages suspentes, Peintures suspentes, Projections en plâtre suspentes

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints cantonnement planchers, Joints carrelage, Joints dilatation/assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures sol, Plaques fibrociment sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous couche moquette, Sous-couches revêtements souples

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.
Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
11	CAF 36 -> RDC -> 003 Accueil Public	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Caoutchouc, Silicone	Noir

2.2. Remarque(s) complémentaire(s)

Les résultats des 2 prélèvements composant la ZPSO 11 (mastic intérieur de la baie vitrée du RDC) sont divergeant. On retrouve dans l'échantillon positif un "matériau de type maillage de fibres et liant (beige)" non présent dans l'échantillon négatif en plus du Matériau de type mousse (noir) présent dans les 2. (Voir PV Laboratoire en annexe). Cela reste non conforme à la norme NFX 46-020 mais des analyses complémentaires n'ayant que peu d'intérêt au vu de la nature même du matériau, et étant dans l'incapacité de définir une nouvelle ZPSO, l'ensemble de la ZPSO 11 est déclarée amiantée.

2.3. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
CAF 36 -> RDC (IA 1)	2- Parois verticales extérieures et façades	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4
CAF 36 -> Toiture (IA 2)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	Investigations destructives sur étanchéité requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire intervenir un étancheur qualifié pour rebouchage des investigations destructives

2.4. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
193 AVENUE DE LA CHATRE
36000 CHATEAUROUX

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	Administrations, bureaux	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Emilie GARRAULT	Donneur d'ordre	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	193 AVENUE DE LA CHATRE 36009 CHATEAUROUX CEDEX	/
Emilie GARRAULT	Accompagnateur	Caisse d'Allocations Familiales de l'Indre	/	/
Caisse d'Allocations Familiales de l'Indre	Propriétaire	/	/	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 15/06/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / dossier de plans ADP transmis en date du 10/03/2026	Emilie GARRAULT	22/05/2026	Mail : Demande de devis diagnostic technique amiante avant travaux CAF Indre	/
Plans / RENOVATION ENERGETIQUE DU SIEGE SOCIAL (5 niveaux)	Lab'O 52	10/03/2026	APD	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CAF 36 -> Sous-Sol -> 013 Chaufferie	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Ciment	Gris	3	P5* N	/	AN	Plafond béton brut	Non
	Faux plafonds	Isolants	Fibreux	Gris, Marron	4	P6* N	/	AN	Fibralith et colle	Non
	Faux plafonds	Jonctions faux plafond/structure	/	/	4	P6* N	/	AN	Fibralith et colle	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	7	P13* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures sol	/	Gris	7	P13* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	7	P14 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CAF 36 -> Sous-Sol -> 013 Chaufferie	Revêtements de sol	Peintures sol	/	Gris	7	P14 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	5	P7* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	5	P8 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	/	6	P11* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	/	6	P12 N	/	AN	/	Non
CAF 36 -> Sous-Sol -> 014 Archives	Faux plafonds	Isolants	Fibreux	Gris, Marron	4	P9 N	/	AN	Fibralith et colle	Non
	Faux plafonds	Jonctions faux plafond/structure	/	/	4	P9 N	/	AN	Fibralith et colle	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Ciment	Gris	3	P10 N	/	AN	Plafond béton brut	Non
CAF 36 -> Sous-Sol -> 016 Parking	Faux plafonds	Isolants	Fibreux	Gris, Marron	4	P15 N	/	AN	Fibralith et colle	Non
	Faux plafonds	Jonctions faux plafond/structure	/	/	4	P15 N	/	AN	Fibralith et colle	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Ciment	Gris	3	P16 N	/	AN	Plafond béton brut	Non
CAF 36 -> Sous-Sol -> 021 Sanitaires	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	P1* N	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	P1* N	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CAF 36 -> Sous-Sol -> 021 Sanitaires	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment, Peint	Beige	2	P2* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	Beige	2	P2* N	/	AN	/	Non
CAF 36 -> Sous-Sol -> 023 Archives	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Ciment	Gris	3	P4 N	/	AN	Plafond béton brut	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment, Peint	Beige	2	P3 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	Beige	2	P3 N	/	AN	/	Non
CAF 36 -> RDC	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	12	P24* N	/	AN	Joints extérieurs	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	12	P25 N	/	AN	Joints extérieurs	Non
CAF 36 -> RDC -> 003 Accueil Public	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Caoutchouc, Silicone	Noir	11	P22* P	/	AN	Mastic Intérieur	***Oui***
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Foncé, Gris	8	P17* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	8	P17* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	8	P17* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Foncé, Gris	8	P18 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	8	P18 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	8	P18 N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CAF 36 -> RDC -> 003 Accueil Public	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Caoutchouc, Silicone	Noir	11 (i)	P23 N	/	AN	Mastic Intérieur	*Oui*
CAF 36 -> RDC -> 008 WC PMR	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment, Peint	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
CAF 36 -> RDC -> 009 WC	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment, Peint	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
CAF 36 -> RDC -> 010 WC F	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CAF 36 -> RDC -> 015 DGT Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	Blanc	10	/	S5	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	Blanc	10	/	S6	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	Blanc	10	P21* N	/	AN	/	Non
CAF 36 -> RDC -> 018 Local Elec	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment, Peint	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
CAF 36 -> RDC -> 021 WC F	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment, Peint	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
CAF 36 -> RDC -> 017 WC H	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment, Peint	Beige	2	P19 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	Beige	2	P19 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	/	9	P20* N	/	AN	/	Non
CAF 36 -> RDC -> Escalier Principal	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	5	Idem P 7	/	AN	/	Non
CAF 36 -> RDC -> Escalier de secours	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	5	Idem P 7	/	AN	/	Non
CAF 36 -> R+1 -> 001 Escalier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	5	Idem P 7	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CAF 36 -> R+1 -> 003 DGT Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	Blanc	10	/	S1	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	Blanc	10	/	S2	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	Blanc	10	/	S3	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	Blanc	10	/	S4	AN	/	Non
CAF 36 -> R+1 -> 006 Bureau	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+1 -> 007 Bureau	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+1 -> 008 Serv. Social Perso	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	P31* N	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+1 -> 009 Bureau	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+1 -> 010 Cons. Territoriales	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+1 -> 011 Contrôleurs	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+1 -> 012 Informatique	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+1 -> 014 Escalier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	5	Idem P 7	/	AN	/	Non
CAF 36 -> R+1 -> 015 Fondé de Pouvoir	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CAF 36 -> R+1 -> 016 Comptabilité	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+1 -> 017 S. Admin. AS	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+1 -> 018 Resp. Action Sosiale	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+1 -> 019 Archives	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment, Peint	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
CAF 36 -> R+1 -> 021 Vestiaire	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	/	S8	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	/	S8	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment, Peint	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
CAF 36 -> R+1 -> 022 WC H	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	P26 N	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	P26 N	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment, Peint	Beige	2	P27 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CAF 36 -> R+1 -> 022 WC H	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	Beige	2	P27 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Mortier	/	9	P28 N	/	AN	/	Non
CAF 36 -> R+1 -> 023 Ménage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	/	13	P29* N	/	AN	Enduit plâtre	Non
CAF 36 -> R+1 -> 025 Local Elec	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Plâtre	/	13	P30 N	/	AN	Enduit plâtre	Non
CAF 36 -> R+1 -> 026 WC F	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment, Peint	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
CAF 36 -> R+1 -> 027 Vestiaires	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	/	S7	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	/	S7	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissage/ragréage murs	Ciment, Peint	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	Beige	2	Idem P 2	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CAF 36 -> R+2 -> 001 Escalier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	5	/	S12	AN	/	Non
CAF 36 -> R+2 -> 003 DGT Circulation	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Ciment	Gris	3	P34 N	/	AN	Plafond béton brut	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	Blanc	10	/	S9	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Granuleux	Blanc	10	/	S10	AN	/	Non
CAF 36 -> R+2 -> 006 Président	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+2 -> 007 RGT	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
CAF 36 -> R+2 -> 008 Conseil Admin.	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+2 -> 009 Salle des Commissions	Revêtements de sol	Moquettes	/	/	16	P32* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	16	P32* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	16	P32* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	/	/	16	P33 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	16	P33 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	16	P33 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CAF 36 -> R+2 -> 009 Salle des Commissions	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+2 -> 010 Directeur	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+2 -> 012 Escalier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	5	/	S11	AN	/	Non
CAF 36 -> R+2 -> 017 Satndard Courrier	Faux plafonds	Panneaux	Métallique	/	14	Idem P 31	/	AN	FP métallique blanc	Non
CAF 36 -> R+2 -> 018 RGT	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
CAF 36 -> R+2 -> 019 WC	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
CAF 36 -> R+2 -> 020 Dir. Adjoint	Faux plafonds	Panneaux	/	/	15	/	/	MA	Armstrong	Non
CAF 36 -> R+2 -> 021 Secrétariat Direction	Faux plafonds	Panneaux	/	/	15	/	/	MA	Armstrong	Non
CAF 36 -> R+2 -> 025 Vestiaire	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CAF 36 -> R+2 -> 025 Vestiaire	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
CAF 36 -> R+2 -> 027 WC H	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
CAF 36 -> R+2 -> 031 WC F	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
CAF 36 -> R+2 -> 032 Local	Faux plafonds	Plaques	Métallique	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non
	Suspentes et contrevents	Peintures suspentes	Décoratif	/	1	Idem P 1	/	AN	Faux Plafond Métallique de type Luxalon	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
11	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	12 ml

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
CAF 36	/
CAF 36 -> Sous-Sol	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 001 Porche	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 001 Porche	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 002 DGT	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 003 DGT	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 004 Sas	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 005 Reprographie	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 006 NA	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 007 Local 2	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 008 Parking	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 009 Local Tech.	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 010 Archives	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 011 RGT	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 012 RGT	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 013 Chaufferie	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 014 Archives	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 015 Parking	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 016 Parking	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 017 Stockage	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 018 Service Entretien	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 019 DGT	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 020 Escalier	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
CAF 36 -> Sous-Sol -> 021 Sanitaires	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 022 Sas	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 023 Archives	/
CAF 36 -> Sous-Sol -> 024 Local Elec	/
CAF 36 -> RDC	/
CAF 36 -> RDC -> 001 Porche	/
CAF 36 -> RDC -> 002 Sas	/
CAF 36 -> RDC -> 003 Accueil Public	/
CAF 36 -> RDC -> 004 Box 2	/
CAF 36 -> RDC -> 005 Box 3	/
CAF 36 -> RDC -> 006 Box 4	/
CAF 36 -> RDC -> 007 Box 5	/
CAF 36 -> RDC -> 008 WC PMR	/
CAF 36 -> RDC -> 009 WC	/
CAF 36 -> RDC -> 010 WC F	/
CAF 36 -> RDC -> 013 Box 1	/
CAF 36 -> RDC -> 014 Bureau	/
CAF 36 -> RDC -> 015 DGT Circulation	/
CAF 36 -> RDC -> 016 RGT	/
CAF 36 -> RDC -> 017 Local Ménage	/
CAF 36 -> RDC -> 018 Local Elec	/
CAF 36 -> RDC -> 021 WC F	/
CAF 36 -> RDC -> 022 Resp. Presta	/
CAF 36 -> RDC -> 024 Téléphone	/
CAF 36 -> RDC -> 025 Informatique	/
CAF 36 -> RDC -> 029 Bureaux	/
CAF 36 -> RDC -> 030 Infirmerie	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
CAF 36 -> RDC -> 031 DGT Circulation	/
CAF 36 -> RDC -> 032 Cafétéria	/
CAF 36 -> RDC -> 033 Local CE	/
CAF 36 -> RDC -> 034 Réunion	/
CAF 36 -> RDC -> 035 Salle Repas	/
CAF 36 -> RDC -> 036 Bureau	/
CAF 36 -> RDC -> 037 Bureaux	/
CAF 36 -> RDC -> 017 WC H	/
CAF 36 -> RDC -> Escalier Principal	/
CAF 36 -> RDC -> Escalier de secours	/
CAF 36 -> R+1	/
CAF 36 -> R+1 -> 001 Escalier	/
CAF 36 -> R+1 -> 002 DGT Palier	/
CAF 36 -> R+1 -> 003 DGT Circulation	/
CAF 36 -> R+1 -> 004 Resp. Adj AS	/
CAF 36 -> R+1 -> 006 Bureau	/
CAF 36 -> R+1 -> 007 Bureau	/
CAF 36 -> R+1 -> 008 Serv. Social Perso	/
CAF 36 -> R+1 -> 009 Bureau	/
CAF 36 -> R+1 -> 010 Cons. Territoriales	/
CAF 36 -> R+1 -> 011 Contrôleurs	/
CAF 36 -> R+1 -> 012 Informatique	/
CAF 36 -> R+1 -> 013 DGT	/
CAF 36 -> R+1 -> 014 Escalier	/
CAF 36 -> R+1 -> 015 Fondé de Pouvoir	/
CAF 36 -> R+1 -> 016 Comptabilité	/
CAF 36 -> R+1 -> 017 S. Admin. AS	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
CAF 36 -> R+1 -> 018 Resp. Action Sosiale	/
CAF 36 -> R+1 -> 019 Archives	/
CAF 36 -> R+1 -> 020 Gaine Tech.	/
CAF 36 -> R+1 -> 021 Vestiaire	/
CAF 36 -> R+1 -> 022 WC H	/
CAF 36 -> R+1 -> 023 Ménage	/
CAF 36 -> R+1 -> 024 Ascenseur	/
CAF 36 -> R+1 -> 025 Local Elec	/
CAF 36 -> R+1 -> 026 WC F	/
CAF 36 -> R+1 -> 027 Vestiaires	/
CAF 36 -> R+1 -> 028 Terrasse	/
CAF 36 -> R+2	/
CAF 36 -> R+2 -> 001 Escalier	/
CAF 36 -> R+2 -> 002 DGT Palier	/
CAF 36 -> R+2 -> 003 DGT Circulation	/
CAF 36 -> R+2 -> 004 Salle de Formation	/
CAF 36 -> R+2 -> 005 Agent Comptable	/
CAF 36 -> R+2 -> 006 Président	/
CAF 36 -> R+2 -> 007 RGT	/
CAF 36 -> R+2 -> 008 Conseil Admin.	/
CAF 36 -> R+2 -> 009 Salle des Commissions	/
CAF 36 -> R+2 -> 010 Directeur	/
CAF 36 -> R+2 -> 011 DGT Palier	/
CAF 36 -> R+2 -> 012 Escalier	/
CAF 36 -> R+2 -> 013 Resp. Fonc. Ressources	/
CAF 36 -> R+2 -> 014 Adm. Générale	/
CAF 36 -> R+2 -> 015 GRH	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
CAF 36 -> R+2 -> 016 Bureau	/
CAF 36 -> R+2 -> 017 Satndard Courrier	/
CAF 36 -> R+2 -> 018 RGT	/
CAF 36 -> R+2 -> 019 WC	/
CAF 36 -> R+2 -> 020 Dir. Adjoint	/
CAF 36 -> R+2 -> 021 Secrétariat Direction	/
CAF 36 -> R+2 -> 022 DGT	/
CAF 36 -> R+2 -> 023 Archives	/
CAF 36 -> R+2 -> 024 Archive S. Gen.	/
CAF 36 -> R+2 -> 025 Vestiaire	/
CAF 36 -> R+2 -> 026 Gaine Tech.	/
CAF 36 -> R+2 -> 027 WC H	/
CAF 36 -> R+2 -> 028 Ménage	/
CAF 36 -> R+2 -> 029 Ascenseur	/
CAF 36 -> R+2 -> 030 Local Elec	/
CAF 36 -> R+2 -> 031 WC F	/
CAF 36 -> R+2 -> 032 Local	/
CAF 36 -> Toiture	/
CAF 36 -> Toiture -> 001 Terrasse	/
CAF 36 -> Toiture -> 002 Gaine Tech.	/
CAF 36 -> Toiture -> 003 Gaine Tech.	/
CAF 36 -> Extérieur	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
CAF 36 -> Sous-Sol -> 021 Sanitaires	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A) | Peintures suspentes	

P2	ZPSO 2
CAF 36 -> Sous-Sol -> 021 Sanitaires	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs | Peinture murs	

P3	ZPSO 2
CAF 36 -> Sous-Sol -> 023 Archives	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs | Peinture murs	

P4	ZPSO 3
CAF 36 -> Sous-Sol -> 023 Archives	
	
Plafonds -> Enduits lissage/ragréage plafonds	

P5	ZPSO 3
CAF 36 -> Sous-Sol -> 013 Chaufferie	
	
Plafonds -> Enduits lissage/ragréage plafonds	

P6	ZPSO 4
CAF 36 -> Sous-Sol -> 013 Chaufferie	
	
Faux plafonds -> Isolants | Jonctions faux plafond/structure	

P7	ZPSO 5
CAF 36 -> Sous-Sol -> 013 Chaufferie	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales	

P8	ZPSO 5
CAF 36 -> Sous-Sol -> 013 Chaufferie	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales	

P9	ZPSO 4
CAF 36 -> Sous-Sol -> 014 Archives	
	
Faux plafonds -> Isolants | Jonctions faux plafond/structure	

P10	ZPSO 3
CAF 36 -> Sous-Sol -> 014 Archives	
	
Plafonds -> Enduits lissage/ragréage plafonds	

P11	ZPSO 6
CAF 36 -> Sous-Sol -> 013 Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs	

P12	ZPSO 6
CAF 36 -> Sous-Sol -> 013 Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs	

P13	ZPSO 7

CAF 36 -> Sous-Sol -> 013 Chaufferie



Revêtements de sol -> Ragréages | Peintures sol

P14	ZPSO 7

CAF 36 -> Sous-Sol -> 013 Chaufferie



Revêtements de sol -> Ragréages | Peintures sol

P15	ZPSO 4

CAF 36 -> Sous-Sol -> 016 Parking



Faux plafonds -> Isolants | Jonctions faux plafond/structure

P16	ZPSO 3

CAF 36 -> Sous-Sol -> 016 Parking



Plafonds -> Enduits lissage/ragréage plafonds

P17	ZPSO 8

CAF 36 -> RDC -> 003 Accueil Public




Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

P18	ZPSO 8

CAF 36 -> RDC -> 003 Accueil Public




Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses | Ragréages

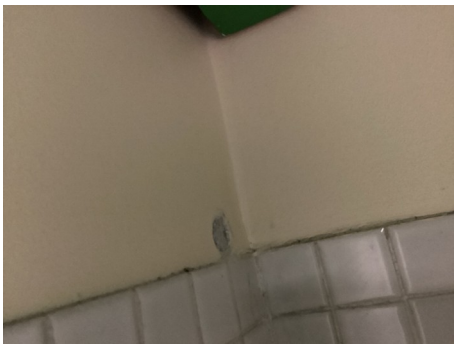P19	ZPSO 2
CAF 36 -> RDC -> 017 WC H	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs | Peinture murs	

P20	ZPSO 9
CAF 36 -> RDC -> 017 WC H	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	


P21	ZPSO 10
CAF 36 -> RDC -> 015 DGT Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

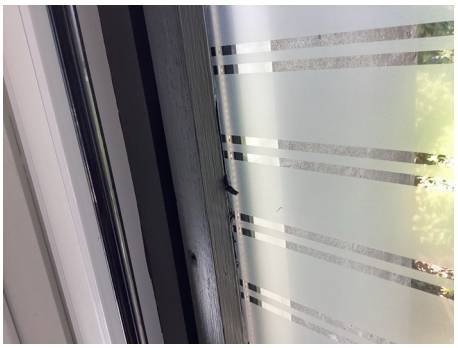P22	ZPSO 11
CAF 36 -> RDC -> 003 Accueil Public	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P23	ZPSO 11
CAF 36 -> RDC -> 003 Accueil Public	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P24	ZPSO 12
CAF 36 -> RDC	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P25	ZPSO 12
CAF 36 -> RDC	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

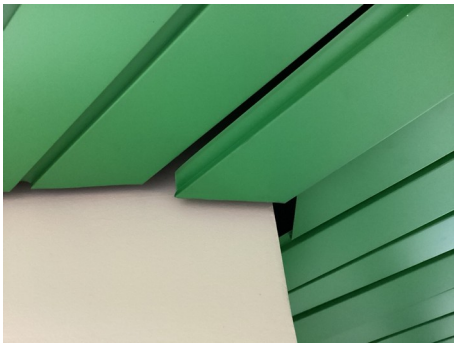P26	ZPSO 1
CAF 36 -> R+1 -> 022 WC H	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A) | Peintures suspentes	

P27	ZPSO 2
CAF 36 -> R+1 -> 022 WC H	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs | Peinture murs	

P28	ZPSO 9
CAF 36 -> R+1 -> 022 WC H	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P29	ZPSO 13
CAF 36 -> R+1 -> 023 Ménage	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs	

P30	ZPSO 13
CAF 36 -> R+1 -> 025 Local Elec	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissage/ragréage murs	

P31	ZPSO 14
CAF 36 -> R+1 -> 008 Serv. Social Perso	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P32	ZPSO 16
CAF 36 -> R+2 -> 009 Salle des Commissions	
	
Revêtements de sol -> Moquettes | Colles non bitumineuses | Ragréages	

P33	ZPSO 16
CAF 36 -> R+2 -> 009 Salle des Commissions	
	
Revêtements de sol -> Moquettes | Colles non bitumineuses | Ragréages	

P34	ZPSO 3
CAF 36 -> R+2 -> 003 DGT Circulation	
	
Plafonds -> Enduits lissage/ragréage plafonds	

7.3. Photos sondages

S7	ZPSO 1
CAF 36 -> R+1 -> 027 Vestiaires	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A) | Peintures suspentes	

S8	ZPSO 1
CAF 36 -> R+1 -> 021 Vestiaire	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A) | Peintures suspentes	

S9	ZPSO 10
CAF 36 -> R+2 -> 003 DGT Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

S10	ZPSO 10
CAF 36 -> R+2 -> 003 DGT Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

7.4. Photos inaccessibilités

Investigation(s) approfondie(s) à réaliser avant les travaux

CAF 36 -> RDC	IA 1
2- Parois verticales extérieures et façades	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4

CAF 36 -> Toiture	IA 2
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Investigations destructives sur étanchéité requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux : Faire intervenir un étancheur qualifié pour rebouchage des investigations destructives

7.5. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat attribué à

Sébastien GARBAN

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	28/07/2023	27/07/2030
Gaz	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	26/09/2023	25/09/2030
Électricité	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	05/12/2023	04/12/2030
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date : 31/03/2026
Numéro du certificat : **13738397**

Samuel DUPRIEU - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

7.7. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 193 AVENUE DE LA CHATRE 36000 CHATEAUROUX	
Localisation CAF 36 > Sous-Sol	Date visite	Le 15/06/2026
	Auteur	Sébastien Garban
	N° dossier	32519473/S1/1
	Planche	1 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

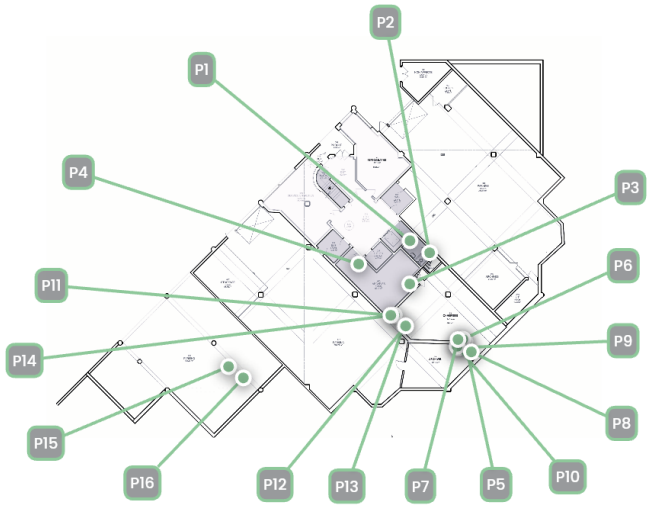

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 193 AVENUE DE LA CHATRE 36000 CHATEAUROUX	
Localisation CAF 36 > RDC	Date visite	Le 15/06/2026
	Auteur	Sébastien Garban
	N° dossier	32519473/S1/1
	Planche	2 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

--- Mastic de vitrage

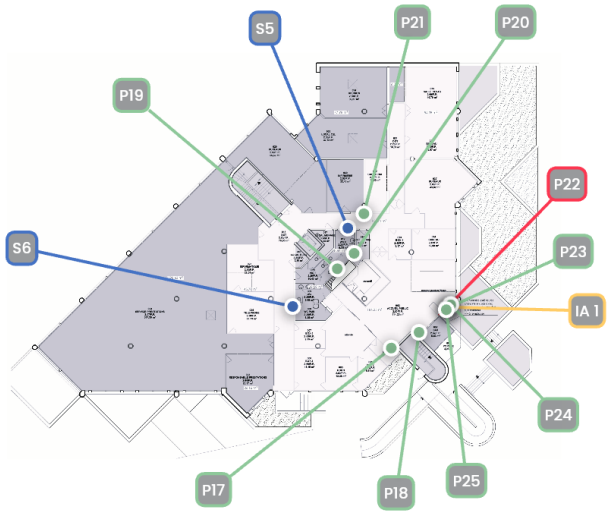

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 193 AVENUE DE LA CHATRE 36000 CHATEAUROUX	
Localisation CAF 36 > R+1	Date visite	Le 15/06/2026
	Auteur	Sébastien Garban
	N° dossier	32519473/S1/1
	Planche	3 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

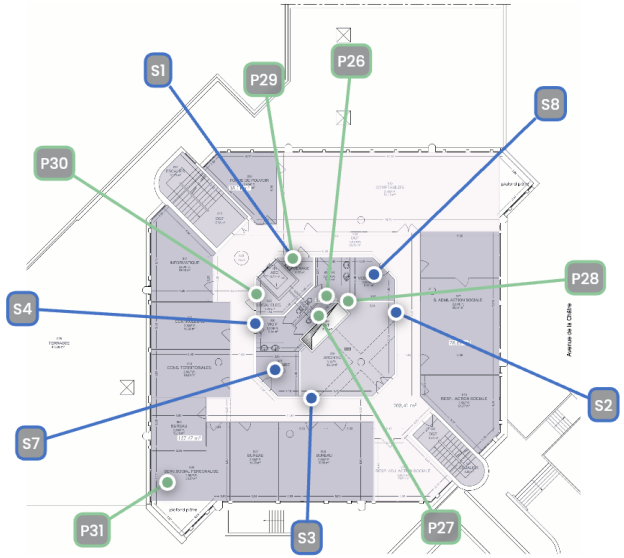

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 193 AVENUE DE LA CHATRE 36000 CHATEAUROUX	
Localisation CAF 36 > R+2	Date visite	Le 15/06/2026
	Auteur	Sébastien Garban
	N° dossier	32519473/S1/1
	Planche	4 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

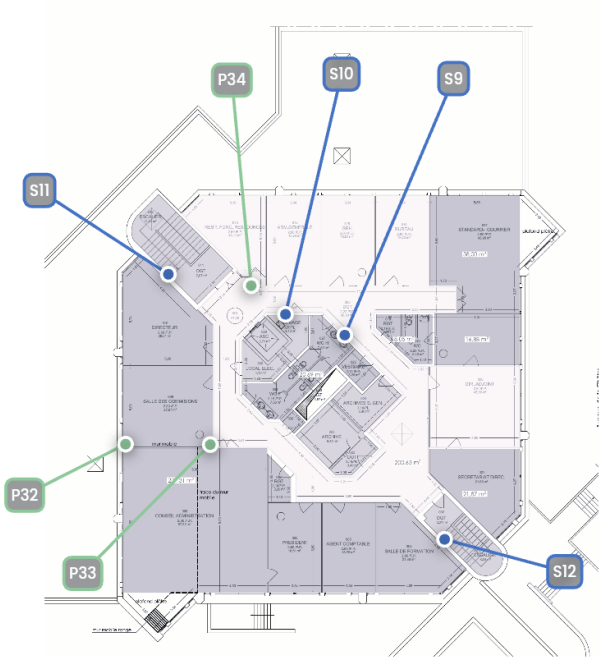

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 193 AVENUE DE LA CHATRE 36000 CHATEAUROUX	
Localisation CAF 36 > Toiture	Date visite	Le 15/06/2026
	Auteur	Sébastien Garban
	N° dossier	32519473/S1/1
	Planche	5 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

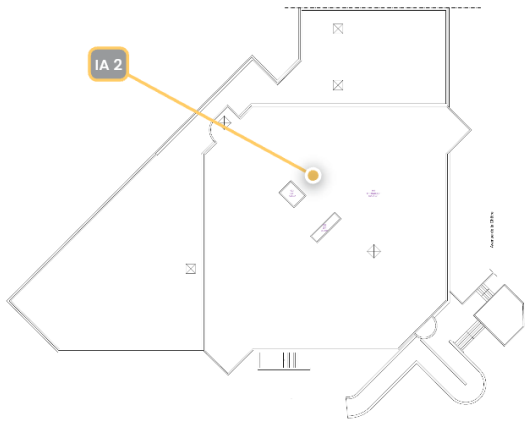

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS – CEN
Monsieur Sébastien GARBAN
110 Boulevard de la Salle
45760 BOIGNY SUR BIONNE

Notre référence : AR-26-NS-042657-01

Numéro de dossier : 26W023588
Référence de dossier : 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26W023588-001 - Référence *EUROFINS250000279369 Réf. Prel : P1 CAF 36 - Sous-Sol - 021 Sanitaires/Faux plafonds : Plaques (Liste A) / Peintures - (Métallique/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-002 - Référence *EUROFINS250000279366 Réf. Prel : P2 CAF 36 - Sous-Sol - 021 Sanitaires/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage / Peinture - (Peint, Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-003 - Référence *EUROFINS250000279368 Réf. Prel : P3 CAF 36 - Sous-Sol - 023 Archives/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage / Peinture - (Peint, Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-004 - Référence *EUROFINS250000279364 Réf. Prel : P4 CAF 36 - Sous-Sol - 023 Archives/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-005 - Référence *EUROFINS250000279367 Réf. Prel : P5 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-006 - Référence *EUROFINS250000279365 Réf. Prel : P6 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Faux plafonds : Isolants / Jonctions entre faux plafond et structure - (Fibreux/Marron, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-007 - Référence *EUROFINS240000036548 Réf. Prel : P7 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-008 - Référence *EUROFINS240000036549 Réf. Prel : P8 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-009 - Référence *EUROFINS250000279363 Réf. Prel : P9 CAF 36 - Sous-Sol - 014 Archives/Faux plafonds : Isolants / Jonctions entre faux plafond et structure - (Fibreux/Marron, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-010 - Référence *EUROFINS250000279360 Réf. Prel : P10 CAF 36 - Sous-Sol - 014 Archives/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-011 - Référence *EUROFINS250000279362 Réf. Prel : P11 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-012 - Référence *EUROFINS250000279361 Réf. Prel : P12 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-013 - Référence *EUROFINS250000279359 Réf. Prel : P13 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Revêtements de sol : Ragréages / Peintures de sol - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-014 - Référence *EUROFINS250000279358 Réf. Prel : P14 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Revêtements de sol : Ragréages / Peintures de sol - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-015 - Référence *EUROFINS250000279357 Réf. Prel : P15 CAF 36 - Sous-Sol - 016 Parking/Faux plafonds : Isolants / Jonctions entre faux plafond et structure - (Fibreux/Marron, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-016 - Référence *EUROFINS250000279356 Réf. Prel : P16 CAF 36 - Sous-Sol - 016 Parking/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-017 - Référence *EUROFINS250000279355 Réf. Prel : P17 CAF 36 - RDC - 003 Accueil Public/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Plastique/Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-018 - Référence *EUROFINS250000279354 Réf. Prel : P18 CAF 36 - RDC - 003 Accueil Public/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Plastique/Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-019 - Référence *EUROFINS250000279353 Réf. Prel : P19 CAF 36 - RDC - 017 WC H/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage / Peinture - (Peint, Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-020 - Référence *EUROFINS250000279352 Réf. Prel : P20 CAF 36 - RDC - 017 WC H/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-021 - Référence *EUROFINS250000279351 Réf. Prel : P21 CAF 36 - RDC - 015 DGT Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Granuleux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-022 - Référence *EUROFINS250000279349 Réf. Prel : P22 CAF 36 - RDC - 003 Accueil Public/Menuiseries extérieures : Mastic de vitrage - (Silicone, Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-023 - Référence *EUROFINS250000279350 Réf. Prel : P23 CAF 36 - RDC - 003 Accueil Public/Menuiseries extérieures : Mastic de vitrage - (Silicone, Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-024 - Référence *EUROFINS250000279347 Réf. Prel : P24 CAF 36 - RDC - 003 Accueil Public/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-025 - Référence *EUROFINS250000279348 Réf. Prel : P25 CAF 36 - RDC - 003 Accueil Public/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-026 - Référence *EUROFINS240000036550 Réf. Prel : P26 CAF 36 - R+1 - 022 WC H/Faux plafonds : Plaques (Liste A) / Peintures - (Métallique/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-027 - Référence *EUROFINS250000279345 Réf. Prel : P27 CAF 36 - R+1 - 022 WC H/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage / Peinture - (Peint, Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-028 - Référence *EUROFINS250000279346 Réf. Prel : P28 CAF 36 - R+1 - 022 WC H/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-029 - Référence *EUROFINS250000279327 Réf. Prel : P29 CAF 36 - R+1 - 023 Ménage/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-030 - Référence *EUROFINS250000279246 Réf. Prel : P30 CAF 36 - R+1 - 025 Local Elec/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-031 - Référence *EUROFINS240000036551 Réf. Prel : P31 CAF 36 - R+1 - 008 Serv. Social Perso/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Métallique/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-032 - Référence *EUROFINS250000279344 Réf. Prel : P32 CAF 36 - R+2 - 009 Salle des Commissions/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses / Ragréages*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W023588-033 - Référence *EUROFINS250000279249 Réf. Prel : P33 CAF 36 - R+2 - 009 Salle des Commissions/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses / Ragréages*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W023588-034 - Référence *EUROFINS240000036552 Réf. Prel : P34 CAF 36 - R+2 - 003 DGT Circulation/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

P-RS-FRM8220

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-023373-01
Référence laboratoire N° : 26RB022675
Reçu au laboratoire le : 26/06/2026
Date d'analyse : 30/06/2026
Référence dossier Client:26W023588 - 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

Date d'émission de rapport : 02/07/2026 17:48
Référence de suivi du dossier N° : 26W023588
Date de réception :25/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	26W023588-001 - EUROFINS250000279 69 Réf. Prel : P1 CAF 36 - Sous-Sol - 021 Sanitaires/Faux plafonds : Plaques (Liste A) / Peintures - (Métallique/)	Matériau de type peinture (vert)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26W023588-002 - EUROFINS250000279 66 Réf. Prel : P2 CAF 36 - Sous-Sol - 021 Sanitaires/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage / Peinture - (Peint, Ciment/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-023373-01 | Date d'émission de rapport : 02/07/2026 17:48 | Page2/12
Référence laboratoire N° : 26RB022675 | Référence de suivi du dossier N° : 26W023588
Reçu au laboratoire le : 26/06/2026 | Date de réception :25/06/2026
Date d'analyse : 30/06/2026
Référence dossier Client:26W023588 - 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	26W023588-003 - EUROFINS250000279 68 Réf. Prel : P3 CAF 36 - Sous-Sol - 023 Archives/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage / Peinture - (Peint, Ciment/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	26W023588-004 - EUROFINS250000279 64 Réf. Prel : P4 CAF 36 - Sous-Sol - 023 Archives/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26W023588-005 - EUROFINS250000279 67 Réf. Prel : P5 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	26W023588-006 - EUROFINS250000279 65 Réf. Prel : P6 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Faux plafonds : Isolants / Jonctions entre faux plafond et structure - (Fibreux/Marron, Gris)	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-023373-01 | Date d'émission de rapport : 02/07/2026 17:48 | Page3/12
Référence laboratoire N° : 26RB022675 | Référence de suivi du dossier N° : 26W023588
Reçu au laboratoire le : 26/06/2026 | Date de réception :25/06/2026
Date d'analyse : 30/06/2026
Référence dossier Client:26W023588 - 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	26W023588-007 - EUROFINS240000036 48 Réf. Prel : P7 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
008	26W023588-008 - EUROFINS240000036 49 Réf. Prel : P8 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
009	26W023588-009 - EUROFINS250000279 63 Réf. Prel : P9 CAF 36 - Sous-Sol - 014 Archives/Faux plafonds : Isolants / Jonctions entre faux plafond et structure - (Fibreux/Marron, Gris)	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-023373-01 | Date d'émission de rapport : 02/07/2026 17:48 | Page4/12
Référence laboratoire N° : 26RB022675 | Référence de suivi du dossier N° : 26W023588
Reçu au laboratoire le : 26/06/2026 | Date de réception :25/06/2026
Date d'analyse : 30/06/2026
Référence dossier Client:26W023588 - 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	26W023588-010 - EUROFINS250000279 60 Réf. Prel : P10 CAF 36 - Sous-Sol - 014 Archives/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	26W023588-011 - EUROFINS250000279 62 Réf. Prel : P11 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Plâtre/)	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26W023588-012 - EUROFINS250000279 61 Réf. Prel : P12 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Plâtre/)	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26W023588-013 - EUROFINS250000279 59 Réf. Prel : P13 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Revêtement de sol : Ragréages / Peintures de sol - (Ciment/)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-023373-01 | Date d'émission de rapport : 02/07/2026 17:48 | Page5/12
Référence laboratoire N° : 26RB022675 | Référence de suivi du dossier N° : 26W023588
Reçu au laboratoire le : 26/06/2026 | Date de réception :25/06/2026
Date d'analyse : 30/06/2026
Référence dossier Client:26W023588 - 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	26W023588-014 - EUROFINS250000279 58 Réf. Prel : P14 CAF 36 - Sous-Sol - 013 Chaufferie/Revêtement de sol : Ragréages / Peintures de sol - (Ciment/)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	26W023588-015 - EUROFINS250000279 57 Réf. Prel : P15 CAF 36 - Sous-Sol - 016 Parking/Faux plafonds : Isolants / Jonctions entre faux plafond et structure - (Fibreux/Marron, Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc) en traces	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	26W023588-016 - EUROFINS250000279 56 Réf. Prel : P16 CAF 36 - Sous-Sol - 016 Parking/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	26W023588-017 - EUROFINS250000279 55 Réf. Prel : P17 CAF 36 - RDC - 003 Accueil Public/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Plastique/Gris, Foncé)	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-023373-01 | Date d'émission de rapport : 02/07/2026 17:48 | Page6/12
Référence laboratoire N° : 26RB022675 | Référence de suivi du dossier N° : 26W023588
Reçu au laboratoire le : 26/06/2026 | Date de réception :25/06/2026
Date d'analyse : 30/06/2026
Référence dossier Client:26W023588 - 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	26W023588-018 - EUROFINS250000279 54 Réf. Prel : P18 CAF 36 - RDC - 003 Accueil Public/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Plastique/Gris, Foncé)	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	26W023588-019 - EUROFINS250000279 53 Réf. Prel : P19 CAF 36 - RDC - 017 WC H/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage / Peinture - (Peint, Ciment/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	26W023588-020 - EUROFINS250000279 52 Réf. Prel : P20 CAF 36 - RDC - 017 WC H/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / FN5U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-023373-01 | Date d'émission de rapport : 02/07/2026 17:48 | Page7/12
Référence laboratoire N° : 26RB022675 | Référence de suivi du dossier N° : 26W023588
Reçu au laboratoire le : 26/06/2026 | Date de réception :25/06/2026
Date d'analyse : 30/06/2026
Référence dossier Client:26W023588 - 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	26W023588-021 - EUROFINS250000279 51 Réf. Prel : P21 CAF 36 - RDC - 015 DGT Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Granuleux/Blanc)	Matériau semi-dur (fibreux) (granulaire) (blanc)	**MET** / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022 (2)	26W023588-022 - EUROFINS250000279 49 Réf. Prel : P22 CAF 36 - RDC - 003 Accueil Public/Menuiseries extérieures : Mastic de vitrage - (Silicone, Caoutchouc/Noir)	Matériau de type mousse (noir) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	**MET** / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
023 (3) (4) (5)	26W023588-023 - EUROFINS250000279 50 Réf. Prel : P23 CAF 36 - RDC - 003 Accueil Public/Menuiseries extérieures : Mastic de vitrage - (Silicone, Caoutchouc/Noir)	Matériau de type mousse (noir)	**MET** / S7VS	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	26W023588-024 - EUROFINS250000279 47 Réf. Prel : P24 CAF 36 - RDC - 003 Accueil Public/Menuiseries extérieures : Joints d''étanchéité - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-023373-01 | Date d'émission de rapport : 02/07/2026 17:48 | Page8/12
Référence laboratoire N° : 26RB022675 | Référence de suivi du dossier N° : 26W023588
Reçu au laboratoire le : 26/06/2026 | Date de réception :25/06/2026
Date d'analyse : 30/06/2026
Référence dossier Client:26W023588 - 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	26W023588-025 - EUROFINS250000279 48 Réf. Prel : P25 CAF 36 - RDC - 003 Accueil Public/Menuiseries extérieures : Joints d''étanchéité - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 (1)	26W023588-026 - EUROFINS240000036 50 Réf. Prel : P26 CAF 36 - R+1 - 022 WC H/Faux plafonds : Plaques (Liste A) / Peintures - (Métallique/)	Matériau de type peinture (vert)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (6)	26W023588-027 - EUROFINS250000279 45 Réf. Prel : P27 CAF 36 - R+1 - 022 WC H/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage / Peinture - (Peint, Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028 (6)	26W023588-028 - EUROFINS250000279 46 Réf. Prel : P28 CAF 36 - R+1 - 022 WC H/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-023373-01 | Date d'émission de rapport : 02/07/2026 17:48 | Page9/12
Référence laboratoire N° : 26RB022675 | Référence de suivi du dossier N° : 26W023588
Reçu au laboratoire le : 26/06/2026 | Date de réception :25/06/2026
Date d'analyse : 30/06/2026
Référence dossier Client:26W023588 - 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	26W023588-029 - EUROFINS250000279 27 Réf. Prel : P29 CAF 36 - R+1 - 023 Ménage/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	26W023588-030 - EUROFINS250000279 46 Réf. Prel : P30 CAF 36 - R+1 - 025 Local Elec/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Plâtre/)	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	26W023588-031 - EUROFINS240000036 51 Réf. Prel : P31 CAF 36 - R+1 - 008 Serv. Social Perso/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Métallique/)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (plâtreux) (marron) en traces(i)	**MET** / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MOLP** / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (plâtreux) (marron)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-023373-01
Référence laboratoire N° : 26RB022675
Reçu au laboratoire le : 26/06/2026
Date d'analyse : 30/06/2026
Référence dossier Client:26W023588 - 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

Date d'émission de rapport : 02/07/2026 17:48
Référence de suivi du dossier N° : 26W023588
Date de réception :25/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	26W023588-032 - EUROFINS250000279 44 Réf. Prel : P32 CAF 36 - R+2 - 009 Salle des Commissions/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses / Ragréages	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (polymérisé) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	26W023588-033 - EUROFINS250000279 49 Réf. Prel : P33 CAF 36 - R+2 - 009 Salle des Commissions/Revêtements de sol : Moquettes / Colles non bitumineuses / Ragréages	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (polymérisé) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	26W023588-034 - EUROFINS240000036 52 Réf. Prel : P34 CAF 36 - R+2 - 003 DGT Circulation/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / FR9V	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-023373-01 | Date d'émission de rapport : 02/07/2026 17:48 | Page11/12
Référence laboratoire N° : 26RB022675 | Référence de suivi du dossier N° : 26W023588
Reçu au laboratoire le : 26/06/2026 | Date de réception :25/06/2026
Date d'analyse : 30/06/2026
Référence dossier Client:26W023588 - 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

Observation(s) échantillon(s)

(1) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(4) Un matériau (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(5) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(6) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.

Observation(s) couche(s)

(i) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-023373-01
Date d'émission de rapport : 02/07/2026 17:48

Référence laboratoire N° : 26RB022675
Référence de suivi du dossier N° : 26W023588
Reçu au laboratoire le : 26/06/2026
Date de réception :25/06/2026
Date d'analyse : 30/06/2026
Référence dossier Client:26W023588 - 1510797445/32519473/S1/1/1_32519473/1/1

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România
