BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
DBE MPY
Zone Europa
4 Rue Johannes Kepler
64000 PAU

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 26070219/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 25/04/2025

Référence au programme de travaux :
Proposition d'aménagement n°1 réalisé le 01/04/2025 par Hervé BUERI

DONNEUR D'ORDRE

Christelle MENDES DA SILVA
Boulevard Tourasse
64000 Pau

SITE D'INTERVENTION

Sous-Prefecture OLORON STE MARIE
Rue de la Poste
64400 OLORON STE MARIE

Sous-Prefecture

Latitude : 43.191300 / Longitude : -0.609500



SYNTHESE DE CONCLUSION

AVEC AMIANTE repéré

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence
Christophe CAZAUX	Diagnostiqueur	C3711

Signataire du rapport
Christophe CAZAUX


Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 6
2.2. Obligations réglementaires 7

3. INFORMATIONS GENERALES **8**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 8
3.2. Parties prenantes 8


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **8**
4.1. Références réglementaires 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **9**
5.1. Date(s) de visite(s) 9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 9
5.3. Conditions spécifiques 9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **10**
6.1. Matériaux et produits repérés 10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 17

7. ANNEXES **18**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 18
7.2. Photos prélèvements 19
7.3. Attestation d'assurance 26
7.4. Certificat de compétence 28
7.5. Croquis de repérage 29
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire 32

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

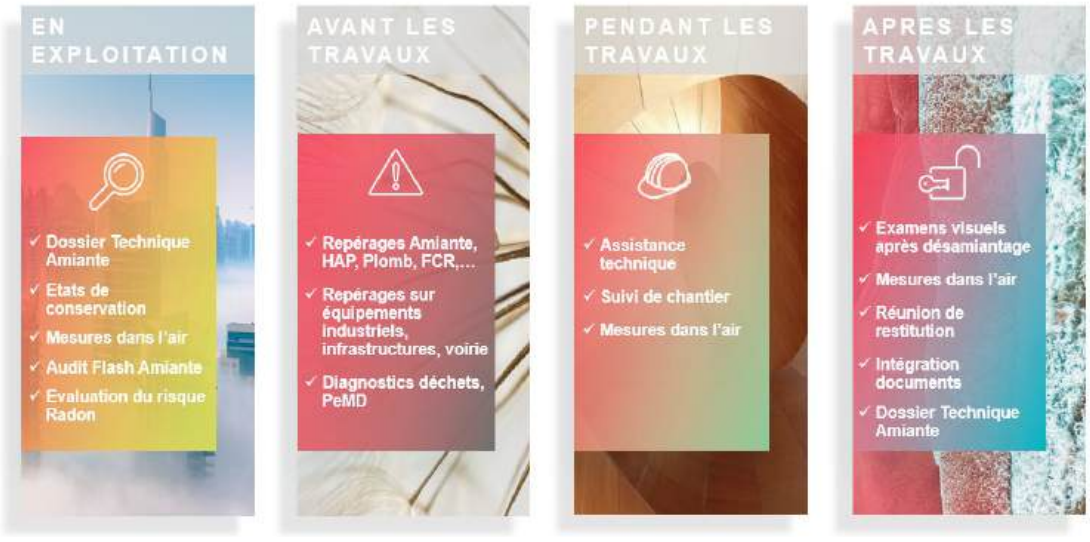

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réaménagement des bureaux avec impact sur les murs, sols et plafonds suivant plan fourni.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

RDC : Hall d’accueil public ,Couloir,local serveur ,bureau 1 ,salle de repos ,sanitaire , WC,local service ,salle de réunion

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
9	RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Blanc
10	RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment, Mortier	Blanc, Gris

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : Sous-Prefecture OLORON STE MARIE
Rue de la Poste
64400 OLORON STE MARIE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
Sous-Prefecture OLORON STE MARIE	Administrations, bureaux	ERP de la 5ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Christelle MENDES DA SILVA	Donneur d'ordre	/	Boulevard Tourasse 64000 Pau	0609900357

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 15/04/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Pas d'accompagnateur lors du repérage
- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Avant projet sommaire / SPREF_Oloron_bureaux_prop1	Hervé BUERI	01/04/2025	Proposition d'aménagement n°1	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Hall Acceuil Public	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc, Gris	15	P29* N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc, Gris	15	P30 N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Vert	7	P13* N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	7	P13* N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Vert	7	P14 N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	7	P14 N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	P15* N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	P16 N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Blanc	9	P17* P	/	AN	/	*Oui*

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Blanc	9	P18 P	/	AN	/	*Oui*
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment, Enduit	Blanc, Gris	10	P19* P	/	AN	/	*Oui*
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment, Enduit	Blanc, Gris	10	P20 P	/	AN	/	*Oui*
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	Blanc	11	P21* N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Plâtreux	Blanc	11	P22 N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	P24* N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	16	P31* N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	16	P32 N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Façades lourdes y compris poteaux	Joints de faïence	Ciment	Gris	17	P33* N	/	AN	/	Non
RDC -> Hall Acceuil Public	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 26	/	AN	/	Non
RDC -> Couloir	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	5	P10* N	/	AN	/	Non
RDC -> Couloir	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Non bitumineux	Jaune, Blanc	5	P10* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Couloir	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	6	P12* N	/	AN	/	Non
RDC -> Couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Couloir	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 26	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaire	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Noir	1	P2* N	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de carrelage	Ciment	Gris	2	P4* N	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	3	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	4	Idem P 7	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaire	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaire	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 26	/	AN	/	Non
RDC -> WC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	3	P6* N	/	AN	/	Non
RDC -> WC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	4	P7* N	/	AN	/	Non
RDC -> WC	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Noir	1	Idem P 2	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> WC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de carrelage	Ciment	Gris	2	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> WC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> WC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 26	/	AN	/	Non
RDC -> LT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	3	P5 N	/	AN	/	Non
RDC -> LT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	4	P8 N	/	AN	/	Non
RDC -> LT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	P26* N	/	AN	/	Non
RDC -> LT	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Noir	1	Idem P 2	/	AN	/	Non
RDC -> LT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de carrelage	Ciment	Gris	2	Idem P 4	/	AN	/	Non
RDC -> LT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Service	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Noir	1	P1 N	/	AN	/	Non
RDC -> Service	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de carrelage	Ciment	Gris	2	P3 N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Service	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	3	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Service	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	4	Idem P 7	/	AN	/	Non
RDC -> Service	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Service	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 26	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	5	/	S1	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Non bitumineux	Jaune, Blanc	5	/	S1	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	6	/	S2	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	P23 N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 26	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de Pause	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	5	P9 N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de Pause	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Non bitumineux	Jaune, Blanc	5	P9 N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de Pause	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	6	P11 N	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Salle de Pause	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	P25 N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de Pause	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	14	P27* N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	5	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Non bitumineux	Jaune, Blanc	5	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	6	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 26	/	AN	/	Non
RDC -> Serveur	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	14	P28 N	/	AN	/	Non
RDC -> Serveur	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	Fibreux, Toile	Orange	18	P34* N	/	AN	/	Non
RDC -> Serveur	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Fibreux	Jaune	18	P34* N	/	AN	/	Non
RDC -> Serveur	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	5	Idem P 10	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Serveur	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Non bitumineux	Jaune, Blanc	5	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Serveur	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	6	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Serveur	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	12	Idem P 24	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
9 et 10	Revêtements de sol	Colles et joints de carrelage	50m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC	/
RDC -> Hall Acceuil Public	/
RDC -> Couloir	/
RDC -> Sanitaire	/
RDC -> WC	/
RDC -> LT	/
RDC -> Service	/
RDC -> Salle de réunion	/
RDC -> Salle de Pause	/
RDC -> Bureau 1	/
RDC -> Serveur	/

7.2. Photos prélèvements

P29	ZPSO 15
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P30	ZPSO 15
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P13	ZPSO 7
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses	

P14	ZPSO 7
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | Colles non bitumineuses	

P15	ZPSO 8
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P16	ZPSO 8
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P17	ZPSO 9
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P18	ZPSO 9
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P19	ZPSO 10
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage	

P20	ZPSO 10
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Revêtements de sol -> Joints de carrelage	

P21	ZPSO 11
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P22	ZPSO 11
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P24	ZPSO 12
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P31	ZPSO 16
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P32	ZPSO 16
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P33	ZPSO 17
RDC -> Hall Acceuil Public	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Joints de faïence	

P10	ZPSO 5
RDC -> Couloir	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Sous-couches des revêtements souples	

P12	ZPSO 6
RDC -> Couloir	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P2	ZPSO 1
RDC -> Sanitaire	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P4	ZPSO 2
RDC -> Sanitaire	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de carrelage	

P6	ZPSO 3
RDC -> WC	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P7	ZPSO 4
RDC -> WC	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe	

P5	ZPSO 3
RDC -> LT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P8	ZPSO 4
RDC -> LT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe	

P26	ZPSO 13
RDC -> LT	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P1	ZPSO 1
RDC -> Service	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

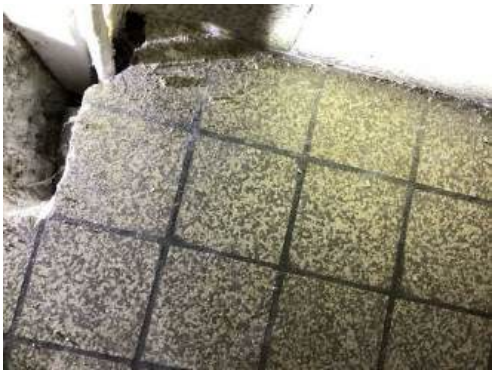P3	ZPSO 2
RDC -> Service	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de carrelage	

P23	ZPSO 12
RDC -> Salle de réunion	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P9	ZPSO 5
RDC -> Salle de Pause	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Sous-couches des revêtements souples	

P11	ZPSO 6
RDC -> Salle de Pause	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P25	ZPSO 13
RDC -> Salle de Pause	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P27	ZPSO 14
RDC -> Bureau 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P28	ZPSO 14
RDC -> Serveur	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P34	ZPSO 18
RDC -> Serveur	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Moquettes murales | Sous couches des tissus muraux	

7.3. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signé par: Juliette Allavoine
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07-01-2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.4. Certificat de compétence

La certification QUALIXPERT des diagnostiqueurs

Certificat N° C3711

Monsieur Christophe CAZAUX

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREDITATION N° 4-0094 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante sans mention	**Certificat valable Du 28/02/2023 au 27/02/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	**Certificat valable Du 28/02/2023 au 27/02/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	**Certificat valable Du 28/02/2023 au 27/02/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique individuel	**Certificat valable Du 06/04/2023 au 05/04/2030**	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.
Etat des installations intérieures d'électricité	**Certificat valable Du 06/04/2023 au 05/04/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	**Certificat valable Du 06/04/2023 au 05/04/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

Date d'établissement le dimanche 01 septembre 2024

Marjorie ALBERT

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17 rue Borel - 81100 Castres
Tél. : 05 63 73 06 13 - www.qualixpert.com
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

7.5. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Sous-Prefecture OLORON STE MARIE Rue de la Poste 64400 OLORON STE MARIE	
Localisation RDC	Date visite	Le 15/04/2025
	Auteur	Christophe CAZAUX
	N° dossier	26070219/S1/1
	Planche	1 / 2
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

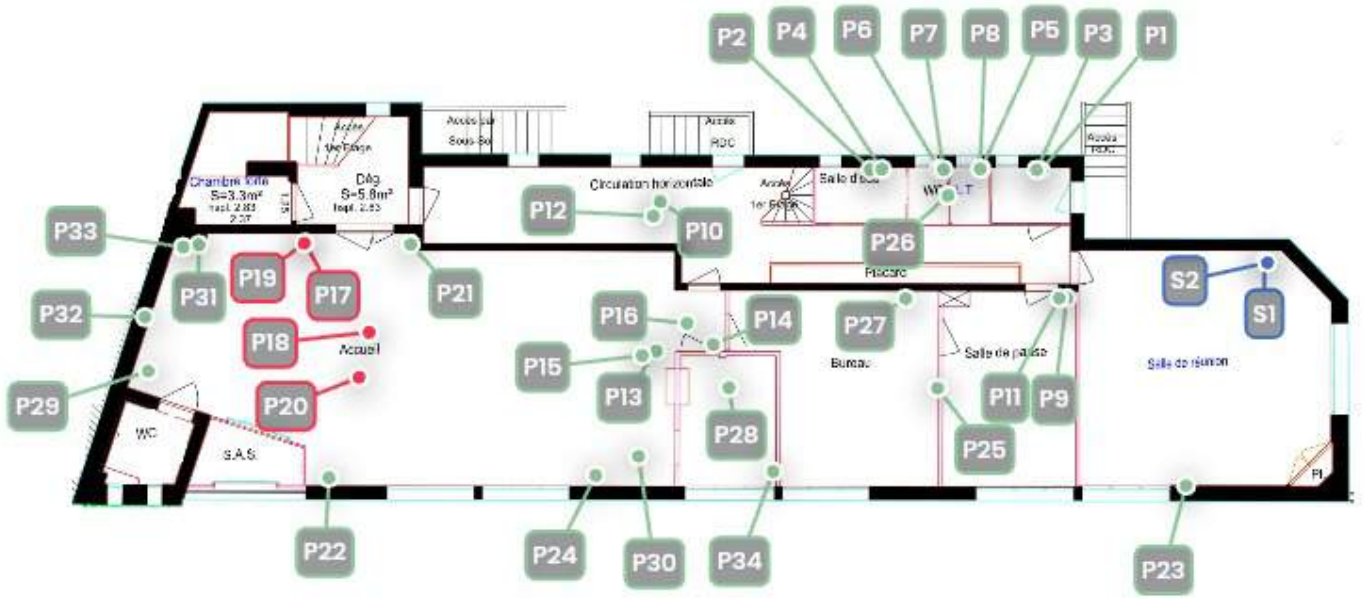

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Sous-Prefecture OLORON STE MARIE Rue de la Poste 64400 OLORON STE MARIE	
Localisation RDC	Date visite	Le 15/04/2025
	Auteur	Christophe CAZAUX
	N° dossier	26070219/S1/1
	Planche	2 / 2
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Colles et joints de carrelage

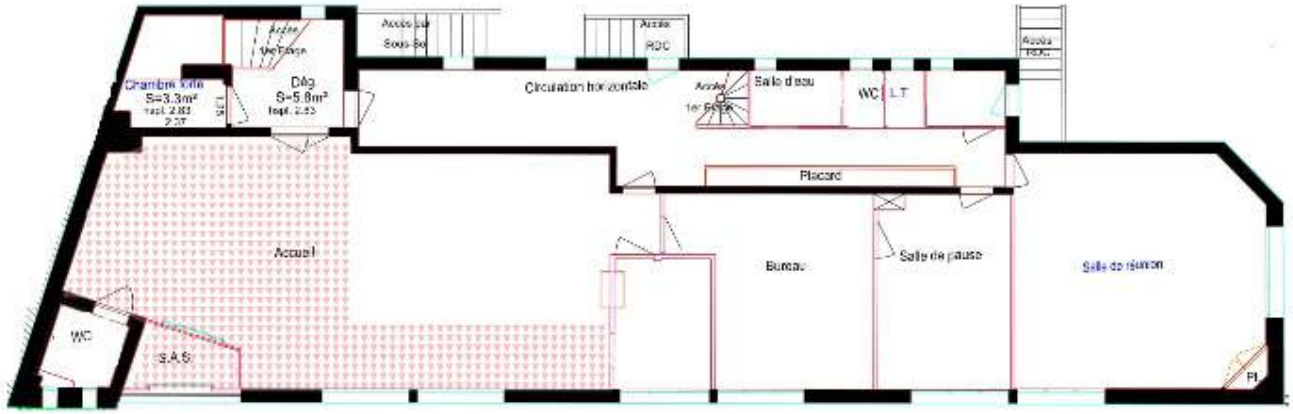

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Christophe CAZAUX
Zone Europa - 4 Rue Johannes Kepler
64000 PAU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028284-01 | Date d'émission de rapport : 24/04/2025 23:46 | Page1/10
Dossier N° : 25K013923 | Date de réception : 22/04/2025 | Date d'analyse : 23/04/2025
Référence dossier Client:1510797383/26070219/S1/1/1_26070219/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	EUROFINS240000058978 Réf. Prel : P1 RDC - Service/Revêtements de sol - (Dur/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	EUROFINS240000058977 Réf. Prel : P2 RDC - Sanitaire/Revêtements de sol - (Dur/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	EUROFINS240000058976 Réf. Prel : P3 RDC - Service/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	EUROFINS240000058975 Réf. Prel : P4 RDC - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028284-01 | Date d'émission de rapport : 24/04/2025 23:46 | Page2/10
Dossier N° : 25K013923 | Date de réception : 22/04/2025 | Date d'analyse : 23/04/2025
Référence dossier Client:1510797383/26070219/S1/1/1_26070219/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	EUROFINS240000058974 Réf. Prel : P5 RDC - LT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	EUROFINS240000058979 Réf. Prel : P6 RDC - WC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	EUROFINS240000058980 Réf. Prel : P7 RDC - WC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	EUROFINS240000058981 Réf. Prel : P8 RDC - LT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028284-01 | Date d'émission de rapport : 24/04/2025 23:46 | Page3/10
Dossier N° : 25K013923 | Date de réception : 22/04/2025 | Date d'analyse : 23/04/2025
Référence dossier Client:1510797383/26070219/S1/1/1_26070219/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	EUROFINS240000058982 Réf. Prel : P9 RDC - Salle de Pause/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	EUROFINS240000058983 Réf. Prel : P10 RDC - Couloir/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	**MET** * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	EUROFINS240000058522 Réf. Prel : P11 RDC - Salle de Pause/Revêtements de sol - (Ragréage/Gris)	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028284-01 | Date d'émission de rapport : 24/04/2025 23:46 | Page4/10
Dossier N° : 25K013923 | Date de réception : 22/04/2025 | Date d'analyse : 23/04/2025
Référence dossier Client:1510797383/26070219/S1/1/1_26070219/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	EUROFINS240000058524 Réf. Prel : P12 RDC - Couloir/Revêtements de sol - (Ragréage/Gris)	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	EUROFINS240000058523 Réf. Prel : P13 RDC - Hall Acceuil Public/Revêtements de sol - (Plastique/Vert)	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	**MET** * / L7JD	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / L7JD	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	EUROFINS240000058526 Réf. Prel : P14 RDC - Hall Acceuil Public/Revêtements de sol - (Plastique/Vert)	Matériau souple de type joint (bleu)	**MET** * / L7JD	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028284-01 | Date d'émission de rapport : 24/04/2025 23:46 | Page5/10
Dossier N° : 25K013923 | Date de réception : 22/04/2025 | Date d'analyse : 23/04/2025
Référence dossier Client:1510797383/26070219/S1/1/1_26070219/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	EUROFINS240000058525 Réf. Prel : P15 RDC - Hall Acceuil Public/Revêtements de sol - (Ragréage/Gris)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	EUROFINS240000058899 Réf. Prel : P16 RDC - Hall Acceuil Public/Revêtements de sol - (Ragréage/Gris)	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	EUROFINS240000058528 Réf. Prel : P17 RDC - Hall Acceuil Public/Revêtements de sol - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	EUROFINS240000058897 Réf. Prel : P18 RDC - Hall Acceuil Public/Revêtements de sol - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)(i)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	EUROFINS240000058888 Réf. Prel : P19 RDC - Hall Acceuil Public/Revêtements de sol - (Enduit, Ciment/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	**MET** * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028284-01 | Date d'émission de rapport : 24/04/2025 23:46 | Page6/10
Dossier N° : 25K013923 | Date de réception : 22/04/2025 | Date d'analyse : 23/04/2025
Référence dossier Client:1510797383/26070219/S1/1/1_26070219/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020 (1)	EUROFINS240000058896 Réf. Prel : P20 RDC - Hall Acceuil Public/Revêtements de sol - (Enduit, Ciment/Blanc, Gris)	Matériau dur (blanc) (granulaire) + (gris)(ii)	**MET** * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021	EUROFINS240000058886 Réf. Prel : P21 RDC - Hall Acceuil Public/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	EUROFINS240000058885 Réf. Prel : P22 RDC - Hall Acceuil Public/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)(iii)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	EUROFINS240000058884 Réf. Prel : P23 RDC - Salle de réunion/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028284-01 | Date d'émission de rapport : 24/04/2025 23:46 | Page7/10
Dossier N° : 25K013923 | Date de réception : 22/04/2025 | Date d'analyse : 23/04/2025
Référence dossier Client:1510797383/26070219/S1/1/1_26070219/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	EUROFINS240000058883 Réf. Prel : P24 RDC - Hall Acceuil Public/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / Z2J2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
025	EUROFINS240000058882 Réf. Prel : P25 RDC - Salle de Pause/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)(iii)	**MET** * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	EUROFINS240000058881 Réf. Prel : P26 RDC - LT/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027 (2)	EUROFINS240000058880 Réf. Prel : P27 RDC - Bureau 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028284-01 | Date d'émission de rapport : 24/04/2025 23:46 | Page8/10
Dossier N° : 25K013923 | Date de réception : 22/04/2025 | Date d'analyse : 23/04/2025
Référence dossier Client:1510797383/26070219/S1/1/1_26070219/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	EUROFINS240000058918 Réf. Prel : P28 RDC - Serveur/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	EUROFINS240000058919 Réf. Prel : P29 RDC - Hall Acceuil Public/Faux plafonds - (Fibreux/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	EUROFINS240000058893 Réf. Prel : P30 RDC - Hall Acceuil Public/Faux plafonds - (Fibreux/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (foncé)	**MET** * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	EUROFINS240000058531 Réf. Prel : P31 RDC - Hall Acceuil Public/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur (rouge)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028284-01 | Date d'émission de rapport : 24/04/2025 23:46 | Page9/10
Dossier N° : 25K013923 | Date de réception : 22/04/2025 | Date d'analyse : 23/04/2025
Référence dossier Client:1510797383/26070219/S1/1/1_26070219/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	EUROFINS240000058530 Réf. Prel : P32 RDC - Hall Acceuil Public/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur (rouge)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	EUROFINS240000058890 Réf. Prel : P33 RDC - Hall Acceuil Public/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur (rouge)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	EUROFINS240000058889 Réf. Prel : P34 RDC - Serveur/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Fibreux, Toile/Orange)	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** * / U3GB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / Z2J2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
(iii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-028284-01 | Date d'émission de rapport : 24/04/2025 23:46 | Page10/10
Dossier N° : 25K013923 | Date de réception : 22/04/2025 | Date d'analyse : 23/04/2025
Référence dossier Client:1510797383/26070219/S1/1/1_26070219/1/1

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Nathan Pouquette
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS
