Agence de contrôle



et d'expertises du bâtiment

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : **36727**
Date du repérage : **17/03/2026**

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 et R4412-97 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... **Caserne GARIN** **107 rue d'Elbeuf** **N° engagement :** Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: **, Lot numéro Non communiqué** Code postal, ville : . **80000 AMIENS**
Périmètre de repérage :	..... Voir programme travaux
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... Foyer /cercle mixte ..... **Autres** ..... **Date du permis de construire <1997**

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom **:** ... **SGAMI DI** Adresse : ..... **130 rue de Rivoli** **59000 LILLE**
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... **SGAMI DI** Adresse : ..... **130 rue de Rivoli** **59000 LILLE**

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	**Fonction**	**Organisme certification**	**Détail de la certification**
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ---------- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	VAILLANT Odile	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 12/04/2023 Échéance : 11/04/2030 N° de certification : CPDI7754

Raison sociale de l'entreprise : **ACOBEX** (Numéro SIRET : **444 080 121 00056)**
Adresse : **7, Avenue du Parc Alata, 60100 CREIL**
Désignation de la compagnie d'assurance : **ALLIANZ**
Numéro de police et date de validité : **60441039 / 31/12/2026**

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 17/04/2026, remis au propriétaire le 17/04/2026
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 154 pages

Sommaire

1 Les conclusions

2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses

3 La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

3.2.3 L'objectif de la mission

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

4.4 Plan et procédures de prélèvements

4.5 Commentaires

5 Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie

5.2 Récapitulatif zone par zone

6 Signatures

7 Annexes

1. – Les conclusions

1.1 Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

Colle de Plinthes marron foncé. (R-1 - Salle de restaurant)

Joint de mastic de vitrage Sur châssis alu (R-1 - Dégagement sur escaliers; R-1 - WC1; R-1 - Couloir cuisine 2; Rez de chaussée - Palier escalier rond)

Joint de mastic de vitrage Sur chassis metal (R-1 - Réserve Epicerie)

Joint de mastic de vitrage Châssis métal peint (R-1 - Local chambres froides)

Conduit en fibres-ciment (R-1 - Local Ménage Entretien)

- des matériaux et produits contenant de l'amiante zones présentant des similitudes d'ouvrages :

Conduit en fibres-ciment (R-1 - Vestiaire femme)

Joint de mastic de vitrage Sur châssis alu (R-1 - Dégagement sur escaliers; R-1 - WC1; R-1; Rez de chaussée - Palier escalier rond)

Joint de mastic de vitrage Châssis métal peint (R-1 - Local chambres froides)

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante et sur zones présentant des similitudes d'ouvrages :

Asphalte (R-2 - Extérieur)
Enduit extérieur Façade beige (R-2 - Façades extérieures)
Sol coulé à base ciment (R-2 - Zone couverte)
Joint de dilatation (R-2 - Zone couverte)
Marches béton (R-2 - Escalier extérieur)
Nez de marche béton (R-2 - Escalier extérieur)
Enduit extérieur Façade blanc (R-2 - Façades extérieures)
Colle de carrelage (R-1 - Plateforme devant monte charge)
Joint de dilatation et d'assemblage seuil de porte (R-1 - Plateforme devant monte charge)
Enduit à base de ciment Plafond (R-2 - Zone couverte)
Chape béton (R-1 - Plateforme devant monte charge)
Colle de carrelage + joint (R-1 - Dégagement cuisine; R-1 - Dégagement 2)
Enduit extérieur Sur mur pour installation rampe pmr (R-2 - Extérieur)
Joint de dilatation mur extérieur (R-2 - Extérieur)
Ragréage sous lino (R-1 - Local poubelles)
Enduit Mural plâtre refend (R-1 - Local poubelles)
Enduit mural refend (R-1 - Dégagement cuisine; R-1 - Réserve Epicerie; R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Dégagement 3; R-1 - Dégagement 4; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Dégagement 2; R-1 - Sas distribution; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - Couloir cuisine 2)
Enduit cloison plâtre. (R-1 - Bureau; R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Dégagement 2; R-1 - Sas distribution; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - WC1)
Dalle de sol Beige + colle + ragréage (R-1 - Bureau; R-1 - Réserve Epicerie)
Dalle de sol Bleue + colle + ragréage sous lino (R-1 - Dégagement reserve)
Colle non bitumineuse sous lino (R-1 - Réserve Epicerie)
Colle de faïence 15X15 blanche (R-1 - Réserve Epicerie)
Enduit Plafond (R-1 - Lingerie; R-1 - Dégagement reserve; R-1 - Réserve Epicerie; R-1 -

Couloir cuisine; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Dégagement 2; R-1 - Sas distribution; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - WC1; R-1 - Lavabo; R-1 - Couloir cuisine 2; R-1 - Bureau)
Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend) (R-1 - Réserve Epicerie)
Colle de carrelage (R-1 - Vestiaire hommes)
Colle de faïence jaune douche (R-1 - Vestiaire hommes)
Colle de Plinthes (R-1 - Vestiaire hommes)
Enduit à base de ciment + peinture crépi mur refend (R-1 - Vestiaire hommes)
Enduit à base de ciment + peinture (plafond) (R-1 - Vestiaire hommes)
Sol coulé à base ciment + peinture fibrée (R-1 - Dégagement 3)
Chape béton (R-1 - Local Ménage Entretien; R-1 - Local chambres froides; R-1 - Reserve boissons)
Joint d'assemblage entre parpaing (R-1 - Réserve boissons; R-1 - Local chambres froides)
Enduit à base de ciment + peinture (plafond) (R-2 - Armurerie 1; R-2 - Soute 1 (armurerie); R-2 - Soute 2 (Armurerie); R-2 - Armement)
Sol coulé à base ciment (R-2 - Ciblerie)
Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend) (R-2 - Ciblerie)
Enduit ciment plâtre peinture embrasure fenêtres (R-1 - Self; R-1 - Salle de restaurant)
Enduit Ciment mur façade (R-1 - Salle de restaurant)
Enduit Plâtre sous tdvp (R-1 - Self)
Bandes calicot (R-1 - Self; R-1 - Salle de restaurant)
Enduit Ciment peinture plafond (R-1 - Self)
Colle de Plinthes Marron clair (R-1 - Self; R-1 - Salle de restaurant)
Colle de carrelage jonction couloir / restaurant (R-1 - Salle de restaurant)
Colle de carrelage + chape (R-1 - Self; R-1 - Salle de restaurant; Rez de chaussée - Hall d'entrée; Rez de chaussée - Salle de réception; Rez de chaussée - Circulation; Rez de chaussée - Palier escalier rond)
Colle de plinthes (Rez de chaussée - Circulation; Rez de chaussée - Palier escalier rond)
Colle de carrelage beige (R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Chambre froide 1; R-1 - Chambre froide 2; R-1 - Chambre froide 3; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Dégagement sur escaliers; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - WC1; R-1 - Lavabo; R-1 - Couloir cuisine 2)
Colle de Plinthes beige (R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Chambre froide 1; R-1 - Chambre froide 2; R-1 - Chambre froide 3; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Dégagement sur escaliers; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - WC1; R-1 - Lavabo; R-1 - Couloir cuisine 2; R-1 - Bar)
Ragréage sous carrelage + joint sur carrelage idem restaurant (R-1 - Véranda; R-1 - Bar)
Plaque plâtre doublage façade (R-1 - Véranda)
Joint d'assemblage briquette parement (R-1 - Bar)
Enduit à base de ciment Sous tdvp embrasure porte (R-1 - Wc Public)
Bandes calicot +plâtre mur cloison Sous tdvp (R-1 - Wc Public)
Colle de carrelage (R-1 - Wc Public)
Enduit mur refend Ciment sous TDVP (R-1 - Wc Public)
Enduit Ciment / peinture plafond (R-1 - Wc Public; R-1 - Vestiaire femme)
Colle de faïence rose (R-1 - Wc Public)
Colle de carrelage (R-1 - Vestiaire femme)
Colle de Plinthes noires (R-1 - Vestiaire femme)
Enduit ciment poutre soutènement plafond (R-1 - Wc Public; R-1 - Vestiaire femme)
Enduit ciment + peinture type crépi jaune refend (R-1 - Hall)
Marches béton (R-1 - Escalier rond)
Limon béton peint (R-1 - Escalier rond)
Enduit béton mur sur extérieur. (R-1 - Escalier rond)
Enduit à base de ciment + peinture poteau escalier (R-1 - Escalier rond)
Enduit béton + peinture plafond (R-1 - Escalier rond ; R-1 - Dégagement sur escaliers; R-1 - Couloir cuisine 2)
Colle sous Nez de marche pvc (R-1 - Escalier rond)
Enduit Ciment + peinture type crépi refend (R-1 - Dégagement sur escaliers rond)
Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend) (R-1 - WC1; R-1 - Lavabo)
Colle de faïence blanche (R-1 - WC1; R-1 - Lavabo)
Enduit à base de plâtre + peinture (mur cloisons) (R-1 - Lavabo)
Enduit à base de ciment + peinture (plafond) (R-1 - WC1; R-1 - Lavabo)
Enduit à base de ciment Plafond (R-1 - Local Ménage Entretien)
Enduit à base de ciment (plafond) (R-1 - Local chambres froides)

Enduit extérieur Façade (R-2 - Façades extérieures)
Enduit extérieur Façade restaurant (R-2 - Façades extérieures)
Enduit extérieur Escaliers (R-2 - Façades extérieures)
Appui de fenêtres (R-2 - Façades extérieures)
Colle de carrelage (Rez de chaussée - Hall d'entrée; Rez de chaussée - Circulation)
Colle de Plinthes (Rez de chaussée - Hall d'entrée; Rez de chaussée - Salle de réception; Rez de chaussée - Salle de réception 2; Rez de chaussée - Circulation)
Enduit Ciment refend peinture crépi jaune (Rez de chaussée - Circulation)
Colle de faïence 15 X15 (R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Legumerie)
Enduit Ciment peinture Refend (R-1 - Dégagement cuisine; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Legumerie)
Enduit à base de ciment + peinture (plafond) (R-1 - Dégagement cuisine; R-1 - Chambre froide 1; R-1 - Chambre froide 2; R-1 - Chambre froide 3; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Legumerie)
Enduit extérieur Parapet (R-1 - Plateforme devant monte charge)
Enduit à base de ciment + peinture (plafond) (R-2 - Local débarras cuisine exterieur)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... SGS
Adresse : ..... 99 -101 avenue Louis Roche 92230 GENNEVILLIERS
Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-7056

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 et R4412-97 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 *Le périmètre de repérage*

Descriptif des travaux :
voir programme travaux

Descriptif des pièces visitées

R-2 - Extérieur,
R-2 - Zone couverte,
R-2 - Entrée,
R-2 - Escalier extérieur,
R-2 - Armurerie 1,
R-2 - Soute 1 (armurerie),
R-2 - Soute 2 (Armurerie),
R-2 - Armurerie 2,
R-2 - Salle de reunion,
R-2 - Sanitaires,
R-2 - Armement,
R-2 - Magasin 1,
R-2 - Magasin 2,
R-1 - Plateforme devant monte charge,
R-1 - Dégagement cuisine,
R-1 - Lingerie,
R-1 - Dégagement reserve,
R-1 - Bureau,
R-1 - Réserve Epicerie,
R-1 - Vestiaire hommes,
R-1 - Local Ménage Entretien,
R-1 - Couloir cuisine,
R-1 - Dégagement 3,
R-1 - Dégagement 4,
R-1 - Chambre froide 1,
R-1 - Chambre froide 2,
R-1 - Chambre froide 3,
R-1 - Plonge 1,
R-1 - Plonge 2,
R-1 - Cuisine,
R-1 - Dégagement 2,
R-1 - Sas distribution,
R-1 - Escalier,
R-1 - Réserve boissons,
R-1 - Local chambres froides,
R-1 - Dégagement sur escaliers,
R-1 - Local électrique,
R-1 - Local poubelles,
R-1 - WC1,
R-1 - Lavabo,
R-1 - Rangement sous escaliers,
R-1 - Couloir cuisine 2,
R-1 - Hall,
R-1 - Self,
R-1 - Salle de restaurant,
R-1 - Terrasse,
R-1 - Véranda,
R-1 - Bar,
R-1 - Réserve Bar,
R-1 - Wc Public,
R-2 - Façades extérieures,
R-2 - Ciblerie,
Rez de chaussée - Hall d'entrée,
Rez de chaussée - Salle de réception,
Rez de chaussée - Salle de réception 2,
Rez de chaussée - Circulation,
Rez de chaussée - Palier escalier rond,
R-1 - Vestiaire femme,
R-1 - Entrée cuisine,
R-1 - Legumerie,
R-2 - Local remise

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Aucun
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Aucun
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Aucun

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : **11/03/2026**
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : **17/03/2026**
Heure d'arrivée : **09 h 30**
Durée du repérage : **02 h 20**
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : **Sans accompagnateur**

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.
Remarques :
panneaux bois etage rdc

4.5 Commentaires

Locaux occupés et meublés le jour de la visite.

Attention : les analyses des matériaux type enduits montrent une absence d'amiante : ces prélèvements ont peut-être été réalisés à côté d'enduit de débullage ou de lissage qui peut contenir de l'amiante. Il peut être présent sur l'ensemble des supports murs et plafonds.

En cas de résultats hétérogènes sur ces enduits, des analyses complémentaires devront être faites afin de déterminer plus précisément la présence ou l'absence d'amiante.

5. – Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

M002 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Enduit extérieur Façade beige).

Niveau : R-2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façades extérieures	1	Identifiant :M002 Description :Enduit extérieur Façade beige Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Façades extérieures	P002	

M004 : Partie à inspecter : Joint de dilatation.

Niveau : R-2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone couverte	1	Identifiant :M004 Description :Joint de dilatation Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Zone couverte	P004	

M007 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Enduit extérieur Façade blanc).

Niveau : R-2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façades extérieures	1	Identifiant :M007 Description :Enduit extérieur Façade blanc Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Façades extérieures	P007	

M013 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Enduit extérieur Sur mur pour installation rampe pmr).

Niveau : R-2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Extérieur	1	Identifiant :M013 Description :Enduit extérieur Sur mur pour installation rampe pmr Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Extérieur	P013	

M014 : Partie à inspecter : Joint de dilatation (Joint de dilatation mur extérieur).

Niveau : R-2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Extérieur	1	Identifiant :M014 Description :Joint de dilatation mur extérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Extérieur	P014	


M046 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Joint de mastic de vitrage Sur châssis alu).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement sur escaliers; R-1 - WC1; R-1 - Couloir cuisine 2; Rez de chaussée - Palier escalier rond	**1**	**Identifiant :M046 Description :Joint de mastic de vitrage Sur châssis alu Résultat : Présence d'amiante**	**Oui R-1 - Couloir cuisine 2 Et sur ZPSO**	**P046**	

M062 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Joint de mastic de vitrage Sur chassis metal).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve Epicerie	**1**	**Identifiant :M062 Description :Joint de mastic de vitrage Sur chassis metal Résultat : Présence d'amiante**	**Oui R-1 - Réserve Epicerie**	**P062**	

M063 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (Joint de mastic de vitrage Châssis métal peint).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chambres froides	**1**	**Identifiant :M063 Description :Joint de mastic de vitrage Châssis métal peint Résultat : Présence d'amiante**	**Oui R-1 - Local chambres froides**	**P063**	

M078 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Enduit extérieur Façade).

Niveau : R-2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façades extérieures	1	Identifiant :M078 Description :Enduit extérieur Façade Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Façades extérieures	P078	


M079 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Enduit extérieur Façade restaurant).					
Niveau : R-2					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Façades extérieures	1	Identifiant :M079 Description :Enduit extérieur Façade restaurant Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Façades extérieures	P079	

M080 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Enduit extérieur Escaliers).					
Niveau : R-2					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Façades extérieures	1	Identifiant :M080 Description :Enduit extérieur Escaliers Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Façades extérieures	P080	

M081 : Partie à inspecter : Appui de fenêtres.					
Niveau : R-2					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Façades extérieures	1	Identifiant :M081 Description :Appui de fenêtres Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Façades extérieures	P081	

M088 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Enduit extérieur Parapet).					
Niveau : R-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Plateforme devant monte charge	1	Identifiant :M088 Description :Enduit extérieur Parapet Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Plateforme devant monte charge	P088	

2 - Parois verticales intérieures

M016 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit Mural plâtre refend).					
Niveau : R-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Local poubelles	1	Identifiant :M016 Description :Enduit Mural plâtre refend Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Local poubelles	P016	

M017 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit mural refend).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement cuisine; R-1 - Réserve Epicerie; R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Dégagement 3; R-1 - Dégagement 4; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Dégagement 2; R-1 - Sas distribution; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - Couloir cuisine 2	1	Identifiant :M017 Description :Enduit mural refend Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Dégagement cuisine et sur ZPSO	P017	

M018 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit cloison plâtre.).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
R-1 – Laverie R-1 - Bureau; R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Dégagement 2; R-1 - Sas distribution; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - WC1	1	Identifiant :M018 Description :Enduit cloison plâtre. Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 Laverie Et sur ZPSO	P018	

M022 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 15X15 blanche).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve Epicerie	1	Identifiant :M022 Description :Colle de faïence 15X15 blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Réserve Epicerie	P022	

M024 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend)).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve Epicerie	1	Identifiant :M024 Description :Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend) Résultat : Absence d'amiante	Oui R -1 reserve épicerie	P024	

M026 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence jaune douche).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vestiaire hommes	1	Identifiant :M026 Description :Colle de faïence jaune douche Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Vestiaire hommes	P026	

M027 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de Plinthes).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vestiaire hommes	1	Identifiant :M027 Description :Colle de Plinthes Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Vestiaire hommes	P027	

M028 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment + peinture crépi mur refend).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vestiaire hommes	1	Identifiant :M028 Description :Enduit à base de ciment + peinture crépi mur refend Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Vestiaire hommes	P028	

M032 : Partie à inspecter : Joint d'assemblage (Joint d'assemblage entre parpaing).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve boissons; R-1 - Local chambres froides	1	Identifiant :M032 Description :Joint d'assemblage entre parpaing Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Local chambres froides Et sur ZPSO	P032	

M035 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend)).

Niveau : R-2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Ciblerie	1	Identifiant :M035 Description :Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend) Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Ciblerie	P035	

M036 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit ciment plâtre peinture embrasure fenêtres).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Self; R-1 - Salle de restaurant	1	Identifiant :M036 Description :Enduit ciment plâtre peinture embrasure fenêtres Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Salle de restaurant Et sur ZPSO	P036	

M037 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit Ciment mur façade).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de restaurant	1	Identifiant :M037 Description :Enduit Ciment mur façade Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Salle de restaurant	P037	

M038 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit Plâtre sous tdvp).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Self	1	Identifiant :M038 Description :Enduit Plâtre sous tdvp Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Self	P038	

M039 : Partie à inspecter : Bandes calicot.

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Self; R-1 - Salle de restaurant	1	Identifiant :M039 Description :Bandes calicot Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Salle de restaurant Et sur ZPSO	P039	

M050 : Partie à inspecter : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés (Plaque plâtre doublage façade).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Véranda	1	Identifiant :M050 Description :Plaque plâtre doublage façade Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Véranda	P050	

M051 : Partie à inspecter : Joint d'assemblage (Joint d'assemblage briquette parement).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bar	1	Identifiant :M051 Description :Joint d'assemblage briquette parement Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Bar	P051	


M052 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment Sous tdvp embrasure porte).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc Public	1	Identifiant :M052 Description :Enduit à base de ciment Sous tdvp embrasure porte Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Wc Public	P052	

M053 : Partie à inspecter : Bandes calicot (Bandes calicot +plâtre mur cloison Sous tdvp).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc Public	1	Identifiant :M053 Description :Bandes calicot +plâtre mur cloison Sous tdvp Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Wc Public	P053	

M055 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit mur refend Ciment sous TDVP).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc Public	1	Identifiant :M055 Description :Enduit mur refend Ciment sous TDVP Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Wc Public	P055	

M057 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence rose).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc Public	1	Identifiant :M057 Description :Colle de faïence rose Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Wc Public	P057	

M061 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit ciment + peinture type crépi jaune refend).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :M061 Description :Enduit ciment + peinture type crépi jaune refend Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Hall	P061	

M066 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit béton mur sur extérieur.).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier rond	1	Identifiant :M066 Description :Enduit béton mur sur extérieur. Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Escalier	P066	

M067 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) (Enduit à base de ciment + peinture poteau escalier).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier rond	1	Identifiant :M067 Description :Enduit à base de ciment + peinture poteau escalier Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Escalier rond	P067	

M070 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit Ciment + peinture type crépi refend).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement sur escaliers rond	1	Identifiant :M070 Description :Enduit Ciment + peinture type crépi refend Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Dégagement sur escaliers	P070	

M071 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend)).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
WC1; R-1 - Lavabo	1	Identifiant :M071 Description :Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend) Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Lavabo Et sur ZPSO	P071	

M072 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence blanche).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
WC1; R-1 - Lavabo	1	Identifiant :M072 Description :Colle de faïence blanche Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Lavabo Et sur ZPSO	P072	

M073 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit à base de plâtre + peinture (mur cloisons)).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Lavabo	1	Identifiant :M073 Description :Enduit à base de plâtre + peinture (mur cloisons) Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Lavabo	P073	

M084 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit Ciment refend peinture crépi jaune).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation	1	Identifiant :M084 Description :Enduit Ciment refend peinture crépi jaune Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Circulation	P084	

M085 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence 15 X15).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Legumerie	1	Identifiant :M085 Description :Colle de faïence 15 X15 Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Legumerie Et sur ZPSO	P085	

M086 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit Ciment peinture Refend).					
Niveau : R-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Dégagement cuisine; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Legumerie	1	Identifiant :M086 Description :Enduit Ciment peinture Refend Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Legumerie Et sur ZPSO	P086	

4 - Plafonds et faux plafonds

M010 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment Plafond).					
Niveau : R-2					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Zone couverte	1	Identifiant :M010 Description :Enduit à base de ciment Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Zone couverte	P010	

M023 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit Plafond).					
Niveau : R-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Lingerie; R-1 - Dégagement reserve; R-1 - Réserve Epicerie; R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Dégagement 2; R-1 - Sas distribution; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - WC1; R-1 - Lavabo; R-1 - Couloir cuisine 2; R-1 - Bureau	1	Identifiant :M023 Description :Enduit Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Bureau Et sur ZPSO	P023	

M029 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment + peinture (plafond)).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vestiaire hommes	1	Identifiant :M029 Description :Enduit à base de ciment + peinture (plafond) Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 Vestiaire hommes	P029	

M033 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment + peinture (plafond)).

Niveau : R-2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Armurerie 1; R-2 - Soute 1 (armurerie); R-2 - Soute 2 (Armurerie); R-2 - Armement	1	Identifiant :M033 Description :Enduit à base de ciment + peinture (plafond) Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Armurerie 1 Et sur ZPSO	P033	


M040 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit Ciment peinture plafond).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Self	1	Identifiant :M040 Description :Enduit Ciment peinture plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Self	P040	

M056 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit Ciment / peinture plafond).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc Public; R-1 - Vestiaire femme	1	Identifiant :M056 Description :Enduit Ciment / peinture plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Wc Public Et sur ZPSO	P056	

M060 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit ciment poutre soutènement plafond).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc Public; R-1 - Vestiaire femme	1	Identifiant :M060 Description :Enduit ciment poutre soutènement plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Vestiaire femme Et sur ZPSO	P060	

M068 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit béton + peinture plafond).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier rond ; R-1 - Dégagement sur escaliers; R-1 - Couloir cuisine 2	1	Identifiant :M068 Description :Enduit béton + peinture plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Escalier rond Et sur ZPSO	P068	

M074 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment + peinture (plafond)).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
WC1; R-1 - Lavabo	1	Identifiant :M074 Description :Enduit à base de ciment + peinture (plafond) Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Lavabo Et sur ZPSO	P074	

M075 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment Plafond).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local Ménage Entretien	1	Identifiant :M075 Description :Enduit à base de ciment Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 Local Ménage Et sur ZPSO	P075	

M076 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment (plafond)).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local chambres froides	1	Identifiant :M076 Description :Enduit à base de ciment (plafond) Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Local chambres froides	P076	

M087 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment + peinture (plafond)).					
Niveau : R-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Dégagement cuisine; R-1 - Chambre froide 1; R-1 - Chambre froide 2; R-1 - Chambre froide 3; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Legumerie	1	Identifiant :M087 Description :Enduit à base de ciment + peinture (plafond) Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Dégagement cuisine Et sur ZPSO	P087	

M089 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment + peinture (plafond)).					
Niveau : R-2					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Local débarras cuisine exterieur	1	Identifiant :M089 Description :Enduit à base de ciment + peinture (plafond) Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Local débarras cuisine	P089	

5 - Planchers et planchers techniques

M003 : Partie à inspecter : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) (Sol coulé à base ciment).					
Niveau : R-2					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Zone couverte	1	Identifiant :M003 Description :Sol coulé à base ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Zone couverte	P003	

M005 : Partie à inspecter : marches (Marches béton).					
Niveau : R-2					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier extérieur	1	Identifiant :M005 Description :Marches béton Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Escalier extérieur	P005	

M006 : Partie à inspecter : Nez de marche (Nez de marche béton).

Niveau : R-2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier extérieur	1	Identifiant :M006 Description :Nez de marche béton Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Escalier extérieur	P006	

M008 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Plateforme devant monte charge	1	Identifiant :M008 Description :Colle de carrelage Quantification : 7 m2 Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Plateforme devant monte charge	P008	

M009 : Partie à inspecter : Joint de dilatation et d'assemblage (Joint de dilatation et d'assemblage seuil de porte).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Plateforme devant monte charge	1	Identifiant :M009 Description :Joint de dilatation et d'assemblage seuil de porte Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Plateforme devant monte charge	P009	

M011 : Partie à inspecter : Sol coulé à base ciment (Chape béton).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Plateforme devant monte charge	1	Identifiant :M011 Description :Chape béton Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Plateforme devant monte charge	P011	

M012 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage + joint).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement cuisine; R-1 - Dégagement 2	1	Identifiant :M012 Description :Colle de carrelage + joint Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Dégagement cuisine Et sur ZPSO	P012	

M015 : Partie à inspecter : Ragréage (Ragréage sous lino).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local poubelles	1	Identifiant :M015 Description :Ragréage sous lino Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Local poubelles	P015	

M019 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Dalle de sol Beige + colle + ragréage).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau; R-1 - Réserve Epicerie	1	Identifiant :M019 Description :Dalle de sol Beige + colle + ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Réserve Epicerie Et sur ZPSO	P019	

M020 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Dalle de sol Bleue + colle + ragréage sous lino).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement reserve	1	Identifiant :M020 Description :Dalle de sol Bleue + colle + ragréage sous lino Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Dégagement reserve	P020	


M021 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse (Colle non bitumineuse sous lino).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve Epicerie	1	Identifiant :M021 Description :Colle non bitumineuse sous lino Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Réserve Epicerie	P021	

M025 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vestiaire hommes	1	Identifiant :M025 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Vestiaire hommes	P025	


M030 : Partie à inspecter : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) (Sol coulé à base ciment + peinture fibrée).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 3	1	Identifiant :M030 Description :Sol coulé à base ciment + peinture fibrée Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Dégagement 3	P030	

M031 : Partie à inspecter : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) (Chape béton).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local Ménage Entretien; R-1 - Local chambres froides; R-1 - Reserve boissons	1	Identifiant :M031 Description :Chape béton Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Local chambres froides Et sur ZPSO	P031	

M034 : Partie à inspecter : Sol coulé à base ciment (terrazolith...) (Sol coulé à base ciment).

Niveau : R-2

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Ciblerie	1	Identifiant :M034 Description :Sol coulé à base ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Ciblerie	P034	

M041 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de Plinthes Marron clair).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Self; R-1 - Salle de restaurant	1	Identifiant :M041 Description :Colle de Plinthes Marron clair Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Salle de restaurant Et sur ZPSO	P041	

M042 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de Plinthes marron foncé.).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de restaurant	**1**	**Identifiant :M042** **Description :Colle de Plinthes marron foncé.** **Résultat : Présence d'amiante**	**Oui** **R-1 - Salle de restaurant**	**P042**	

M043 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage jonction couloir / restaurant).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de restaurant	1	Identifiant :M043 Description :Colle de carrelage jonction couloir / restaurant Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Salle de restaurant	P043	

M044 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage + chape).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Self; R-1 - Salle de restaurant; Rez de chaussée - Hall d'entrée; Rez de chaussée - Salle de réception; Rez de chaussée - Circulation; Rez de chaussée - Palier escalier rond	1	Identifiant :M044 Description :Colle de carrelage + chape Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Salle de restaurant Et sur ZPSO	P044	

M045 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de plinthes).

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation; Rez de chaussée - Palier escalier rond	1	Identifiant :M045 Description :Colle de plinthes Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Palier escalier rond Et sur ZPSO	P045	

M047 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage beige).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir cuisine; R-1 - Chambre froide 1; R-1 - Chambre froide 2; R-1 - Chambre froide 3; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Dégagement sur escaliers; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - WC1; R-1 - Lavabo; R-1 - Couloir cuisine 2	1	Identifiant :M047 Description :Colle de carrelage beige Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Couloir cuisine 2 Et sur ZPSO	P047	

M048 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de Plinthes beige).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir cuisine; R-1 - Chambre froide 1; R-1 - Chambre froide 2; R-1 - Chambre froide 3; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Dégagement sur escaliers; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - WC1; R-1 - Lavabo; R-1 - Couloir cuisine 2; R-1 - Bar	1	Identifiant :M048 Description :Colle de Plinthes beige Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Couloir cuisine 2 Et sur ZPSO	P048	

M049 : Partie à inspecter : Ragréage (Ragréage sous carrelage + joint sur carrelage idem restaurant).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Véranda; R-1 - Bar	1	Identifiant :M049 Description :Ragréage sous carrelage + joint sur carrelage idem restaurant Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Bar Et sur ZPSO	P049	

M054 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc Public	1	Identifiant :M054 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Wc Public	P054	

M058 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vestiaire femme	1	Identifiant :M058 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Vestiaire femme	P058	

M059 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de Plinthes noires).

Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Vestiaire femme	1	Identifiant :M059 Description :Colle de Plinthes noires Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Vestiaire femme	P059	


M064 : Partie à inspecter : marche (Marches béton).


Niveau : R-1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier rond	1	Identifiant :M064 Description :Marches béton Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Escalier rond	P064	


M065 : Partie à inspecter : Escalier (Limon béton peint).					
Niveau : R-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier rond	1	Identifiant :M065 Description :Limon béton peint Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Escalier	P065	

M069 : Partie à inspecter : Nez de marche (Colle sous Nez de marche pvc).					
Niveau : R-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Escalier rond	1	Identifiant :M069 Description :Colle sous Nez de marche pvc Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Escalier rond	P069	

M082 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Hall d'entrée; Rez de chaussée - Circulation	1	Identifiant :M082 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Hall d'entrée Et sur ZPSO	P082	

M083 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de Plinthes).					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Hall d'entrée; Rez de chaussée - Salle de réception; Rez de chaussée - Salle de réception 2; Rez de chaussée - Circulation	1	Identifiant :M083 Description :Colle de Plinthes Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée – Circulation Et sur ZPSO	P083	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO01 : Partie à inspecter : Conduit en fibres-ciment.					
Niveau : R-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Vestiaire femme	**1**	**Identifiant :ZPSO01 Description :Conduit en fibres-ciment Résultat : Présence d'amiante**	**Sur Zone présentant des similitudes d'ouvrages avec le conduit présent dans le local ménage**		

M077 : Partie à inspecter : Conduit en fibres-ciment.					
Niveau : R-1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Local Ménage Entretien	**1**	**Identifiant :M077** **Description :Conduit en fibres-ciment** **Résultat : Présence d'amiante**	**Oui** **R-1 - Local Ménage Entretien**	**P077**	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

M001 : Partie à inspecter : Asphalte.					
Niveau : R-2					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Extérieur	1	Identifiant :M001 Description :Asphalte Résultat : Absence d'amiante	Oui R-2 - Extérieur	P001	

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Sans objet

5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone	**Identifiant + Description**	**Conclusion (justification)**	**Photo**
M001	Localisation : R-2 - Extérieur Echantillons : P001 Description : Asphalte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M002	Localisation : R-2 - Façades extérieures Echantillons : P002 Description : Enduit extérieur Façade beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M003	Localisation : R-2 - Zone couverte Echantillons : P003 Description : Sol coulé à base ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M004	Localisation : R-2 - Zone couverte Echantillons : P004 Description : Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M005	Localisation : R-2 - Escalier extérieur Echantillons : P005 Description : Marches béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M006	Localisation : R-2 - Escalier extérieur Echantillons : P006 Description : Nez de marche béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M007	Localisation : R-2 - Façades extérieures Echantillons : P007 Description : Enduit extérieur Façade blanc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M008	Localisation : R-1 - Plateforme devant monte charge Echantillons : P008 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M009	Localisation : R-1 - Plateforme devant monte charge Echantillons : P009 Description : Joint de dilatation et d'assemblage seuil de porte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M010	Localisation : R-2 - Zone couverte Echantillons : P010 Description : Enduit à base de ciment Plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M011	Localisation : R-1 - Plateforme devant monte charge Echantillons : P011 Description : Chape béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M012	Localisation : R-1 - Dégagement cuisine; R-1 - Dégagement 2 Echantillons : P012 Description : Colle de carrelage + joint	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M013	Localisation : R-2 - Extérieur Echantillons : P013 Description : Enduit extérieur Sur mur pour installation rampe pmr	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M014	Localisation : R-2 - Extérieur Echantillons : P014 Description : Joint de dilatation mur extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M015	Localisation : R-1 - Local poubelles Echantillons : P015 Description : Ragréage sous lino	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M016	Localisation : R-1 - Local poubelles Echantillons : P016 Description : Enduit Mural plâtre refend	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M017	Localisation : R-1 - Dégagement cuisine; R-1 - Réserve Epicerie; R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Dégagement 3; R-1 - Dégagement 4; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Dégagement 2; R-1 - Sas distribution; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - Couloir cuisine 2 Echantillons : P017 Description : Enduit mural refend	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M018	Localisation : R-1 - Bureau; R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Dégagement 2; R-1 - Sas distribution; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - WC1 Echantillons : P018 Description : Enduit cloison plâtre.	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M019	Localisation : R-1 - Bureau; R-1 - Réserve Epicerie Echantillons : P019 Description : Dalle de sol Beige + colle + ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M020	Localisation : R-1 - Dégagement reserve Echantillons : P020 Description : Dalle de sol Bleue + colle + ragréage sous lino	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M021	Localisation : R-1 - Réserve Epicerie Echantillons : P021 Description : Colle non bitumineuse sous lino	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M022	Localisation : R-1 - Réserve Epicerie Echantillons : P022 Description : Colle de faïence 15X15 blanche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M023	Localisation : R-1 - Lingerie; R-1 - Dégagement reserve; R-1 - Réserve Epicerie; R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Dégagement 2; R-1 - Sas distribution; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - WC1; R-1 - Lavabo; R-1 - Couloir cuisine 2; R-1 - Bureau Echantillons : P023 Description : Enduit Plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M024	Localisation : R-1 - Réserve Epicerie Echantillons : P024 Description : Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M025	Localisation : R-1 - Vestiaire hommes Echantillons : P025 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M026	Localisation : R-1 - Vestiaire hommes Echantillons : P026 Description : Colle de faïence jaune douche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M027	Localisation : R-1 - Vestiaire hommes Echantillons : P027 Description : Colle de Plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M028	Localisation : R-1 - Vestiaire hommes Echantillons : P028 Description : Enduit à base de ciment + peinture crépi mur refend	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M029	Localisation : R-1 - Vestiaire hommes Echantillons : P029 Description : Enduit à base de ciment + peinture (plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M030	Localisation : R-1 - Dégagement 3 Echantillons : P030 Description : Sol coulé à base ciment + peinture fibrée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M031	Localisation : R-1 - Local Ménage Entretien; R-1 - Local chambres froides; R-1 - Reserve boissons Echantillons : P031 Description : Chape béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

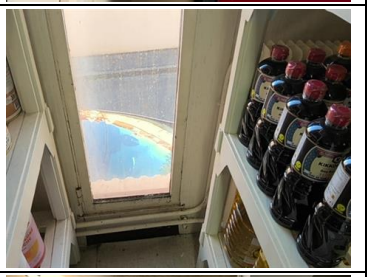
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M032	Localisation : R-1 - Réserve boissons; R-1 - Local chambres froides Echantillons : P032 Description : Joint d'assemblage entre parpaing	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M033	Localisation : R-2 - Armurerie 1; R-2 - Soute 1 (armurerie); R-2 - Soute 2 (Armurerie); R-2 - Armement Echantillons : P033 Description : Enduit à base de ciment + peinture (plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M034	Localisation : R-2 - Ciblerie Echantillons : P034 Description : Sol coulé à base ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M035	Localisation : R-2 - Ciblerie Echantillons : P035 Description : Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M036	Localisation : R-1 - Self; R-1 - Salle de restaurant Echantillons : P036 Description : Enduit ciment plâtre peinture embrasure fenêtres	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M037	Localisation : R-1 - Salle de restaurant Echantillons : P037 Description : Enduit Ciment mur façade	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M038	Localisation : R-1 - Self Echantillons : P038 Description : Enduit Plâtre sous tdvp	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M039	Localisation : R-1 - Self; R-1 - Salle de restaurant Echantillons : P039 Description : Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M040	Localisation : R-1 - Self Echantillons : P040 Description : Enduit Ciment peinture plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M041	Localisation : R-1 - Self; R-1 - Salle de restaurant Echantillons : P041 Description : Colle de Plinthes Marron clair	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M042	Localisation : R-1 - Salle de restaurant Echantillons : P042 Description : Colle de Plinthes marron foncé.	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M043	Localisation : R-1 - Salle de restaurant Echantillons : P043 Description : Colle de carrelage jonction couloir / restaurant	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M044	Localisation : R-1 - Self; R-1 - Salle de restaurant; Rez de chaussée - Hall d'entrée; Rez de chaussée - Salle de réception; Rez de chaussée - Circulation; Rez de chaussée - Palier escalier rond Echantillons : P044 Description : Colle de carrelage + chape	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M045	Localisation : Rez de chaussée - Circulation; Rez de chaussée - Palier escalier rond Echantillons : P045 Description : Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M046	Localisation : R-1 - Dégagement sur escaliers; R-1 - WC1; R-1 - Couloir cuisine 2; Rez de chaussée - Palier escalier rond Echantillons : P046 Description : Joint de mastic de vitrage Sur châssis alu	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M047	Localisation : R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Chambre froide 1; R-1 - Chambre froide 2; R-1 - Chambre froide 3; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Dégagement sur escaliers; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - WC1; R-1 - Lavabo; R-1 - Couloir cuisine 2 Echantillons : P047 Description : Colle de carrelage beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M048	Localisation : R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Chambre froide 1; R-1 - Chambre froide 2; R-1 - Chambre froide 3; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Dégagement sur escaliers; R-1 - Local électrique; R-1 - Local poubelles; R-1 - WC1; R-1 - Lavabo; R-1 - Couloir cuisine 2; R-1 - Bar Echantillons : P048 Description : Colle de Plinthes beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M049	Localisation : R-1 - Véranda; R-1 - Bar Echantillons : P049 Description : Ragréage sous carrelage + joint sur carrelage idem restaurant	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M050	Localisation : R-1 - Véranda Echantillons : P050 Description : Plaque plâtre doublage façade	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M051	Localisation : R-1 - Bar Echantillons : P051 Description : Joint d'assemblage briquette parement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M052	Localisation : R-1 - Wc Public Echantillons : P052 Description : Enduit à base de ciment Sous tdvp embrasure porte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M053	Localisation : R-1 - Wc Public Echantillons : P053 Description : Bandes calicot +plâtre mur cloison Sous tdvp	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M054	Localisation : R-1 - Wc Public Echantillons : P054 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M055	Localisation : R-1 - Wc Public Echantillons : P055 Description : Enduit mur refend Ciment sous TDVP	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M056	Localisation : R-1 - Wc Public; R-1 - Vestiaire femme Echantillons : P056 Description : Enduit Ciment / peinture plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M057	Localisation : R-1 - Wc Public Echantillons : P057 Description : Colle de faïence rose	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M058	Localisation : R-1 - Vestiaire femme Echantillons : P058 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M059	Localisation : R-1 - Vestiaire femme Echantillons : P059 Description : Colle de Plinthes noires	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M060	Localisation : R-1 - Wc Public; R-1 - Vestiaire femme Echantillons : P060 Description : Enduit ciment poutre soutènement plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M061	Localisation : R-1 - Hall Echantillons : P061 Description : Enduit ciment + peinture type crépi jaune refend	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO01	Localisation : R-1 - Vestiaire femme Echantillons : Description : Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Zones présentant des similitudes d'ouvrages)	
M062	Localisation : R-1 - Réserve Epicerie Echantillons : P062 Description : Joint de mastic de vitrage Sur chassis metal	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M063	Localisation : R-1 - Local chambres froides Echantillons : P063 Description : Joint de mastic de vitrage Châssis métal peint	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M064	Localisation : R-1 - Escalier rond Echantillons : P064 Description : Marches béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M065	Localisation : R-1 - Escalier rond Echantillons : P065 Description : Limon béton peint	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M066	Localisation : R-1 - Escalier rond Echantillons : P066 Description : Enduit béton mur sur extérieur.	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M067	Localisation : R-1 - Escalier rond Echantillons : P067 Description : Enduit à base de ciment + peinture poteau escalier	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M068	Localisation : R-1 - Escalier rond ; R-1 - Dégagement sur escaliers; R-1 - Couloir cuisine 2 Echantillons : P068 Description : Enduit béton + peinture plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M069	Localisation : R-1 - Escalier rond Echantillons : P069 Description : Colle sous Nez de marche pvc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M070	Localisation : R-1 - Dégagement sur escaliers rond Echantillons : P070 Description : Enduit Ciment + peinture type crépi refend	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M071	Localisation : R-1 - WC1; R-1 - Lavabo Echantillons : P071 Description : Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M072	Localisation : R-1 - WC1; R-1 - Lavabo Echantillons : P072 Description : Colle de faïence blanche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M073	Localisation : R-1 - Lavabo Echantillons : P073 Description : Enduit à base de plâtre + peinture (mur cloisons)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M074	Localisation : R-1 - WC1; R-1 - Lavabo Echantillons : P074 Description : Enduit à base de ciment + peinture (plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M075	Localisation : R-1 - Local Ménage Entretien Echantillons : P075 Description : Enduit à base de ciment Plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M076	Localisation : R-1 - Local chambres froides Echantillons : P076 Description : Enduit à base de ciment (plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M077	Localisation : R-1 - Local Ménage Entretien Echantillons : P077 Description : Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M078	Localisation : R-2 - Façades extérieures Echantillons : P078 Description : Enduit extérieur Façade	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M079	Localisation : R-2 - Façades extérieures Echantillons : P079 Description : Enduit extérieur Façade restaurant	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M080	Localisation : R-2 - Façades extérieures Echantillons : P080 Description : Enduit extérieur Escaliers	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M081	Localisation : R-2 - Façades extérieures Echantillons : P081 Description : Appui de fenêtres	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M082	Localisation : Rez de chaussée - Hall d'entrée; Rez de chaussée - Circulation Echantillons : P082 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M083	Localisation : Rez de chaussée - Hall d'entrée; Rez de chaussée - Salle de réception; Rez de chaussée - Salle de réception 2; Rez de chaussée - Circulation Echantillons : P083 Description : Colle de Plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M084	Localisation : Rez de chaussée - Circulation Echantillons : P084 Description : Enduit Ciment refend peinture crépi jaune	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M085	Localisation : R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Legumerie Echantillons : P085 Description : Colle de faïence 15 X15	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M086	Localisation : R-1 - Dégagement cuisine; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Legumerie Echantillons : P086 Description : Enduit Ciment peinture Refend	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M087	Localisation : R-1 - Dégagement cuisine; R-1 - Chambre froide 1; R-1 - Chambre froide 2; R-1 - Chambre froide 3; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Legumerie Echantillons : P087 Description : Enduit à base de ciment + peinture (plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M088	Localisation : R-1 - Plateforme devant monte charge Echantillons : P088 Description : Enduit extérieur Parapet	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M089	Localisation : R-2 - Local débarras cuisine exterieur Echantillons : P089 Description : Enduit à base de ciment + peinture (plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

6. – Signatures

Nota : *Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par* ***I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE***

Fait à **CREIL** le **17/04/2026**

Par : VAILLANT Odile


ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 36727

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Recommandations générales de sécurité

7.4 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

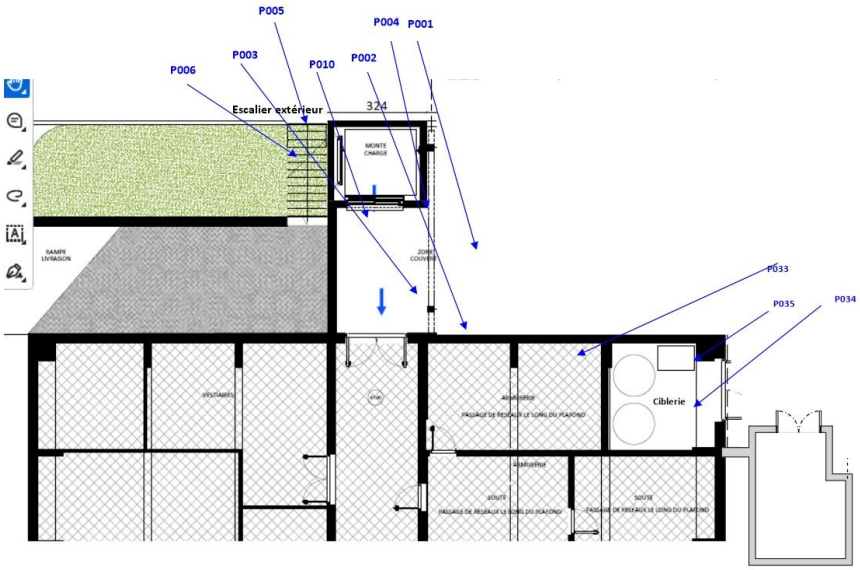


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ACOBEX, auteur : VAILLANT Odile

Dossier n° 36727 du 17/03/2026

Adresse du bien : Caserne GARIN
107 rue d'Elbeuf
N° engagement : (Non communiqué) 80000 AMIENS

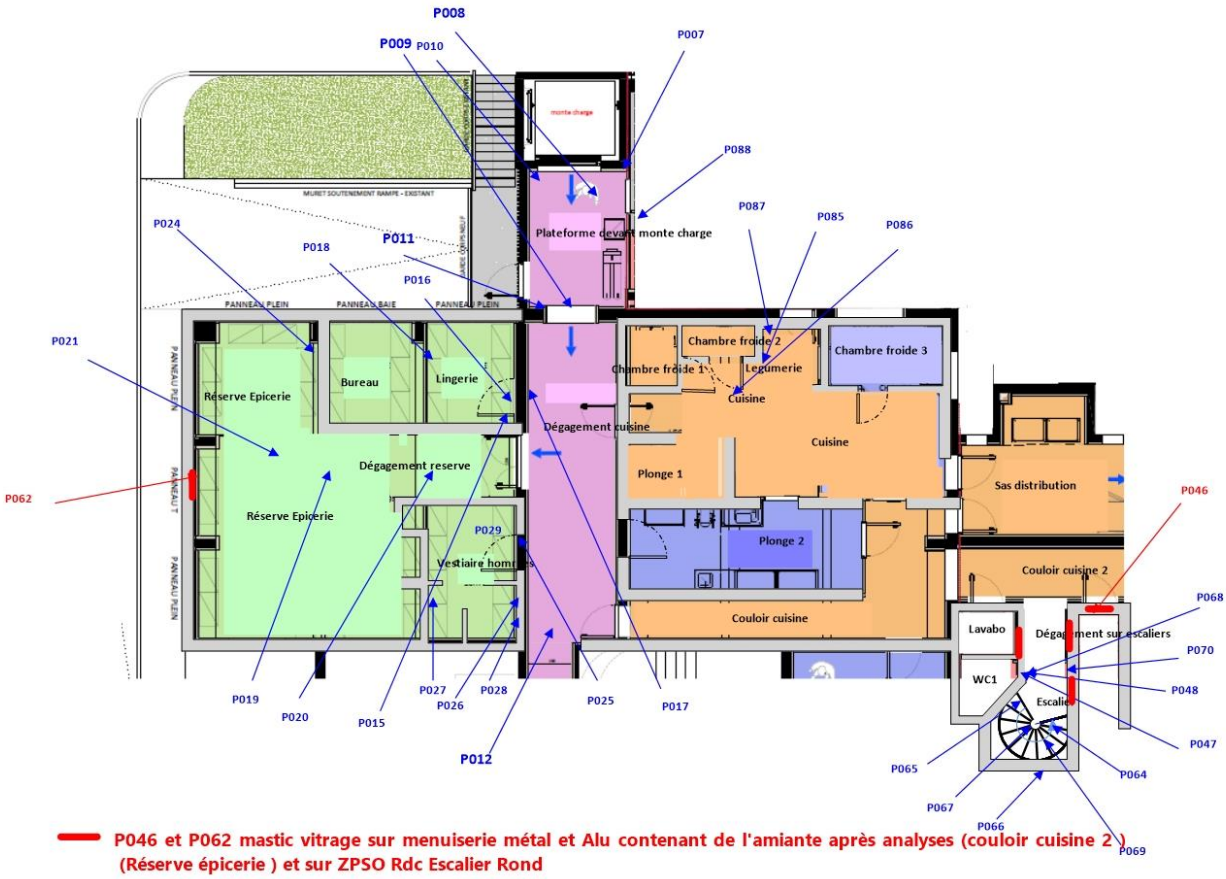
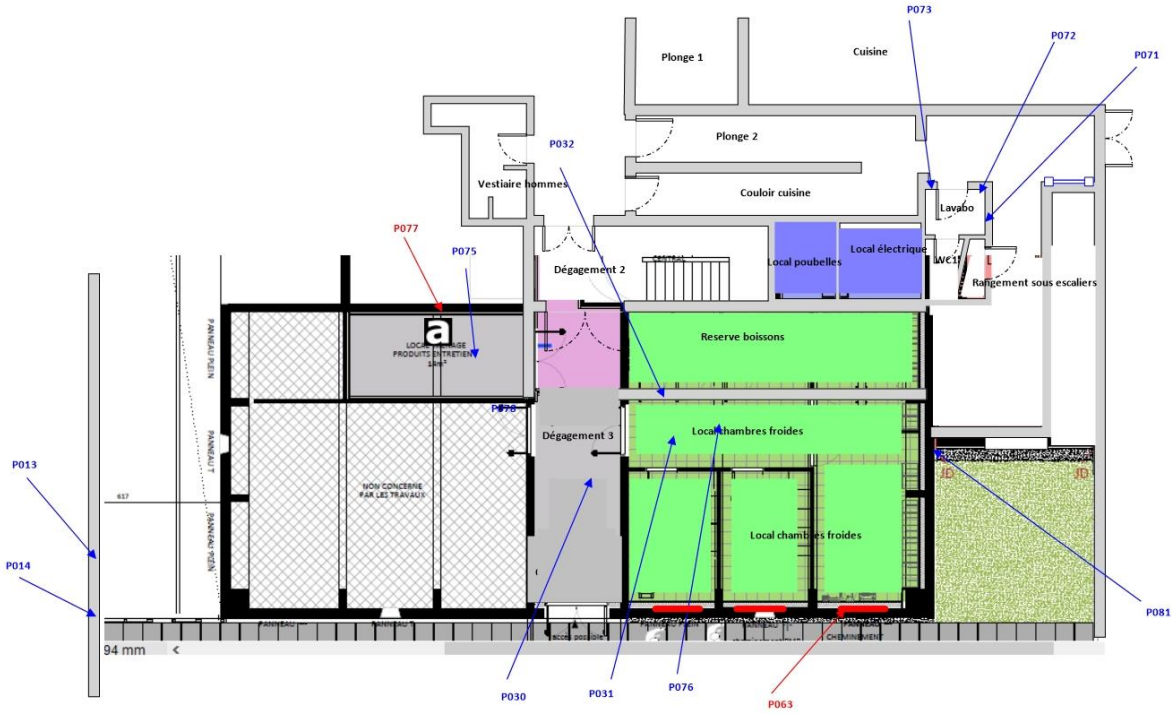


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ACOBEX, auteur : VAILLANT Odile

Dossier n° 36727 du 17/03/2026

Adresse du bien : Caserne GARIN
107 rue d'Elbeuf
N° engagement : (Non communiqué) 80000 AMIENS



P063 mastic vitrage sur menuiserie métalique contenant de l'amiante après analyses (Local Chambres froides) et sur ZPSO

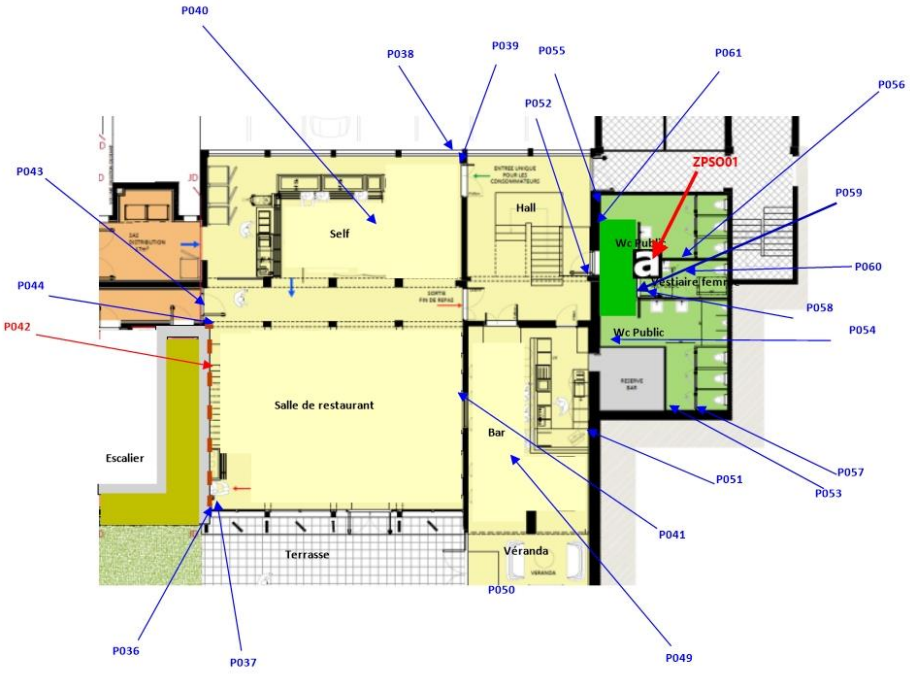
Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ACOBEX, auteur : VAILLANT Odile

Dossier n° 36727 du 17/03/2026

Adresse du bien : Caserne GARIN

107 rue d'Elbeuf

N° engagement : (Non communiqué) 80000 AMIENS



ZPSO01 Conduit fluides (air/eau) en fibro ciment contenant de l'amiante sur ZPSO avec le conduit présent dans le local ménage

P042 Colle de plinthes Marron foncé contenant de l'amiante après analyse (salle de Restaurant)

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ACOBEX, auteur : VAILLANT Odile

Dossier n° 36727 du 17/03/2026

Adresse du bien : Caserne GARIN
107 rue d'Elbeuf
N° engagement : (Non communiqué) 80000 AMIENS

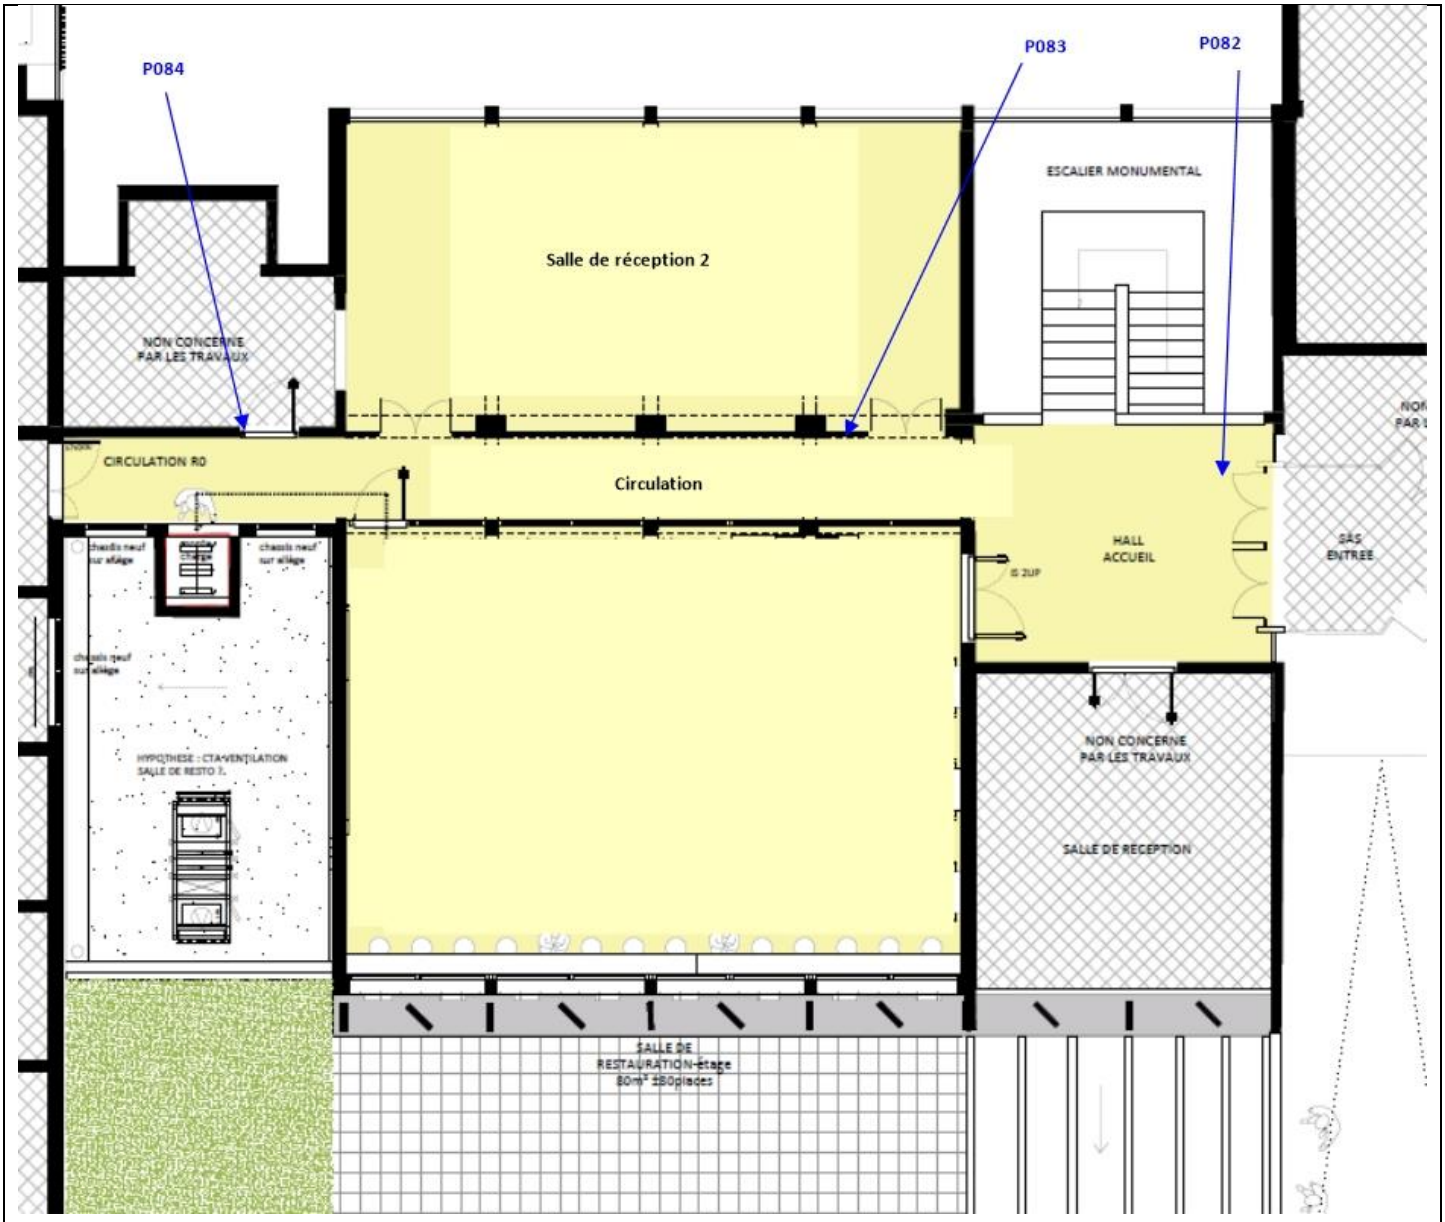


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ACOBEX, auteur : VAILLANT Odile

Dossier n° 36727 du 17/03/2026

Adresse du bien : Caserne GARIN
107 rue d'Elbeuf
N° engagement : (Non communiqué) 80000 AMIENS

Légende :

Pxx : Matériau ou produit contenant de l'amiante après analyse

Pxx : Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante après analyse

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
M001-P001	R-2 - Extérieur	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	Asphalte	Asphalte **Réf. laboratoire:** AM26-03108.001
M002-P002	R-2 - Façades extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur Façade beige **Réf. laboratoire:** AM26-03108.002
M003-P003	R-2 - Zone couverte	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith…)	Sol coulé à base ciment **Réf. laboratoire:** AM26-03108.003
M004-P004	R-2 - Zone couverte	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Joint de dilatation	Joint de dilatation **Réf. laboratoire:** AM26-03108.004
M005-P005	R-2 - Escalier extérieur	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	marches	Marches béton **Réf. laboratoire:** AM26-03108.005
M006-P006	R-2 - Escalier extérieur	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Nez de marche	Nez de marche béton **Réf. laboratoire:** AM26-03108.006
M007-P007	R-2 - Façades extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur Façade blanc **Réf. laboratoire:** AM26-03108.007
M008-P008	R-1 - Plateforme devant monte charge	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage **Réf. laboratoire:** AM26-03108.008
M009-P009	R-1 - Plateforme devant monte charge	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Joint de dilatation et d'assemblage	Joint de dilatation et d'assemblage seuil de porte **Réf. laboratoire:** AM26-03108.009

M010-P010	R-2 - Zone couverte	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment Plafond **Réf. laboratoire:** AM26-03108.010
M011-P011	R-1 - Plateforme devant monte charge	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment	Chape béton **Réf. laboratoire:** AM26-03108.011
M012-P012	R-1 - Dégagement cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage + joint **Réf. laboratoire:** AM26-03108.012
M013-P013	R-2 - Extérieur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur Sur mur pour installation rampe pmr **Réf. laboratoire:** AM26-03108.013
M014-P014	R-2 - Extérieur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Joint de dilatation	Joint de dilatation mur extérieur **Réf. laboratoire:** AM26-03108.090
M015-P015	R-1 - Local poubelles	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage sous lino **Réf. laboratoire:** AM26-03108.015
M016-P016	R-1 - Local poubelles	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit Mural plâtre refend **Réf. laboratoire:** AM26-03108.016
M017-P017	R-1 - Dégagement cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural refend **Réf. laboratoire:** AM26-03108.017
M018-P018	R-1 - Bureau; R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Dégagement 2; R-1 - Sas distribution; R-1 - Local électrique; R-1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit cloison plâtre. **Réf. laboratoire:** AM26-03108.018

	- Local poubelles; R-1 - WC1			
M019-P019	R-1 - Réserve Epicerie	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol Beige + colle + ragréage **Réf. laboratoire:** AM26-03108.092
M020-P020	R-1 - Dégagement reserve	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol Bleue + colle + ragréage sous lino **Réf. laboratoire:** AM26-03108.020
M021-P021	R-1 - Réserve Epicerie	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse sous lino **Réf. laboratoire:** AM26-03108.094
M022-P022	R-1 - Réserve Epicerie	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 15X15 blanche **Réf. laboratoire:** AM26-03108.022
M023-P023	R-1 - Bureau	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit Plafond **Réf. laboratoire:** AM26-03108.023
M024-P024	R-1 - Réserve Epicerie	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend) **Réf. laboratoire:** AM26-03108.024
M025-P025	R-1 - Vestiaire hommes	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage **Réf. laboratoire:** AM26-03108.025
M026-P026	R-1 - Vestiaire hommes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence jaune douche **Réf. laboratoire:** AM26-03108.026
M027-P027	R-1 - Vestiaire hommes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de Plinthes **Réf. laboratoire:** AM26-03108.027
M028-P028	R-1 - Vestiaire hommes	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment + peinture crépi mur refend

M029-P029	R-1 - Vestiaire hommes	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment + peinture (plafond) **Réf. laboratoire:** AM26-03108.029
M030-P030	R-1 - Dégagement 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith…)	Sol coulé à base ciment + peinture fibrée **Réf. laboratoire:** AM26-03108.030
M031-P031	R-1 - Local chambres froides	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith…)	Chape béton **Réf. laboratoire:** AM26-03108.031
M032-P032	R-1 - Local chambres froides	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint d'assemblage	Joint d'assemblage entre parpaing **Réf. laboratoire:** AM26-03108.032
M033-P033	R-2 - Armurerie 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment + peinture (plafond) **Réf. laboratoire:** AM26-03108.033
M034-P034	R-2 - Ciblerie	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith…)	Sol coulé à base ciment **Réf. laboratoire:** AM26-03108.034
M035-P035	R-2 - Ciblerie	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend) **Réf. laboratoire:** AM26-03108.035
M036-P036	R-1 - Salle de restaurant	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment plâtre peinture embrasure fenêtres **Réf. laboratoire:** AM26-03108.036
M037-P037	R-1 - Salle de restaurant	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit Ciment mur façade **Réf. laboratoire:** AM26-03108.037
M038-P038	R-1 - Self	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit Plâtre sous tdvp **Réf. laboratoire:** AM26-03108.038
M039-P039	R-1 - Salle de restaurant	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot

				Réf. laboratoire: AM26-03108.039
M040-P040	R-1 - Self	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit Ciment peinture plafond **Réf. laboratoire:** AM26-03108.040
M041-P041	R-1 - Salle de restaurant	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de Plinthes Marron clair **Réf. laboratoire:** AM26-03108.041
M042-P042	R-1 - Salle de restaurant	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de Plinthes marron foncé. **Réf. laboratoire:** AM26-03108.042
M043-P043	R-1 - Salle de restaurant	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage jonction couloir / restaurant **Réf. laboratoire:** AM26-03108.043
M044-P044	R-1 - Salle de restaurant	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage + chape **Réf. laboratoire:** AM26-03108.044
M045-P045	Rez de chaussée - Palier escalier rond	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de plinthes **Réf. laboratoire:** AM26-03108.045
M046-P046	R-1 - Couloir cuisine 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage Sur châssis alu **Réf. laboratoire:** AM26-03108.046
M047-P047	R-1 - Couloir cuisine 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage beige **Réf. laboratoire:** AM26-03108.047
M048-P048	R-1 - Couloir cuisine 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de Plinthes beige **Réf. laboratoire:** AM26-03108.048
M049-P049	R-1 - Bar	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage sous carrelage + joint sur carrelage idem restaurant **Réf. laboratoire:** AM26-03108.049

M050-P050	R-1 - Véranda	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Plaque plâtre doublage façade **Réf. laboratoire:** AM26-03108.050
M051-P051	R-1 - Bar	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Joint d'assemblage	Joint d'assemblage briquette parement **Réf. laboratoire:** AM26-03108.051
M052-P052	R-1 - Wc Public	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment Sous tdvp embrasure porte **Réf. laboratoire:** AM26-03108.052
M053-P053	R-1 - Wc Public	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot +plâtre mur cloison Sous tdvp **Réf. laboratoire:** AM26-03108.053
M054-P054	R-1 - Wc Public	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage **Réf. laboratoire:** AM26-03108.054
M055-P055	R-1 - Wc Public	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit mur refend Ciment sous TDVP **Réf. laboratoire:** AM26-03108.055
M056-P056	R-1 - Wc Public	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit Ciment / peinture plafond **Réf. laboratoire:** AM26-03108.056
M057-P057	R-1 - Wc Public	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence rose **Réf. laboratoire:** AM26-03108.057
M058-P058	R-1 - Vestiaire femme	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage **Réf. laboratoire:** AM26-03108.058
M059-P059	R-1 - Vestiaire femme	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de Plinthes noires **Réf. laboratoire:** AM26-03108.059
M060-P060	R-1 - Vestiaire femme	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment poutre soutènement plafond

				Réf. laboratoire: AM26-03108.060
M061-P061	R-1 - Hall	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment + peinture type crépi jaune refend **Réf. laboratoire:** AM26-03108.061
M062-P062	R-1 - Réserve Epicerie	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage Sur chassis metal **Réf. laboratoire:** AM26-03108.062
M063-P063	R-1 - Local chambres froides	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage Châssis métal peint **Réf. laboratoire:** AM26-03108.063
M064-P064	R-1 - Escalier rond	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	marche	Marches béton **Réf. laboratoire:** AM26-03108.064
M065-P065	R-1 - Escalier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Escalier	Limon béton peint **Réf. laboratoire:** AM26-03108.065
M066-P066	R-1 - Escalier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit béton mur sur extérieur. **Réf. laboratoire:** AM26-03108.066
M067-P067	R-1 - Escalier rond	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment + peinture poteau escalier **Réf. laboratoire:** AM26-03108.067
M068-P068	R-1 - Escalier rond	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit béton + peinture plafond **Réf. laboratoire:** AM26-03108.068
M069-P069	R-1 - Escalier rond	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Nez de marche	Colle sous Nez de marche pvc **Réf. laboratoire:** AM26-03108.069
M070-P070	R-1 - Dégagement sur escaliers	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit Ciment + peinture type crépi refend **Réf. laboratoire:** AM26-03108.070

M071-P071	R-1 - Lavabo	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment + peinture (mur de refend) **Réf. laboratoire:** AM26-03108.071
M072-P072	R-1 - Lavabo	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence blanche **Réf. laboratoire:** AM26-03108.072
M073-P073	R-1 - Lavabo	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre + peinture (mur cloisons) **Réf. laboratoire:** AM26-03108.073
M074-P074	R-1 - Lavabo	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment + peinture (plafond) **Réf. laboratoire:** AM26-03108.074
M075-P075	R-1 - Local Ménage Entretien	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment Plafond **Réf. laboratoire:** AM26-03108.075
M076-P076	R-1 - Local chambres froides	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment (plafond) **Réf. laboratoire:** AM26-03108.076
M077-P077	R-1 - Local Ménage Entretien	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment **Réf. laboratoire:** AM26-03108.077
M078-P078	R-2 - Façades extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur Façade **Réf. laboratoire:** AM26-03108.078
M079-P079	R-2 - Façades extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur Façade restaurant **Réf. laboratoire:** AM26-03108.079
M080-P080	R-2 - Façades extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur Escaliers **Réf. laboratoire:** AM26-03108.080

M081-P081	R-2 - Façades extérieures	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Appui de fenêtres	Appui de fenêtres **Réf. laboratoire:** AM26-03108.081
M082-P082	Rez de chaussée - Hall d'entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage **Réf. laboratoire:** AM26-03108.082
M083-P083	Rez de chaussée - Circulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de Plinthes **Réf. laboratoire:** AM26-03108.083
M084-P084	Rez de chaussée - Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit Ciment refend peinture crépi jaune **Réf. laboratoire:** AM26-03108.084
M085-P085	R-1 - Legumerie	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence 15 X15 **Réf. laboratoire:** AM26-03108.085
M086-P086	R-1 - Legumerie	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit Ciment peinture Refend **Réf. laboratoire:** AM26-03108.086
M087-P087	R-1 - Dégagement cuisine	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment + peinture (plafond) **Réf. laboratoire:** AM26-03108.087
M088-P088	R-1 - Plateforme devant monte charge	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur Parapet **Réf. laboratoire:** AM26-03108.088
M089-P089	R-2 - Local débarras cuisine	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment + peinture (plafond) **Réf. laboratoire:** AM26-03108.089

Copie des rapports d'essais :

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik

Commentaire:
- Référence Commande : 36727_260320-140306
- Type Analyse : MATERIAUX

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 1 / 90

Technique analytique :
Les analyses couvertes par l'accréditation sont réalisées conformément à l'arrêté du 01 Octobre 2019 modifié par l'arrêté du 3 juin 2025.
Les couches décrites entre parenthèses dans le rapport ne sont pas soumises à analyse.
Tout échantillon analysé a été qualifié et considéré comme étant apte à être préparé .

Si MOLP :
Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée selon méthode interne + guide HSG 248 appendice 2.
Préparation effectuée de façon à être représentative de l'échantillon.
La limite de détection est de 0,1% pour toutes fibres d'amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d'au moins 95%.
« Amiante non détectée », l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2µm.

Si META :
Identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (Méthodes internes + parties pertinentes de la norme NF X 43-050).
Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon, deux préparations différentes peuvent être utilisées :
Broyage manuel en phase aqueuse puis filtration sur polycarbonate ou attaque chimique au chloroforme puis dépôt sur grille de microscopie.
La limite de détection à 95% garantie par le laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante par couche ou par mélange de couches indissociables dans la limite de 4 couches maximum.
« amiante non détectée », l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Un matériau peut être constitué d'une ou plusieurs couches. Une couche est un élément pouvant être distingué des autres éléments par superposition ou stratification, une couche peut être homogène ou hétérogène à l'œil nu.
Si pour une couche la quantité de matière n'atteint pas la quantité de matière minimale de prise d'essai, le laboratoire qualifiera la couche de « trace », celle-ci ne constituera pas une couche à proprement parlé et par conséquent la limite de détection ne pourra pas être garantie dans cette partie de l'échantillon.

Couches inséparables :
1. : quantité insuffisante
2. : matériaux friable en vrac ou en poudre
3. : couche trop fine indissociable

Autres Fibres : Mentionne la présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées
Morphologie NC = Morphologie non conforme à une fibre d'amiante
EDX NC = Composition chimique non conforme à une fibre d'amiante
Cristallographie NC = Structure cristalline non conforme à une fibre d'amiante

OLIVIA TESTE
Responsable adjoint UT

P/O **THOMAS BAS**
Responsable UT
(signature électronique)

SGS France
Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Laboratoire de Toulouse ZI de Thibaud, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - t +33 (0)5 61 44 23 23 - www.sgsgroup.fr
Membre du groupe SGS
Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 976 579 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P001 :

Commentaire:
R-2 - Exterieur

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.001 Matériau dur bitumineux
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux par META par couche		
Préparation chloroforme		
MET- NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242		
(To) Analyste (trigramme)		DNo
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P002 :

Commentaire:
R-2 - Facades exterieures

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.002 Matériau dur beige + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		EMI
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P003 :

Commentaire:
R-2 - Zone couverte

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.003 Matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		EMI
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P004 :

Commentaire:
R-2 - Zone couverte

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.004 Joint souple gris + mousse grise indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux par META par couche		
Préparation chloroforme		
MET- NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242		
(To) Analyste (trigramme)		DNo
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P005 :

Commentaire:
R-2 - Escalier exterieur

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 6 / 90

	Unités	AM26-03108.005 Matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		EMI
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P006 :

Commentaire:
R-2 - Escalier exterieur

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 7 / 90

	Unités	AM26-03108.006 Matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P007 :

Commentaire:
R-2 - Facades exterieures

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.007 Matériaux durs gris et beige + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P008 :

Commentaire:
R-1 - Plateforme devant monte charge

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.008 Vrac matériaux durs gris et beige + (carrelage beige) indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P009 :

Commentaire:
R-1 - Plateforme devant monte charge

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 10 / 90

	Unités	AM26-03108.009 Joint souple transparent
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux par META par couche		
Préparation chloroforme		
MET- NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242		
(To) Analyste (trigramme)		DNo
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P010 :

Commentaire:
R-2 - Zone couverte

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.010 Vrac plâtre + matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P011 :

Commentaire:
R-1 - Plateforme devant monte charge

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 12 / 90

	Unités	AM26-03108.011 Matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P012 :

Commentaire:
R-1 - Degagement cuisine; R-1 - Degagement 2

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.012 Matériau dur gris + (carrelage beige)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche Préparation simple MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P013 :

Commentaire:
R-2 - Exterieur

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.013 Matériau dur gris + peinture beige indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: 014

Commentaire:
R-2 - Exterieur

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 15 / 90

	Unités	AM26-03108.090 Joint souple gris	AM26-03108.09 1 Mousse grise
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux par META par couche			
Préparation chloroforme			
MET- NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242			
(To) Analyste (trigramme)		DNo	DNo
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**	**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-	-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non	Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)	1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P015 :

Commentaire:
R-1 - Local poubelles

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 16 / 90

	Unités	AM26-03108.015 Vrac matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P016 :

Commentaire:
R-1 - Local poubelles

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 17 / 90

	Unités	AM26-03108.016 Plâtre + carton + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P017 :

Commentaire:
R-1 - Degagement cuisine

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.017 Matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P018 :

Commentaire:
R-1 - Local poubelles

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.018 Vrac plâtre + papier + carton + fibres tissées + peinture beige indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: 019

Commentaire:
R-1 - Bureau; R-1 - Reserve Epicerie

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.092 Dalle dure beige	AM26-03108.093 Matériau dur gris + colle jaune indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche Préparation simple MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243			
(To) Analyste (trigramme)			EMI
(To*) Résultat			**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante			-
(To) Autres fibres (l<3µm)			Non
(To) Nombre de préparations			1 (1 grille)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux par META par couche Préparation chloroforme MET- NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242			
(To) Analyste (trigramme)		EMI	
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**	
(To*) Type d'amiante		-	
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non	
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)	

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P020 :

Commentaire:
R-1 - Degagement reserve

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.020 Matériau dur gris + colle jaune indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: 021

Commentaire:
R-1 - Reserve Epicerie

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 22 / 90

	Unités	AM26-03108.094 Dalle souple grise	AM26-03108.095 Matériau dur gris + colle jaune indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche			
Préparation simple			
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243			
(To) Analyste (trigramme)		HBA	HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**	**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-	-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non	Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)	1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P022 :

Commentaire:
R-1 - Reserve Epicerie

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.022 Matériau dur blanc + peintures blanche et beige + (carrelage blanc) indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P023 :

Commentaire:
R-1 - Bureau

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 24 / 90

	Unités	AM26-03108.023 Vrac plâtre + matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P024 :

Commentaire:
R-1 - Reserve Epicerie

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.024 Matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P025 :
Commentaire:
R-1 - Vestiaire hommes

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 26 / 90

	Unités	AM26-03108.025 Matériau dur gris + (carrelage gris)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche Préparation simple MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P026 :

Commentaire:
R-1 - Vestiaire hommes

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.026 Matériau dur blanc + peintures blanche, beige et verte + (carrelage beige) indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P027 :

Commentaire:
R-1 - Vestiaire hommes

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.027 Vrac matériaux durs gris et blanc + peinture beige + (carrelage marron) indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P028 :

Commentaire:
R-1 - Vestiaire hommes

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.028 Vrac plâtre + matériau dur gris + peinture jaune indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P029 :

Commentaire:
R-1 - Vestiaire hommes

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.029 Vrac plâtre + matériau dur gris + peinture beige indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P030 :

Commentaire:
R-1 - Degagement 3

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.030 Matériau dur gris + peinture grise + fibres tissées synthétiques indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P031 :

Commentaire:
R-1 - Local Menage Entretien; R-1 - Local chambres froides; R-1 - Reserve boissons

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 32 / 90

	Unités	AM26-03108.031 Vrac matériau dur gris + peinture grise indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P032 :

Commentaire:
R-1 - Local chambres froides

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.032 Vrac matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P033 :

Commentaire:
R-2 - Armurerie 1; R-2 - Soute 1 (armurerie); R-2 - Soute 2 (Armurerie); R-2 - Armement

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 34 / 90

	Unités	AM26-03108.033 Matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P034 :

Commentaire:
R-2 - Ciblerie

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 35 / 90

	Unités	AM26-03108.034 Matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P035 :

Commentaire:
R-2 - Ciblerie

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.035 Matériau dur gris + peinture beige indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P036 :

Commentaire:
R-1 - Self; R-1 - Salle de restaurant

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.036 Vrac plâtre + matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P037 :

Commentaire:
R-1 - Salle de restaurant

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.037 Vrac plâtre + matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P038 :

Commentaire:
R-1 - Self

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 39 / 90

	Unités	AM26-03108.038 Plâtre + peinture blanche + fibres tissées synthétiques indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P039 :

Commentaire:
R-1 - Self; R-1 - Salle de restaurant

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.039 Plâtre + peintures grise et blanche + carton + fibres tissées synthétiques indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Fibres minérales asbestiformes (EDX NC) TALC
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P040 :

Commentaire:
R-1 - Self

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.040 Vrac plâtre + matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P041 :

Commentaire:
R-1 - Self; R-1 - Salle de restaurant

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 42 / 90

	Unités	AM26-03108.041 Vrac plâtre + traces carton indissociables (1)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P042 :

Commentaire:
R-1 - Salle de restaurant

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.042 Bois + traces matériau dur beige + (carrelage marron) indissociables (1)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		EDI
(To*) Résultat		**Amiante identifié**
(To*) Type d'amiante		**Chrysotile**
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		2 (2 grilles)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P043 :

Commentaire:
R-1 - Salle de restaurant

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.043 Matériau dur gris + (carrelage marron)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche Préparation simple MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P044 :

Commentaire:
R-1 - Self; R-1 - Salle de restaurant; Rez de chaussee - Hall d`entree; Rez de chaussee - Salle de reception; Rez de chaussee - Circulation; Rez de chaussee - Palier escalier rond

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.044 Matériau dur gris + (carrelage marron)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche Préparation simple MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P045 :

Commentaire:
Rez de chaussee - Circulation; Rez de chaussee - Palier escalier rond

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.045 Matériau dur blanc + peintures beige + (carrelage marron) indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P046 :

Commentaire:
R-1 - Degagement sur escaliers; R-1 - WC1; R-1 - Couloir cuisine 2; Rez de chaussee - Palier escalier rond

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 47 / 90

	Unités	AM26-03108.046 Poudre matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Amiante identifié**
(To*) Type d'amiante		**Chrysotile**
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		**1** (**1** grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)
L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P047 :

Commentaire:
R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Chambre froide 1; R-1 - Chambre froide 2; R-1 - Chambre froide 3; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Degagement sur escaliers; R-1 - Local

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.047 Matériau dur gris + (carrelage gris)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche Préparation simple MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P048 :

Commentaire:
R-1 - Couloir cuisine; R-1 - Chambre froide 1; R-1 - Chambre froide 2; R-1 - Chambre froide 3; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Degagement sur escaliers; R-1 - Local

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.048 Matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P049 :

Commentaire:
R-1 - Veranda; R-1 - Bar

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 50 / 90

	Unités	AM26-03108.049 Matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P050 :

Commentaire:
R-1 - Veranda

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.050 Matériau dur gris + carton indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P051 :

Commentaire:
R-1 - Bar

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.051 Matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P052 :

Commentaire:
R-1 - Wc Public

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 53 / 90

	Unités	AM26-03108.052 Vrac plâtre + peinture jaune indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS France
Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Laboratoire de Toulouse ZI de Thibaud, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - t +33 (0)5 61 44 23 23 - www.sgsgroup.fr
Membre du groupe SGS
Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 976 579 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P053 :

Commentaire:
R-1 - Wc Public

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.053 Plâtre + peinture blanche + fibres tissées synthétiques indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P054 :

Commentaire:
R-1 - Wc Public

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.054 Vrac matériaux durs gris et blanc + (carrelage marron) indissociables (2)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P055 :
Commentaire:
R-1 - Wc Public

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.055 Matériau dur gris + peinture grise indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P056 :

Commentaire:
R-1 - Wc Public

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.056 Vrac plâtre + peinture beige indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS France
Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Laboratoire de Toulouse ZI de Thibaud, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - t +33 (0)5 61 44 23 23 - www.sgsgroup.fr
Membre du groupe SGS
Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 976 579 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P057 :

Commentaire:
R-1 - Wc Public

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 58 / 90

	Unités	AM26-03108.057 Matériau dur blanc + (carrelage blanc)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P058 :

Commentaire:
R-1 - Vestiaire femme

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 59 / 90

	Unités	AM26-03108.058 Matériau dur gris + (carrelage gris)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche Préparation simple MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P059 :

Commentaire:
R-1 - Vestiaire femme

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.059 Joint dur gris + peintures beige et noire + (carrelage marron) indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P060 :

Commentaire:
R-1 - Vestiaire femme

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.060 Matériau dur gris + peinture beige indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P061 :

Commentaire:
R-1 - Hall

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.061 Vrac plâtre + matériau dur gris + peinture jaune indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P062 :

Commentaire:
R-1 - Reserve Epicerie

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 63 / 90

	Unités	AM26-03108.062 Vrac matériau dur gris + peinture beige indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Amiante identifié**
(To*) Type d'amiante		**Chrysotile**
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P063 :

Commentaire:
R-1 - Local chambres froides

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 64 / 90

	Unités	AM26-03108.063 Poudre matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Amiante identifié**
(To*) Type d'amiante		**Chrysotile**
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		**1** (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P064 :

Commentaire:
R-1 - Escalier

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.064 Matériau dur gris + peinture beige indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P065 :

Commentaire:
R-1 - Escalier

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.065 Vrac matériau dur gris + peinture beige indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P066 :

Commentaire:
R-1 - Escalier

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.066 Matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P067 :

Commentaire:
R-1 - Escalier

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.067 Vrac matériau dur gris + peinture beige indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P068 :

Commentaire:
R-1 - Escalier; R-1 - Degagement sur escaliers; R-1 - Couloir cuisine 2

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.068 Vrac plâtre + matériau dur gris + peintures beige et blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P069 :

Commentaire:
R-1 - Escalier

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.069 Dalle souple marron + traces colle jaune + traces peinture blanche indissociables (1)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P070 :

Commentaire:
R-1 - Degagement sur escaliers

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.070 Matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P071 :

Commentaire:
R-1 - WC1; R-1 - Lavabo

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.071 Vrac plâtre + matériau dur gris + peinture jaune indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P072 :

Commentaire:
R-1 - WC1; R-1 - Lavabo

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.072 Matériau dur gris + peinture jaune + (carrelage blanc) indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P073 :

Commentaire:
R-1 - Lavabo

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 74 / 90

	Unités	AM26-03108.073 Vrac plâtre
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche Préparation simple MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P074 :

Commentaire:
R-1 - WC1; R-1 - Lavabo

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.074 Vrac plâtre
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche Préparation simple MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P075 :

Commentaire:
R-1 - Local Menage Entretien

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 76 / 90

	Unités	AM26-03108.075 Poudre matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		EDI
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		2 (2 grilles)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P076 :

Commentaire:
R-1 - Local chambres froides

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 77 / 90

	Unités	AM26-03108.076 Poudre matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		EDI
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		2 (2 grilles)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS France
Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Laboratoire de Toulouse ZI de Thibaud, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - t +33 (0)5 61 44 23 23 - www.sgsgroup.fr
Membre du groupe SGS
Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 976 579 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P077 :

Commentaire:
R-1 - Local Menage Entretien

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 78 / 90

	Unités	AM26-03108.077 Poudre matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Amiante identifié**
(To*) Type d'amiante		**Chrysotile**
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		**1** (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS France
Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Laboratoire de Toulouse ZI de Thibaud, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - t +33 (0)5 61 44 23 23 - www.sgsgroup.fr
Membre du groupe SGS
Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 976 579 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P078 :

Commentaire:
R-2 - Facades exterieures

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.078 Matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P079 :

Commentaire:
R-2 - Facades exterieures

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 80 / 90

	Unités	AM26-03108.079 Matériau dur beige
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P080 :

Commentaire:
R-2 - Facades exterieures

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.080 Matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P081 :

Commentaire:
R-2 - Facades exterieures

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

Page 82 / 90

	Unités	AM26-03108.081 Matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		JBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P082 :

Commentaire:
Rez de chaussee - Hall d`entree; Rez de chaussee - Circulation

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.082 Matériau dur gris + (carrelage marron)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche Préparation simple MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		EMI
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P083 :

Commentaire:
Rez de chaussee - Hall d`entree; Rez de chaussee - Salle de reception; Rez de chaussee - Salle de reception 2; Rez de chaussee - Circulation

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.083 Matériau dur gris + traces matériau dur beige + (carrelage marron) indissociables (1)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		EMI
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P084 :

Commentaire:
Rez de chaussee - Circulation

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.084 Plâtre + matériau dur gris + peinture jaune indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		EMI
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P085 :

Commentaire:
R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Legumerie

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.085 Matériau dur blanc
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		EMI
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306
Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P086 :

Commentaire:
R-1 - Degagement cuisine; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Legumerie

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.086 Plâtre + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		EMI
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Fibres minérales asbestiformes (EDX NC) Talc
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P087 :

Commentaire:
R-1 - Degagement cuisine; R-1 - Chambre froide 1; R-1 - Chambre froide 2; R-1 - Chambre froide 3; R-1 - Plonge 1; R-1 - Plonge 2; R-1 - Cuisine; R-1 - Sas distribution; R-1 - Legumerie

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.087 Vrac plâtre + matériau dur gris + peinture blanche indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		EMI
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Fibres minérales asbestiformes (EDX NC) Talc
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672
Reçu le, 23/03/2026 **Prélevé le** 17/03/26
Demandeur: M. HEBRI Malik
Description: P088 :

Commentaire:
R-1 - Plateforme devant monte charge

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.088 Matériau dur gris + peinture beige indissociables (3)
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Fibres minérales non asbestiformes (morphologie NC)
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

SGS

cofrac ESSAIS

Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 36727_260320-140306

Devis : DE25-1672

Reçu le, 23/03/2026 Prélevé le 17/03/26

Demandeur: M. HEBRI Malik

Description: P089 :

Commentaire:
R-2 - Local debarras cuisine

ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL
FRANCE

Toulouse, le 27 - mars - 26

RAPPORT D'ESSAI
AM26-03108

	Unités	AM26-03108.089 Matériau dur gris
Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrac par META par couche		
Préparation simple		
MET-NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243		
(To) Analyste (trigramme)		HBA
(To*) Résultat		**Pas d'amiante détecté**
(To*) Type d'amiante		-
(To) Autres fibres (l<3µm)		Non
(To) Nombre de préparations		1 (1 grille)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454
(To) : Essai réalisé à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 - Annexe - Autres documents

Allianz

ATTESTATION D'ASSURANCE

ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé : 1 Cours Michelet – CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX en sa qualité d'Assureur certifie que :

SARL ACOBEX
7 AVENUE DU PARC ALATA
60100 CREIL

Est garanti par le contrat N° **60441039** contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il peut encourir, en raison des dommages garantis causés aux tiers dans l'exercice des activités assurées, soit :

Expert immobilier exerçant les missions de diagnostic et expertises suivantes :

- Constat de risque d'exposition au plomb,
- Etat mentionnant avant travaux et avant démolition, la présence ou l'absence de matériaux, ou de produits contenant de l'amiante
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment,
- Etat de l'installation intérieure de gaz naturel,
- Etat des risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Etat de l'installation intérieure d'électricité,
- Conformité des réseaux d'eau usée assainissement non collectif),
- Mesure « Loi Carrez »,
- Diagnostic Technique loi SRU,
- Etat apparent solidité clos et couvert, état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs de sécurité,
- Conformité des installations d'eau de consommation (plomb dans l'eau),
- Etat relatif à la présence d'insectes xylophages et parasites du bois dans le bâtiment (autres que termites).

Il est précisé que la mission SPS : coordination en matière de sécurité et de la protection de la santé sur construction en chantiers est assurée par contrat BTP séparé et ne fait donc pas l'objet des garanties du présent contrat.

La présente attestation est valable du 01/01/2026 au 31/12/2026, sous réserve du paiement des primes émises.

A concurrence des montants de garantie stipulés ci-après.

Ce document, établi par ALLIANZ IARD à pour objet d'attester l'existence du contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ IARD au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances....)

Toute adjonction autre que le cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 07/01/2026

Pour ALLIANZ

ADMIC2230 - V02/16 - Imp11/21 - Création graphique Allianz

Allianz IARD
Entreprises régie par le Code des Assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre

Allianz Vie
Société anonyme au capital de 643.051.426 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR86 340 234 962

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR78 542 110 291

Entreprises régies par le Code des assurances
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

Allianz

Contrat RC N° 60441039

Montants des garanties :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Tous dommages confondus	10 000 000 €	par sinistre
Sans pouvoir dépasser, pour les dommages ci-après :		
Dommages matériels et immatériels consécutifs	2 000 000 €	par sinistre
Sauf cas ci-après :		
Vol par préposés	15 300 €	par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs	305 000 €	par sinistre
Atteintes à l'environnement accidentelles	300 000 €	par année d'assurance
Dommages corporels et matériels accessoires causés aux préposés	3 000 000 €	par année d'assurance

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (ANNEXE SPECIFIQUE DIG20704)

Tout dommages corporels, matériels et immatériels confondus	1000 000 €	par année d'assurance Et pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance
Dont :		
Dommages matériels et immatériels consécutifs aux biens (objets, documents, supports informatiques) remis en vue de l'exécution de votre Prestation, y compris frais de reconstitution	300 000 €	par année d'assurance
Dommages résultant d'infections informatiques	50 000 €	par sinistre

DEFENSE PENALE ET RECOURS SUITE A ACCIDENT

FRAIS ET HONORAIRES ASSURES, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE VICTIMES	50 000 €	par année d'assurance

ADM00233 - V02/16 - imc11/21 - Création graphique Allianz

Allianz Vie
Société anonyme au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR66 340 234 962

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

Entreprises régies par le Code des assurances
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI7754 Version 000

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Madame VAILLANT Odile

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 12/04/2023 - Date d'expiration : 11/04/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 12/04/2023 - Date d'expiration : 11/04/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 12/04/2023 - Date d'expiration : 11/04/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 12/04/2023 - Date d'expiration : 11/04/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 12/04/2023 - Date d'expiration : 11/04/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 15/03/2023 - Date d'expiration : 14/03/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 15/03/2023 - Date d'expiration : 14/03/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 14/03/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0502 PORTÉE CERTIFICATION DE PERSONNES DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev20
