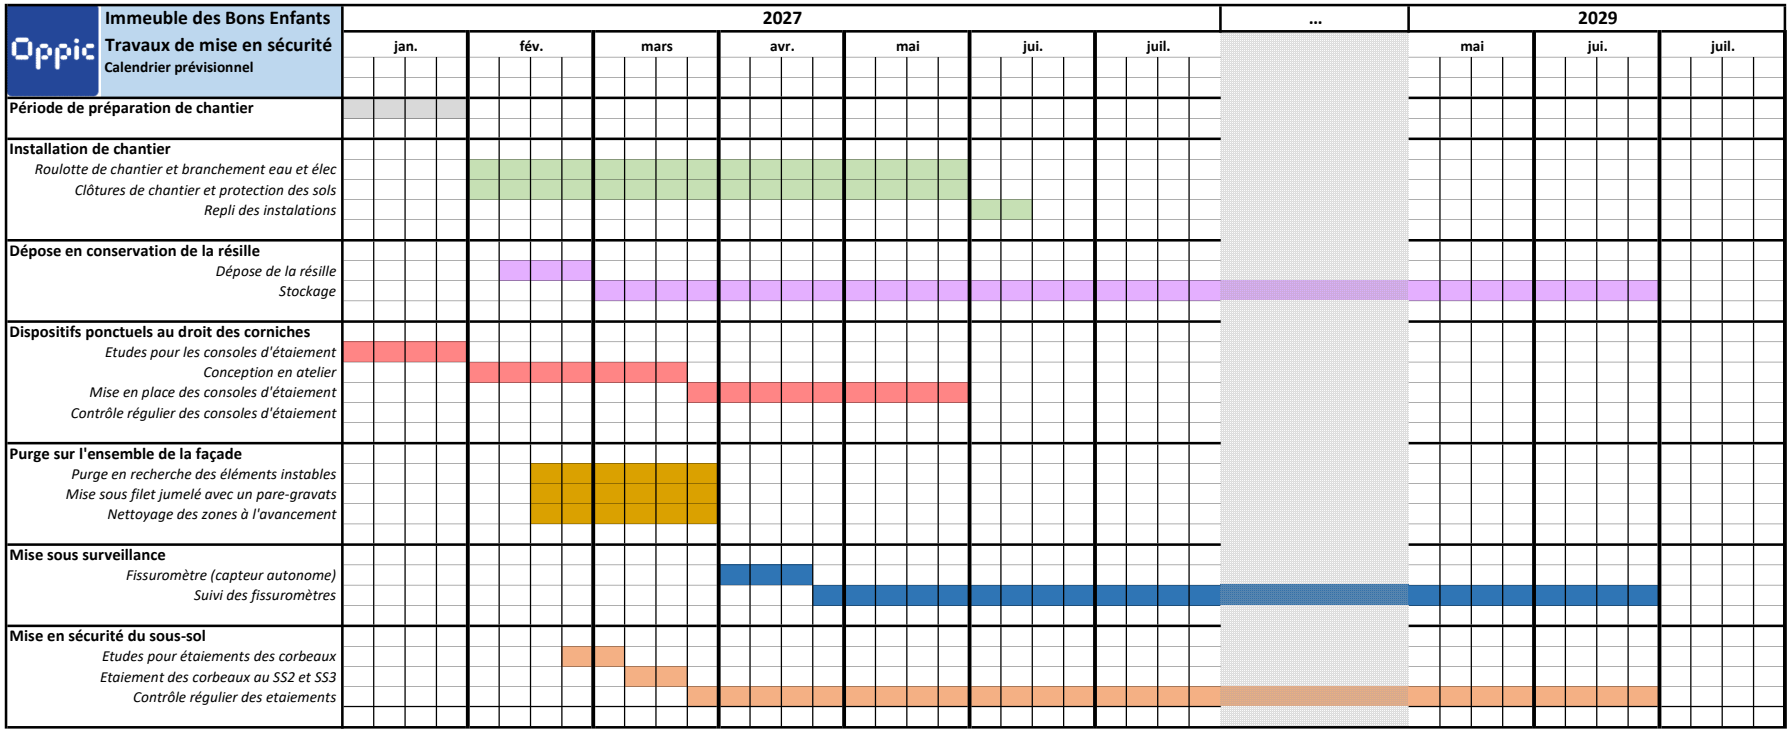

Oppic
Immeuble des Bons Enfants
Travaux de mise en sécurité
Calendrier prévisionnel
2027
...
2029
jan.
fév.
mars
avr.
mai
jui.
juil.
mai
jui.
juil.
Période de préparation de chantier
Installation de chantier
Roulotte de chantier et branchement eau et élec
Clôtures de chantier et protection des sols
Repli des instalations
Dépose en conservation de la résille
Dépose de la résille
Stockage
Dispositifs ponctuels au droit des corniches
Etudes pour les consoles d'étaiement
Conception en atelier
Mise en place des consoles d'étaiement
Contrôle régulier des consoles d'étaiement
Purge sur l'ensemble de la façade
Purge en recherche des éléments instables
Mise sous filet jumelé avec un pare-gravats
Nettoyage des zones à l'avancement
Mise sous surveillance
Fissuromètre (capteur autonome)
Suivi des fissuromètres
Mise en sécurité du sous-sol
Etudes pour étaiements des corbeaux
Etaiement des corbeaux au SS2 et SS3
Contrôle régulier des etaiements
