DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFERENCES	DÉSIGNATION DU BIEN	PROPRIÉTAIRE
Référence dossier : **26DAA285** Réalisé le : **28/08/2026** Référence bien : **IUT St Avold-Accessibilité**	**IUT St Avold - Rue Victor Demange** **57500 SAINT-AVOLD**	**UNIVERSITE DE LORRAINE** **34 Cours Léopold** **54052 NANCY CEDEX**

OBJET DE LA MISSION

REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

SYNTHÈSE DU REPÉRAGE



SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1.1 Désignation de l'immeuble bâti visité
1.2 Désignation du propriétaire
1.3 Désignation du donneur d'ordre
1.4 Opérateur de repérage
1.5 Société
1.6 Laboratoire d'analyses

2. CONCLUSIONS

2.1 Conclusion du repérage
2.2 Réserves et commentaires

3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

3.1 Liste des locaux visités
3.2 Liste des locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

4. ÉTUDE PRÉALABLE

4.1 Programme de travaux du donneur d'ordre
4.2 Périmètre défini par le donneur d'ordre
4.3 Objectif de la mission
4.4 Programme de repérage de la mission
4.5 Analyse des documents transmis
4.6 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapports aux normes en vigueur
4.7 Plan et procédures de prélèvements

5. CONDITIONS DE REPÉRAGES

5.1 Modalités de repérages
5.2 Obligations de communication du rapport de repérage

6. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

6.1 Tableau des mesures
6.2 Quantitatif de matériaux amiantés

7. ANNEXES

RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1.1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE BÂTI VISITÉ

Adresse : **IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD**

Référence bien : **IUT St Avold-Accessibilité**

Date de construction : **Date du permis de construire non connue**

1.2 DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE


UNIVERSITE DE LORRAINE
34 Cours Léopold
54052 NANCY CEDEX

1.3 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

UNIVERSITE DE LORRAINE
34 Cours Léopold
54052 NANCY CEDEX

1.4 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

*Nom : **M VEGEZZI Thibault***
*N° de certification : **1495***
*Délivré le : **26/04/2023***
*Échéance le : **25/04/2030***
*Accompagnateur : **Sans accompagnateur***



Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LA CERTIFICATION DE PERSONNES - 25 Avenue Léonard de Vinci, Immeuble Europarc, 33600 PESSAC

1.5 SOCIÉTÉ

Raison sociale : **DIAGOBAH** (SIRET : **88429685600021**)

Adresse : **3 Rue du Chanoine Pieron, 54600 Villers-Les-Nancy**

Assurance : **AXA**

Numéro de police et date de validité : **10825380704 / 31/12/2027**

1.6 LABORATOIRE D'ANALYSES

Raison sociale : **ITGA Metz**

Adresse : **1 Rue Graham Bell - Technopole 2000 57070 METZ**

Numéro de l'accréditation Cofrac : **n° 1-6091 - 39408269700506**

2. CONCLUSIONS

2.1 CONCLUSION DU REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION
P061	RDC - Sanitaires 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	RDC - Sanitaires 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

2.2 RÉSERVES ET COMMENTAIRES

NEANT

3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

3.1 *LISTE DES LOCAUX VISITÉS*

Nombre de locaux visités : 32

RDC - Extérieur, RDC - Sanitaires 1, RDC - Circulation 1, RDC - Cafétéria, RDC - Documentation, RDC - Hall, RDC - Sas, RDC - Bureau, RDC - Sanitaires 2, RDC - Sanitaires 3, RDC - Circulation 2, RDC - Halle demi-grand, RDC - Escaliers 1, RDC - Escalier extérieur, RDC - Escaliers 2, RDC - Sanitaires 4, R+1 - Escaliers 3, R+1 - Circulation 3, R+1 - Escaliers 4, R+1 - Escaliers 5, R+1 - Sanitaires 5, R+1 - Escaliers 6, R+1 - Sanitaires 6, R+1 - Amphithéâtre, R+1 - Escaliers 7, R+1 - Circulation 4, R+2 - Sanitaires 7, R+2 - Sanitaires 8, R+2 - Sanitaires 9, R+2 - Circulation 5, R+2 - Escalier 8, R+2 - Escalier 9

3.2 *LISTE DES LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)*


Nombre de locaux non visités : 0

LOCALISATION	*PARTIES DU LOCAL*	*RAISON*
Néant	-	


3. ÉTUDE PRÉALABLE

4.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE


TRAVAUX ACCESSIBILITE
POUR PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP

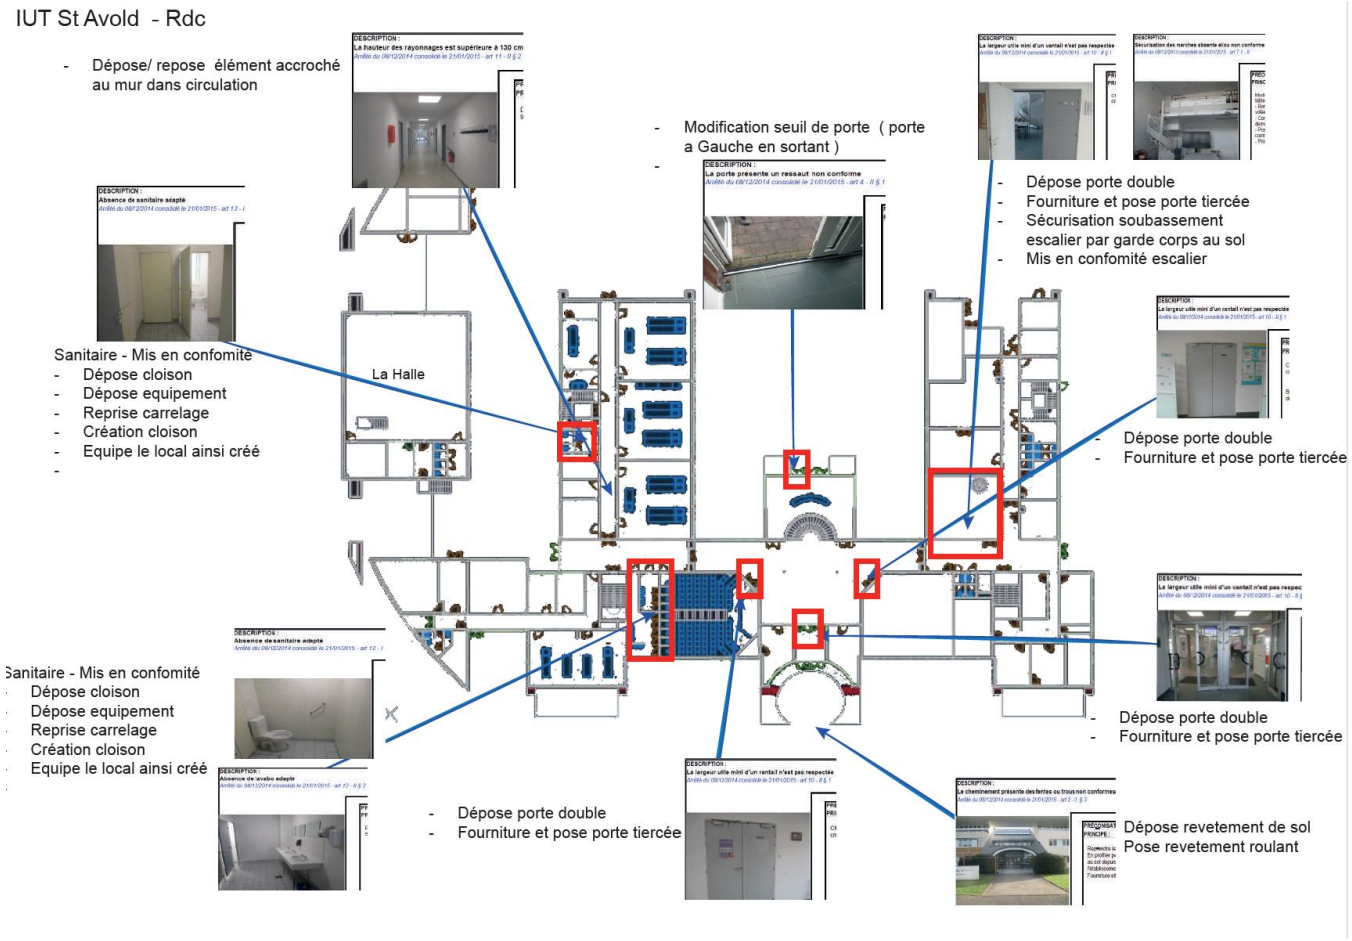


IUT St Avold - 1er Etage

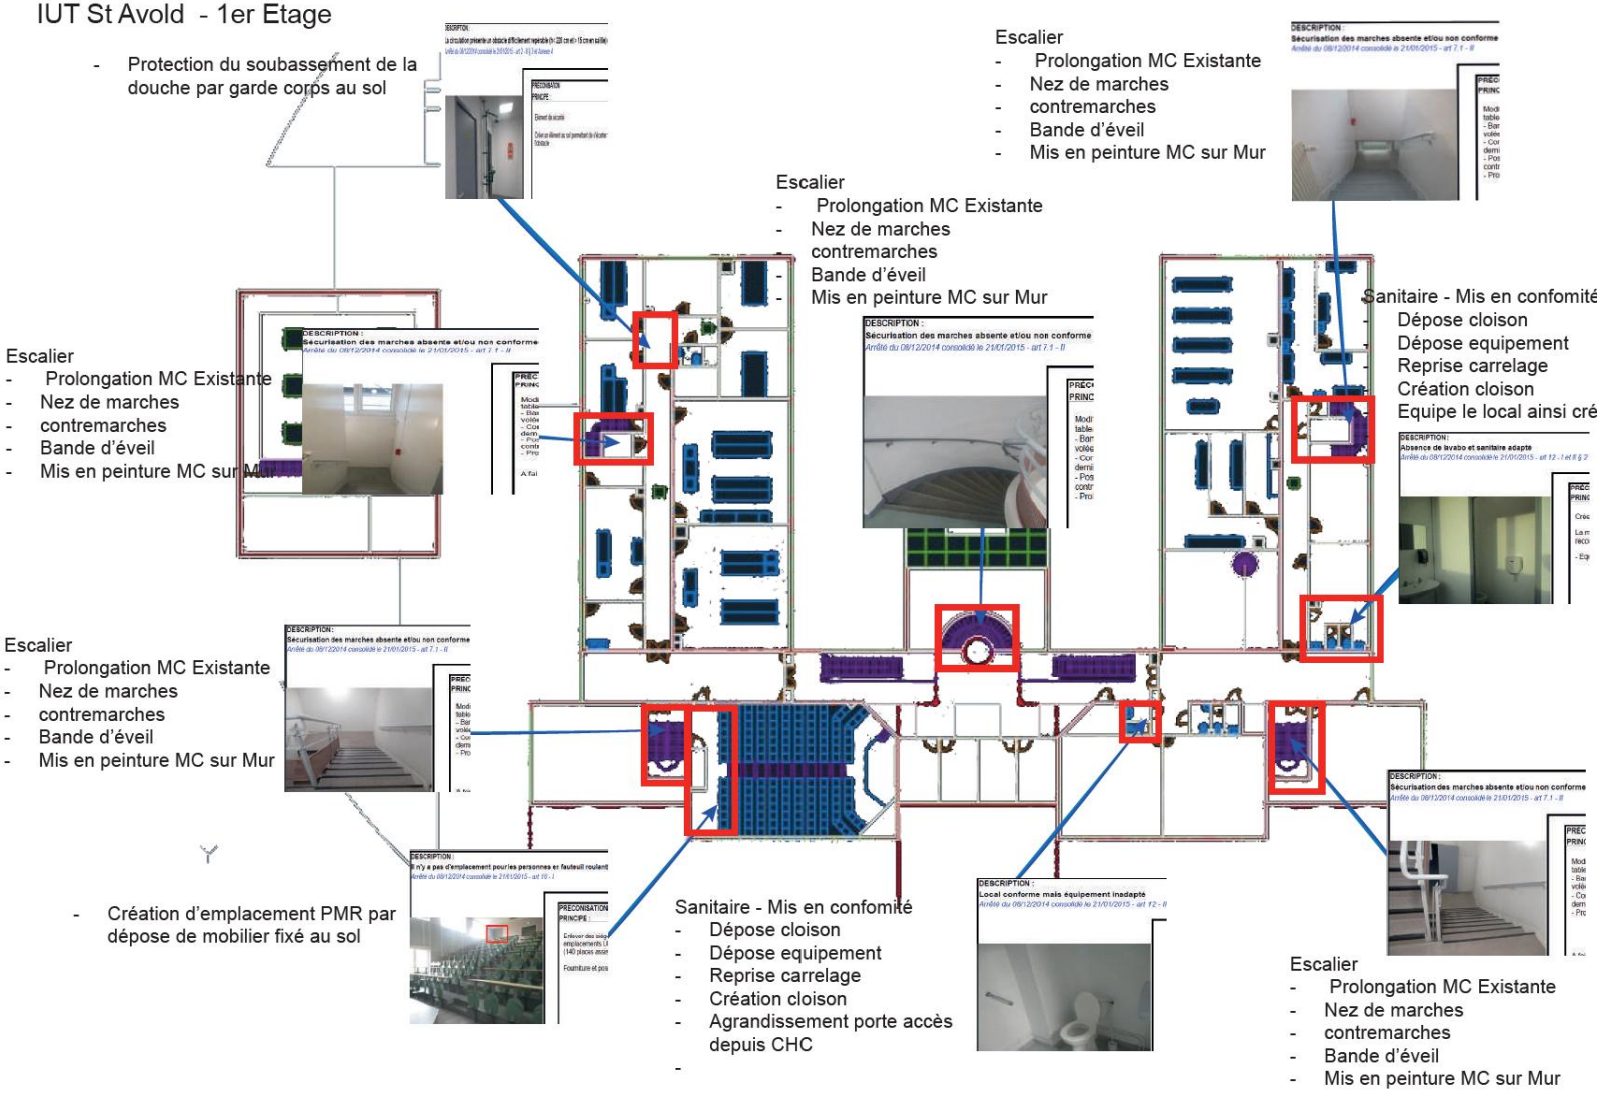


IUT St Avold - 2ème Etage

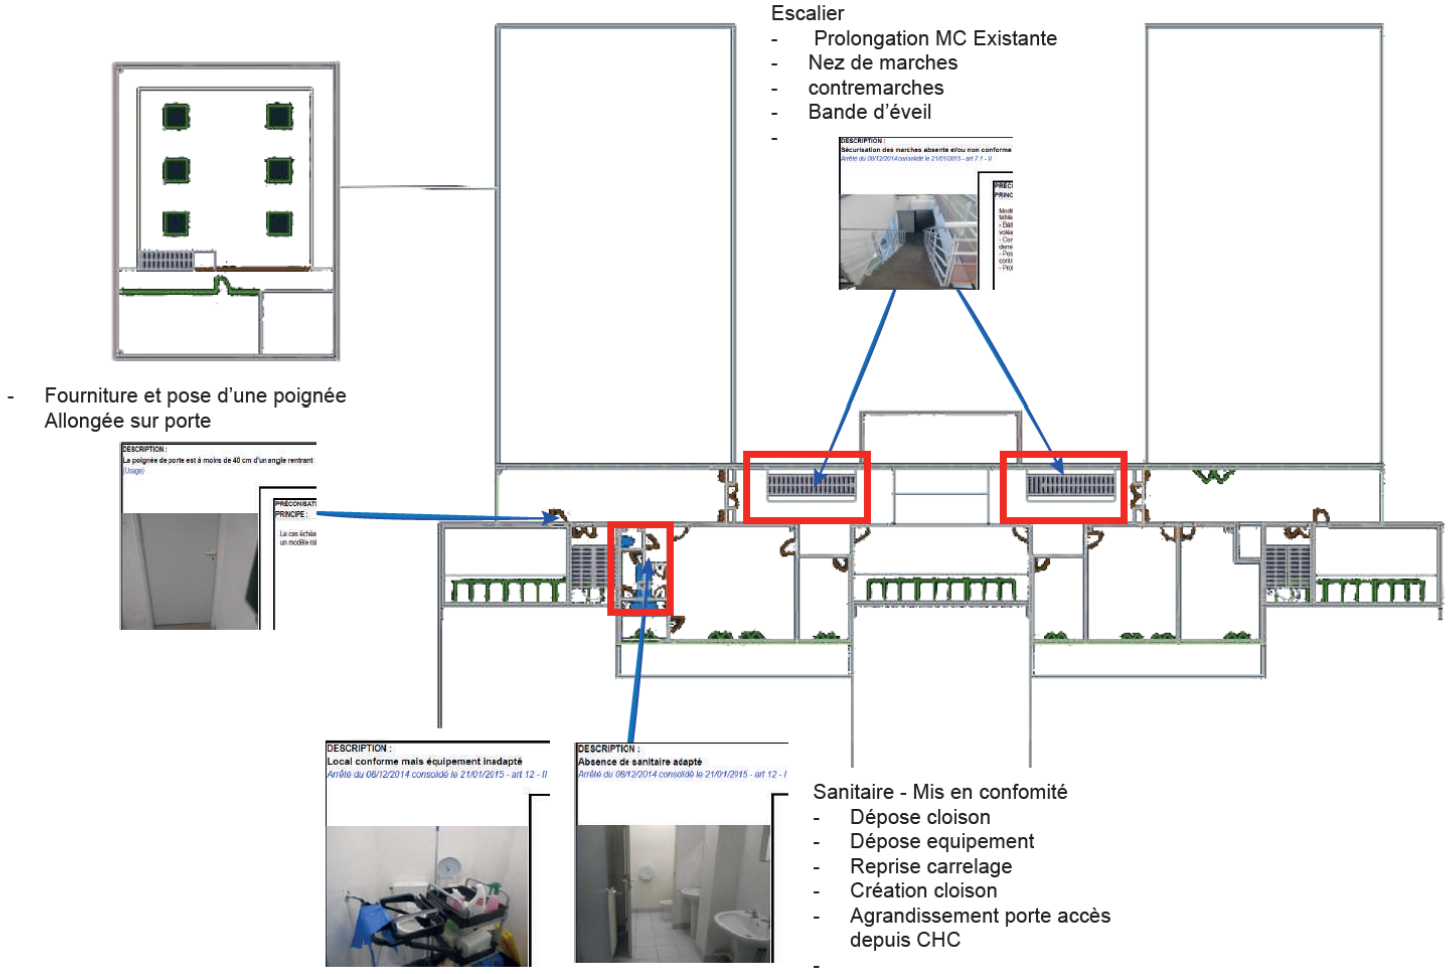

IUT St Avold - La Halle



- Cheminement Extérieur
- Création d'une rampe paysagère le long du batiment

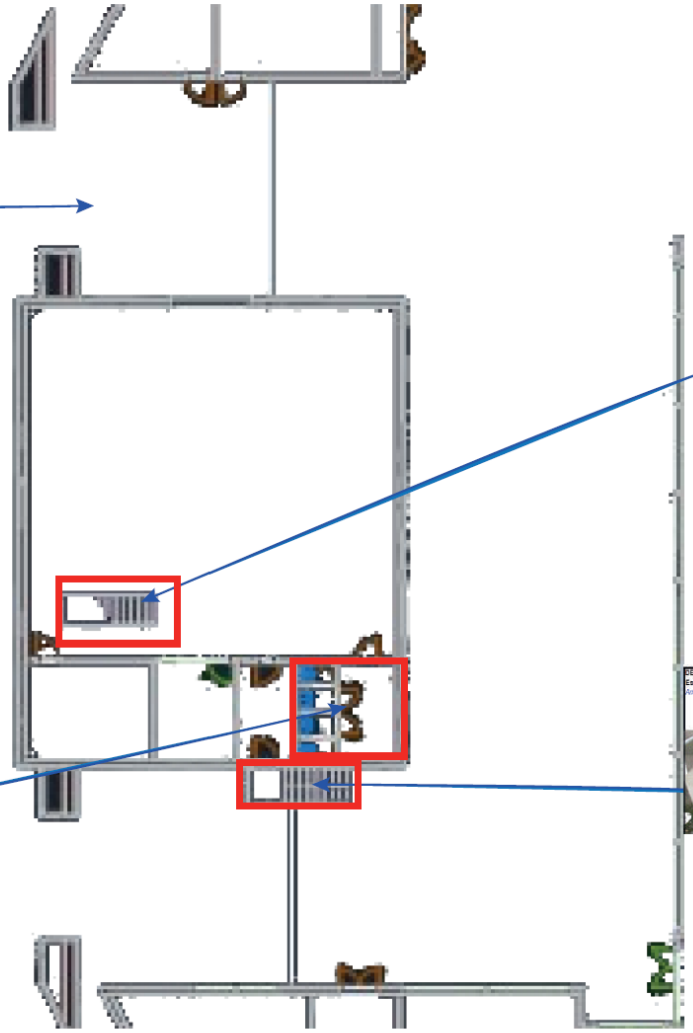



Escalier
- Prolongation MC Existante
- Nez de marches
- contremarches
- Bande d'éveil
-

Sanitaire - Mis en confomité Homme et Femme
- Dépose cloison
- Dépose equipement
- Reprise carrelage
- Création cloison
-
-







Escalier
- Prolongation MC Existante
- Nez de marches
- contremarches
- Bande d'éveil
-

4.2 PÉRIMÈTRE DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

4.3 OBJECTIF DE LA MISSION

« Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux ». Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

4.4 PROGRAMME DE REPÉRAGE DE LA MISSION

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017. **Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020** d'août 2017 (liste non exhaustive) :

1 - COUVERTURES, TOITURES, TERRASSES ET ETANCHEITES	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières
2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FAÇADES	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - PLANCHERS ET PLANCHERS TECHNIQUES	Revêtements de sols
6 - CONDUITS ET ACCESSOIRES INTERIEURS	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ESCALIERS MECANIQUES	Portes et cloisons palières
	Parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - ÉQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	Fusibles à broche
	Canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - FONDATIONS ET SOUBASSEMENTS	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - AMENAGEMENTS, VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

4.5 *ANALYSE DES DOCUMENTS TRANSMIS*

DOCUMENTS DEMANDÉS	*DOCUMENTS REMIS*
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Dossier de plans	Fond de plan remis
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti	Listing des occupants et coordonnés du ou des contacts sur place

Observations :
Néant

4.6 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORTS AUX NORMES EN VIGUEUR

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

OBSERVATIONS	*OUI*	*NON*	*SANS OBJET*
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Plan des sondages détaillés disponible mais non joint au présent rapport.	X		
Accompagnateur disponible sur l'ensemble de l'intervention et disposant de l'ensemble des moyens d'accès demandés	X		

4.7 PLAN ET PROCÉDURES DE PRÉLÈVEMENTS

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. CONDITIONS DE REPÉRAGES

5.1 MODALITÉS DE REPÉRAGES

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage rechercher la présence de Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autres aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la liste des matériaux de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

L'ensemble du périmètre du bien concerné par les travaux doit être inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés, l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être menées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendues des ZPSO.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux ou produits utilisées, il atteste, le cas échant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaire pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisées couches par couches par un organismes accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

5.2 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPÉRAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personnes physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti. Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

6. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

6.1 TABLEAU DES MESURES

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
S001	-	RDC - Sanitaires 4	-	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Panneaux métalliques	Panneaux métalliques	-	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
S002		RDC - Sanitaires 1		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		R+1 - Sanitaires 5		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		R+1 - Sanitaires 6		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		R+2 - Sanitaires 7		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-001	P001	RDC - Escaliers 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	P002	RDC - Sanitaires 4	Murs refends - pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	P003	RDC - Sanitaires 4	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	P004	RDC - Sanitaires 4	Plafonds - Pièces humides	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	P005	RDC - Sanitaires 4	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	P006	RDC - Sanitaires 4		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	P007	RDC - Sanitaires 4		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	P008	RDC - Sanitaires 4	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
ZPSO-009	P009	RDC - Escaliers 1	Nez de marche	7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Enduit ciment	Enduit ciment		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	P010	RDC - Escaliers 1		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	P011	RDC - Extérieur		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Scellement ciment	Scellement ciment		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	P012	RDC - Extérieur		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment	Sol coulé à base ciment		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	P013	R+2 - Escalier 8	Cloisons - Pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Escalier 9	Cloisons - Pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014		R+2 - Circulation 5		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol pvc + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Dalle de sol pvc + Couche2: Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P014	R+2 - Escalier 8		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol pvc + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Dalle de sol pvc + Couche2: Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Escalier 9		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol pvc + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Dalle de sol pvc + Couche2: Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015		R+2 - Circulation 5		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P015	R+2 - Escalier 8		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Escalier 9		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	P016	R+2 - Escalier 8		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Escalier 9		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	P017	R+2 - Escalier 8	Nez de marche	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
		R+2 - Escalier 9	Nez de marche	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018		R+2 - Sanitaires 7		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P018	R+2 - Sanitaires 8		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Sanitaires 9		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019		R+2 - Sanitaires 7	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P019	R+2 - Sanitaires 8	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Sanitaires 9	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020		R+2 - Sanitaires 7		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P020	R+2 - Sanitaires 8		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Sanitaires 9		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021		R+2 - Sanitaires 7	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Sanitaires 8	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P021	R+2 - Sanitaires 9	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
ZPSO-022	P022	R+2 - Sanitaires 7		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	P023	R+2 - Sanitaires 7	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Sanitaires 8	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Sanitaires 9	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	P024	R+2 - Sanitaires 7	Cloisons - Pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Sanitaires 8	Cloisons - Pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+2 - Sanitaires 9	Cloisons - Pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	P025	R+1 - Circulation 3	Cloisons - Pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	P026	R+1 - Circulation 3	Cloisons - Pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	P027	R+1 - Escaliers 3		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Escaliers 4		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Escaliers 5		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Escaliers 6		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
		R+1 - Escaliers 7		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	P028	R+1 - Escaliers 3		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Escaliers 4		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Escaliers 5		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Escaliers 6		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Escaliers 7		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	P029	R+1 - Escaliers 3	Cloisons - Pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		R+1 - Escaliers 5	Cloisons - Pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	P030	R+1 - Amphithéâtre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031		RDC - Bureau		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P031	R+1 - Amphithéâtre		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	P033	R+1 - Escaliers 6	Murs refends - pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P032	R+1 - Escaliers 7	Murs refends - pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	P034	R+1 - Escaliers 3	Murs de façade - pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	P035	R+1 - Escaliers 3	Murs refends - pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
ZPSO-035	P046	R+1 - Sanitaires 5		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P036	R+1 - Sanitaires 6		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	P047	R+1 - Sanitaires 5		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P037	R+1 - Sanitaires 6		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	P048	R+1 - Sanitaires 5	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P038	R+1 - Sanitaires 6	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	P049	R+1 - Sanitaires 5	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P039	R+1 - Sanitaires 6	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	P051	R+1 - Sanitaires 5		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P040	R+1 - Sanitaires 6		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	P050	R+1 - Sanitaires 5	Murs refends - pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P041	R+1 - Sanitaires 6	Murs refends - pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	P042	R+1 - Circulation 4	Cloisons - Pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	P043	R+1 - Circulation 4		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
ZPSO-043	P044	R+1 - Circulation 4		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	P045	R+1 - Sanitaires 5		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	P052	RDC - Circulation 1	Murs refends - pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	P053	RDC - Sanitaires 1		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RDC - Sanitaires 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P058	RDC - Sanitaires 3		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	P054	RDC - Sanitaires 1		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P059	RDC - Sanitaires 2		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RDC - Sanitaires 3		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	P055	RDC - Sanitaires 1	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P060	RDC - Sanitaires 2		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RDC - Sanitaires 3		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	P056	RDC - Sanitaires 1	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RDC - Sanitaires 2		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P062	RDC - Sanitaires 3		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
ZPSO-050	P057	RDC - Sanitaires 1	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P063	RDC - Sanitaires 3	Cloisons - Pièces humides	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051		RDC - Sanitaires 2		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P061	RDC - Sanitaires 3		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052		RDC - Bureau	Murs refends - pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P064	R+1 - Amphithéâtre	Murs refends - pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	P065	RDC - Hall	Murs refends - pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P073	RDC - Circulation 2		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054		RDC - Cafétéria		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P066	RDC - Hall		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P068	RDC - Sas		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RDC - Circulation 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055		RDC - Cafétéria		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P067	RDC - Hall		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	CONCLUSION
	P069	RDC - Sas		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RDC - Circulation 2		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	P070	RDC - Bureau		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol	Colle non bitumineuse + Dalle de sol		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	P071	RDC - Extérieur		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	P072	RDC - Extérieur		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	Colle de plinthes		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	P074	RDC - Documentation		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Dalle de sol	Colle non bitumineuse + Dalle de sol		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-060	P075	RDC - Documentation		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

6.2 QUANTITATIF DE MATÉRIAUX AMIANTÉS

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	ETAT DE CONSERVATION	QUANTITATIF
ZPSO-051		RDC - Sanitaires 2	-	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Etat d'usage	8 m²
	P061	RDC - Sanitaires 3		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Etat d'usage	

7. ANNEXES

SOMMAIRE

7.1 SCHÉMA DE REPÉRAGE

7.2 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

7.3 RAPPORT D'ESSAIS

7.4 EVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

7.5 CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

7.6 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

7.7 AUTRES DOCUMENTS

7.1 Annexe : SCHÉMA DE REPÉRAGE

Zones d'Intervention RDC



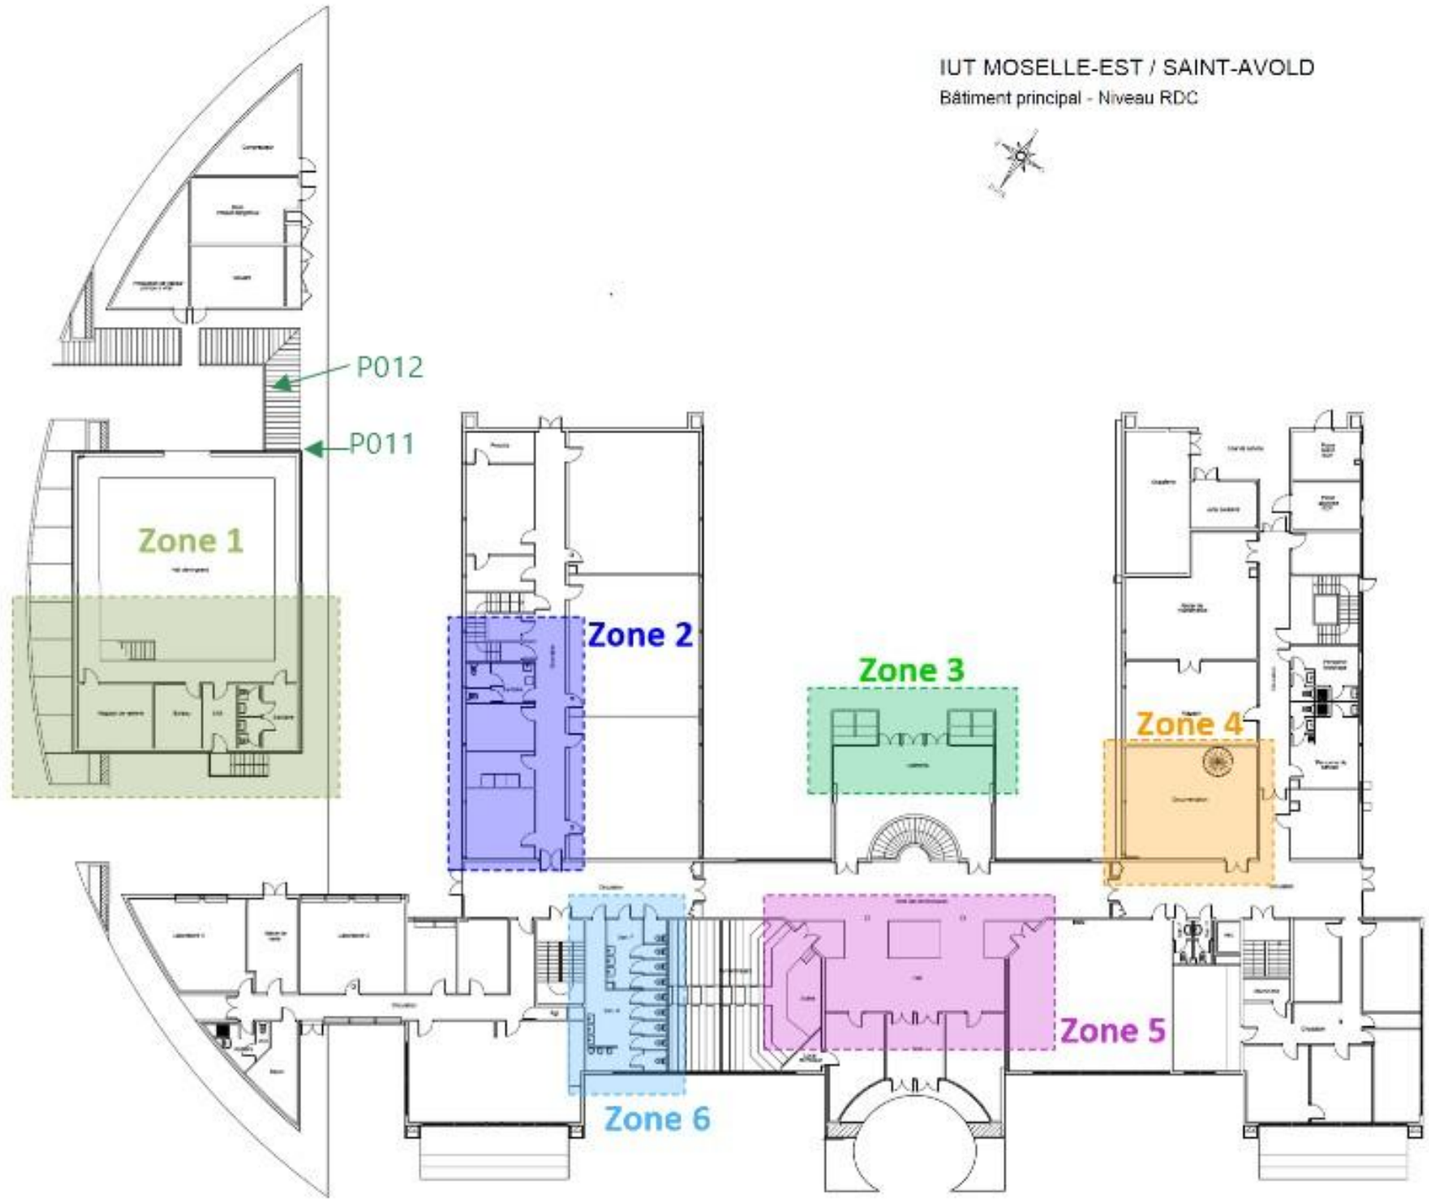


Planche (croquis) de repérage technique : Zones d'Intervention RDC
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26DAA285 du 16/09/2026
Adresse du bien : IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD

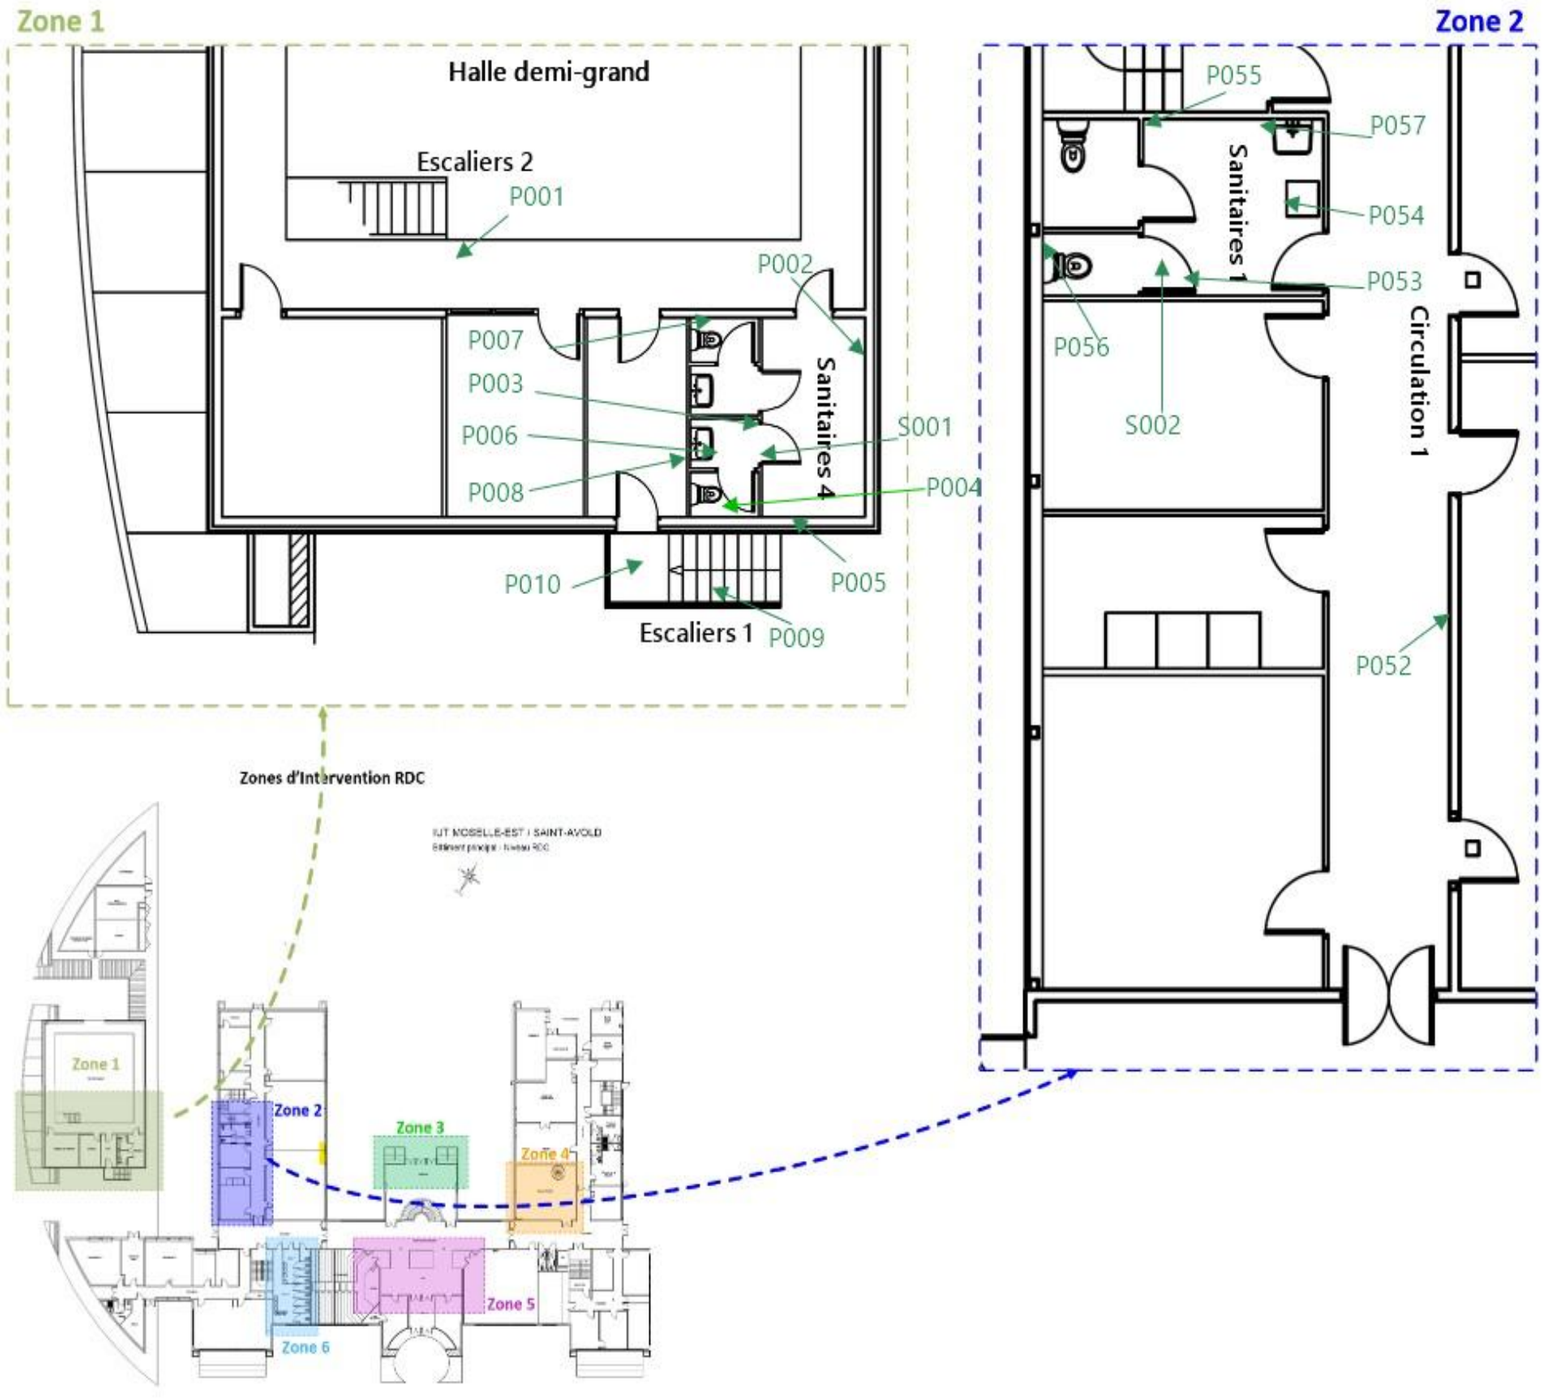


P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX →	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX →	Localisation d'un sondage - Positif

Planche (croquis) de repérage technique : RDC – Zone 1/ Zone 2
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26DAA285 du 16/09/2026
Adresse du bien : IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD

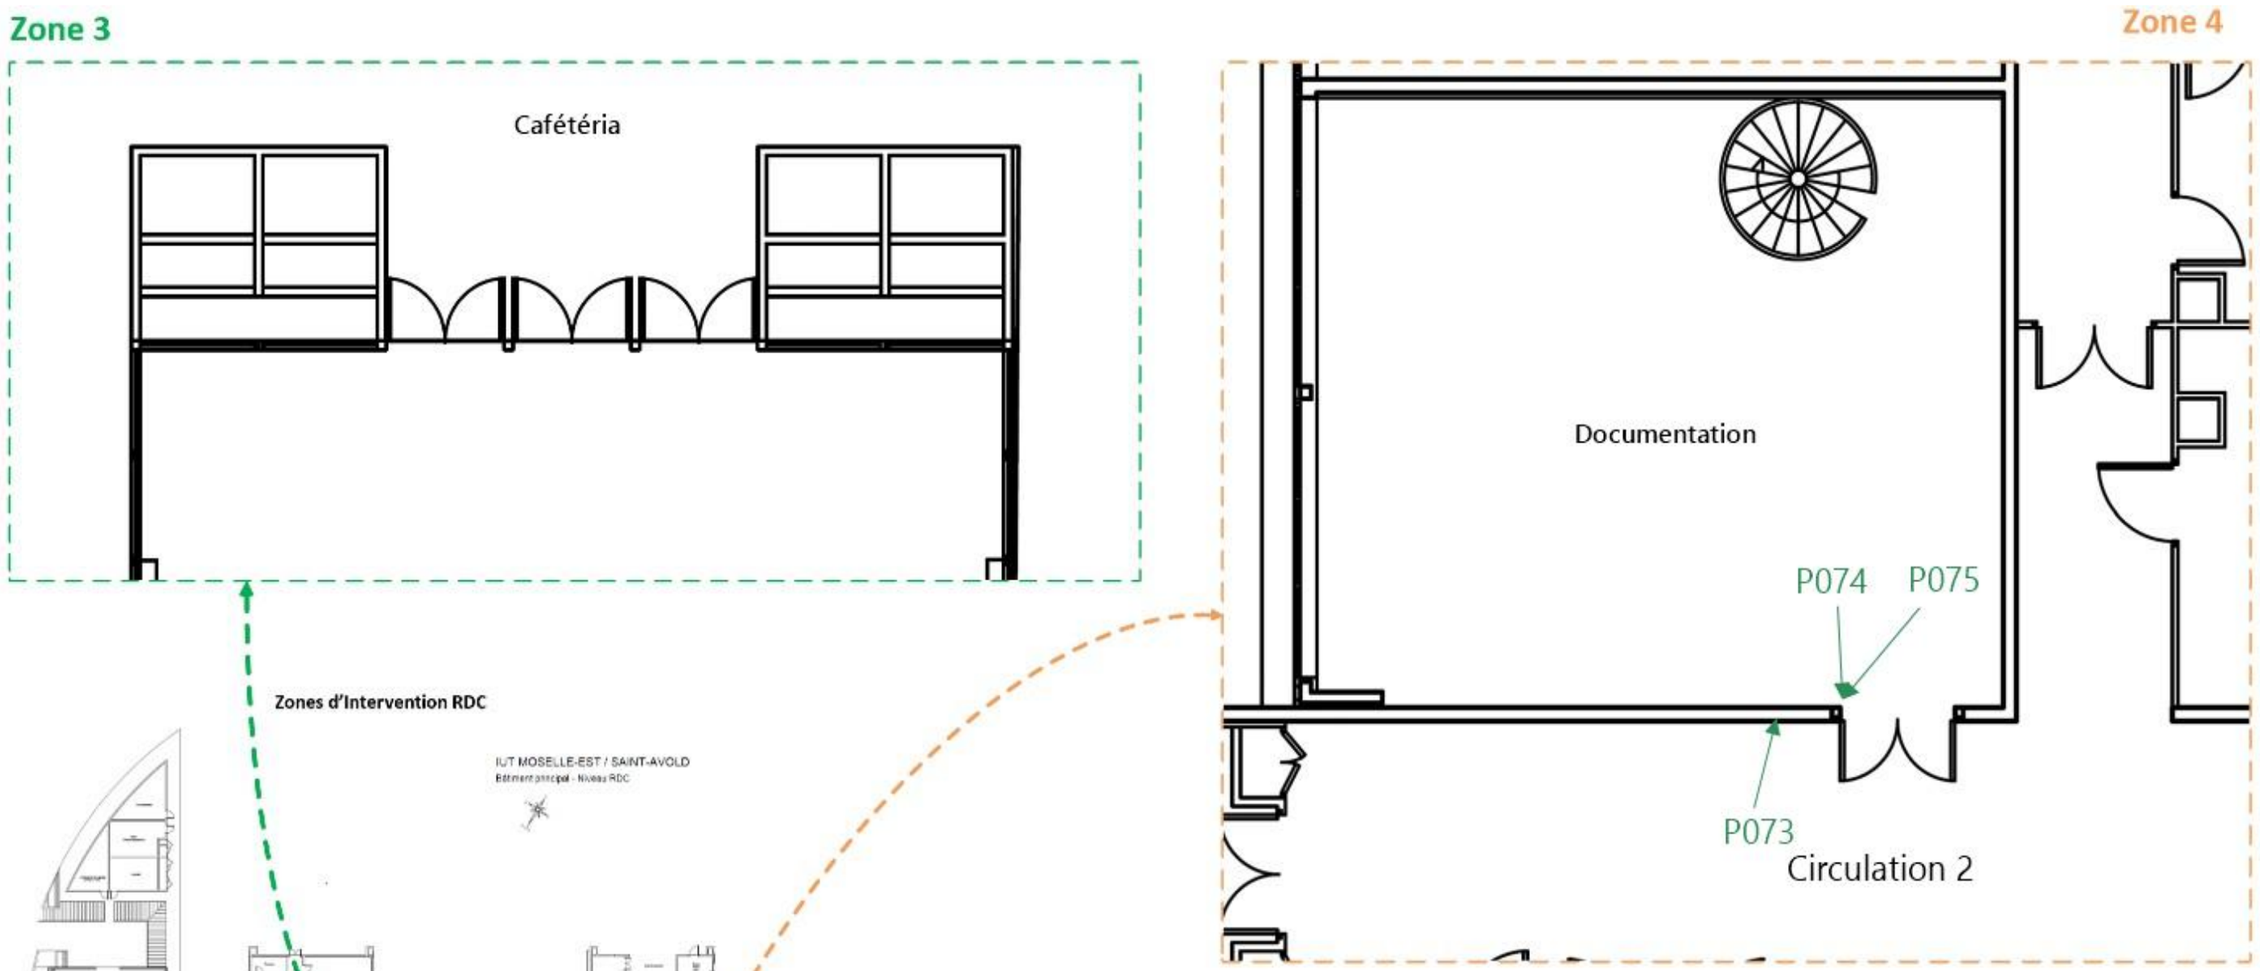

P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX →	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX →	Localisation d'un sondage - Positif


Planche (croquis) de repérage technique : RDC – Zone 3/ Zone 4
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26DAA285 du 16/09/2026
Adresse du bien : IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD

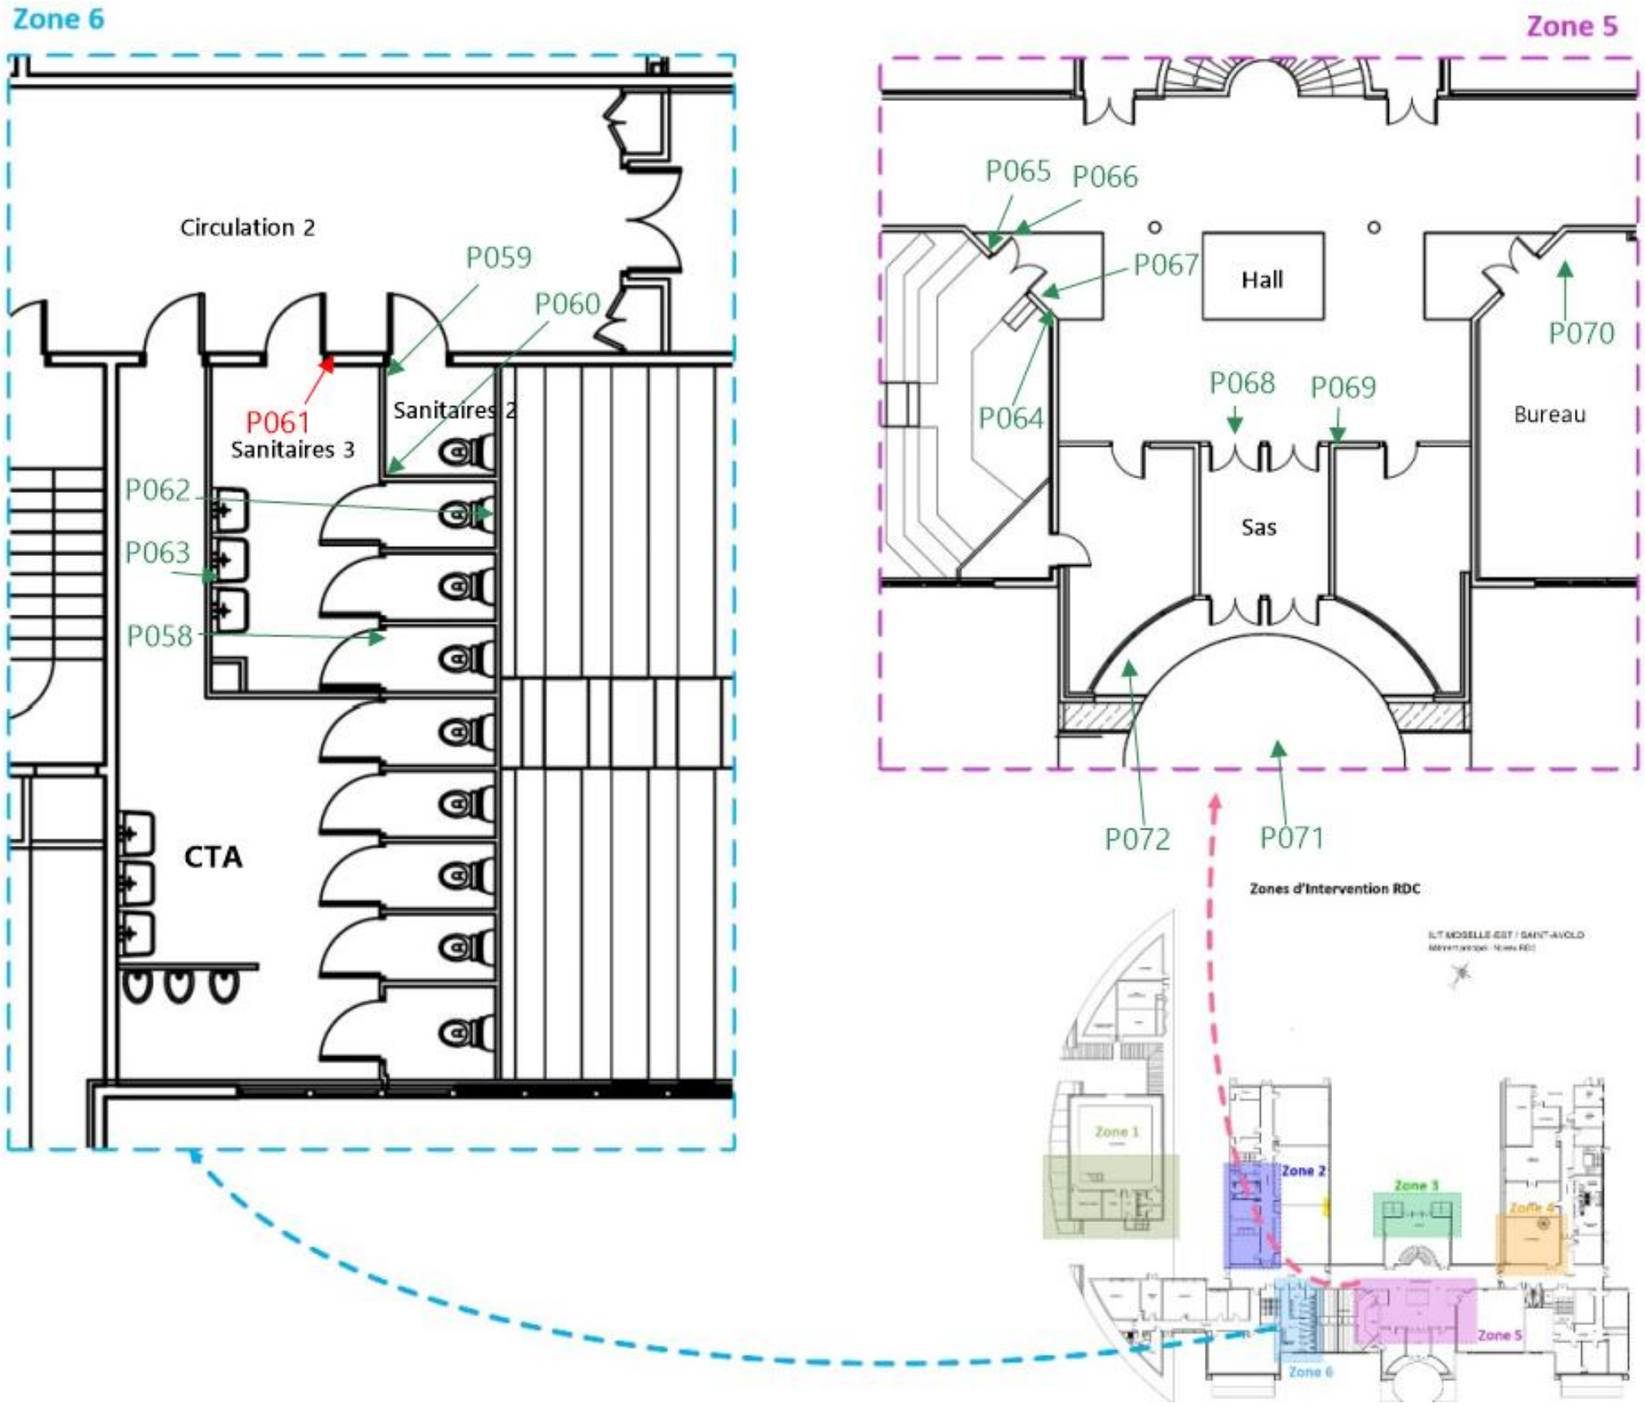

P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX →	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX →	Localisation d'un sondage - Positif

Planche (croquis) de repérage technique : RDC – Zone 5/ Zone 6
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26DAA285 du 16/09/2026
Adresse du bien : IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD

Zone 6

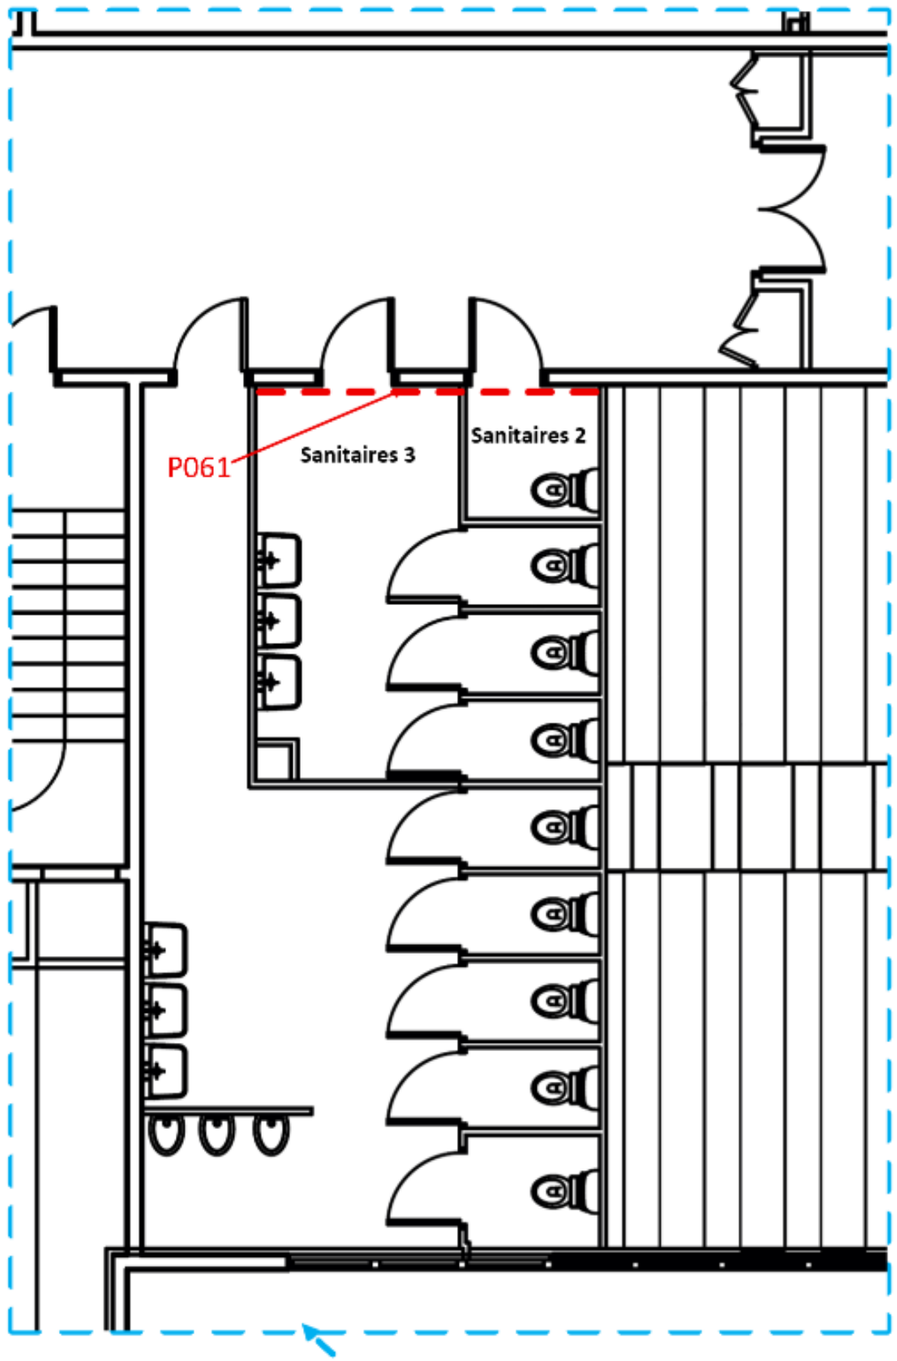

ZPSO-051 - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché



Matériaux et produits contenant de l'amiante RDC –Zone 6
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26DAA285 du 16/09/2026
Adresse du bien : IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD

Zones d'Intervention R+1



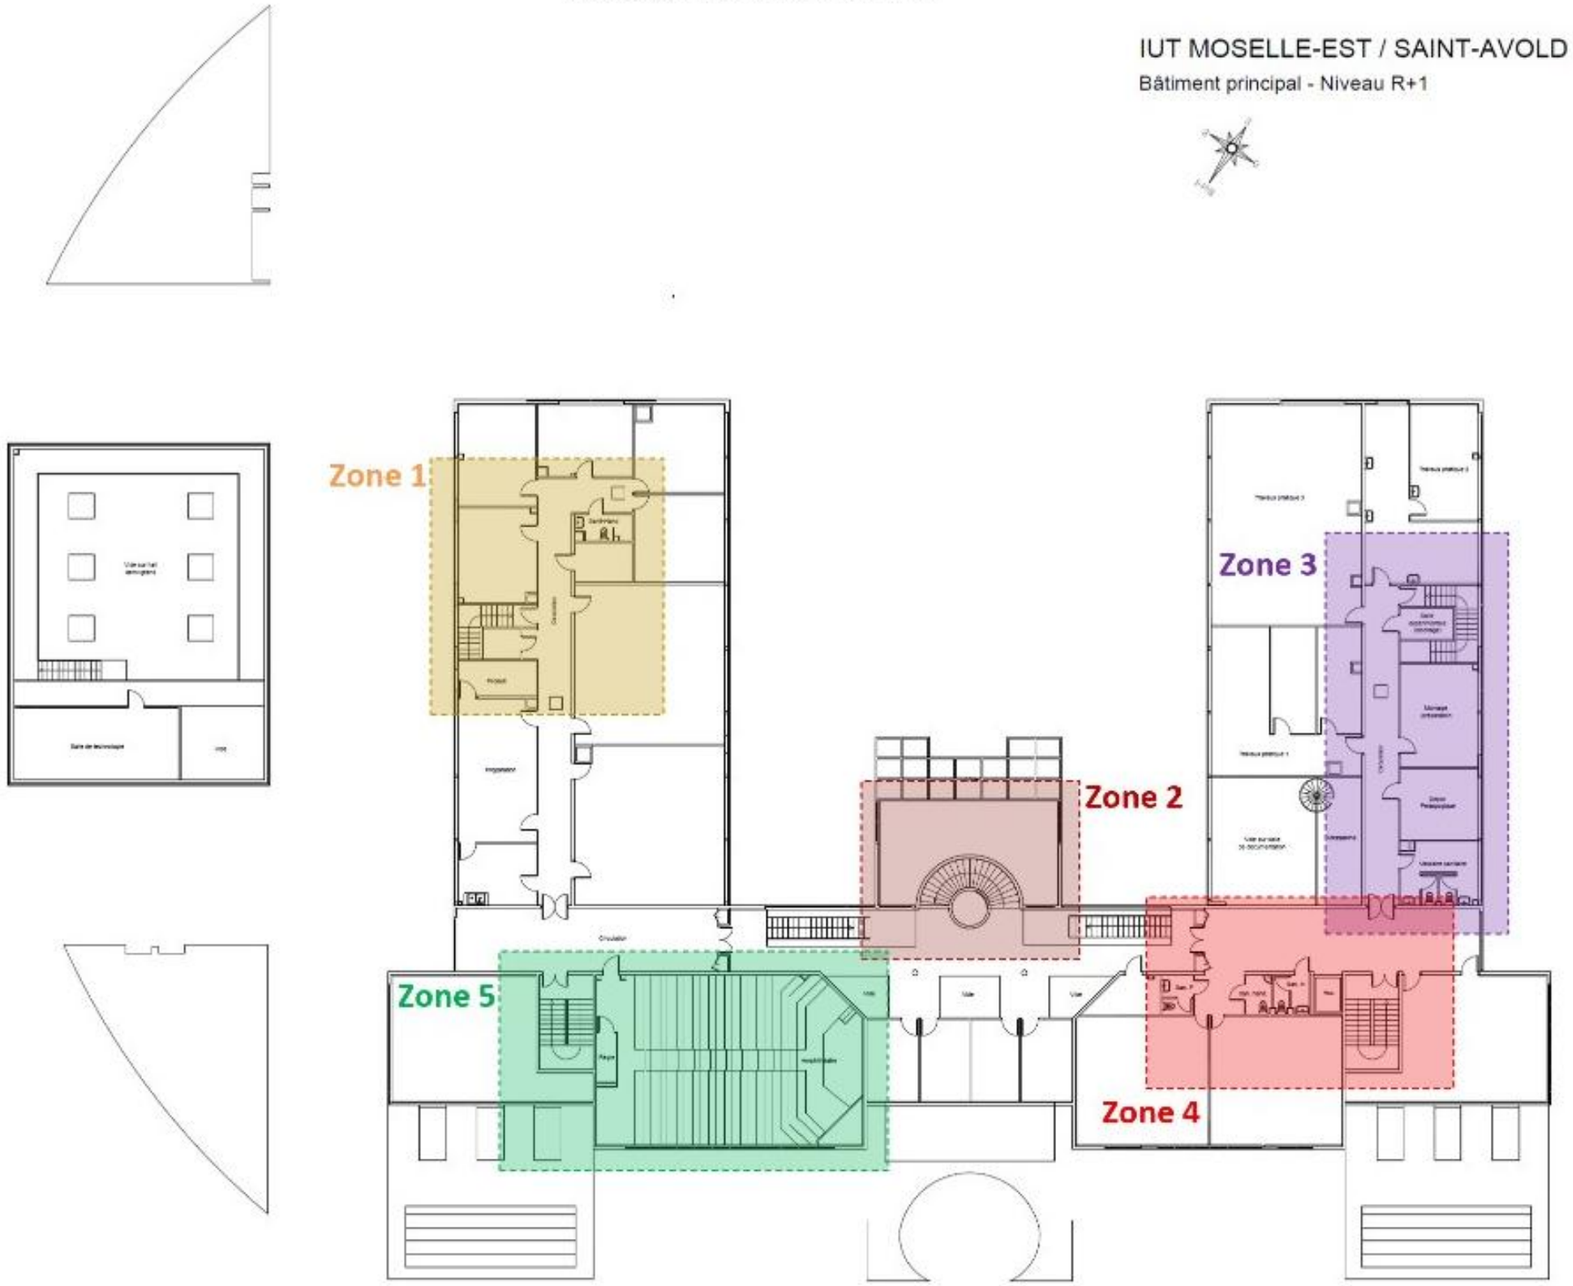


Planche (croquis) de repérage technique : Zones d'Intervention R+1
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26DAA285 du 16/09/2026
Adresse du bien : IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD

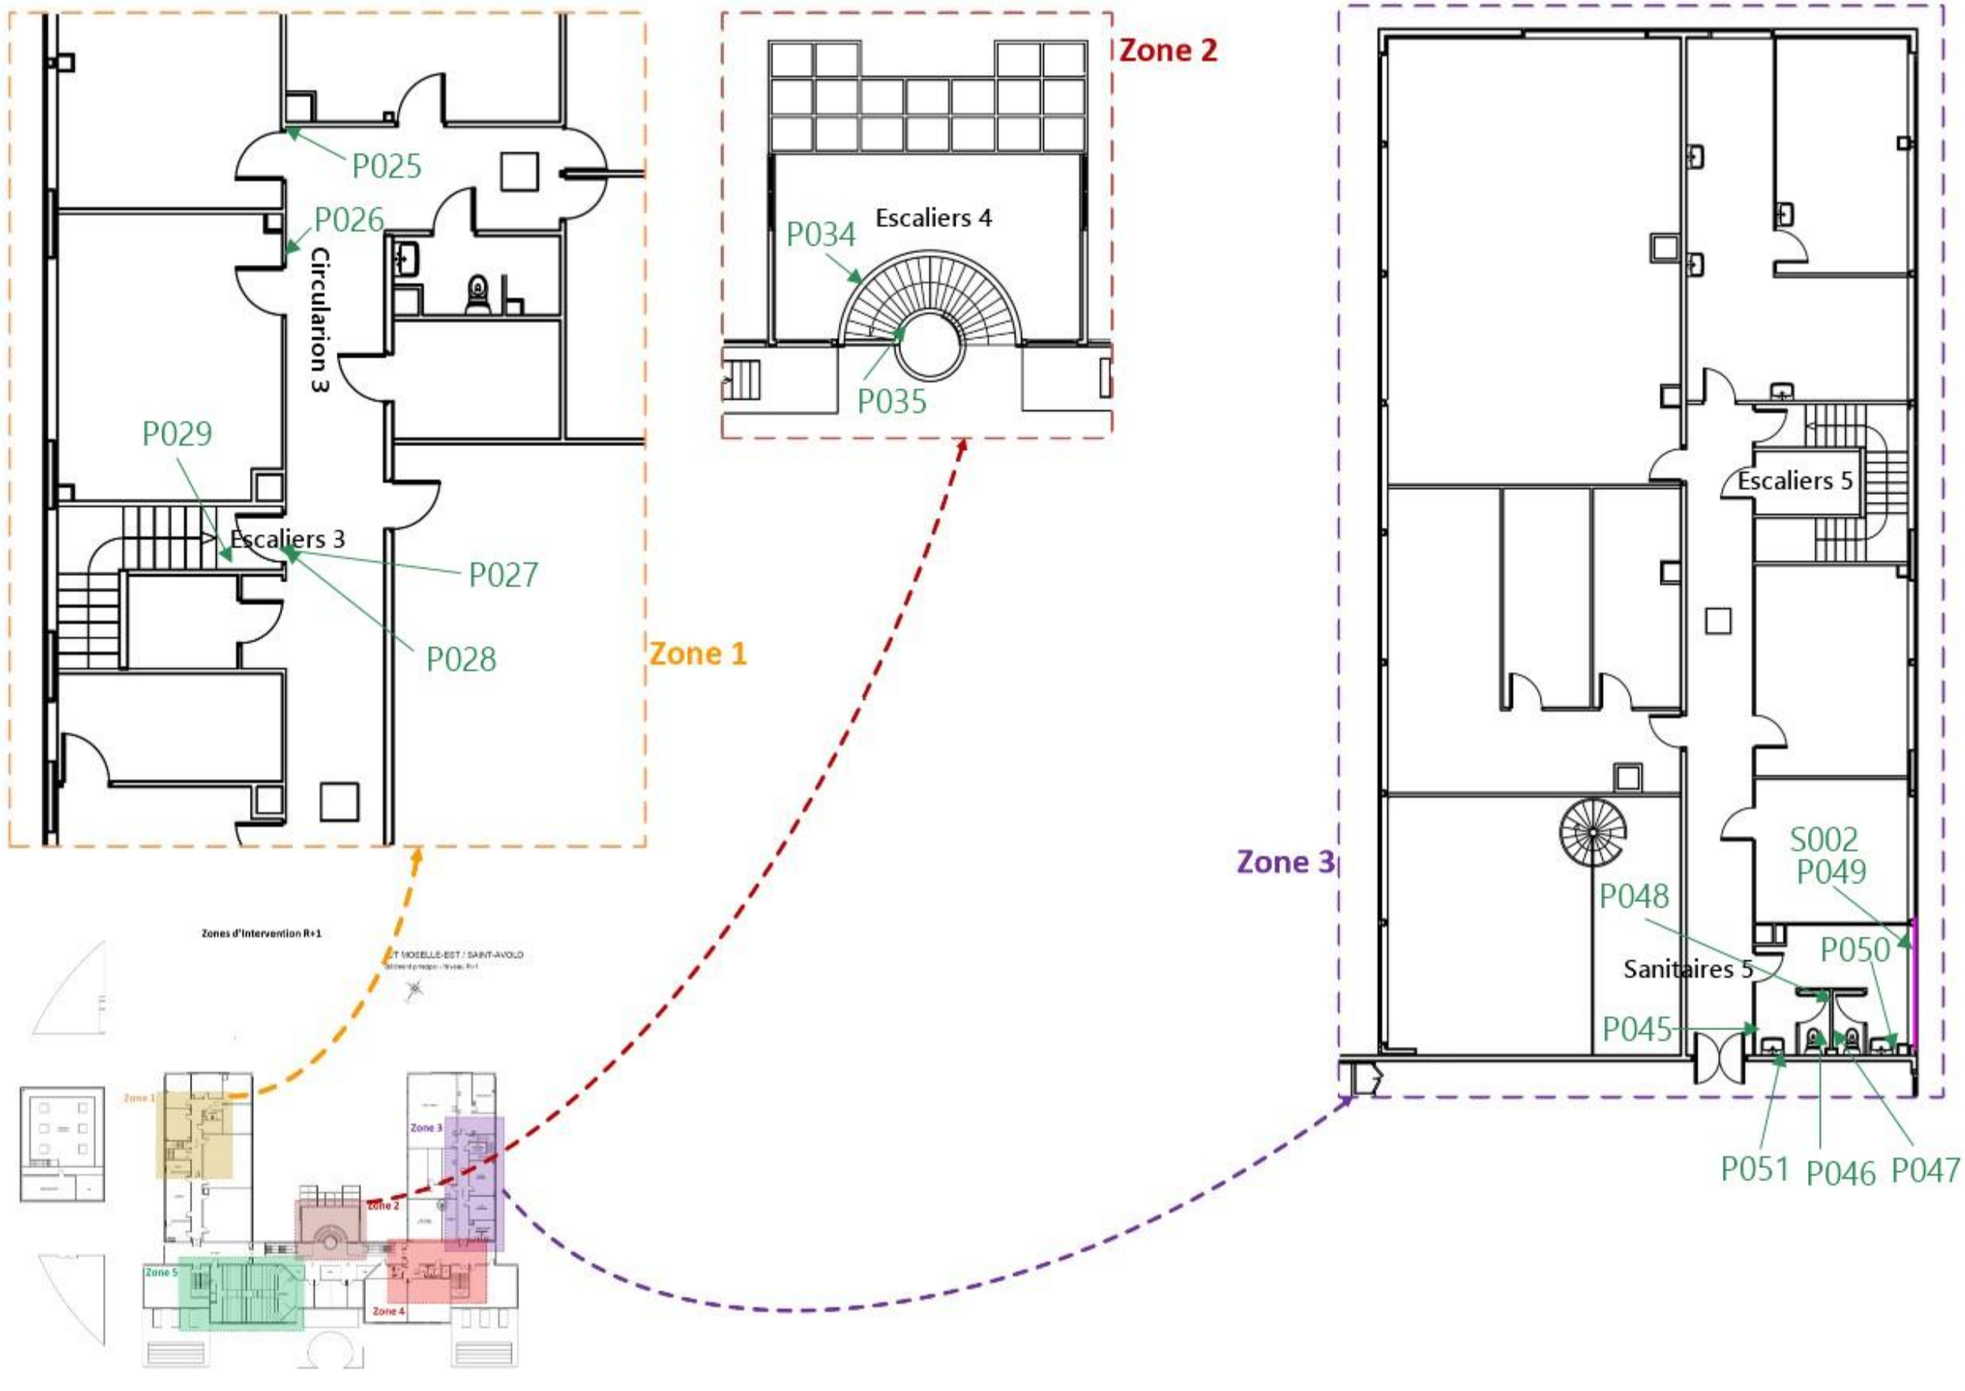

P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX →	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX →	Localisation d'un sondage - Positif

Planche (croquis) de repérage technique : R+1 – Zone 1/ Zone 2/Zone 3
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26DAA285 du 16/09/2026
Adresse du bien : IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD

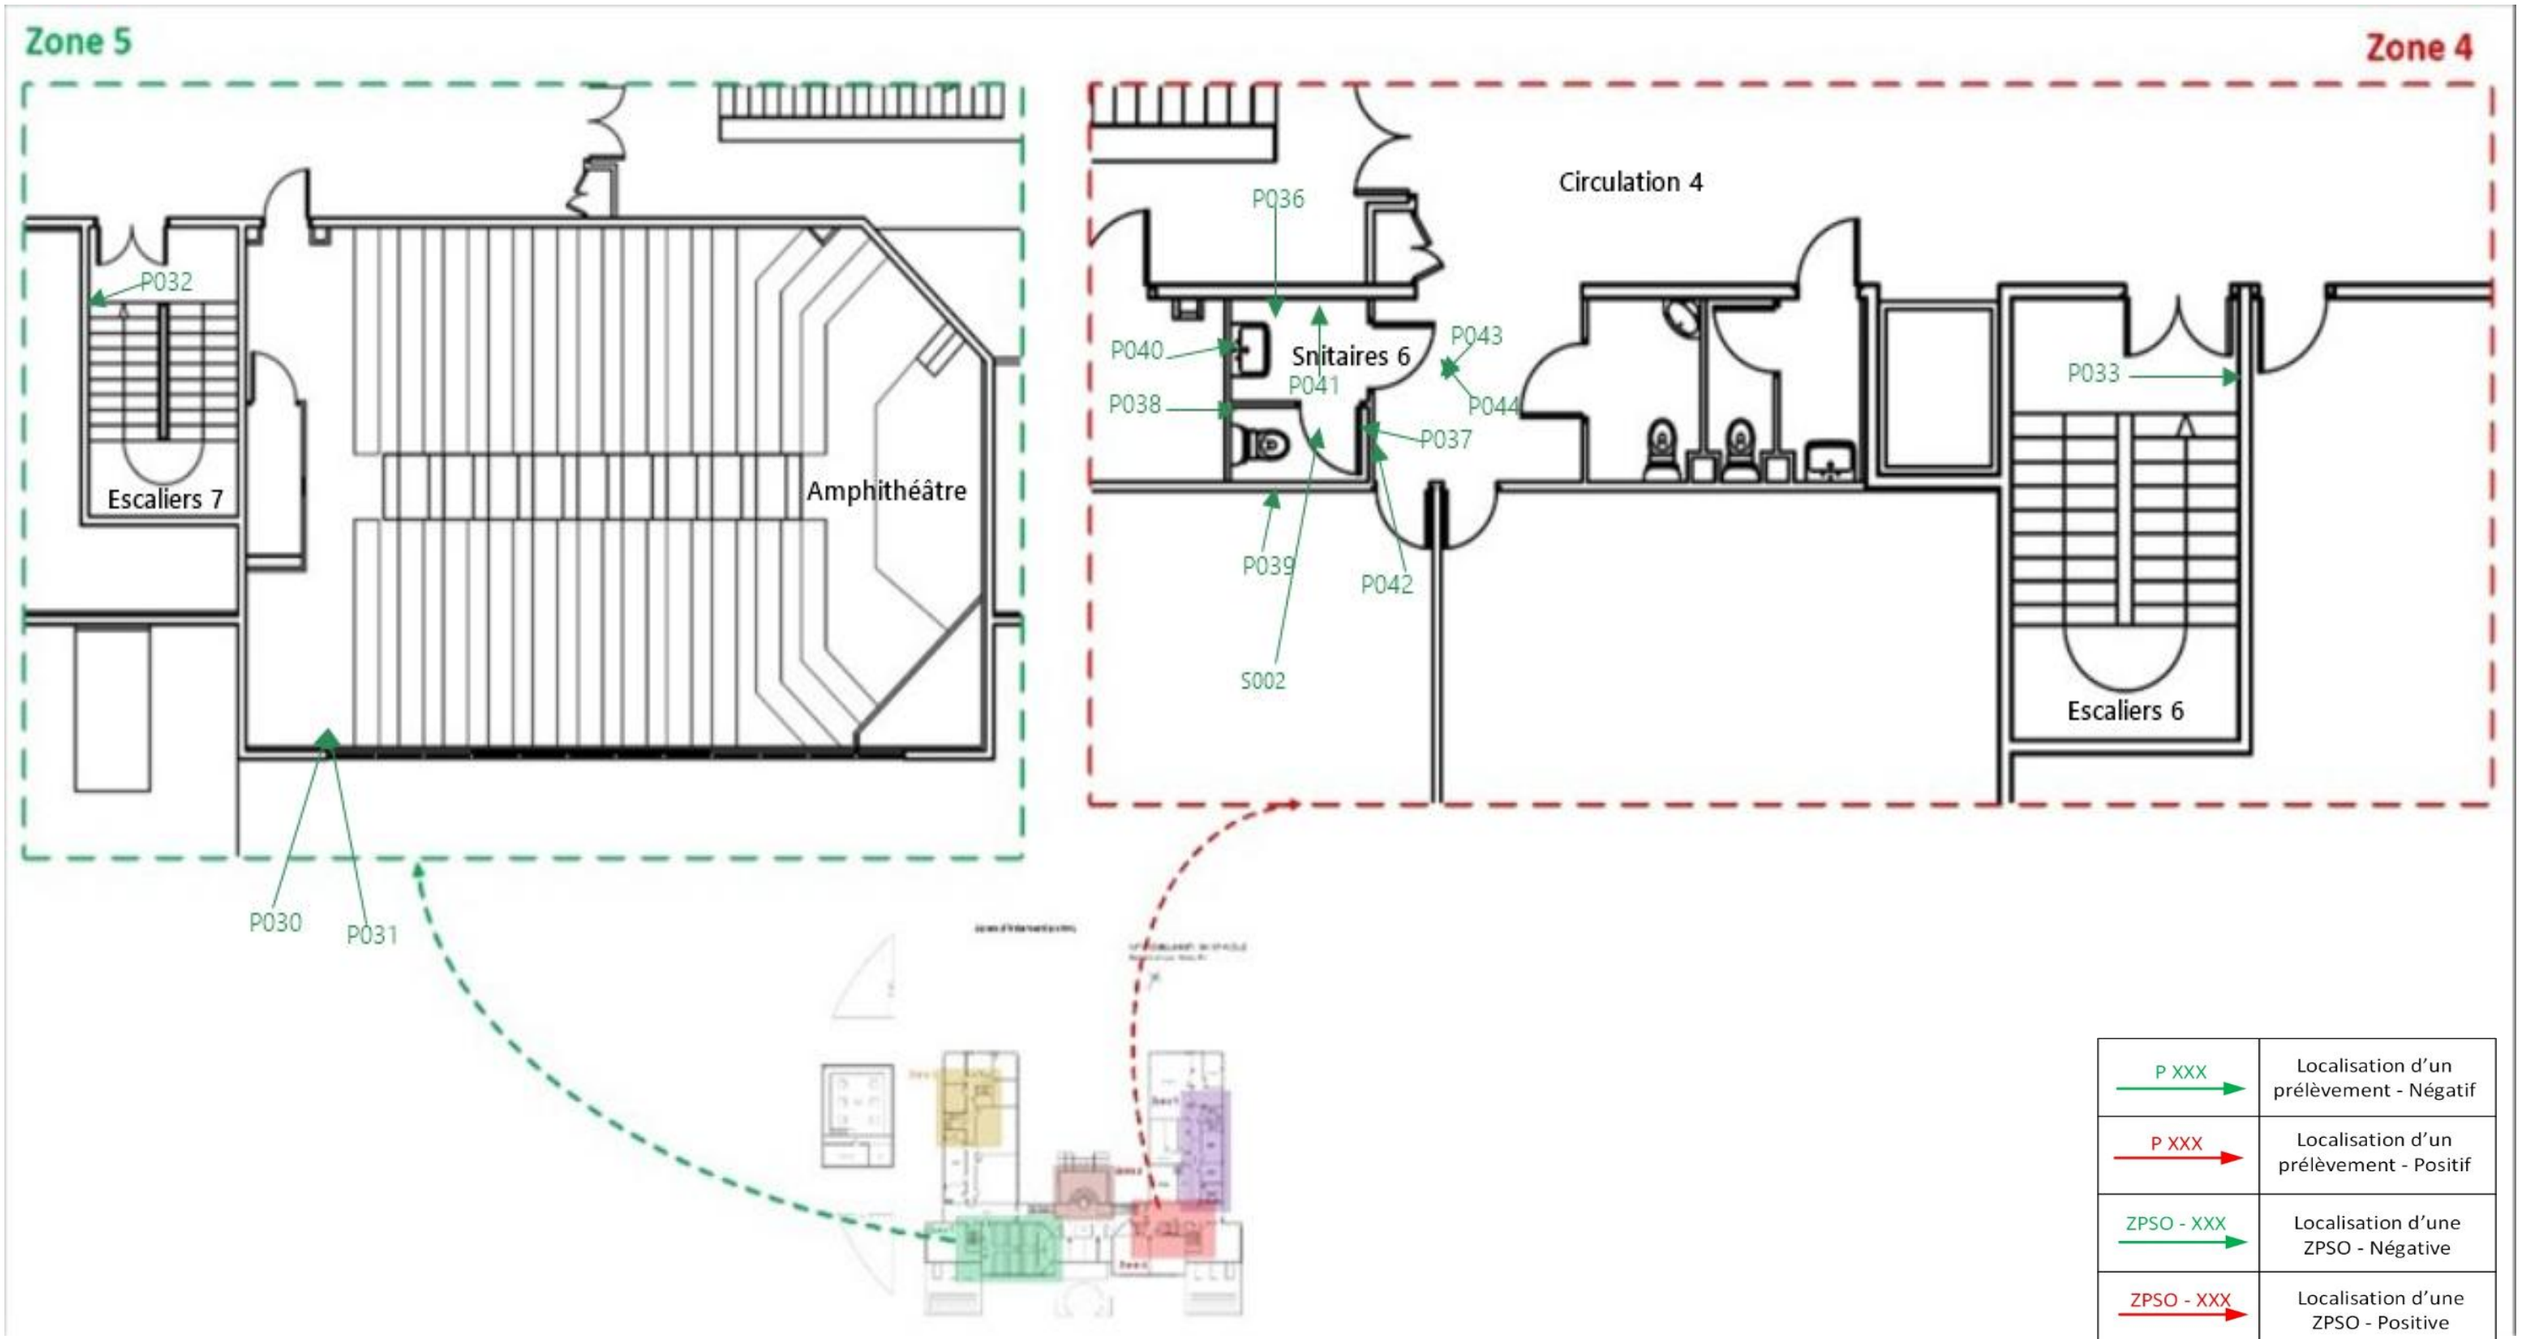

P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX →	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX →	Localisation d'un sondage - Positif

Planche (croquis) de repérage technique : R+1 – Zone 4/ Zone 5
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26DAA285 du 16/09/2026
Adresse du bien : IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD

Zones d'Intervention R+2




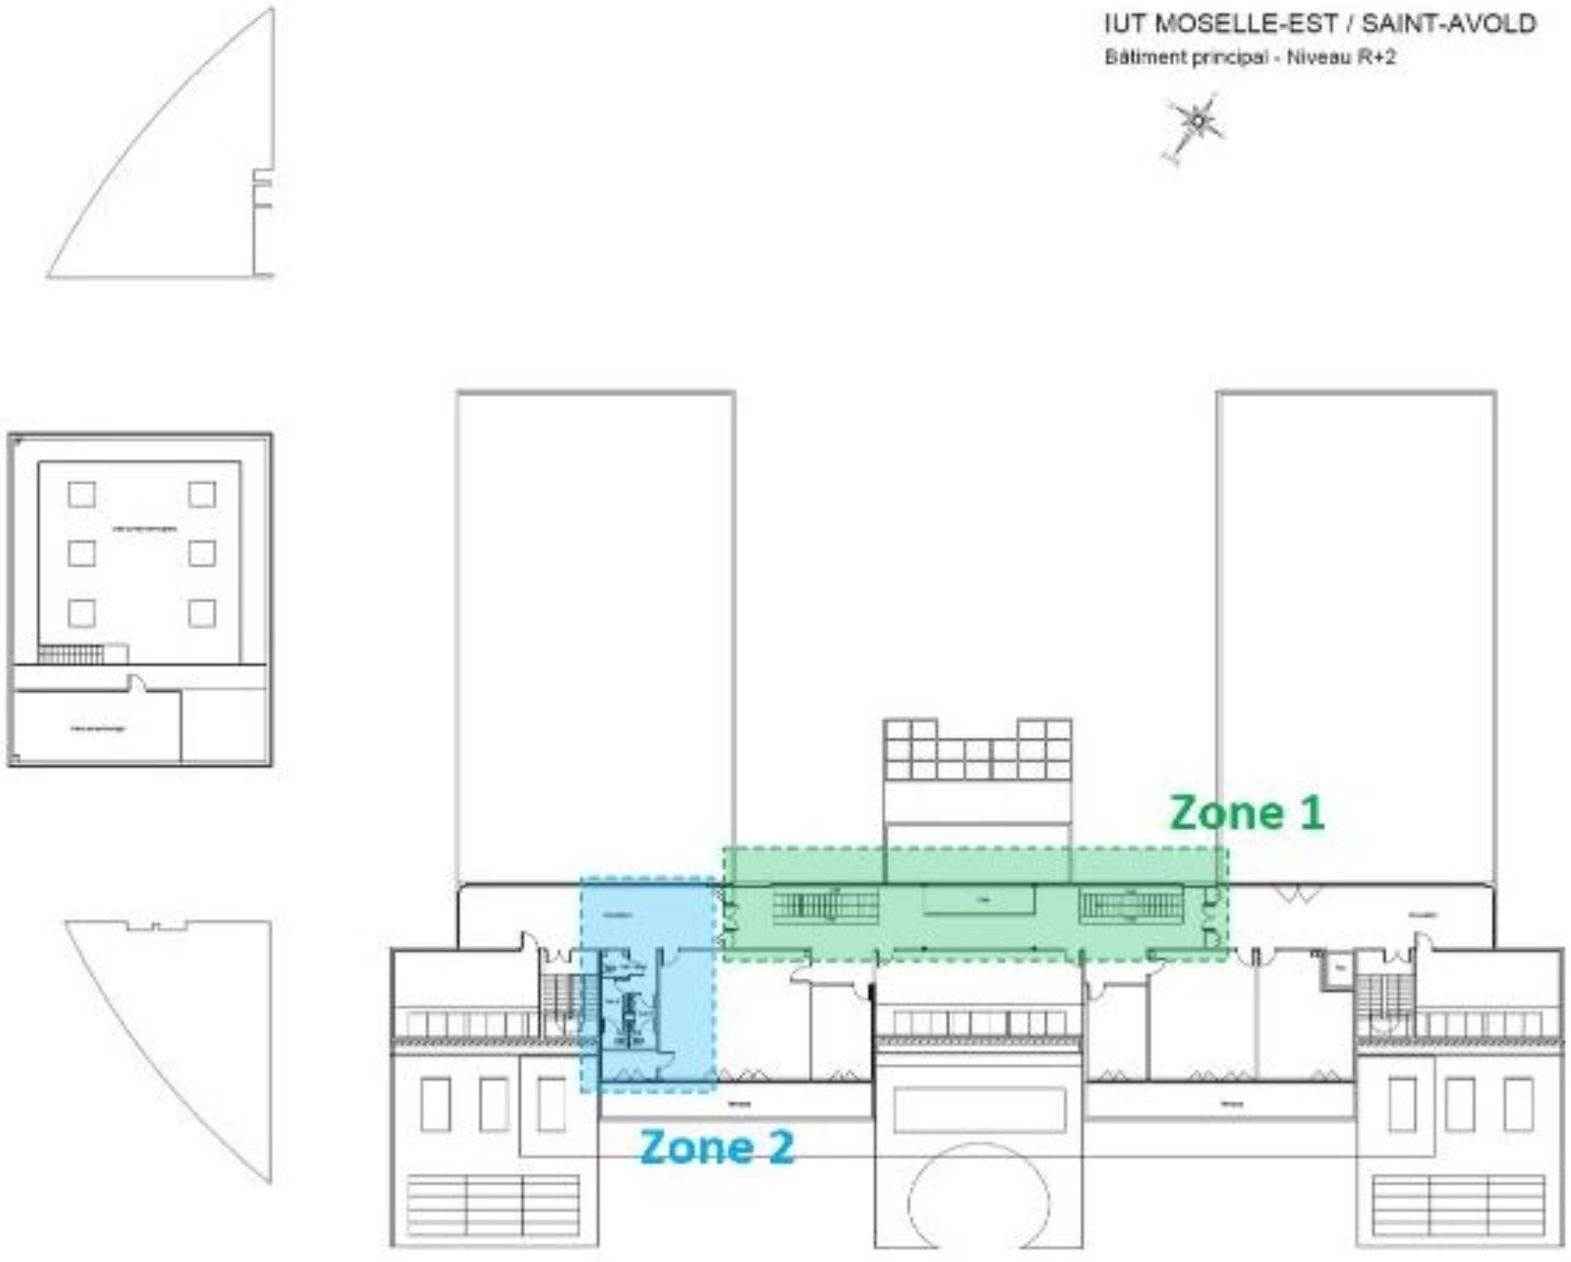


Planche (croquis) de repérage technique : Zones d'Intervention R+2
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26DAA285 du 16/09/2026
Adresse du bien : IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD

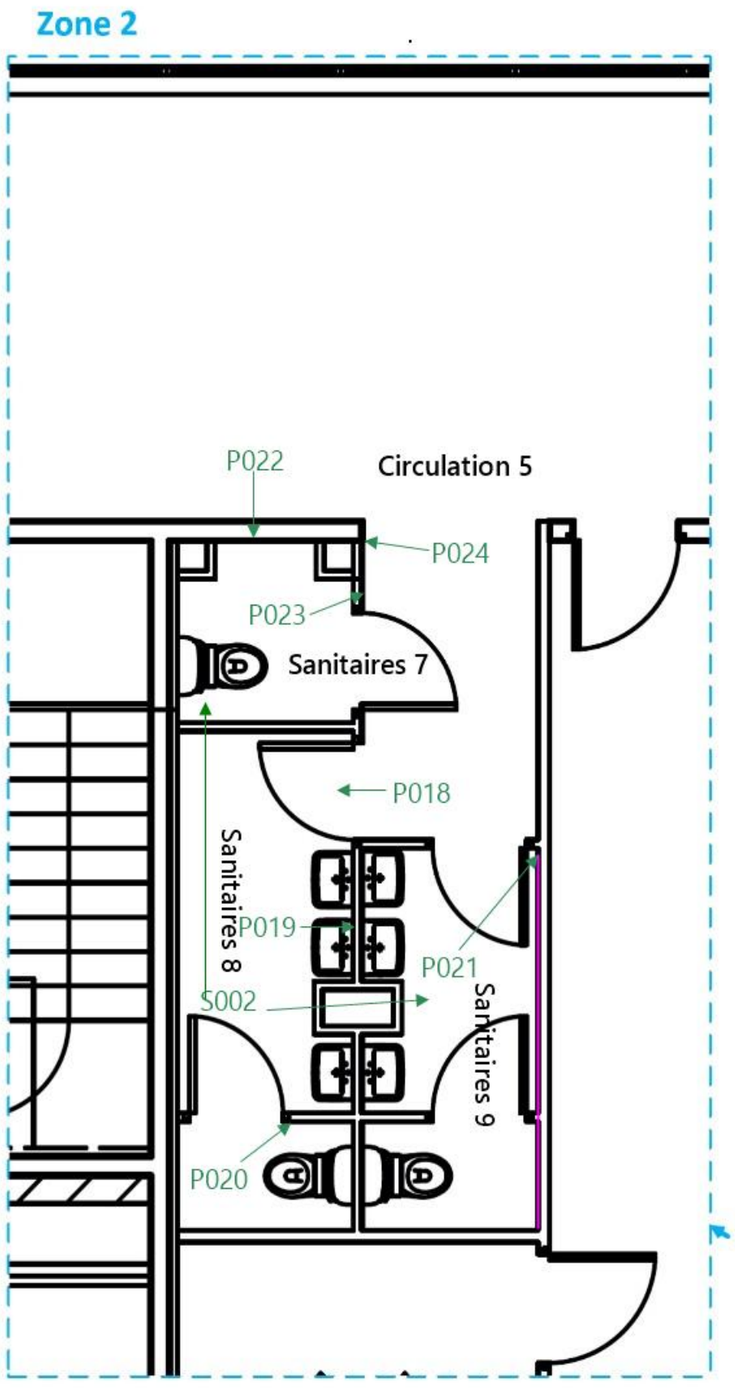

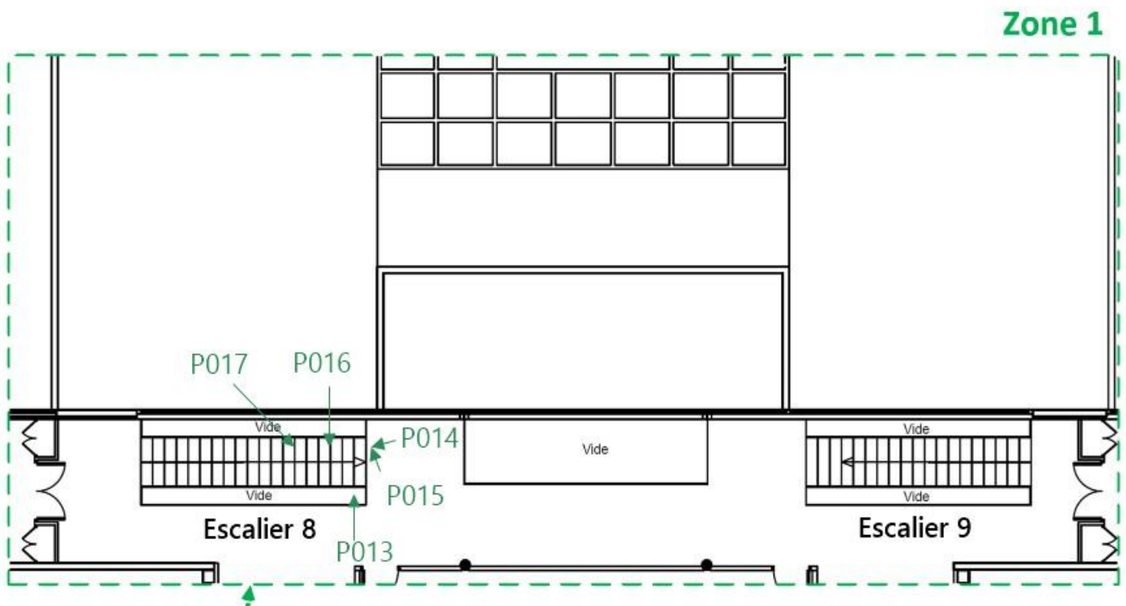

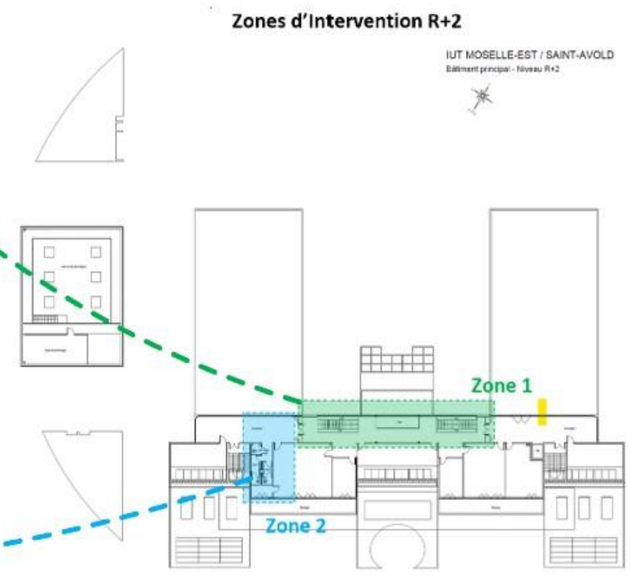

P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX →	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX →	Localisation d'un sondage - Positif

Planche (croquis) de repérage technique R+1 – Zone 1/Zone2
DIAGOBAH, auteur : M VEGEZZI Thibault
Dossier n° 26DAA285 du 16/09/2026
Adresse du bien : IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD

7.2 Annexe : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE


Rouge = Positif ; Vert = Négatif

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P001	RDC - Escaliers 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P002	RDC - Sanitaires 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P003	RDC - Sanitaires 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P004	RDC - Sanitaires 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P005	RDC - Sanitaires 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P006	RDC - Sanitaires 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P007	RDC - Sanitaires 4	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	
P008	RDC - Sanitaires 4	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P009	RDC - Escaliers 1	7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Enduit ciment	
P010	RDC - Escaliers 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	
P011	RDC - Escalier extérieur	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Scellement ciment	
P012	RDC - Escalier extérieur	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment	


N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P013	R+2 - Escalier 8	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P014	R+2 - Escalier 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol pvc + Couche2: Colle non bitumineuse	
P015	R+2 - Escalier 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	
P016	R+2 - Escalier 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	

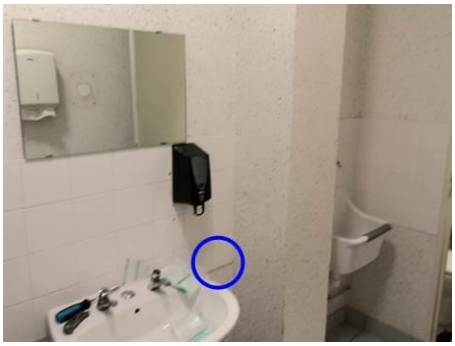N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P017	R+2 - Escalier 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	
P018	R+2 - Sanitaires 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P019	R+2 - Sanitaires 8	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	 


N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P020	R+2 - Sanitaires 8	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	
P021	R+2 - Sanitaires 9	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P022	R+2 - Sanitaires 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P023	R+2 - Sanitaires 7	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P024	R+2 - Sanitaires 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P025	R+1 - Circulation 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P026	R+1 - Circulation 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P027	R+1 - Escaliers 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P028	R+1 - Escaliers 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	
P029	R+1 - Escaliers 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P030	R+1 - Amphithéâtre	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	
P031	R+1 - Amphithéâtre	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	

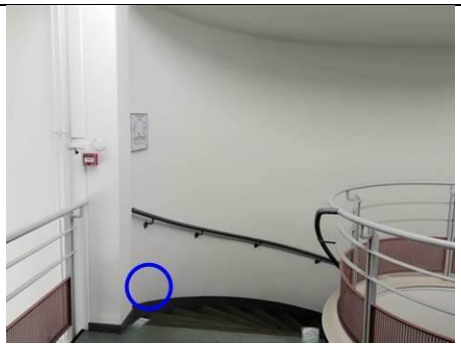N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P032	R+1 - Escaliers 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P033	R+1 - Escaliers 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P034	R+1 - Escaliers 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P035	R+1 - Escaliers 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P036	R+1 - Sanitaires 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	
P037	R+1 - Sanitaires 6	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	
P038	R+1 - Sanitaires 6	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P039	R+1 - Sanitaires 6	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	

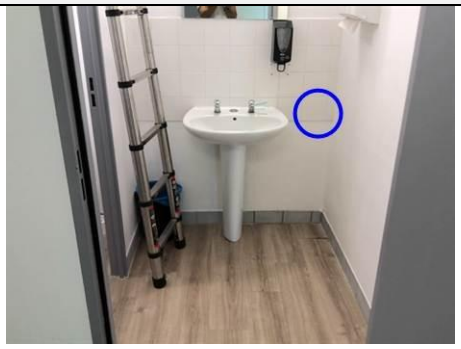N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P040	R+1 - Sanitaires 6	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	
P041	R+1 - Sanitaires 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P042	R+1 - Circulation 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P043	R+1 - Circulation 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	


N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P044	R+1 - Circulation 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	
P045	R+1 - Sanitaires 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P046	R+1 - Sanitaires 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	
P047	R+1 - Sanitaires 5	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P048	R+1 - Sanitaires 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P049	R+1 - Sanitaires 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P050	R+1 - Sanitaires 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P051	R+1 - Sanitaires 5	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P052	RDC - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P053	RDC - Sanitaires 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P054	RDC - Sanitaires 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	
P055	RDC - Sanitaires 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P056	RDC - Sanitaires 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P057	RDC - Sanitaires 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	
P058	RDC - Sanitaires 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P059	RDC - Sanitaires 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P060	RDC - Sanitaires 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P061	RDC - Sanitaires 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P062	RDC - Sanitaires 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P063	RDC - Sanitaires 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	

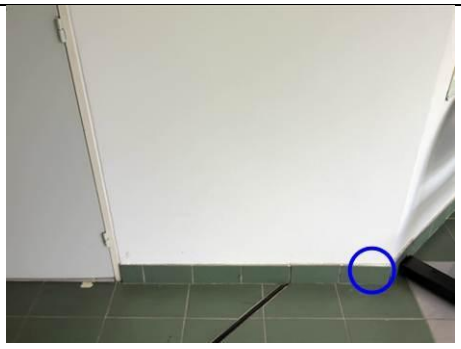N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P064	R+1 - Amphithéâtre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P065	RDC - Hall	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P066	RDC - Hall	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P067	RDC - Hall	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P068	RDC - Sas	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P069	RDC - Sas	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	
P070	RDC - Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse + Dalle de sol	
P071	RDC - Extérieur	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P072	RDC - Extérieur	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	
P073	RDC - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	
P074	RDC - Documentation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse + Dalle de sol	
P075	RDC - Documentation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	

7.3 Annexe : RAPPORT D'ESSAIS

Copie des rapports d'essais :

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tel : 03.87.35.83.50
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : DIAGOBAH ALSACE 1 Rue René Laennec 67300 Schiltigheim	Réf. Commande ITGA : IT0326-11390 Réf. Commande Client : 26DAA285_2026_08_28_1527_0275

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/09/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD Réf échantillon client : P001 - Colle de carrelage - RDC - Escaliers 2		Réf échantillon ITGA : IT032609-315 Description ITGA : Colle grise	
1 ▸ Colle grise	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD Réf échantillon client : P002 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - RDC - Sanitaires 4		Réf échantillon ITGA : IT032609-316 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris / Matériau plâtreux blanc	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris + Matériau plâtreux blanc non séparable (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19 Page 1/15

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-317	
Réf échantillon client : P003 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - RDC - Sanitaires 4		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
1 ▸ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-318	
Réf échantillon client : P004 - Panneaux et plaques - RDC - Sanitaires 4		Description ITGA : Enduit blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Enduit blanc avec couche cartonnée	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-319	
Réf échantillon client : P005 - Bandes calicot - RDC - Sanitaires 4		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)
1 ▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-320	
Réf échantillon client : P006 - Colle de carrelage - RDC - Sanitaires 4		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
1 ▸ Colle beige + Joint cassant gris non séparable (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-321	
Réf échantillon client : P007 - Colle de plinthes - RDC - Sanitaires 4		Description ITGA : Colle blanche en vrac	
1 ▸ Colle blanche en vrac	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-322	
Réf échantillon client : P008 - Colle de faience - RDC - Sanitaires 4		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
1 ▸ Colle blanche	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-323	
Réf échantillon client : P009 - Enduit ciment - RDC - Escaliers 1		Description ITGA : Enduit compact gris	
1 ▸ Enduit compact gris	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YNG (5)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-324	
Réf échantillon client : P010 - Ragreage - RDC - Escaliers 1		Description ITGA : Ragréage gris	
1 ▸ Ragréage gris	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-325	
Réf échantillon client : P011 - Scellement ciment - RDC - Escalier exterieur		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 ▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-326	
Réf échantillon client : P012 - Sol coule a base ciment - RDC - Escalier exterieur		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 ▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-327	
Réf échantillon client : P013 - Bandes calicot - R+2 - Escalier 8		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YNG (6)
1 ▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-328	
Réf échantillon client : P014 - Couche1: Dalle de sol pvc + Couche2: Colle non bitumineuse - R+2 - Escalier 8		Description ITGA : Dalle dure cassante verte / Colle polymère jaune / Revêtement souple noir / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
1 ▸ Dalle dure cassante verte + Colle polymère jaune non séparable (2)	META (B) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)
1 ▸ Revêtement souple noir	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste(s) : BVM / YNG
1 ▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-329	
Réf échantillon client : P015 - Ragreage - R+2 - Escalier 8		Description ITGA : Ragréage gris	
1 ▸ Ragréage gris	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-330	
Réf échantillon client : P016 - Colle non bitumineuse - R+2 - Escalier 8		Description ITGA : Colle blanche / Ragréage gris	
1 ▸ Colle blanche + Ragréage gris non séparable (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-331	
Réf échantillon client : P017 - Ragreage - R+2 - Escalier 8		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune	
1 ▸ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-332	
Réf échantillon client : P018 - Colle de carrelage - R+2 - Sanitaires 8		Description ITGA : Colle grise	
1 ▸ Colle grise	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-333	
Réf échantillon client : P019 - Colle de faience - R+2 - Sanitaires 8		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
1 ▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-334	
Réf échantillon client : P020 - Colle de plinthes - R+2 - Sanitaires 8		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
1 ▸ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant gris non séparable (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-335	
Réf échantillon client : P021 - Bandes calicot - R+2 - Sanitaires 9		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)
1 ▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-336	
Réf échantillon client : P022 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - R+2 - Sanitaires 7		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-337	
Réf échantillon client : P023 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - R+2 - Sanitaires 7		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : BVM (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-338	
Réf échantillon client : P024 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+2 - Sanitaires 7		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (5)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-339	
Réf échantillon client : P025 - Bandes calicot - R+1 - Circularion 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)
1 ▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-340	
Réf échantillon client : P026 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - R+1 - Circularion 3		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-341	
Réf échantillon client : P027 - Couche1 : Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple + Couche2 : Colle non bitumineuse - R+1 - Escaliers 3		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité (1)	
1 ▸ Revêtement souple gris	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM
1 ▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-342	
Réf échantillon client : P028 - Ragreage - R+1 - Escaliers 3		Description ITGA : Ragréage gris	
1 ▸ Ragréage gris	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-343	
Réf échantillon client : P029 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - R+1 - Escaliers 3		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-344	
Réf échantillon client : P030 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Amphitheatre		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
1 ▸ Revêtement souple gris	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ
1 ▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-345	
Réf échantillon client : P031 - Ragreage - R+1 - Amphitheatre		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris / Matériau souple blanc	
1 ▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Matériau gris non séparable (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YNG (6)
1 ▸ Matériau souple blanc	META (B) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-346	
Réf échantillon client : P032 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Escaliers 7		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DIAGOBAH
1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 51
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-347	
Réf échantillon client : P033 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Escaliers 6		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (5)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-348	
Réf échantillon client : P034 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Escaliers 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (5)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-349	
Réf échantillon client : P035 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Escaliers 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (5)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-350	
Réf échantillon client : P036 - Ragreage - R+1 - Snitaires 6		Description ITGA : Ragréage gris	
1 ▸ Ragréage gris	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-351	
Réf échantillon client : P037 - Colle de plinthes - R+1 - Snitaires 6		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
1 ▸ Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-352	
Réf échantillon client : P038 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - R+1 - Snitaires 6		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DIAGOBAH
1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 51
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-353	
Réf échantillon client : P039 - Bandes calicot - R+1 - Snitaires 6		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : BVM (6)
1 ▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-354	
Réf échantillon client : P040 - Colle de faience - R+1 - Snitaires 6		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
1 ▸ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : BVM (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-355	
Réf échantillon client : P041 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Snitaires 6		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YNG (5)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-356	
Réf échantillon client : P042 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Circulation 4		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YNG (5)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-357	
Réf échantillon client : P043 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - R+1 - Circulation 4		Description ITGA : Dalle dure cassante verte / Colle polymère jaune / Ragréage rose en faible quantité	
1 ▸ Dalle dure cassante verte + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en faible quantité non séparable (2)	META (B) le 02/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BKA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-358	
Réf échantillon client : P044 - Ragreage - R+1 - Circulation 4		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
1 ▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-359	
Réf échantillon client : P045 - Colle de carrelage - R+1 - Sanitaires 5		Description ITGA : Colle grise en vrac	
1 ▸ Colle grise en vrac	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM (5)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-360	
Réf échantillon client : P046 - Ragreage - R+1 - Sanitaires 5		Description ITGA : Ragréage gris	
1 ▸ Ragréage gris	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-361	
Réf échantillon client : P047 - Colle de plinthes - R+1 - Sanitaires 5		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
1 ▸ Colle grise	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-362	
Réf échantillon client : P048 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - R+1 - Sanitaires 5		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-363	
Réf échantillon client : P049 - Bandes calicot - R+1 - Sanitaires 5		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture + Papier	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ
1 ▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GLJ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-364	
Réf échantillon client : P050 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Sanitaires 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : YNG (5)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-365	
Réf échantillon client : P051 - Colle de faience - R+1 - Sanitaires 5		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Joint cassant blanc	
1 ▸ Peinture non séparable + Colle grise + Joint cassant blanc non séparable (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM (6)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-366	
Réf échantillon client : P052 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - RDC - Circulation 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM (5)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-367	
Réf échantillon client : P053 - Colle de carrelage - RDC - Sanitaires 1		Description ITGA : Colle polymère jaune / Colle grise	
1 ▸ Colle polymère jaune non séparable + Colle grise (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM (6)
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-368	
Réf échantillon client : P054 - Colle de plinthes - RDC - Sanitaires 1		Description ITGA : Colle beige hétérogène	
1 ▸ Colle beige hétérogène	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-369	
Réf échantillon client : P055 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - RDC - Sanitaires 1		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc (2)	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BVM (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-370	
Réf échantillon client : P056 - Bandes calicot - RDC - Sanitaires 1		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture + Papier	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM
1 ▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-371	
Réf échantillon client : P057 - Colle de faience - RDC - Sanitaires 1		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
1 ▸ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-372	
Réf échantillon client : P058 - Colle de carrelage - RDC - Sanitaires 3		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
1 ▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-373	
Réf échantillon client : P059 - Colle de plinthes - RDC - Sanitaires 2		Description ITGA : Colle beige hétérogène	
1 ▸ Colle beige hétérogène	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-374	
Réf échantillon client : P060 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - RDC - Sanitaires 2		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
1 ▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : BVM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DIAGOBAH
1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 51
RCS Nancy : 884 296 856 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-375	
Réf échantillon client : P061 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - RDC - Sanitaires 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YNG
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-376	
Réf échantillon client : P062 - Bandes calicot - RDC - Sanitaires 3		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc	
1 ▸ Peinture + Papier	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : GLJ
1 ▸ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : GLJ
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-377	
Réf échantillon client : P063 - Colle de faience - RDC - Sanitaires 3		Description ITGA : Colle blanche en vrac	
1 ▸ Colle blanche en vrac	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-378	
Réf échantillon client : P064 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - R+1 - Amphitheatre		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-379	
Réf échantillon client : P065 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - RDC - Hall		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-380	
Réf échantillon client : P066 - Colle de carrelage - RDC - Hall		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
1 ▸ Colle grise en vrac	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD Réf échantillon client : P067 - Colle de plinthes - RDC - Hall		Réf échantillon ITGA : IT032609-381 Description ITGA : Colle beige hétérogène	
1 ▸ Colle beige hétérogène	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD Réf échantillon client : P068 - Colle de carrelage - RDC - Sas		Réf échantillon ITGA : IT032609-382 Description ITGA : Colle blanche en vrac	
1 ▸ Colle blanche en vrac	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD Réf échantillon client : P069 - Colle de plinthes - RDC - Sas		Réf échantillon ITGA : IT032609-383 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
1 ▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD Réf échantillon client : P070 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - RDC - Bureau		Réf échantillon ITGA : IT032609-384 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère incolore avec poussières	
1 ▸ Dalle dure cassante beige + Colle polymère incolore avec poussières non séparable	META (B) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : GLJ
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD Réf échantillon client : P071 - Colle de carrelage - RDC - Exterieur		Réf échantillon ITGA : IT032609-385 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
1 ▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD Réf échantillon client : P072 - Colle de plinthes - RDC - Exterieur		Réf échantillon ITGA : IT032609-386 Description ITGA : Colle grise	
1 ▸ Colle grise	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : BVM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-11390 EN DATE DU 03/09/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-387	
Réf échantillon client : P073 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - RDC - Circulation 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-388	
Réf échantillon client : P074 - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - RDC - Documentation		Description ITGA : Dalle dure cassante beige avec poussières / Colle polymère jaune	
1 ▸ Dalle dure cassante beige avec poussières + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : GLJ
Réf dossier client : 26DAA285 - IUT St Avold - Rue Victor Demange 57500 SAINT-AVOLD		Réf échantillon ITGA : IT032609-389	
Réf échantillon client : P075 - Ragreage - RDC - Documentation		Description ITGA : Ragréage gris	
1 ▸ Ragréage gris	META (A) le 03/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BVM

(1) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse.
(2) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
1.accréditation n° 1-6091

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

7.4 Annexe
ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

GRILLES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

FORT	*MOYEN*	*FAIBLE*
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

FORT	*MOYEN*	*FAIBLE*
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

GRILLES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	*Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation*	*Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation*
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc…

7.5 Annexe
CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS

CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES SUIVANT L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :
Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.
Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.
Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

DÉTAIL DES PRÉCONISATIONS SUIVANT L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX OU PRODUIT DE LA LISTE B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.6 Annexe
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

4. INTERVENTION DE PROFESSIONNELS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

5. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SECURITÉ

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
- *perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;*
- *remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;*
- *travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.*

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

6. GESTION DES DÉCHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :
- *de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;*
- *du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux;*
- *de la mairie ;*
- *ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.*

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.7 Annexe : AUTRES DOCUMENTS



LCP CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1495

Monsieur VEGEZZI Thibault

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Amiante Date d'effet : 26/04/2023 : - Date d'expiration : 25/04/2030
Amiante avec mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Missions spécifiques, bâtiments complexes Date d'effet : 26/04/2023 : - Date d'expiration : 25/04/2030
DPE individuel Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Diagnostic de performances énergétique Date d'effet : 26/04/2023 : - Date d'expiration : 25/04/2030
Electricité Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Etat de l'installation intérieure électricité Date d'effet : 17/03/2023 : - Date d'expiration : 16/03/2030
Gaz Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/03/2023 : - Date d'expiration : 16/03/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 24 Décembre 2021	Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/03/2023 : - Date d'expiration : 16/03/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 26/04/2023, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC
Salles d'examens : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 150000€ - SIRET : 80914913800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 – Code APE : 7022 Z
Ent488@ LE CERTIFICAT V011 du 10-01-2022



Dominique ROSANO
Agent Général AXA
59, avenue Clemenceau
57100 THIONVILLE
Tel : 03 82 53 58 11
Fax : 03 82 53 58 02
N° ORIAS : 14 005 882

ATTESTATION D'ASSURANCE
CONTRAT N° 10825380704

Je, soussigné Dominique ROSANO, Agent Général AXA FRANCE, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex,


Atteste par la présente que la SAS DIAGOBAH est titulaire auprès de notre agence d'une police « Responsabilité Civile » n°**10825380704** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'elle pourrait encourir dans l'exercice de ses activités :

Diagnostic de Performance énergétique collectif (DPE)
Audit Energétique (AE)
Diagnostic Technique Amiante (DTA) (avant-vente, avant-location, avant-travaux et démolition)
Contrôle visuel après travaux de désamiantage
Diagnostic Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux et démolition, plomb dans l'eau)
Etat d'installation intérieure Electricité
Etat d'installation intérieure Gaz
Diagnostic technique Global
Diagnostic gestion des déchets issues de la démolition

Cette attestation est valable du 01/07/2026 au 30/06/2027 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des assurances ou par le contrat.
Elle ne peut nous engager au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Thionville, le 24/06/2026, pour servir et valoir ce que de droit,

D. ROSANO
Votre agent général

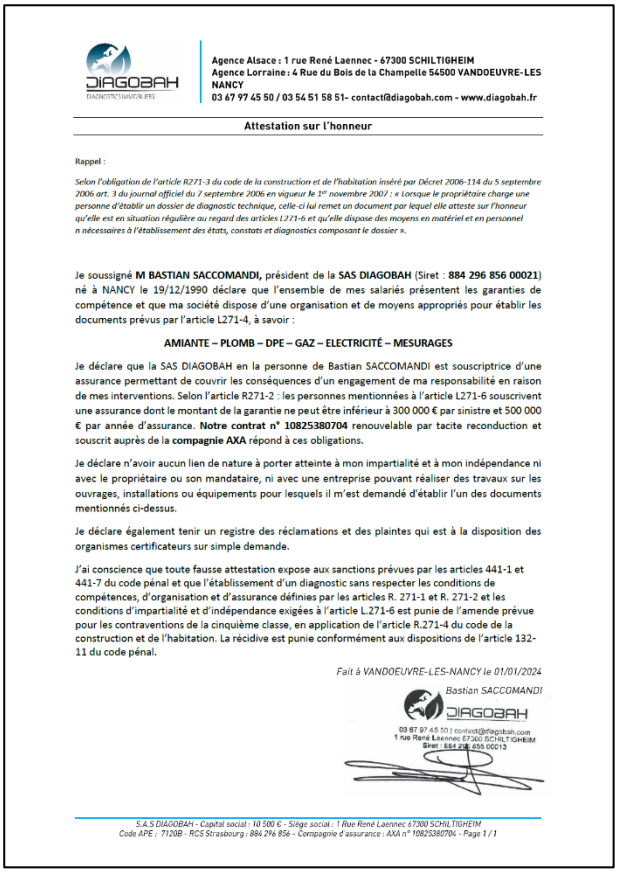

DIAGOBAH DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Agence Alsace : 1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM
Agence Lorraine : 4 Rue du Bois de la Champelle 54500 VANDOEUVRE-LES NANCY
03 67 97 45 50 / 03 54 51 58 51- contact@diagobah.com - www.diagobah.fr

Attestation sur l'honneur

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 du code de la construction et de l'habitation inséré par Décret 2006-114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007 : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel n nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier ».

Je soussigné **M BASTIAN SACCOMANDI,** président de la **SAS DIAGOBAH** (Siret : **884 296 856 00021**) né à NANCY le 19/12/1990 déclare que l'ensemble de mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus par l'article L271-4, à savoir :

AMIANTE – PLOMB – DPE – GAZ – ELECTRICITÉ – MESURAGES

Je déclare que la SAS DIAGOBAH en la personne de Bastian SACCOMANDI est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. Selon l'article R271-2 : les personnes mentionnées à l'article L271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance. **Notre contrat n° 10825380704** renouvelable par tacite reconduction et souscrit auprès de la **compagnie AXA** répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

Je déclare également tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

J'ai conscience que toute fausse attestation expose aux sanctions prévues par les articles 441-1 et 441-7 du code pénal et que l'établissement d'un diagnostic sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L.271-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en application de l'article R.271-4 du code de la construction et de l'habitation. La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait à VANDOEUVRE-LES-NANCY le 01/01/2024

Bastian SACCOMANDI

DIAGOBAH
03 67 97 45 50 | contact@diagobah.com
1 rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM
Siret : 884 296 856 00013

S.A.S DIAGOBAH - Capital social : 10 500 € - Siège social : 1 Rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM
Code APE : 7120B - RCS Strasbourg : 884 296 856 – Compagnie d'assurance : AXA n° 10825380704 - Page 1 / 1
