Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 5 Place d'Arsonval 69003 LYON

Référence client : HEH-PAV-R

Désignation : Pavillon R

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

Donneur d'ordre :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : AOUADI AYMANE

Accompagnateur : ()

Date de repérage 25/03/2026

Numéro attestation : CPDI6313

Délivré le : 03/03/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 07/04/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 07/04/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1	Ascenseur R1 - Vol 2
Ascenseur R1 - Vol 3	Ascenseur R1 - Vol 4
Ascenseur R1 - Vol 5	Ascenseur R1 - Vol 6
Ascenseur R1 - Vol 7	RDC - Vol 8
RDC - Vol 9	RDC - Vol 10
RDC - Vol 11	RDC - Vol 12
RDC - Vol 13	RDC - Vol 14
RDC - Vol 15	RDC - Vol 16
RDC - Vol 17	RDC - Vol 18
RDC - Vol 19	RDC - Vol 20
RDC - Vol 22	RDC - Vol 23
RDC - Vol 24	RDC - Vol 25
RDC - Vol 26	RDC - Vol 27
RDC - Vol 28	RDC - Vol 29

RDC - Vol 30 RDC - Vol 32

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
RDC - Vol 21	Moyen investigation non mis a disposition	

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Refection des locaux

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le perimetre d'intervention concerne les volumes impactés par les travaux

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Ascenceurs et monte charges	Ascenseur R1	ASC-HEH-R-1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6	
Façades	Ascenseur R1	ASC-HEH-R-1	
Parois verticales intérieures et enduits	Ascenseur R1	ASC-HEH-R-1 - Vol 7	
Toiture et étanchéité	Ascenseur R1	ASC-HEH-R-1	
Plafond et faux-plafonds	Ascenseur R1	Vol 3 - Vol 7	
Revêtement de sol	Ascenseur R1	Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 22 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 32	
Revêtement de mur	RDC	Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 27 - Vol 30 - Vol 32	
Revêtement de sol	RDC	Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 30 - Vol 32	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 10 - Vol 11 - Vol 15 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 27 - Vol 32	

Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 20 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 27 - Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 32

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 20	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	P43
Vol 20	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	P44
Vol 20	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	P45 Phase 1
Vol 20	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Joint de bride	P45 Phase 2

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Vol 7	Panneaux vissés	Inaccessible dans la gaine.		
RDC - Vol 21		Moyen investigation non mis a disposition		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Néant

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Ascenceurs et monte charges

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascenseur R1	ASC-HEH-R-1	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P4	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"	002EW91596 7 n°4 - 1	002EW91596 7 n°4	Bande - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascenseur R1	ASC-HEH-R-1	Menuiseries	Mastic vitrier	P2	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW91596 7 n°2 - 1	002EW91596 7 n°2	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	ASC-HEH-R-1	Menuiseries	Mastic vitrier	P3	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW91596 7 n°3 - 1	002EW91596 7 n°3 Phase 1	Mastic - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	ASC-HEH-R-1	Menuiseries	Mastic vitrier	P3	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW91596 7 n°3 - 1	002EW91596 7 n°3 Phase 2	Mastic - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascenseur R1	ASC-HEH-R-1	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur muret	002EW91596 7 n°5 - 1	002EW91596 7 n°5	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	Vol 7	Murs et cloisons	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur fosse	002EW91596 7 n°7 - 1	002EW91596 7 n°7	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P14	Réalisation d'un prélevement	Cloison	002EW 91596 7-1 n °14 - 1	P14	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °15 - 1	P15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 91596 7-1 n °15 - 1	P15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 91596 7-1 n °15 - 1	P15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 91596 7-1 n °15 - 1	P15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 91596 7-1 n °15 - 1	P15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 91596 7-1 n °15 - 1	P15	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Menuiseries	Mastic vitrier	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °20 - 1	P20	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Menuiseries	Mastic vitrier	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 91596 7-1 n °20 - 1	P20	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9	Menuiseries	Mastic vitrier	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 91596 7-1 n °20 - 1	P20	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 - Vol 9	Menuiseries	Mastic vitrier	P20 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 91596 7-1 n °20 - 1	P20	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement	sur brique en faux plafond	002EW 91596 7-1 n °21 - 1	P21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	sur brique en faux plafond	002EW 91596 7-1 n °21 - 1	P21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	sur brique en faux plafond	002EW 91596 7-1 n °21 - 1	P21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 - Vol 11	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	sur brique en faux plafond	002EW 91596 7-1 n °21 - 1	P21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélevement	Cloison	002EW 91596 7-1 n °31 - 1	P31	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S40	Réalisation d'un sondage		S40 - 1				Négatif sur document
RDC	Vol 16	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S40	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S40		S40 - 1				Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 91596 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 91596 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 91596 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 91596 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 91596 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 8	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32 - S41 - S42 - S43 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 91596 7-1 n °32 - 1	P32	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits ciment	P41	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °41 - 1	P41	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Murs et cloisons	Enduits ciment	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002EW 91596 7-1 n °41 - 1	P41	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Menuiseries	Mastic vitrier	P51	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °51 - 1	P51	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 27	Menuiseries	Mastic vitrier	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 91596 7-1 n °51 - 1	P51	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P54	Réalisation d'un prélevement	Cloison	002EW 91596 7-1 n °54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Cloison	002EW 91596 7-1 n °54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Cloison	002EW 91596 7-1 n °54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Cloison	002EW 91596 7-1 n °54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Cloison	002EW 91596 7-1 n °54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Cloison	002EW 91596 7-1 n °54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Cloison	002EW 91596 7-1 n °54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 30 - Vol 23 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P54 - S64 - S65 - S66 - S67 - S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Cloison	002EW 91596 7-1 n °54 - 1	P54	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P55	Réalisation d'un prélevement	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 29	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 25	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 28	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 32	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 30 - Vol 29 - Vol 26 - Vol 25 - Vol 24 - Vol 23 - Vol 22 - Vol 28 - Vol 32	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62 - S79 - S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	porteur	002EW 91596 7-1 n °55 - 1	P55	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Menuiseries	Mastic vitrier	P58	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Menuiseries	Mastic vitrier	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW 91596 7-1 n °58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 24	Menuiseries	Mastic vitrier	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW 91596 7-1 n °58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23	Menuiseries	Mastic vitrier	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW 91596 7-1 n °58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30 - Vol 24 - Vol 23	Menuiseries	Mastic vitrier	P58 - S69 - S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW 91596 7-1 n °58 - 1	P58	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 32	Murs et cloisons	Enduits ciment	P64	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °64 - 1	P64	Peinture non séparable + matériau compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 32	Murs et cloisons	Enduits ciment	P64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002EW 91596 7-1 n °64 - 1	P64	Peinture non séparable + matériau compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascenseur R1	Vol 3	Plafonds	Enduits plâtre	P11	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre plafond	002EW 91596 7 n°11 - 1	002EW 91596 7 n°11	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	Vol 7	Plafonds	Panneaux vissés	I1			002EW 91596 7 n°12 - 2				Inaccessible dans la gaine.
RDC	Vol 10	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °17 - 1	P17	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Plafonds	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °19 - 1	P19	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P22	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °22 - 1	P22	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 91596 7-1 n °22 - 1	P22	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 91596 7-1 n °22 - 1	P22	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 - Vol 12	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 91596 7-1 n °22 - 1	P22	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Plafonds	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15	Plafonds	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 91596 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Plafonds	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 91596 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Plafonds	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 91596 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 - Vol 17 - Vol 18	Plafonds	Enduits plâtre	S45 - S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 91596 7-1 n °33 - 1	P33	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P37	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °37 - 1	P37	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Plafonds	Enduits ciment	P42	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °42 - 1	P42	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Plafonds	Enduits ciment	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 91596 7-1 n °42 - 1	P42	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P57	Réalisation d'un prélevement			P57	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Plafonds	Enduits plâtre	P59	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 29	Plafonds	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 91596 7-1 n °59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25	Plafonds	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 91596 7-1 n °59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 26	Plafonds	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 91596 7-1 n °59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24	Plafonds	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 91596 7-1 n °59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23	Plafonds	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 91596 7-1 n °59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 28	Plafonds	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 91596 7-1 n °59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 32	Plafonds	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 91596 7-1 n °59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 29 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 24 - Vol 23 - Vol 28 - Vol 32	Plafonds	Enduits plâtre	S72 - S73 - S74 - S75 - S76 - S78 - S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 91596 7-1 n °59 - 1	P59	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 32	Plafonds	Enduits ciment	P65	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °65 - 1	P65	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascenseur R1	Vol 6	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélevement	Carrelage rectangle + colle grise	002EW 91596 7 n°9 - 1	002EW 91596 7 n°9	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	Vol 5	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Carrelage rectangle + colle grise	002EW 91596 7 n°9 - 1	002EW 91596 7 n°9	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	Vol 4	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Carrelage rectangle + colle grise	002EW 91596 7 n°9 - 1	002EW 91596 7 n°9	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	Vol 3	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Carrelage rectangle + colle grise	002EW 91596 7 n°9 - 1	002EW 91596 7 n°9	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	Vol 5 - Vol 4 - Vol 3	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Carrelage rectangle + colle grise	002EW 91596 7 n°9 - 1	002EW 91596 7 n°9	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascenseur R1	Vol 6	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P10	Réalisation d'un prélevement	Carrelage carré + colle grise	002EW91596 7 n°10 - 1	002EW91596 7 n°10	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélevement		002EW91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 - Vol 9 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 15	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 - Vol 9 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 15	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 91596 7-1 n °12 - 1	P12 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P25	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °25 - 1	P25 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P25	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °25 - 1	P25 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °27 - 1	P27 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °27 - 1	P27 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P29	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °29 - 1	P29	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 91596 7-1 n °29 - 1	P29	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 91596 7-1 n °29 - 1	P29	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 91596 7-1 n °29 - 1	P29	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 91596 7-1 n °29 - 1	P29	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 8	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S33 - S34 - S35 - S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 91596 7-1 n °29 - 1	P29	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P38	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °38 - 1	P38	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P40	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °40 - 1	P40	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 26	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 91596 7-1 n °40 - 1	P40	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P47	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °47 - 1	P47	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P52	Réalisation d'un prélevement			P52	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52			P52	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 32	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P61	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °61 - 1	P61	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 32	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P63	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °63 - 1	P63	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P66	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °66 - 1	P66	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 91596 7-1 n °66 - 1	P66	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 - Vol 10 - Vol 9 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 - Vol 10 - Vol 9 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 91596 7-1 n °13 - 1	P13 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °16 - 1	P16 Phase 1	Carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °16 - 1	P16 Phase 2	Colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °23 - 1	P23 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °23 - 1	P23 Phase 2	Colle beige et grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P24	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °24 - 1	P24 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P24	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °24 - 1	P24 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °26 - 1	P26 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °26 - 1	P26 Phase 2	Colle blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °28 - 1	P28 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °28 - 1	P28 Phase 2	Colle beige non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 - Vol 19 - Vol 17 - Vol 8	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S31 - S32 - S38 - S39 - S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 - Vol 19 - Vol 17 - Vol 8	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S31 - S32 - S38 - S39 - S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW91596 7-1 n °30 - 1	P30 Phase 2	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW91596 7-1 n °34 - 1	P34 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW91596 7-1 n °34 - 1	P34 Phase 2	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P35	Réalisation d'un prélevement		002EW91596 7-1 n °35 - 1	P35 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW91596 7-1 n °35 - 1	P35 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P35	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °35 - 1	P35 Phase 2	Colle grise en vrac + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 91596 7-1 n °35 - 1	P35 Phase 2	Colle grise en vrac + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °36 - 1	P36 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 91596 7-1 n °36 - 1	P36 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °36 - 1	P36 Phase 2	Colle beige non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 91596 7-1 n °36 - 1	P36 Phase 2	Colle beige non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P48	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °48 - 1	P48	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 91596 7-1 n °48 - 1	P48	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P53	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °53 - 1	P53	Peinture non séparable + colle grise en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91596 7-1 n °53 - 1	P53	Peinture non séparable + colle grise en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91596 7-1 n °53 - 1	P53	Peinture non séparable + colle grise en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P53 - S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 91596 7-1 n °53 - 1	P53	Peinture non séparable + colle grise en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °56 - 1	P56	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 91596 7-1 n °56 - 1	P56	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P60	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °60 - 1	P60	Peinture en vrac non séparable + colle beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °62 - 1	P62 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 91596 7-1 n °62 - 1	P62 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °62 - 1	P62 Phase 2	Colle beige + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 91596 7-1 n °62 - 1	P62 Phase 2	Colle beige + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °67 - 1	P67	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P68	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °68 - 1	P68	Peinture non séparable + colle grise en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10	Conduit eau	Calorifugeage	P18	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °18 - 1	P18	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + couche bitumineuse noire non séparable + matériau fibreux jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Conduit eau	Conduit	S23	Réalisation d'un sondage		S23 - 1				Négatif sur document
RDC	Vol 15	Conduit eau	Conduit	S23	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S23		S23 - 1				Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19	Conduit eau	Calorifugeage	P39	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °39 - 1	P39	Toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + couche bitumineuse noire + matériau fibreux orange non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Conduit eau	Calorifugeage	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 91596 7-1 n °39 - 1	P39	Toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + couche bitumineuse noire + matériau fibreux orange non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20	Conduit eau	Joint de bride	P43	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °43 - 1	P43	Matériau beige en vrac avec fibres visibles avec poussières	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 20	Conduit eau	Joint de bride	P44	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °44 - 1	P44	Peinture en faible quantité non séparable + matériau beige en vrac avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 20	Conduit eau	Joint de bride	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °45 - 1	P45 Phase 1	Matériau fibreux beige en vrac avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 20	Conduit eau	Joint de bride	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °45 - 1	P45 Phase 2	Matériau fibreux noir en vrac avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 20	Conduit air	Manchon	S51	Réalisation d'un sondage		S51 - 1				Négatif sur document
RDC	Vol 20	Conduit air	Manchon	S51	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S51		S51 - 1				Négatif sur document

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20	Conduit eau	Calorifugeage	P46	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °46 - 1	P46 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Conduit eau	Calorifugeage	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 91596 7-1 n °46 - 1	P46 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Conduit eau	Calorifugeage	P46	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °46 - 1	P46 Phase 2	Toile bitumée noire	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Conduit eau	Calorifugeage	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002EW 91596 7-1 n °46 - 1	P46 Phase 2	Toile bitumée noire	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Conduit air	Rubans adhésifs	P49	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °49 - 1	P49	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Conduit air	Rubans adhésifs	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 91596 7-1 n °49 - 1	P49	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 27	Conduit air	Joint entre éléments	P50	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7-1 n °50 - 1	P50	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 27	Conduit air	Joint entre éléments	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 91596 7-1 n °50 - 1	P50	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 32	Conduit air	Conduit	S85	Réalisation d'un sondage		S85 - 1				Négatif sur docum ent

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascense ur R1	ASC-HEH-R-1	Machinerie	Frein	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7 n°1 - 1	002EW 91596 7 n°1	Matériau - Dur Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Ascense ur R1	ASC-HEH-R-1	Machinerie	Frein	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 91596 7 n°1 - 1	002EW 91596 7 n°1	Matériau - Dur Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Ascense ur R1	Vol 2	Portes palières	Peinture porte palière	P6	Réalisation d'un prélevement		002EW 91596 7 n°6 - 1	002EW 91596 7 n°6	Peinture - Effritable - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Ascense ur R1	Vol 4	Portes palières	Peinture porte palière	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 91596 7 n°6 - 1	002EW 91596 7 n°6	Peinture - Effritable - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Ascense ur R1	Vol 5	Portes palières	Peinture porte palière	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 91596 7 n°6 - 1	002EW 91596 7 n°6	Peinture - Effritable - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascenseur R1	Vol 6	Portes palières	Peinture porte palière	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW91596 7 n°6 - 1	002EW91596 7 n°6	Peinture - Effritable - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	Vol 4 - Vol 5 - Vol 6	Portes palières	Peinture porte palière	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW91596 7 n°6 - 1	002EW91596 7 n°6	Peinture - Effritable - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	Vol 6	Portes palières	Peinture porte palière	P8	Réalisation d'un prélevement		002EW91596 7 n°8 - 1	002EW91596 7 n°8	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	Vol 5	Portes palières	Peinture porte palière	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW91596 7 n°8 - 1	002EW91596 7 n°8	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	Vol 3	Portes palières	Peinture porte palière	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW91596 7 n°8 - 1	002EW91596 7 n°8	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	Vol 4	Portes palières	Peinture porte palière	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW91596 7 n°8 - 1	002EW91596 7 n°8	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseur R1	Vol 5 - Vol 3 - Vol 4	Portes palières	Peinture porte palière	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW91596 7 n°8 - 1	002EW91596 7 n°8	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Ascenseur R1	Ascenseur R1 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements


ASCENSEUR R1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW915967-1

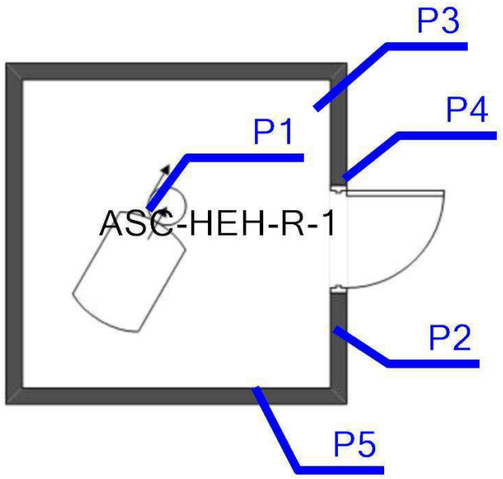


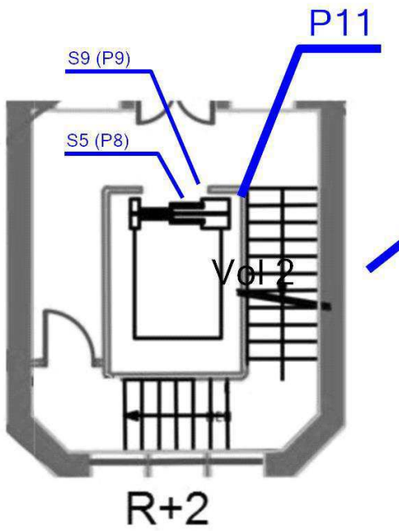


Vol 3

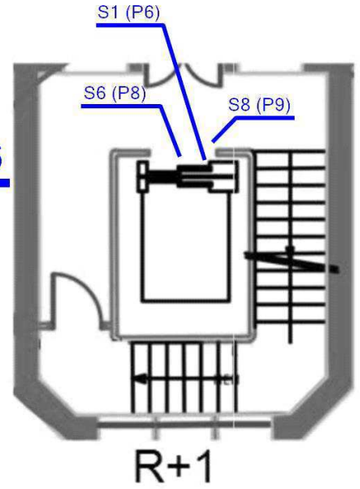


Vol 4

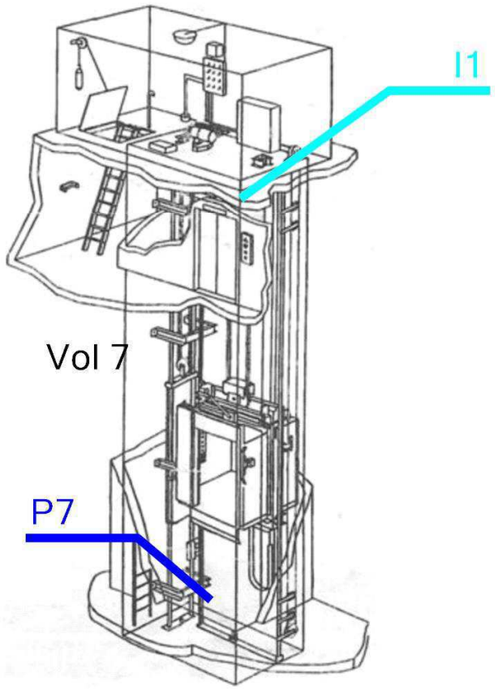

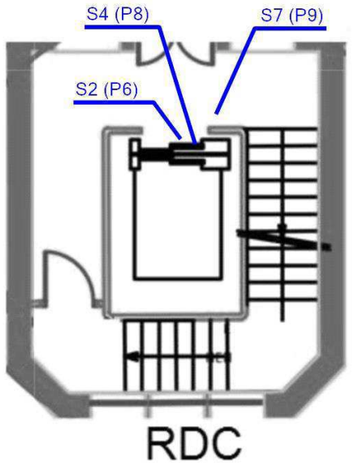

Vol 5

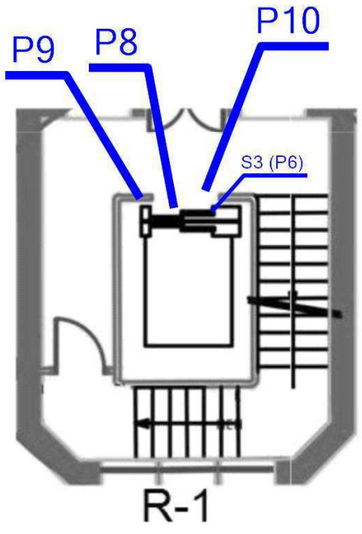

Vol 6

Légende


P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon R	25/03/2026	AOUADI AYMANE

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW915967-1

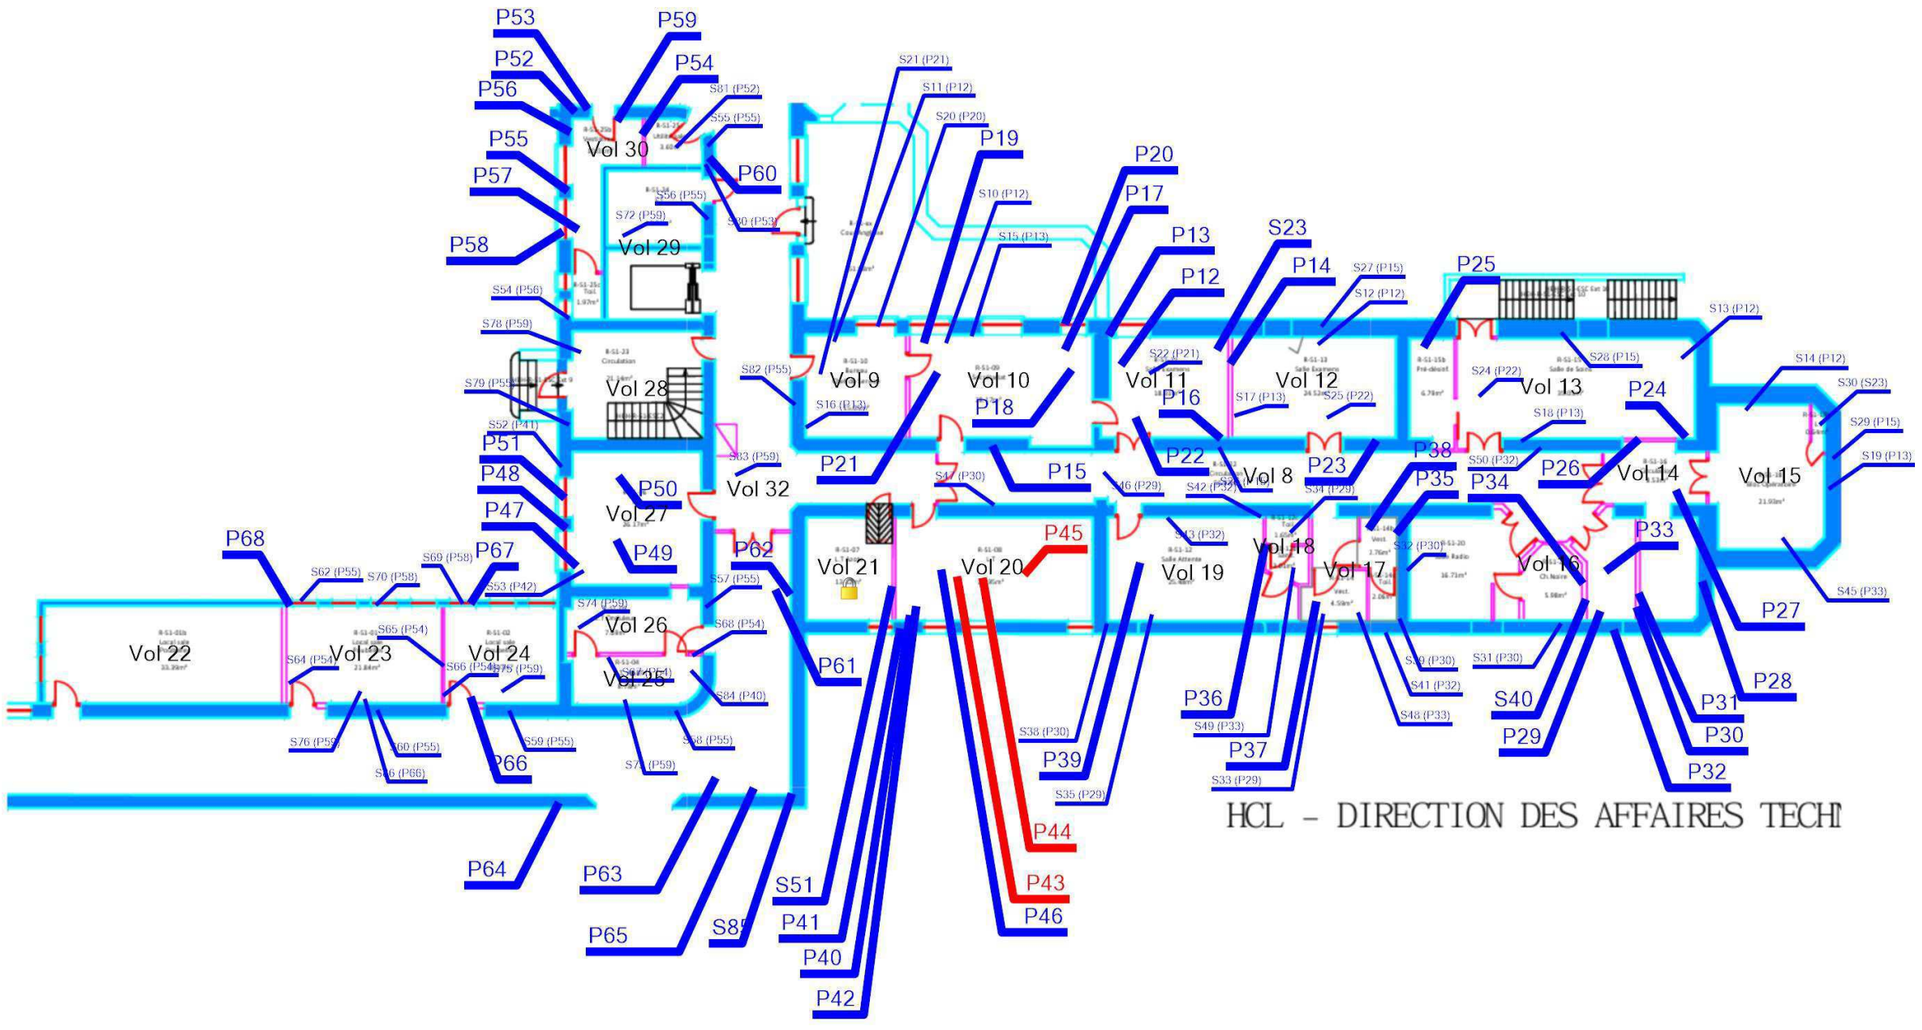

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

HCL - DIRECTION DES AFFAIRES TECHN

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon R	25/03/2026	AOUADI AYMANE

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW915967-1

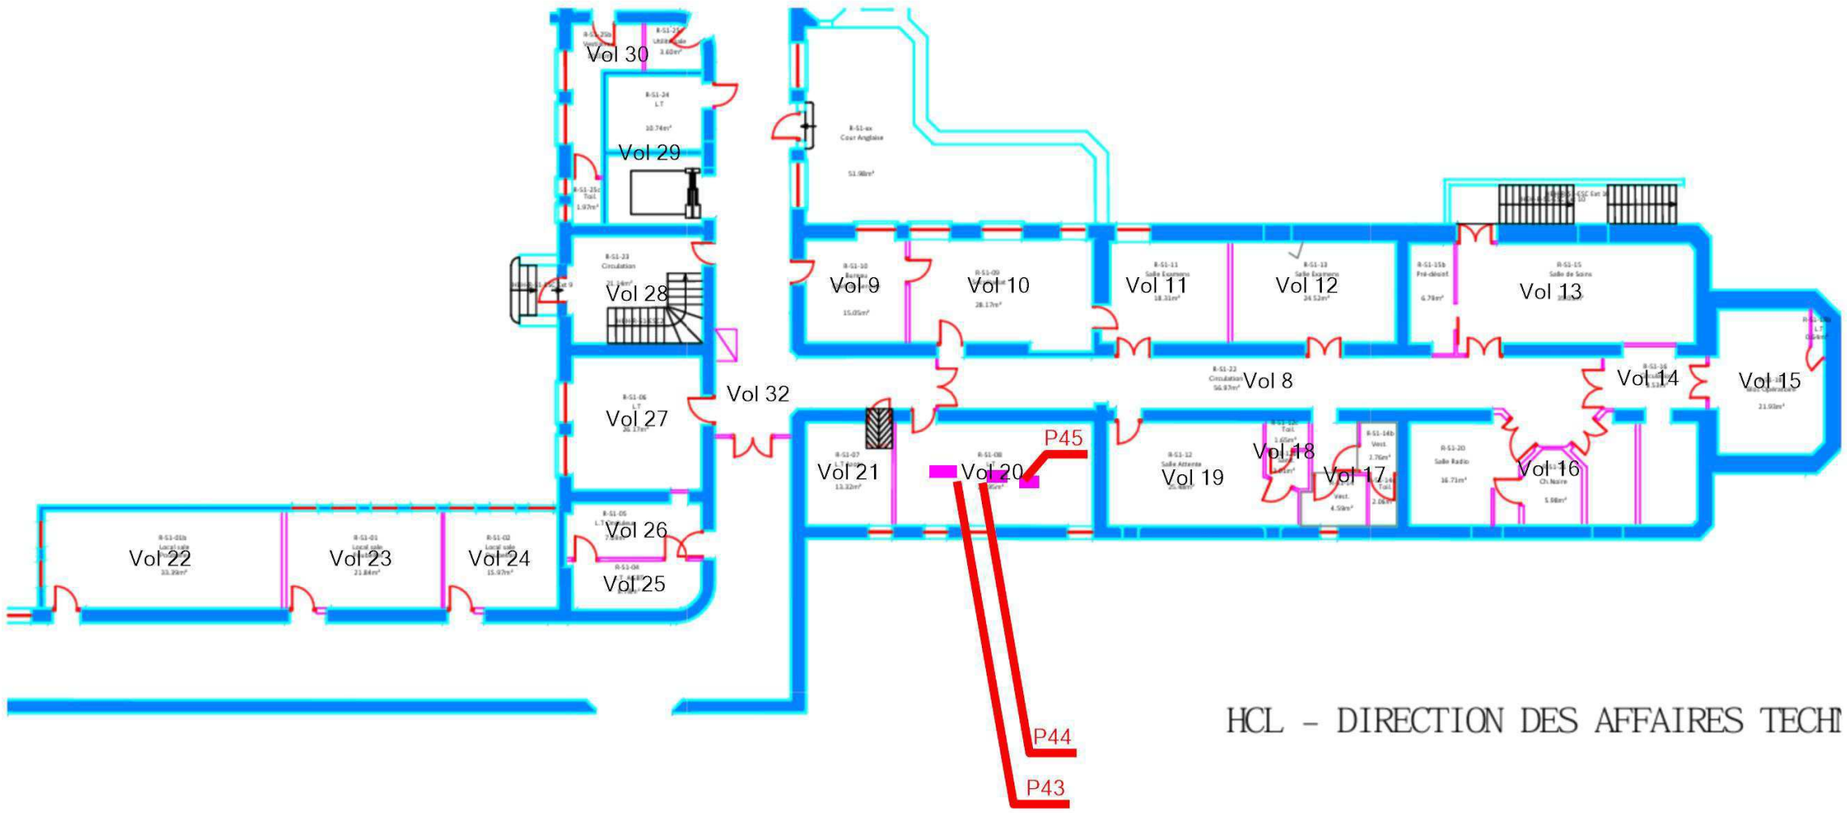


Légende

	P44 : Joint de bride
	P45 : Matériau fibreux beige en vrac avec fibres visibles, Matériau fibreux noir en vrac avec fibres visibles
	P43 : Joint de bride

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon R	25/03/2026	AOUADI AYMANE

RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW915967-1

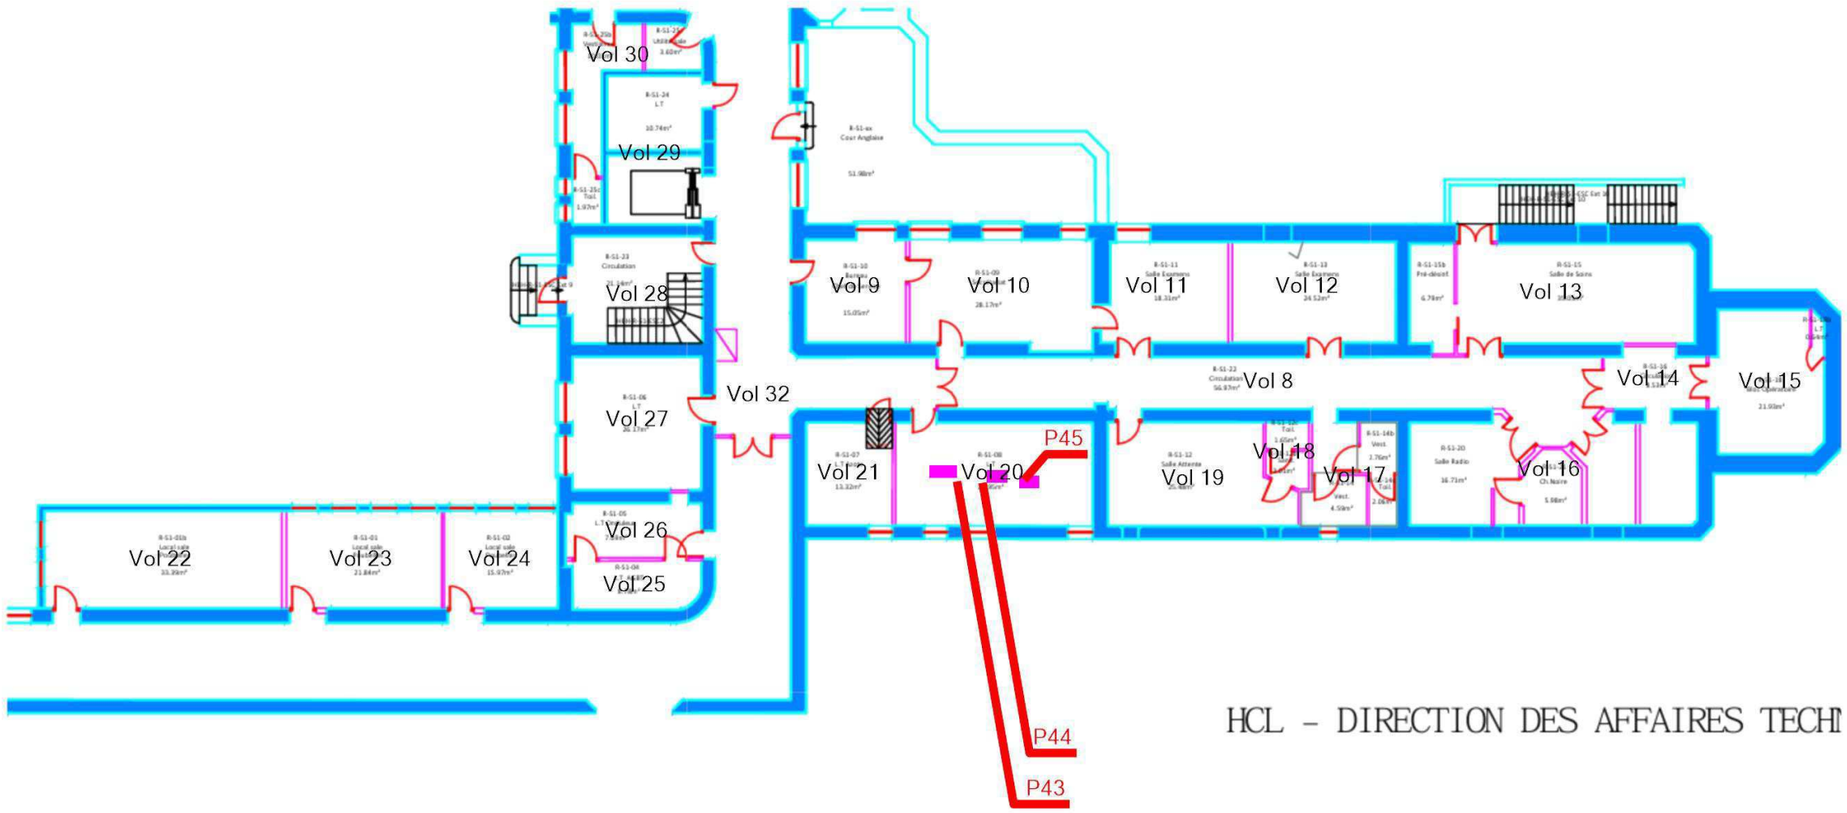

Légende

	P44 : Joint de bride
	P45 : Matériau fibreux beige en vrac avec fibres visibles, Matériau fibreux noir en vrac avec fibres visibles
	P43 : Joint de bride

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon R	25/03/2026	AOUADI AYMANE

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW915967 n°1 - 1 (P1)	Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1	Prélevement négatif
002EW915967 n°2 - 1 (P2)	Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1	Prélevement négatif
002EW915967 n°3 - 1 (P3)	Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1	Prélevement négatif
002EW915967 n°4 - 1 (P4)	Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1	Prélevement négatif
002EW915967 n°5 - 1 (P5)	Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1	Prélevement négatif
002EW915967 n°6 - 1 (P6)	Ascenseur R1 - Vol 2	Prélevement négatif
002EW915967 n°7 - 1 (P7)	Ascenseur R1 - Vol 7	Prélevement négatif
002EW915967 n°8 - 1 (P8)	Ascenseur R1 - Vol 6	Prélevement négatif
002EW915967 n°9 - 1 (P9)	Ascenseur R1 - Vol 6	Prélevement négatif
002EW915967 n°10 - 1 (P10)	Ascenseur R1 - Vol 6	Prélevement négatif
002EW915967 n°11 - 1 (P11)	Ascenseur R1 - Vol 3	Prélevement négatif
	Ascenseur R1 - Vol 7	I1
002EW915967-1 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 11	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 11	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 11	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 10	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 10	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 10	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 10	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 10	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 10	Prélevement négatif
S23 - 1 (S23)	RDC - Vol 11	Absence sur présentation de documents
002EW915967-1 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 11	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 11	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 12	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 13	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 13	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°33 - 1 (P33)	RDC - Vol 16	Prélevement négatif
S40 - 1 (S40)	RDC - Vol 16	Absence sur présentation de documents
002EW915967-1 n°32 - 1 (P32)	RDC - Vol 16	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 16	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°29 - 1 (P29)	RDC - Vol 16	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 16	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°34 - 1 (P34)	RDC - Vol 16	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°35 - 1 (P35)	RDC - Vol 17	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°36 - 1 (P36)	RDC - Vol 18	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°37 - 1 (P37)	RDC - Vol 18	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°38 - 1 (P38)	RDC - Vol 17	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°39 - 1 (P39)	RDC - Vol 19	Prélevement négatif
S51 - 1 (S51)	RDC - Vol 20	Absence sur présentation de documents
002EW915967-1 n°40 - 1 (P40)	RDC - Vol 20	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°41 - 1 (P41)	RDC - Vol 20	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°42 - 1 (P42)	RDC - Vol 20	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°43 - 1 (P43)	RDC - Vol 20	Prélevement positif
002EW915967-1 n°46 - 1 (P46)	RDC - Vol 20	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°44 - 1 (P44)	RDC - Vol 20	Prélevement positif
002EW915967-1 n°45 - 1 (P45)	RDC - Vol 20	Prélevement positif
002EW915967-1 n°47 - 1 (P47)	RDC - Vol 27	Prélevement négatif

002EW915967-1 n°48 - 1 (P48)	RDC - Vol 27	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°49 - 1 (P49)	RDC - Vol 27	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°50 - 1 (P50)	RDC - Vol 27	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°51 - 1 (P51)	RDC - Vol 27	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°53 - 1 (P53)	RDC - Vol 30	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°56 - 1 (P56)	RDC - Vol 30	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°55 - 1 (P55)	RDC - Vol 30	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°54 - 1 (P54)	RDC - Vol 30	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°58 - 1 (P58)	RDC - Vol 30	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°59 - 1 (P59)	RDC - Vol 30	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°60 - 1 (P60)	RDC - Vol 30	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°61 - 1 (P61)	RDC - Vol 32	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°62 - 1 (P62)	RDC - Vol 32	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°63 - 1 (P63)	RDC - Vol 32	Prélevement négatif
S85 - 1 (S85)	RDC - Vol 32	Absence sur présentation de documents
002EW915967-1 n°64 - 1 (P64)	RDC - Vol 32	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°65 - 1 (P65)	RDC - Vol 32	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°66 - 1 (P66)	RDC - Vol 24	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°67 - 1 (P67)	RDC - Vol 24	Prélevement négatif
002EW915967-1 n°68 - 1 (P68)	RDC - Vol 23	Prélevement négatif



002EW915967 n°1 - 1 (P1) - Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1



002EW915967 n°2 - 1 (P2) - Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1



002EW915967 n°3 - 1 (P3) - Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1



002EW915967 n°4 - 1 (P4) - Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1



002EW915967 n°5 - 1 (P5) - Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1



002EW915967 n°6 - 1 (P6) - Ascenseur R1 - Vol 2



002EW915967 n°7 - 1 (P7) - Ascenseur R1 - Vol 7



002EW915967 n°8 - 1 (P8) - Ascenseur R1 - Vol 6



002EW915967 n°9 - 1 (P9) - Ascenseur R1 - Vol 6



002EW915967 n°10 - 1 (P10) - Ascenseur R1 - Vol 6



002EW915967 n°11 - 1 (P11) - Ascenseur R1 - Vol 3



002EW915967 n°12 - 2 - Ascenseur R1 - Vol 7



002EW915967-1 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 11



002EW915967-1 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 11



002EW915967-1 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 11




002EW915967-1 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 10



002EW915967-1 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 10



002EW915967-1 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 10

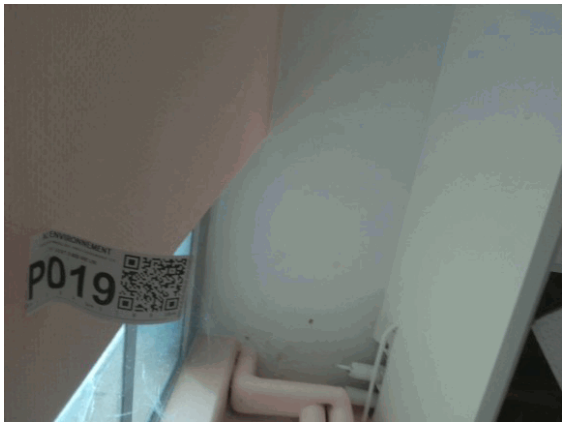


002EW915967-1 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 10




002EW915967-1 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 10




002EW915967-1 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 10

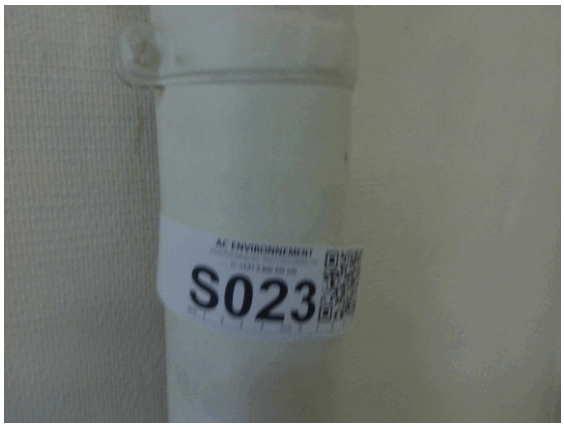

S23 - 1 (S23) - RDC - Vol 11

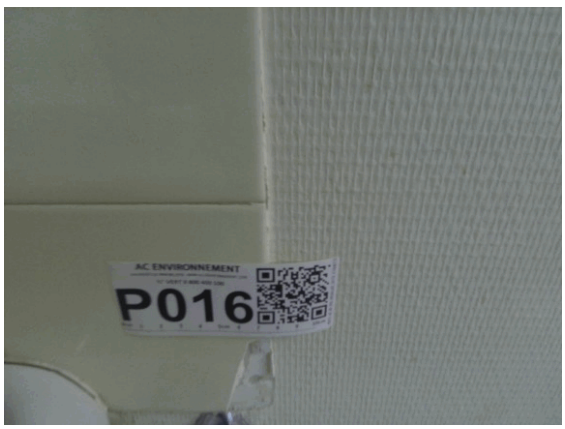

002EW915967-1 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 11

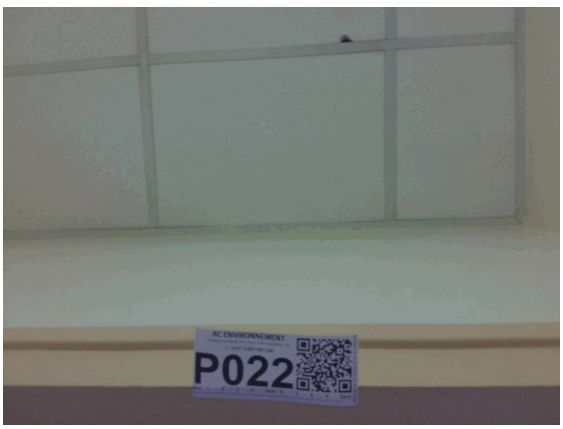

002EW915967-1 n°22 - 1 (P22) - RDC - Vol 11



002EW915967-1 n°23 - 1 (P23) - RDC - Vol 12



002EW915967-1 n°24 - 1 (P24) - RDC - Vol 13



002EW915967-1 n°25 - 1 (P25) - RDC - Vol 13



002EW915967-1 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 14



002EW915967-1 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 14



002EW915967-1 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 14



002EW915967-1 n°33 - 1 (P33) - RDC - Vol 16



S40 - 1 (S40) - RDC - Vol 16



002EW915967-1 n°32 - 1 (P32) - RDC - Vol 16




002EW915967-1 n°31 - 1 (P31) - RDC - Vol 16



002EW915967-1 n°29 - 1 (P29) - RDC - Vol 16



002EW915967-1 n°30 - 1 (P30) - RDC - Vol 16

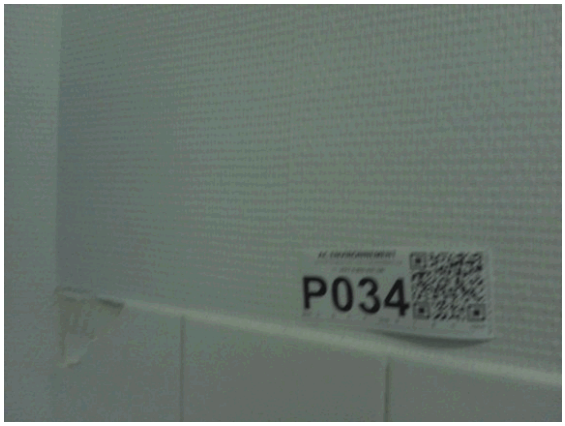

002EW915967-1 n°34 - 1 (P34) - RDC - Vol 16



002EW915967-1 n°35 - 1 (P35) - RDC - Vol 17



002EW915967-1 n°36 - 1 (P36) - RDC - Vol 18



002EW915967-1 n°37 - 1 (P37) - RDC - Vol 18



002EW915967-1 n°38 - 1 (P38) - RDC - Vol 17



002EW915967-1 n°39 - 1 (P39) - RDC - Vol 19



S51 - 1 (S51) - RDC - Vol 20



002EW915967-1 n°40 - 1 (P40) - RDC - Vol 20



002EW915967-1 n°41 - 1 (P41) - RDC - Vol 20



002EW915967-1 n°42 - 1 (P42) - RDC - Vol 20




002EW915967-1 n°43 - 1 (P43) - RDC - Vol 20




002EW915967-1 n°46 - 1 (P46) - RDC - Vol 20



002EW915967-1 n°44 - 1 (P44) - RDC - Vol 20

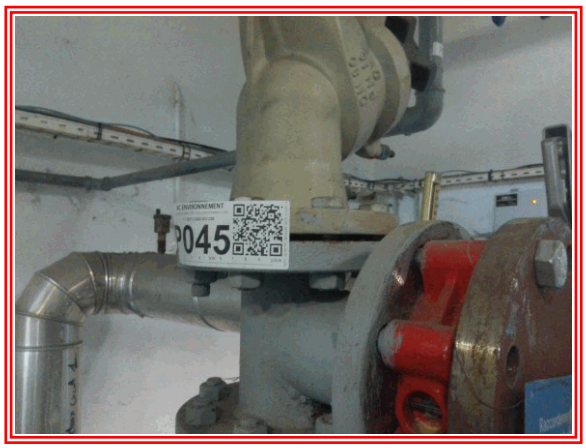

002EW915967-1 n°45 - 1 (P45) - RDC - Vol 20

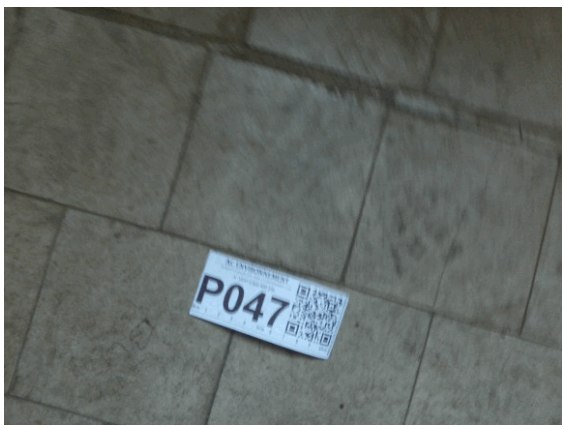

002EW915967-1 n°47 - 1 (P47) - RDC - Vol 27



002EW915967-1 n°48 - 1 (P48) - RDC - Vol 27



002EW915967-1 n°49 - 1 (P49) - RDC - Vol 27



002EW915967-1 n°50 - 1 (P50) - RDC - Vol 27



002EW915967-1 n°51 - 1 (P51) - RDC - Vol 27



002EW915967-1 n°53 - 1 (P53) - RDC - Vol 30



002EW915967-1 n°56 - 1 (P56) - RDC - Vol 30



002EW915967-1 n°55 - 1 (P55) - RDC - Vol 30



002EW915967-1 n°54 - 1 (P54) - RDC - Vol 30



002EW915967-1 n°58 - 1 (P58) - RDC - Vol 30



002EW915967-1 n°59 - 1 (P59) - RDC - Vol 30



002EW915967-1 n°60 - 1 (P60) - RDC - Vol 30



002EW915967-1 n°61 - 1 (P61) - RDC - Vol 32



002EW915967-1 n°62 - 1 (P62) - RDC - Vol 32



002EW915967-1 n°63 - 1 (P63) - RDC - Vol 32



S85 - 1 (S85) - RDC - Vol 32



002EW915967-1 n°64 - 1 (P64) - RDC - Vol 32




002EW915967-1 n°65 - 1 (P65) - RDC - Vol 32



002EW915967-1 n°66 - 1 (P66) - RDC - Vol 24



002EW915967-1 n°67 - 1 (P67) - RDC - Vol 24

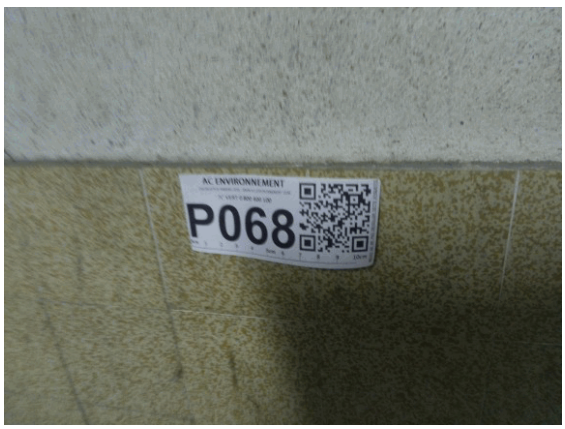

002EW915967-1 n°68 - 1 (P68) - RDC - Vol 23

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002EW915967 n°1	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau - Dur Fibreux - Noir	Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1	
002EW915967 n°2	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige - Mastic vitrier effritable	Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1	
002EW915967 n°3 Phase 1	Façades	Menuiseries	Mastic - Souple - Gris - Mastic vitrier effritable	Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1	
002EW915967 n°3 Phase 2	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Blanc - Mastic vitrier effritable	Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1	
002EW915967 n°4	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux - Noir - Bande type "Paxalu"	Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1	
002EW915967 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris - Enduit ciment sur muret	Ascenseur R1 - ASC-HEH-R-1	
002EW915967 n°6	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Noir	Ascenseur R1 - Vol 2	
002EW915967 n°7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris - Enduit ciment sur fosse	Ascenseur R1 - Vol 7	
002EW915967 n°8	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Gris	Ascenseur R1 - Vol 6	
002EW915967 n°9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage rectangle + colle grise	Ascenseur R1 - Vol 6	
002EW915967 n°10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage carré + colle grise	Ascenseur R1 - Vol 6	
002EW915967 n°11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre plafond	Ascenseur R1 - Vol 3	
P12 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	RDC - Vol 11	
P12 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac	RDC - Vol 11	
P13 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	RDC - Vol 11	
P13 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	RDC - Vol 11	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Cloison	RDC - Vol 11	

P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	RDC - Vol 10
P16 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage + peinture	RDC - Vol 11
P16 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	RDC - Vol 11
P17	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige en vrac	RDC - Vol 10
P18	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + couche bitumineuse noire non séparable + matériau fibreux jaune non séparable	RDC - Vol 10
P19	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	RDC - Vol 10
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	RDC - Vol 10
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - sur brique en faux plafond	RDC - Vol 10
P22	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	RDC - Vol 11
P23 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	RDC - Vol 12
P23 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige et grise	RDC - Vol 12
P24 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	RDC - Vol 13
P24 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peinture non séparable	RDC - Vol 13
P25 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	RDC - Vol 13
P25 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune	RDC - Vol 13

P26 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	RDC - Vol 14
P26 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable	RDC - Vol 14
P27 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron	RDC - Vol 14
P27 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	RDC - Vol 14
P28 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	RDC - Vol 14
P28 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peinture non séparable	RDC - Vol 14
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige	RDC - Vol 16
P30 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	RDC - Vol 16
P30 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac	RDC - Vol 16
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Cloison	RDC - Vol 16
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	RDC - Vol 16
P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	RDC - Vol 16
P34 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	RDC - Vol 16
P34 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	RDC - Vol 16
P35 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	RDC - Vol 17
P35 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac + joint cassant blanc	RDC - Vol 17
P36 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage	RDC - Vol 18
P36 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + matériau gris non séparable	RDC - Vol 18
P37	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	RDC - Vol 18
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac	RDC - Vol 17

P39	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + couche bitumineuse noire + matériau fibreux orange non séparable	RDC - Vol 19
P40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	RDC - Vol 20
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	RDC - Vol 20
P42	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	RDC - Vol 20
P43	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau beige en vrac avec fibres visibles avec poussières	RDC - Vol 20
P44	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture en faible quantité non séparable + matériau beige en vrac avec fibres visibles	RDC - Vol 20
P45 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux beige en vrac avec fibres visibles	RDC - Vol 20
P45 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux noir en vrac avec fibres visibles	RDC - Vol 20
P46 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux jaune	RDC - Vol 20
P46 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile bitumée noire	RDC - Vol 20
P47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	RDC - Vol 27
P48	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	RDC - Vol 27
P49	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche	RDC - Vol 27
P50	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau souple blanc	RDC - Vol 27
P51	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	RDC - Vol 27
P52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	RDC - Vol 30

P53	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise en vrac non séparable	RDC - Vol 30
P54	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Cloison	RDC - Vol 30
P55	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - porteur	RDC - Vol 30
P56	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac	RDC - Vol 30
P57	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	RDC - Vol 30
P58	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture en vrac non séparable + matériau compact beige en vrac non séparable	RDC - Vol 30
P59	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	RDC - Vol 30
P60	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture en vrac non séparable + colle beige en vrac non séparable	RDC - Vol 30
P61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	RDC - Vol 32
P62 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	RDC - Vol 32
P62 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau blanc non séparable	RDC - Vol 32
P63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris	RDC - Vol 32
P64	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact gris non séparable	RDC - Vol 32
P65	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	RDC - Vol 32
P66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle grise	RDC - Vol 24
P67	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac	RDC - Vol 24

P68	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise en vrac non séparable	RDC - Vol 23

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022025329800**
Adresse	Commande : 002EW915967 Affaire : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval 69003 LYON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 10/10/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025329800
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW915967_001

Référence labo	42PM02660524
Date du prélèvement	02/10/2025
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Machinerie - Frein
Zone de prélèvement	Pavillon R - ASC-HEH-R-1
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	10/10/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Fibreux Noir	-	-	-	Acétone	1	1	COY	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW915967_002

Référence labo	42PM02660525	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	10/10/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - ASC-HEH-R-1		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	COY	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW915967_003

Référence labo	42PM02660526	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	10/10/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - ASC-HEH-R-1		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que les couches Mastic Effritable Beige, Mastic Souple Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	1	COY	Non détecté	●
2	2	Mastic Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	COY	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW915967_004

Référence labo	42PM02660527	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	10/10/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Pavillon R - ASC-HEH-R-1		
Remarque concernant le prélèvement	Bande type "Paxalu" Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Bande Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	COY	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EW915967_005

Référence labo	42PM02660528	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	09/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon R - ASC-HEH-R-1		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur muret		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	CFS	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW915967_006

Référence labo	42PM02660529	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	09/10/2025
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	Pavillon R - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Noir	-	-	-	Acétone	1	1	CFS	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW915967_007

Référence labo	42PM02660530	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	09/10/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon R - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur fosse		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	CFS	Non détecté	●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025329800
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW915967_008

Référence labo	42PM02660531	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	10/10/2025
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	Pavillon R - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	COY	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW915967_009

Référence labo	42PM02660532	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	10/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon R - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage rectangle + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	COY	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW915967_010

Référence labo	42PM02660533	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	10/10/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon R - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage carré + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	COY	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025329800
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW915967_011

Référence labo	42PM02660534	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/10/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	10/10/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon R - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre plafond Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	COY	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022025329800

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 12 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 12/12

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Anaïs Feugère



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA :	IT0726-13882
		Réf. Commande Client :	002EW915967-1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/04/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 11		Réf échantillon ITGA : IT072604-4403 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4404	
Réf échantillon client : 002EW915967-1013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 11		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / **Peinture** / **Couche plâtreuse blanche**	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (6)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4405	
Réf échantillon client : 002EW915967-1014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 11		Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : MVS (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4406	
Réf échantillon client : 002EW915967-1015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 10		Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : MVS (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4407	
Réf échantillon client : 002EW915967-1016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 11		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / **Matériau gris en faible quantité** / **Peinture**	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable + Peinture non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : MVS (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1017 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 10		Réf échantillon ITGA : IT072604-4408 Description ITGA : Enduit blanc en faible quantité / Matériau fibreux beige en vrac	
Enduit blanc en faible quantité non séparable + Matériau fibreux beige en vrac (1)	MOLP + META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HDZ (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1018 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 10		Réf échantillon ITGA : IT072604-4409 Description ITGA : **Peintures multiples** / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Couche bitumineuse noire / Matériau fibreux jaune	
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Couche bitumineuse noire non séparable + Matériau fibreux jaune non séparable (1)	MOLP + META (B) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LDA (6)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1019 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 10		Réf échantillon ITGA : IT072604-4410 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : MVS (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1020 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 10		Réf échantillon ITGA : IT072604-4411 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau compact beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau compact beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4412	
Réf échantillon client : 002EW915967-1021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 10		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4413	
Réf échantillon client : 002EW915967-1022 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 11		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HDZ (6)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4414	
Réf échantillon client : 002EW915967-1023 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 12		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige et grise	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige et grise	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4415	
Réf échantillon client : 002EW915967-1024 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 13		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / **Peinture**	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Peinture non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4416	
Réf échantillon client : 002EW915967-1025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 13		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
Revêtement souple beige	META (A) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HDZ
Colle polymère jaune	META (B) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4417	
Réf échantillon client : 002EW915967-1026 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 14		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / **Joint cassant blanc**	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (6)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4418	
Réf échantillon client : 002EW915967-1027 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 14		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / **Matériau blanc en faible quantité**	
Revêtement souple marron	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH
Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (6)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4419	
Réf échantillon client : 002EW915967-1028 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 14		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / **Peinture**	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Peinture non séparable (1)	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1029 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 16		Réf échantillon ITGA : IT072604-4420 Description ITGA : Colle beige	
Colle beige	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : MVS
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1030 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 16		Réf échantillon ITGA : IT072604-4421 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige en vrac	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1031 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 16		Réf échantillon ITGA : IT072604-4422 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : MVS (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1032 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 16		Réf échantillon ITGA : IT072604-4423 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Papier**	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : MVS (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1033 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 16		Réf échantillon ITGA : IT072604-4424 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1034 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 16		Réf échantillon ITGA : IT072604-4425 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche**	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (6)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1035 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 17		Réf échantillon ITGA : IT072604-4426 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac / **Joint cassant blanc**	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac + Joint cassant blanc	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1036 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 18		Réf échantillon ITGA : IT072604-4427 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / **Matériau gris**	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Matériau gris non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LYA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4428	
Réf échantillon client : 002EW915967-1037 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 18		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HDZ (6)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4429	
Réf échantillon client : 002EW915967-1038 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 17		Description ITGA : Colle grise en vrac	
Colle grise en vrac	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : MVS (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4430	
Réf échantillon client : 002EW915967-1039 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 19		Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Couche bitumineuse noire / Matériau fibreux orange	
Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Couche bitumineuse noire + Matériau fibreux orange non séparable (1)	MOLP + META (B) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LDA (6)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4431	
Réf échantillon client : 002EW915967-1040 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 20		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LYA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1041 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 20		Réf échantillon ITGA : IT072604-4432 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : MVS (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1042 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 20		Réf échantillon ITGA : IT072604-4433 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : MVS (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1043 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 20		Réf échantillon ITGA : IT072604-4434 Description ITGA : Matériau beige en vrac avec fibres visibles avec poussières	
Matériau beige en vrac avec fibres visibles avec poussières	MOLP le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKP (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1044 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 20		Réf échantillon ITGA : IT072604-4435 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau beige en vrac avec fibres visibles	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau beige en vrac avec fibres visibles (1)	MOLP le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKP (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1045 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 20		Réf échantillon ITGA : IT072604-4436 Description ITGA : Matériau fibreux beige en vrac avec fibres visibles / Matériau fibreux noir en vrac avec fibres visibles	
Matériau fibreux beige en vrac avec fibres visibles	MOLP le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JIP (5)
Matériau fibreux noir en vrac avec fibres visibles	MOLP le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JIP (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1046 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 20		Réf échantillon ITGA : IT072604-4437 Description ITGA : Toile bitumée noire / Matériau fibreux jaune	
Toile bitumée noire	MOLP + META (B) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ILM
Matériau fibreux jaune	MOLP le 03/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / Aucune	Analyste : GJI
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1047 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 27		Réf échantillon ITGA : IT072604-4438 Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1048 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 27		Réf échantillon ITGA : IT072604-4439 Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4440	
Réf échantillon client : 002EW915967-1049 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Rubans adhésifs / Vol 27		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche (1)	MOLP + META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (6)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4441	
Réf échantillon client : 002EW915967-1050 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 27		Description ITGA : Matériau souple blanc	
Matériau souple blanc	META (B) le 07/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4442	
Réf échantillon client : 002EW915967-1051 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 27		Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau compact beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau compact beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4443	
Réf échantillon client : 002EW915967-1052 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 30		Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R		Réf échantillon ITGA : IT072604-4444	
Réf échantillon client : 002EW915967-1053 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 30		Description ITGA : **Peinture** / Colle grise en vrac	
Peinture non séparable + Colle grise en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1054 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 30		Réf échantillon ITGA : IT072604-4445 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1055 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 30		Réf échantillon ITGA : IT072604-4446 Description ITGA : **Peinture en vrac** / **Toile fibreuse blanche en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HDZ (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1056 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 30		Réf échantillon ITGA : IT072604-4447 Description ITGA : Colle beige en vrac	
Colle beige en vrac	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1057 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 30		Réf échantillon ITGA : IT072604-4448 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1058 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 30		Réf échantillon ITGA : IT072604-4449 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau compact beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau compact beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1059 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 30		Réf échantillon ITGA : IT072604-4450 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1060 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 30		Réf échantillon ITGA : IT072604-4451 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Colle beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Colle beige en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1061 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 32		Réf échantillon ITGA : IT072604-4452 Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : MVS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1062 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 32		Réf échantillon ITGA : IT072604-4453 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / **Matériau blanc**	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Matériau blanc non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (6)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1063 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 32		Réf échantillon ITGA : IT072604-4454 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (6)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1064 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 32		Réf échantillon ITGA : IT072604-4455 Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (6)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1065 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 32		Réf échantillon ITGA : IT072604-4456 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Matériau gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1066 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 24		Réf échantillon ITGA : IT072604-4457 Description ITGA : **Peinture** / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise (1)	META (A) le 04/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-13882 EN DATE DU 07/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1067 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 24		Réf échantillon ITGA : IT072604-4458 Description ITGA : Colle grise en vrac	
Colle grise en vrac	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : HEH-PAV-R 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon R Réf échantillon client : 002EW915967-1068 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 23		Réf échantillon ITGA : IT072604-4459 Description ITGA : **Peinture** / Colle grise en vrac	
Peinture non séparable + Colle grise en vrac non séparable	META (A) le 03/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATH


(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Vincent GEFFROY Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

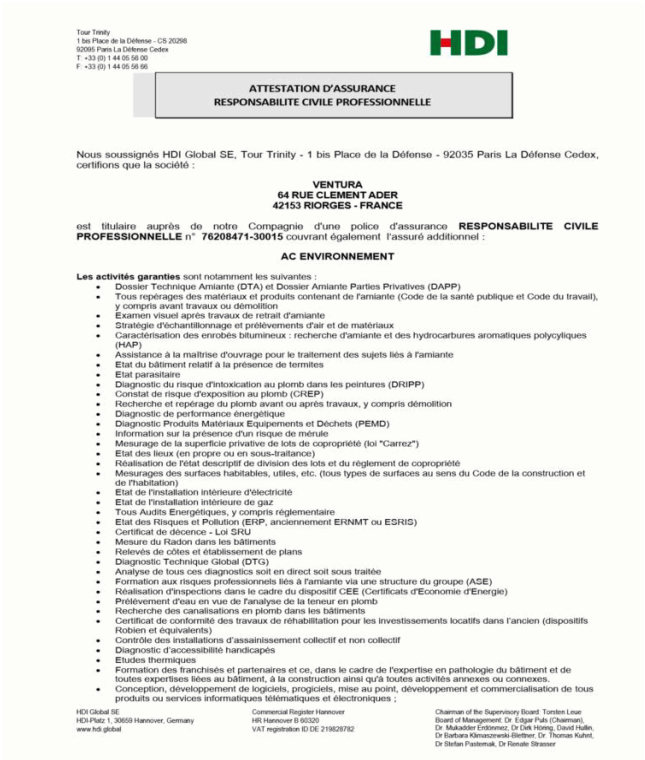

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2

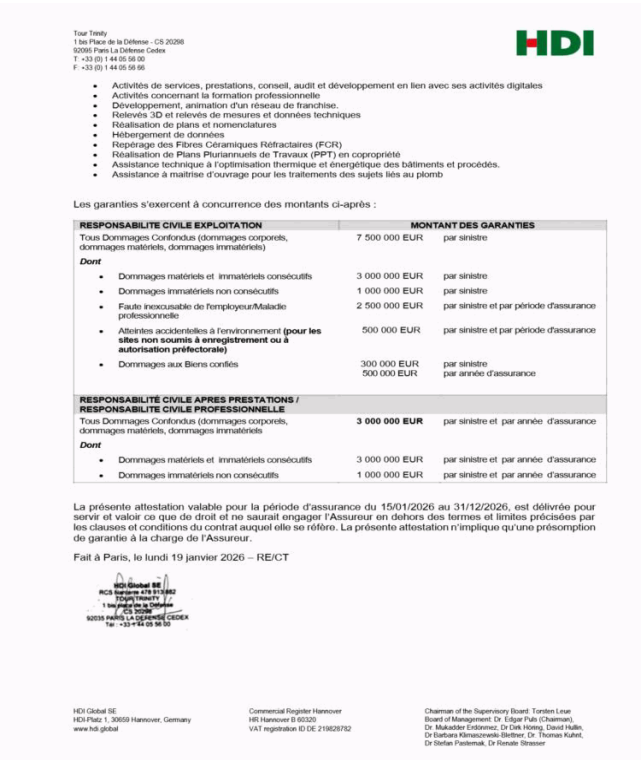

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	**MONTANT DES GARANTIES**	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
RCS Nanterre 478 913 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.


Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6313

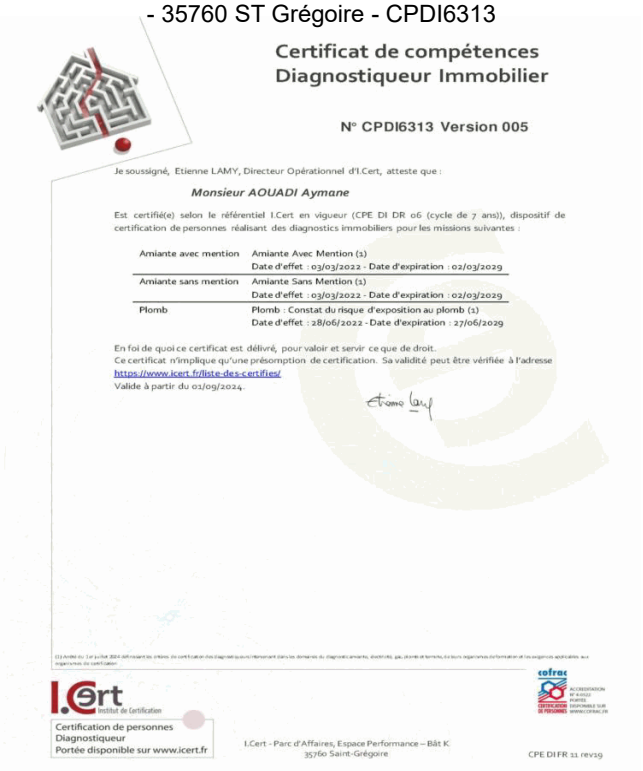

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6313 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur AOUADI Aymane

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 03/03/2022 - Date d'expiration : 02/03/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 03/03/2022 - Date d'expiration : 02/03/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 28/06/2022 - Date d'expiration : 27/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6313



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6313 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur AOUADI Aymane

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 03/03/2022 - Date d'expiration : 02/03/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 03/03/2022 - Date d'expiration : 02/03/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 28/06/2022 - Date d'expiration : 27/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, et leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19
