Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 5 PLACE D'ARSONVAL 69003 LYON

Référence client : HEH-PAV-R

Désignation : Pavillon R

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3 QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON

Donneur d'ordre :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3 QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SABRE Mathieu

Accompagnateur : Sans objet. (0800 400 100)

Date de repérage 21/09/2026

Numéro attestation : CPDI4978

Délivré le : 02/08/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 07/10/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 07/10/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Pre-Rapport

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
A-1 - Désignation de l'immeuble
A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
A-3 - Opérateur de repérage
A-4 - Société
B - Sommaire
C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
C-1 - Locaux visités
C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)
D- Etude préalable
D-1 - Descriptif des travaux envisagés
D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
D-3 - Objectif de la mission
D-4 - Document(s) mis à disposition
D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement
E - Conditions de repérage
E-1 - Modalités de repérage
E-2 - Moyens d'investigation
E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage
F - Conclusions
F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
F-2 - Réserves / Commentaires
G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

Pre-Rapport

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Sous sol 2 - HEH-R-S2-ESC6	Sous sol 2 - HEH-R-S2-04
Sous sol 2 - HEH-R-S2-03	Sous sol 2 - HEH-R-S2-02
Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d	Sous sol 1 - HEH-R-S1-95
Sous sol 1 - HEH-R-S1-96	Sous sol 1 - HEH-R-S1-105
Sous sol 1 - HEH-R-S1-99	Sous sol 1 - HEH-R-S1-100
Sous sol 1 - HEH-R-S1-101	Sous sol 1 - HEH-R-S1-102
Sous sol 1 - HEH-R-S1-103	Sous sol 1 - HEH-R-S1-98
Sous sol 1 - HEH-R-S1-30	Sous sol 1 - HEH-R-S1-31
Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e
Sous sol 1 - HEH-R-S1-46b	Sous sol 1 - HEH-R-S1-46
Sous sol 1 - HEH-R-S1-44	RDC - HEH-R-00-106
RDC - HEH-R-00-107	RDC - HEH-R-00-100
RDC - HEH-R-00-100b	RDC - HEH-R-00-101
RDC - HEH-R-00-105	RDC - HEH-R-00-104

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Pre-Rapport

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réhabilitation totale des locaux

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention concerne l'ensemble des volumes définis dans le schéma de repérage.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol 2	HEH-R-S2-ESC6 - HEH-R-S2-03 - HEH-R-S2-01d	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol 2	HEH-R-S2-ESC6	
Revêtement de sol	Sous sol 2	HEH-R-S2-ESC6 - HEH-R-S2-04 - HEH-R-S2-03 - HEH-R-S2-02 - HEH-R-S2-01d	
Conduits, canalisations et équipements	Sous sol 2	HEH-R-S2-03 - HEH-R-S2-01d	
Equipements divers et accessoires	Sous sol 2	HEH-R-S2-03 - HEH-R-S2-01d	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol 1	HEH-R-S1-95 - HEH-R-S1-96 - HEH-R-S1-105 - HEH-R-S1-100 - HEH-R-S1-102 - HEH-R-S1-103 - HEH-R-S1-98 - HEH-R-S1-31 - HEH-R-S1-34d - HEH-R-S1-34e - HEH-R-S1-46b - HEH-R-S1-44	

Pre-Rapport

Plafond et faux-plafonds	Sous sol 1	HEH-R-S1-95 - HEH-R-S1-96 - HEH-R-S1-105 - HEH-R-S1-99 - HEH-R-S1-100 - HEH-R-S1-102 - HEH-R-S1-103 - HEH-R-S1-98 - HEH-R-S1-30 - HEH-R-S1-31 - HEH-R-S1-34d - HEH-R-S1-34e - HEH-R-S1-46b - HEH-R-S1-44
Revêtement de mur	Sous sol 1	HEH-R-S1-95 - HEH-R-S1-96 - HEH-R-S1-99 - HEH-R-S1-100 - HEH-R-S1-102 - HEH-R-S1-103 - HEH-R-S1-98 - HEH-R-S1-30 - HEH-R-S1-31 - HEH-R-S1-34d - HEH-R-S1-34e
Revêtement de sol	Sous sol 1	HEH-R-S1-95 - HEH-R-S1-96 - HEH-R-S1-105 - HEH-R-S1-99 - HEH-R-S1-100 - HEH-R-S1-101 - HEH-R-S1-102 - HEH-R-S1-103 - HEH-R-S1-98 - HEH-R-S1-30 - HEH-R-S1-31 - HEH-R-S1-34d - HEH-R-S1-34e - HEH-R-S1-46b - HEH-R-S1-44
Façades	Sous sol 1	HEH-R-S1-99 - HEH-R-S1-100 - HEH-R-S1-101 - HEH-R-S1-102 - HEH-R-S1-103 - HEH-R-S1-98 - HEH-R-S1-30 - HEH-R-S1-31 - HEH-R-S1-34d - HEH-R-S1-34e - HEH-R-S1-44
Conduits, canalisations et équipements	Sous sol 1	HEH-R-S1-103
Equipements divers et accessoires	Sous sol 1	HEH-R-S1-103 - HEH-R-S1-98 - HEH-R-S1-34d
Toiture et étanchéité	Sous sol 1	HEH-R-S1-34d - HEH-R-S1-34e
Façades	RDC	HEH-R-00-106 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-100b - HEH-R-00-101 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-104 - HEH-R-00-103 - HEH-R-00-102

Pre-Rapport

Parois verticales intérieures et enduits	RDC	HEH-R-00-106 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-100 - HEH-R-00-101 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-104 - HEH-R-00-103 - HEH-R-00-102
Plafond et faux-plafonds	RDC	HEH-R-00-106 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-100 - HEH-R-00-100b - HEH-R-00-101 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-104 - HEH-R-00-103 - HEH-R-00-102
Revêtement de mur	RDC	HEH-R-00-106 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-101 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-104 - HEH-R-00-103 - HEH-R-00-102
Revêtement de sol	RDC	HEH-R-00-106 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-100 - HEH-R-00-101 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-104 - HEH-R-00-103 - HEH-R-00-102

Pre-Rapport

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans objet.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans objet.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans objet.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Pré-Rapport

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

Pre-Rapport

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
HEH-R-S1-34e	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P14
HEH-R-S1-34d	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P14
HEH-R-S1-34e	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P15
HEH-R-S1-34d	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P15
HEH-R-S1-34e	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P18
HEH-R-S1-30	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P27
HEH-R-S1-31	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P27
HEH-R-S1-31	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P28
HEH-R-S1-30	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P28
HEH-R-S2-01d	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P37
HEH-R-S1-98	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P60
HEH-R-00-100	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P64
HEH-R-00-102	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P64
HEH-R-00-101	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P64
HEH-R-00-105	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P64
HEH-R-00-104	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P64
HEH-R-00-102	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P80
HEH-R-00-103	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P80
HEH-R-00-101	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P82
HEH-R-00-105	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P82
HEH-R-00-107	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P82
HEH-R-00-106	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P82

Pre-Rapport

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
HEH-R-S1-30	Joint de structure	Impossible à sonder sans dégradation importante.		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Aucun composant électrique ne peut être sondé sans réception préalable du Procès Verbal de Consignation

Les joints de structure de menuiseries n'ont pu être sondés sans dégradation importante.

Pre-Rapport

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Equipements divers et accessoires

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 e	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P18	Réalisation d'un prélevement	Plaques ondulées	002EX 53049 5 n°18 - 1	P18	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 e	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P19	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"	002EX 53049 5 n°19 - 1	P19	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 d	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Bande type "Paxalu"	002EX 53049 5 n°19 - 1	P19	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-44	Menuiseries	Mastic vitrier	S9	Réalisation d'un sondage		S9 - 1				Négatif sur document Fenêtre récente
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 e	Menuiseries	Mastic vitrier	P14	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EX 53049 5 n°14 - 1	P14	Mastic - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 d	Menuiseries	Mastic vitrier	S15 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Mastic vitrier effritable	002EX 53049 5 n°14 - 1	P14	Mastic - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 e	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EX 53049 5 n°15 - 1	P15	Mastic - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 d	Menuiseries	Mastic vitrier	S16 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Mastic vitrier effritable	002EX 53049 5 n°15 - 1	P15	Mastic - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 d	Murs	Enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment	002EX 53049 5 n°17 - 1	P17	Enduit / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-30	Menuiseries	Mastic vitrier	P27	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EX 53049 5 n°27 - 1	P27	Mastic - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-31	Menuiseries	Mastic vitrier	S21 (P27)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Mastic vitrier effritable	002EX 53049 5 n°27 - 1	P27	Mastic - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-31	Menuiseries	Mastic vitrier	P28	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EX 53049 5 n°28 - 1	P28	Mastic - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-30	Menuiseries	Mastic vitrier	S22 (P28)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Mastic vitrier effritable	002EX 53049 5 n°28 - 1	P28	Mastic - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-30	Menuiseries	Mastic vitrier	S23	Réalisation d'un sondage		S23 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureJoint mousse sur menuiserie rénovée
Sous sol 1	HEH-R-S1-30	Menuiseries	Mastic vitrier	S23	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S23		S23 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureJoint mousse sur menuiserie rénovée

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-30	Menuiseries	Joint de structure	I1	Joint de structure		I1 - 1				Impossible à sonder sans dégradation importante.
Sous sol 1	HEH-R-S1-103	Menuiseries	Mastic vitrier	P55	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EX530495 n°55 - 1	P55	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-103	Menuiseries	Mastic vitrier	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Mastic vitrier effritable	002EX530495 n°55 - 1	P55	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-102	Menuiseries	Mastic vitrier	P56	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EX530495 n°56 - 1	P56	Mastic - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-102	Menuiseries	Mastic vitrier	P56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56	Mastic vitrier effritable	002EX530495 n°56 - 1	P56	Mastic - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-99	Menuiseries	Mastic vitrier	P57	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EX530495 n°57 - 1	P57	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-100	Menuiseries	Mastic vitrier	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Mastic vitrier effritable	002EX53049 5 n°57 - 1	P57	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-98	Menuiseries	Mastic vitrier	P60	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier effritable	002EX53049 5 n°60 - 1	P60	Mastic - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-98	Menuiseries	Mastic vitrier	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60	Mastic vitrier effritable	002EX53049 5 n°60 - 1	P60	Mastic - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	HEH-R-00-102	Menuiseries	Mastic vitrier	P80	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier effritable	002EX53049 5 n°80 - 1	P80	Mastic - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	HEH-R-00-103	Menuiseries	Mastic vitrier	S108 (P80)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Mastic vitrier effritable	002EX53049 5 n°80 - 1	P80	Mastic - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC	HEH-R-00-104	Menuiseries	Mastic vitrier	P81	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier effritable	002EX53049 5 n°81 - 1	P81	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-101	Menuiseries	Mastic vitrier	P82	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier effritable	002EX53049 5 n°82 - 1	P82	Mastic - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-105	Menuiseries	Mastic vitrier	S109 (P82)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Mastic vitrier effritable	002EX530495 n°82 - 1	P82	Mastic - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	HEH-R-00-107	Menuiseries	Mastic vitrier	S110 (P82)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Mastic vitrier effritable	002EX530495 n°82 - 1	P82	Mastic - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	HEH-R-00-106	Menuiseries	Mastic vitrier	S111 (P82)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Mastic vitrier effritable	002EX530495 n°82 - 1	P82	Mastic - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	HEH-R-00-101	Menuiseries	Mastic vitrier	P83	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier résineux	002EX530495 n°83 - 1	P83	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-105	Menuiseries	Mastic vitrier	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Mastic vitrier résineux	002EX530495 n°83 - 1	P83	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-107	Menuiseries	Mastic vitrier	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Mastic vitrier résineux	002EX530495 n°83 - 1	P83	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-106	Menuiseries	Mastic vitrier	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Mastic vitrier résineux	002EX530495 n°83 - 1	P83	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-105 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-106	Menuiseries	Mastic vitrier	S112 - S113 - S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P83	Mastic vitrier résineux	002EX53049 5 n°83 - 1	P83	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-100b	Menuiseries	Mastic vitrier	P85	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EX53049 5 n°85 - 1	P85	Mastic / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-100b	Menuiseries	Mastic vitrier	P85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Mastic vitrier effritable	002EX53049 5 n°85 - 1	P85	Mastic / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-101	Menuiseries	Mastic vitrier	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85	Mastic vitrier effritable	002EX53049 5 n°85 - 1	P85	Mastic / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-44	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélevement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX53049 5 n°3 - 1 - 002EX53049 5 n°3 - 2	P3	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-46 b	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX 53049 5 n°3 - 1 - 002EX 53049 5 n°3 - 2	P3	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-46	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX 53049 5 n°3 - 1 - 002EX 53049 5 n°3 - 2	P3	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-46 b	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX 53049 5 n°3 - 1 - 002EX 53049 5 n°3 - 2	P3	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-46 b	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de panneaux de plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement	Colle de panneaux de plâtre		P4	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-46	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de panneaux de plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle de panneaux de plâtre		P4	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-44	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de panneaux de plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle de panneaux de plâtre		P4	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-46 - HEH-R-S1-44	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de panneaux de plâtre	S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Colle de panneaux de plâtre		P4	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-44	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P5	Réalisation d'un prélevement	Enduit de rebouchage	002EX530495 n°5 - 1	P5	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 e	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur porteur	002EX530495 n°9 - 1	P9	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 d	Murs et cloisons	Enduits ciment	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Enduit ciment sur porteur	002EX530495 n°9 - 1	P9	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-31	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX530495 n°23 - 1	P23	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-31	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons	002EX530495 n°24 - 1	P24	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 2	HEH-R-S2-ES C6	Murs et cloisons	Enduits ciment	P30	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur porteur	002EX 53049 5 n°30 - 1	P30	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-ES C6	Murs et cloisons	Enduits ciment	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Enduit ciment sur porteur	002EX 53049 5 n°30 - 1	P30	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-03	Murs et cloisons	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Enduit ciment sur porteur	002EX 53049 5 n°30 - 1	P30	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-ES C6 - HEH-R-S2-03	Murs et cloisons	Enduits ciment	P30 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Enduit ciment sur porteur	002EX 53049 5 n°30 - 1	P30	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-01 d	Murs et cloisons	Enduits ciment	P36	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur porteur	002EX 53049 5 n°36 - 1	P36	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-01 d	Murs et cloisons	Enduits ciment	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Enduit ciment sur porteur	002EX 53049 5 n°36 - 1	P36	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-105	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P47	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°47 - 1	P47	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-103	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°47 - 1	P47	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-98	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°47 - 1	P47	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-100	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°47 - 1	P47	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-102	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°47 - 1	P47	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-95	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°47 - 1	P47	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-103 - HEH-R-S1-98 - HEH-R-S1-100 - HEH-R-S1-102 - HEH-R-S1-95	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S45 - S46 - S47 - S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°47 - 1	P47	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-96	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P48	Réalisation d'un prélevement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX53049 5 n°48 - 1	P48	Peinture / Enduit / Matériau / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-95	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX53049 5 n°48 - 1	P48	Peinture / Enduit / Matériau / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-105	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX530495 n°48 - 1	P48	Peinture / Enduit / Matériau / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-103	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX530495 n°48 - 1	P48	Peinture / Enduit / Matériau / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-95 - HEH-R-S1-105 - HEH-R-S1-103	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S50 - S51 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX53049 5 n°48 - 1	P48	Peinture / Enduit / Matériau / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-98	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S66	Réalisation d'un sondage		S66 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage
RDC	HEH-R-00-100	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P69	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°69 - 1	P69	Peinture / Papier / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-101	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°69 - 1	P69	Peinture / Papier / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-105	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°69 - 1	P69	Peinture / Papier / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-107	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°69 - 1	P69	Peinture / Papier / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-106	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°69 - 1	P69	Peinture / Papier / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-104	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°69 - 1	P69	Peinture / Papier / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-101 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-106 - HEH-R-00-104	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S87 - S88 - S89 - S90 - S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EX53049 5 n°69 - 1	P69	Peinture / Papier / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-100	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P70	Réalisation d'un prélevement	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX530495 n°70 - 1	P70 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-100	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX530495 n°70 - 1	P70 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-105	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX530495 n°70 - 1	P70 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-107	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX530495 n°70 - 1	P70 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-106	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX530495 n°70 - 1	P70 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-104	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX530495 n°70 - 1	P70 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-103	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX530495 n°70 - 1	P70 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-102	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX530495 n°70 - 1	P70 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-100 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-106 - HEH-R-00-104 - HEH-R-00-103 - HEH-R-00-102	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P70 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX530495 n°70 - 1	P70 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-100	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P70	Réalisation d'un prélevement	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX53049 5 n°70 - 1	P70 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-100	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX53049 5 n°70 - 1	P70 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-105	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX53049 5 n°70 - 1	P70 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-107	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX53049 5 n°70 - 1	P70 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-106	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX53049 5 n°70 - 1	P70 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-104	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX53049 5 n°70 - 1	P70 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-103	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX53049 5 n°70 - 1	P70 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-102	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX53049 5 n°70 - 1	P70 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-100 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-106 - HEH-R-00-104 - HEH-R-00-103 - HEH-R-00-102	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P70 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX53049 5 n°70 - 1	P70 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-103	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P71	Réalisation d'un prélevement	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX53049 5 n°71 - 1	P71 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-103	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P71	Réalisation d'un prélevement	Plaque type BA13 + bande à joint	002EX53049 5 n°71 - 1	P71 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-103	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P72	Réalisation d'un prélevement	Plaque type BA13 + bande à joint (ITI)	002EX53049 5 n°72 - 1	P72 Phase 1	Fibres / Enduit / Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-104	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Plaque type BA13 + bande à joint (ITI)	002EX53049 5 n°72 - 1	P72 Phase 1	Fibres / Enduit / Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-103	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P72	Réalisation d'un prélevement	Plaque type BA13 + bande à joint (ITI)	002EX53049 5 n°72 - 1	P72 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-104	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72	Plaque type BA13 + bande à joint (ITI)	002EX530495 n°72 - 1	P72 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-103	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de panneaux de plâtre	P84	Réalisation d'un prélevement	Colle de panneaux de plâtre	002EX530495 n°84 - 1	P84	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-46b	Plafonds	Enduits ciment	P6	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment	002EX530495 n°6 - 1	P6	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-46	Plafonds	Enduits ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit ciment	002EX530495 n°6 - 1	P6	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-44	Plafonds	Enduits ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit ciment	002EX530495 n°6 - 1	P6	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-46 - HEH-R-S1-44	Plafonds	Enduits ciment	S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit ciment	002EX530495 n°6 - 1	P6	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-44	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P7	Réalisation d'un prélevement	Panneaux faux plafonds	002EX 53049 5 n°7 - 1	P7	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-46 b	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Panneaux faux plafonds	002EX 53049 5 n°7 - 1	P7	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-46 b	Plafonds	Flocages	S10	Réalisation d'un sondage		S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Ouate de cellulose
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 e	Plafonds	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment	002EX 53049 5 n°11 - 1	P11	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 d	Plafonds	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Enduit ciment	002EX 53049 5 n°11 - 1	P11	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 e	Plafonds	Peinture	P12	Réalisation d'un prélevement	Peinture bleue	002EX 53049 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 d	Plafonds	Peinture	P13	Réalisation d'un prélevement	Peinture verte	002EX 53049 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Noir / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-31	Plafonds	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre	002EX 53049 5 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-30	Plafonds	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Peinture + enduit plâtre	002EX 53049 5 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-ES C6	Plafonds	Enduits ciment	P32	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment	002EX 53049 5 n°32 - 1	P32	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 3	Plafonds	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre	002EX 53049 5 n°53 - 1	P53	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-98	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Peinture + enduit plâtre	002EX 53049 5 n°53 - 1	P53	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-105	Plafonds	Enduits plâtre	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Peinture + enduit plâtre	002EX 53049 5 n°53 - 1	P53	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-100	Plafonds	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Peinture + enduit plâtre	002EX 53049 5 n°53 - 1	P53	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-99	Plafonds	Enduits plâtre	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Peinture + enduit plâtre	002EX 53049 5 n°53 - 1	P53	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-95	Plafonds	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Peinture + enduit plâtre	002EX 53049 5 n°53 - 1	P53	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-96	Plafonds	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Peinture + enduit plâtre	002EX 53049 5 n°53 - 1	P53	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-102	Plafonds	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Peinture + enduit plâtre	002EX 53049 5 n°53 - 1	P53	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-98 - HEH-R-S1-105 - HEH-R-S1-100 - HEH-R-S1-99 - HEH-R-S1-95 - HEH-R-S1-96 - HEH-R-S1-102	Plafonds	Enduits plâtre	S53 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Peinture + enduit plâtre	002EX 53049 5 n°53 - 1	P53	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-98	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P58	Réalisation d'un prélevement	Panneaux faux plafonds	002EX 53049 5 n°58 - 1	P58	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-103	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P59	Réalisation d'un prélevement	Panneaux faux plafonds BA13	002EX 53049 5 n°59 - 2	P59	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-100	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Panneaux faux plafonds BA13	002EX 53049 5 n°59 - 2	P59	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-99	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Panneaux faux plafonds BA13	002EX 53049 5 n°59 - 2	P59	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-96	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Panneaux faux plafonds BA13	002EX 53049 5 n°59 - 2	P59	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-95	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Panneaux faux plafonds BA13	002EX 53049 5 n°59 - 2	P59	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 5	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Panneaux faux plafonds BA13	002EX 53049 5 n°59 - 2	P59	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 0 - HEH-R-S1-99 - HEH-R-S1-96 - HEH-R-S1-95 - HEH-R-S1-10 5	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S61 - S62 - S63 - S64 - S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Panneaux faux plafonds BA13	002EX 53049 5 n°59 - 2	P59	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-10 0	Plafonds	Enduits plâtre	P79	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre	002EX 53049 5 n°79 - 1	P79	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-102	Plafonds	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Peinture + enduit plâtre	002EX53049 5 n°79 - 1	P79	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-103	Plafonds	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Peinture + enduit plâtre	002EX53049 5 n°79 - 1	P79	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-104	Plafonds	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Peinture + enduit plâtre	002EX53049 5 n°79 - 1	P79	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-106	Plafonds	Enduits plâtre	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Peinture + enduit plâtre	002EX53049 5 n°79 - 1	P79	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-107	Plafonds	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Peinture + enduit plâtre	002EX53049 5 n°79 - 1	P79	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-105	Plafonds	Enduits plâtre	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Peinture + enduit plâtre	002EX53049 5 n°79 - 1	P79	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-101	Plafonds	Enduits plâtre	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Peinture + enduit plâtre	002EX53049 5 n°79 - 1	P79	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-100b	Plafonds	Enduits plâtre	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Peinture + enduit plâtre	002EX53049 5 n°79 - 1	P79	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-102 - HEH-R-00-103 - HEH-R-00-104 - HEH-R-00-106 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-101 - HEH-R-00-100b	Plafonds	Enduits plâtre	S101 - S102 - S103 - S104 - S105 - S106 - S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Peinture + enduit plâtre	002EX53049 5 n°79 - 1	P79	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-44	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°1 - 1	P1 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-44	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°1 - 1	P1 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-46 b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°2 - 1	P2 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°2 - 1	P2 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-46 b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 d	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P8	Réalisation d'un prélevement	Carrelage + colle beige	002EX 53049 5 n°8 - 1	P8 Phase 1	Colle / Colle - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 e	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Carrelage + colle beige	002EX 53049 5 n°8 - 1	P8 Phase 1	Colle / Colle - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 d	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P8	Réalisation d'un prélevement	Carrelage + colle beige	002EX 53049 5 n°8 - 1	P8 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 e	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Carrelage + colle beige	002EX 53049 5 n°8 - 1	P8 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-30	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P20	Réalisation d'un prélevement	Carrelage inférieur + colle grise	002EX 53049 5 n°20 - 1	P20	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-31	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Carrelage inférieur + colle grise	002EX 53049 5 n°20 - 1	P20	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-30	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P21	Réalisation d'un prélevement	Carrelage supérieur + colle grise	002EX 53049 5 n°21 - 1	P21	Colle / Peinture / Ragréage - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-31	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Carrelage supérieur + colle grise	002EX 53049 5 n°21 - 1	P21	Colle / Peinture / Ragréage - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-02	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P29	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment	002EX 53049 5 n°29 - 1	P29	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 2	HEH-R-S2-03	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Chape ciment	002EX 53049 5 n°29 - 1	P29	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-ES C6	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Chape ciment	002EX 53049 5 n°29 - 1	P29	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-04	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Chape ciment	002EX 53049 5 n°29 - 1	P29	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-01 d	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Chape ciment	002EX 53049 5 n°29 - 1	P29	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 1	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Chape ciment	002EX 53049 5 n°29 - 1	P29	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-03 - HEH-R-S2-ES C6 - HEH-R-S2-04 - HEH-R-S2-01 d	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S25 - S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Chape ciment	002EX 53049 5 n°29 - 1	P29	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-103	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P40	Réalisation d'un prélevement	Carrelage blanc inferieur + colle beige	002EX53049 5 n°40 - 1	P40	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-98	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Carrelage blanc inferieur + colle beige	002EX53049 5 n°40 - 1	P40	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-100	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Carrelage blanc inferieur + colle beige	002EX53049 5 n°40 - 1	P40	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-99	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Carrelage blanc inferieur + colle beige	002EX53049 5 n°40 - 1	P40	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-105	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Carrelage blanc inferieur + colle beige	002EX53049 5 n°40 - 1	P40	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-96	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Carrelage blanc inferieur + colle beige	002EX53049 5 n°40 - 1	P40	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-95	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Carrelage blanc inferieur + colle beige	002EX53049 5 n°40 - 1	P40	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-98 - HEH-R-S1-100 - HEH-R-S1-99 - HEH-R-S1-105 - HEH-R-S1-96 - HEH-R-S1-95	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Carrelage blanc inferieur + colle beige	002EX53049 5 n°40 - 1	P40	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-102	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P41	Réalisation d'un prélevement	Carrelage + colle marron	002EX53049 5 n°41 - 1	P41	Matériau / Peinture / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Rouge Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-98	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P42	Réalisation d'un prélevement	Carrelage + colle grise	002EX53049 5 n°42 - 1	P42	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-103	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P43	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-105	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-96	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-99	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 0	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-95	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-10 1	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-10 2	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-10 6	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-107	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-105	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-100	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-105 - HEH-R-S1-96 - HEH-R-S1-99 - HEH-R-S1-100 - HEH-R-S1-95	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39 - S40 - S41 - S42 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-101 - HEH-R-00-102 - HEH-R-00-106 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-100	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-103	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P43	Réalisation d'un prélèvement	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-105	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-96	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-99	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 0	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-95	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-10 1	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-10 2	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-10 6	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-10 7	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-10 5	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX 53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-100	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-105 - HEH-R-S1-96 - HEH-R-S1-99 - HEH-R-S1-100 - HEH-R-S1-95	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39 - S40 - S41 - S42 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-101 - HEH-R-00-102 - HEH-R-00-106 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-100	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S68 - S69 - S70 - S71 - S72 - S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	002EX53049 5 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-100	Revêtement de sol	Plancher	S74	Réalisation d'un sondage		S74 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-104	Revêtement de sol	Plancher	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage
RDC	HEH-R-00-106	Revêtement de sol	Plancher	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage
RDC	HEH-R-00-107	Revêtement de sol	Plancher	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-105	Revêtement de sol	Plancher	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage
RDC	HEH-R-00-103	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P63	Réalisation d'un prélevement	Carrelage + colle grise	002EX530495 n°63 - 1	P63	Papier / Colle / Ciment - Souple Fibreux / Dur / Dur - Beige / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-100	Revêtement de sol	Ragréage	P64	Réalisation d'un prélevement	colle + ragréage	002EX530495 n°64 - 1	P64	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Bitumineux / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-102	Revêtement de sol	Ragréage	S79 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	colle + ragréage	002EX530495 n°64 - 1	P64	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Bitumineux / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC	HEH-R-00-101	Revêtement de sol	Ragréage	S80 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	colle + ragréage	002EX530495 n°64 - 1	P64	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Bitumineux / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-105	Revêtement de sol	Ragréage	S81 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	colle + ragréage	002EX530495 n°64 - 1	P64	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Bitumineux / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC	HEH-R-00-104	Revêtement de sol	Ragréage	S82 (P64)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	colle + ragréage	002EX530495 n°64 - 1	P64	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Bitumineux / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC	HEH-R-00-100	Revêtement de sol	Ragréage	P65	Réalisation d'un prélevement	Ragréage marron	002EX530495 n°65 - 1	P65	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-101	Revêtement de sol	Ragréage	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Ragréage marron	002EX53049 5 n°65 - 1	P65	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-100	Revêtement de sol	Ragréage	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Ragréage marron	002EX53049 5 n°65 - 1	P65	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-104	Revêtement de sol	Ragréage	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Ragréage marron	002EX53049 5 n°65 - 1	P65	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-102	Revêtement de sol	Ragréage	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Ragréage marron	002EX53049 5 n°65 - 1	P65	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-101 - HEH-R-00-100 - HEH-R-00-104 - HEH-R-00-102	Revêtement de sol	Ragréage	S83 - S84 - S85 - S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65	Ragréage marron	002EX53049 5 n°65 - 1	P65	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-104	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P66	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques	002EX53049 5 n°66 - 1	P66	Revêtement - Semi-dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-34e	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX53049 5 n°10 - 1	P10	Colle / Peinture / Enduit / Ciment - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-34d	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Faïence + colle beige	002EX53049 5 n°10 - 1	P10	Colle / Peinture / Enduit / Ciment - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-31	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle grise	002EX53049 5 n°22 - 1	P22 Phase 1	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-31	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle grise	002EX 53049 5 n°22 - 1	P22 Phase 2	Joint / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle grise	002EX 53049 5 n°25 - 1	P25	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Faïence + colle grise	002EX 53049 5 n°25 - 1	P25	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-31	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Faïence + colle grise	002EX 53049 5 n°25 - 1	P25	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-30 - HEH-R-S1-31	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Faïence + colle grise	002EX 53049 5 n°25 - 1	P25	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P44	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle grise	002EX 53049 5 n°44 - 1	P44	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Plinthe + colle grise	002EX 53049 5 n°44 - 1	P44	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-98	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P45	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle grise	002EX 53049 5 n°45 - 1	P45	Colle / Enduit / Peinture - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-95	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle grise	002EX 53049 5 n°46 - 1	P46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-95	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Plinthe + colle grise	002EX 53049 5 n°46 - 1	P46	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX 53049 5 n°49 - 1	P49	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX 53049 5 n°50 - 1	P50	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Faïence + colle beige	002EX 53049 5 n°50 - 1	P50	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-96	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P51	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX 53049 5 n°51 - 1	P51	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-95	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P52	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX 53049 5 n°52 - 1	P52	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-95	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Faïence + colle beige	002EX 53049 5 n°52 - 1	P52	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-99	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P62	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX 53049 5 n°62 - 1	P62	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 0	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	Faïence + colle beige	002EX 53049 5 n°62 - 1	P62	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-103	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P67	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle grise	002EX53049 5 n°67 - 1	P67	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-103	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67	Plinthe + colle grise	002EX53049 5 n°67 - 1	P67	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-103	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P68	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle beige	002EX53049 5 n°68 - 1	P68	Colle / Enduit / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-102	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX53049 5 n°73 - 1	P73	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-103	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P74	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX53049 5 n°74 - 1	P74	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-103	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Faïence + colle beige	002EX53049 5 n°74 - 1	P74	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Blanc Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-101	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P75	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX53049 5 n°75 - 1	P75	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-106	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P76	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX53049 5 n°76 - 1	P76	Colle - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-107	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Faïence + colle beige	002EX53049 5 n°76 - 1	P76	Colle - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-105	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Faïence + colle beige	002EX53049 5 n°76 - 1	P76	Colle - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-107 - HEH-R-00-105	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S99 - S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Faïence + colle beige	002EX53049 5 n°76 - 1	P76	Colle - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	HEH-R-00-104	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P77	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX53049 5 n°77 - 1	P77	Enduit / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	HEH-R-00-103	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P78	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle grise	002EX530495 n°78 - 1	P78	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 2	HEH-R-S2-03	Conduit eau	Conduit	S30	Réalisation d'un sondage		S30 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage
Sous sol 2	HEH-R-S2-01d	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P37	Réalisation d'un prélevement	Enveloppe de calorifuge sur liège	002EX530495 n°37 - 1	P37	Matériau / Toile / Enduit - Bitumineux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Noir / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 2	HEH-R-S2-01 d	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P38	Réalisation d'un prélevement	Enveloppe de calorifuge sur liège	002EX 53049 5 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Souple - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-01 d	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Enveloppe de calorifuge sur liège	002EX 53049 5 n°38 - 1	P38	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Souple - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-01 d	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P39	Réalisation d'un prélevement	Enveloppe de calorifuge sur laine rose	002EX 53049 5 n°39 - 1	P39 Phase 1	Laine - Souple Fibreux - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 2	HEH-R-S2-01 d	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P39	Réalisation d'un prélevement	Enveloppe de calorifuge sur laine rose	002EX 53049 5 n°39 - 1	P39 Phase 2	Toile - Souple Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-01 d	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P39	Réalisation d'un prélevement	Enveloppe de calorifuge sur laine rose	002EX 53049 5 n°39 - 1	P39 Phase 3	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-01 d	Conduit eau	Calorifugeage	S31	Réalisation d'un sondage		S31 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 3	Conduit eau	Mastics	P54	Réalisation d'un prélevement	Mastic sur pipe d'évacuation	002EX 53049 5 n°54 - 1	P54	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 1	HEH-R-S1-34 d	Radiateurs	Peinture anti-condensation	P16	Réalisation d'un prélevement	Peinture anti-condensation	002EX 53049 5 n°16 - 1	P16	Peinture - Effritable - Gris Orange	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol 2	HEH-R-S2-03	Cables électriques	Isolant	P31	Réalisation d'un prélevement		002EX 53049 5 n°31 - 1	P31	Matériau / Matériau / Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Souple / Souple / Souple - Noir / Bleu / Rouge / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-01 d	Cables électriques	Isolant	P33	Réalisation d'un prélevement		002EX 53049 5 n°33 - 1	P33	Matériau - Fibreux Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-01 d	Cables électriques	Isolant	P34	Réalisation d'un prélevement		002EX 53049 5 n°34 - 1	P34	Matériau - Dur - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 2	HEH-R-S2-01 d	Cables électriques	Isolant	P35	Réalisation d'un prélevement		002EX 53049 5 n°35 - 1	P35	Peinture / Matériau - Effritable / Fibreux Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol 1	HEH-R-S1-98	Evier	Tampon bitumineux	S59	Réalisation d'un sondage		S59 - 1				Négatif sur marquage2003
Sous sol 1	HEH-R-S1-10 3	Radiateurs	Peinture anti-condensation	P61	Réalisation d'un prélevement	Peinture anti-condensation	002EX 53049 5 n°61 - 1	P61	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC				
P64	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Bitumineux / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Noir / Gris / Blanc	HEH-R-00-100 - HEH-R-00-102 - HEH-R-00-101 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-104	43,65 m		20,05 m²	5 unité(s)
P80	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige	HEH-R-00-102 - HEH-R-00-103	,98 m			2 unité(s)
P82	Menuiseries	Mastic - Dur - Gris	HEH-R-00-101 - HEH-R-00-105 - HEH-R-00-107 - HEH-R-00-106	4,34 m			4 unité(s)
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Sous sol 1				
P14	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	HEH-R-S1-34e - HEH-R-S1-34d	5,52 m			2 unité(s)
P15	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	HEH-R-S1-34e - HEH-R-S1-34d	5,37 m			2 unité(s)
P18	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	HEH-R-S1-34e	3,48 m		,74 m²	1 unité(s)
P27	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	HEH-R-S1-30 - HEH-R-S1-31	2,23 m			2 unité(s)
P28	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris	HEH-R-S1-31 - HEH-R-S1-30	2,12 m			2 unité(s)
P60	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris	HEH-R-S1-98 - HEH-R-S1-98	2,6 m			2 unité(s)
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Sous sol 2				

Pre-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Sous sol 2				
P37	Conduit eau	Matériau / Toile / Enduit - Bitumineux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Noir / Beige / Blanc	HEH-R-S2-01 d	,72 m			1 unité(s)

Pre-Rapport


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol 2	Sous sol 2 - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol 2	Sous sol 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol 2	Sous sol 2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Sous sol 1	Sous sol 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol 1	Sous sol 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol 1	Sous sol 1 - MPCA Toiture et étanchéité
	Sous sol 1	Sous sol 1 - MPCA Façades
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Façades
	RDC	RDC - MPCA Revêtement de sol

Pre-Rapport

SOUS SOL 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX530495

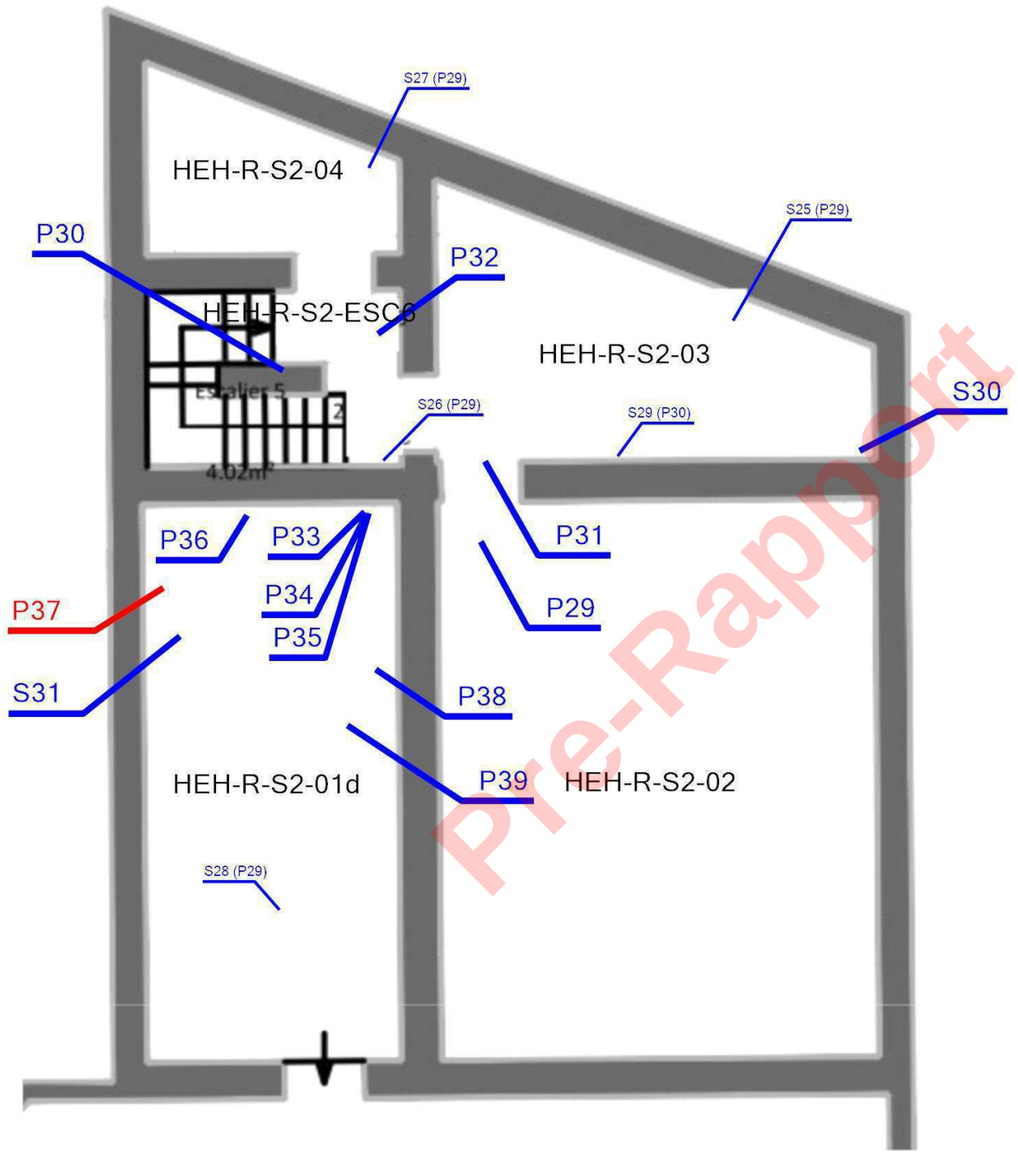

Pré-Rapport


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Pavillon R	21/09/2026	SABRE Mathieu

SOUS SOL 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX530495

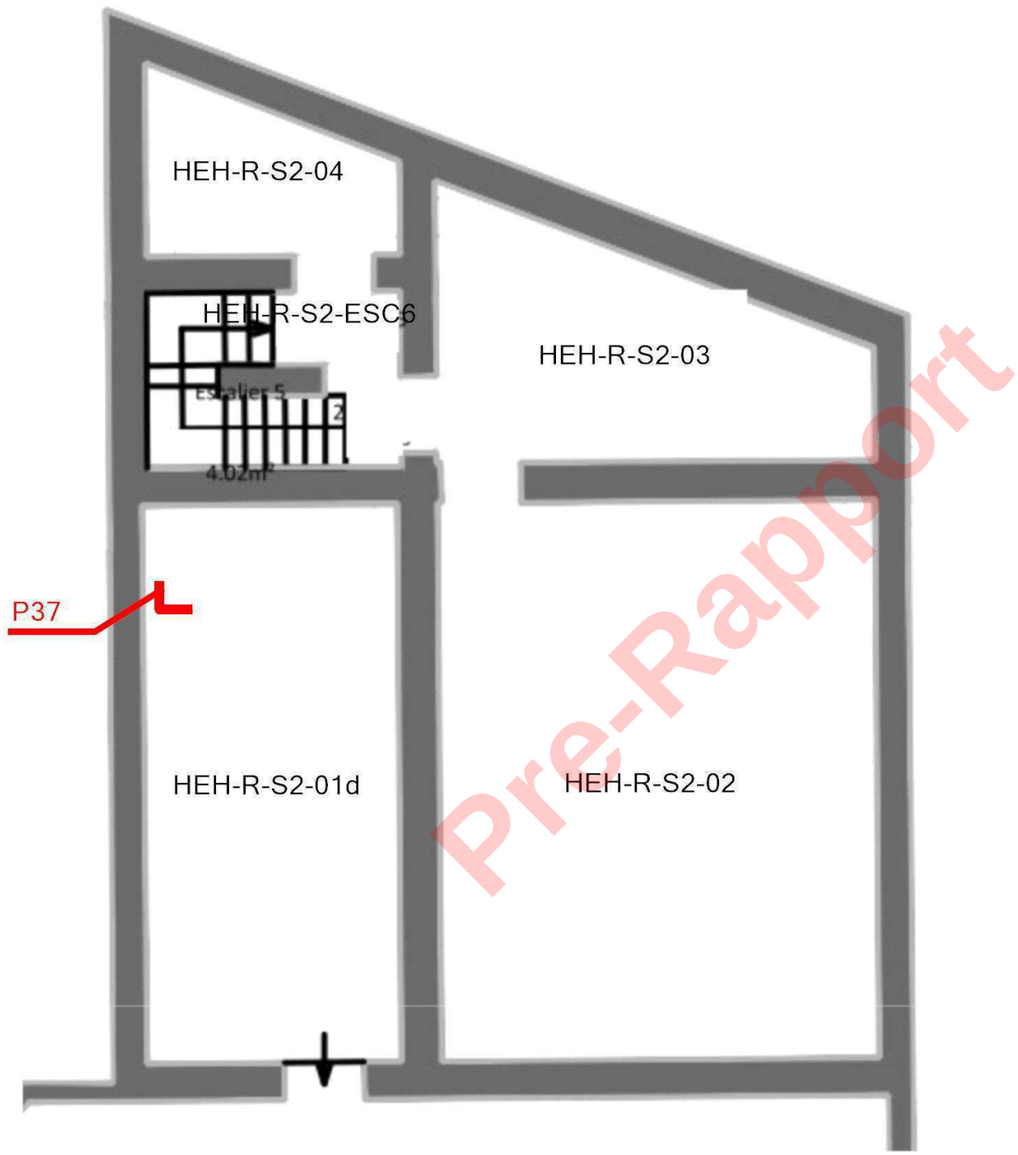


Pre-Rapport

Légende	
	P37 : Enveloppe de calorifuge

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Pavillon R	21/09/2026	SABRE Mathieu

SOUS SOL 2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EX530495

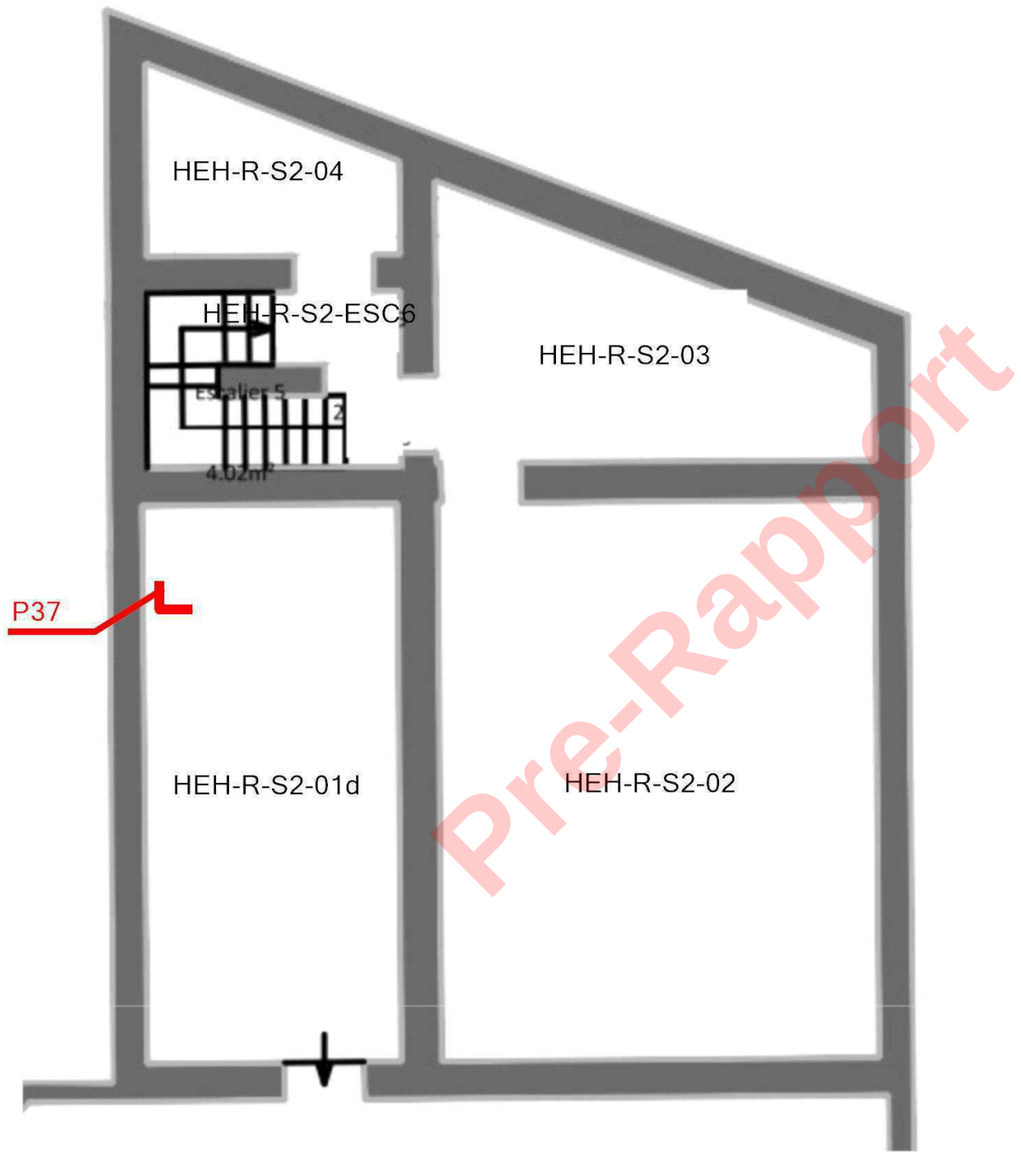


Pre-Rapport

Légende	
	P37 : Enveloppe de calorifuge

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Pavillon R	21/09/2026	SABRE Mathieu

SOUS SOL 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX530495

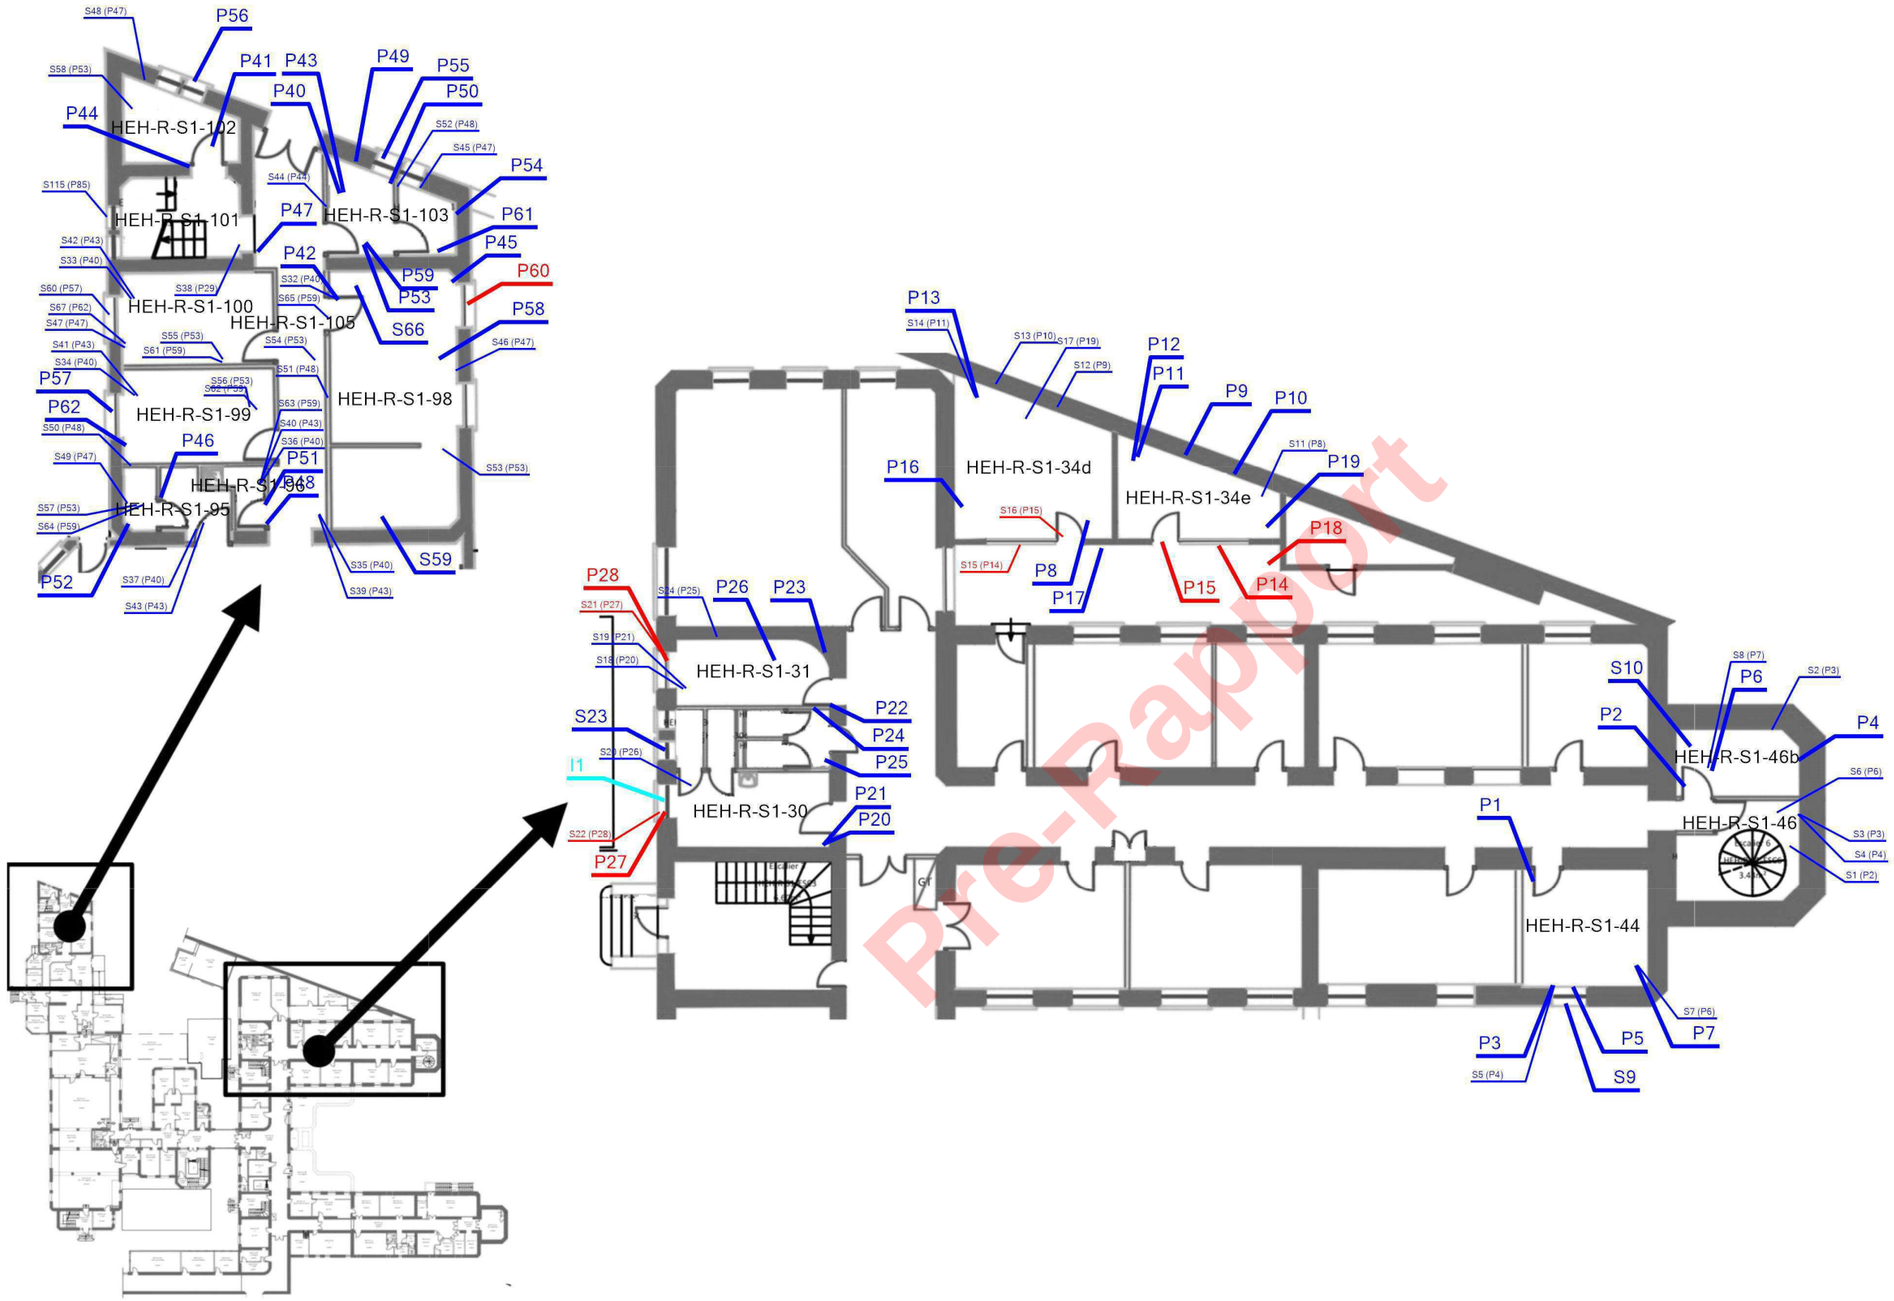

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Pré-Rapport

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Pavillon R	21/09/2026	SABRE Mathieu

SOUS SOL 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX530495

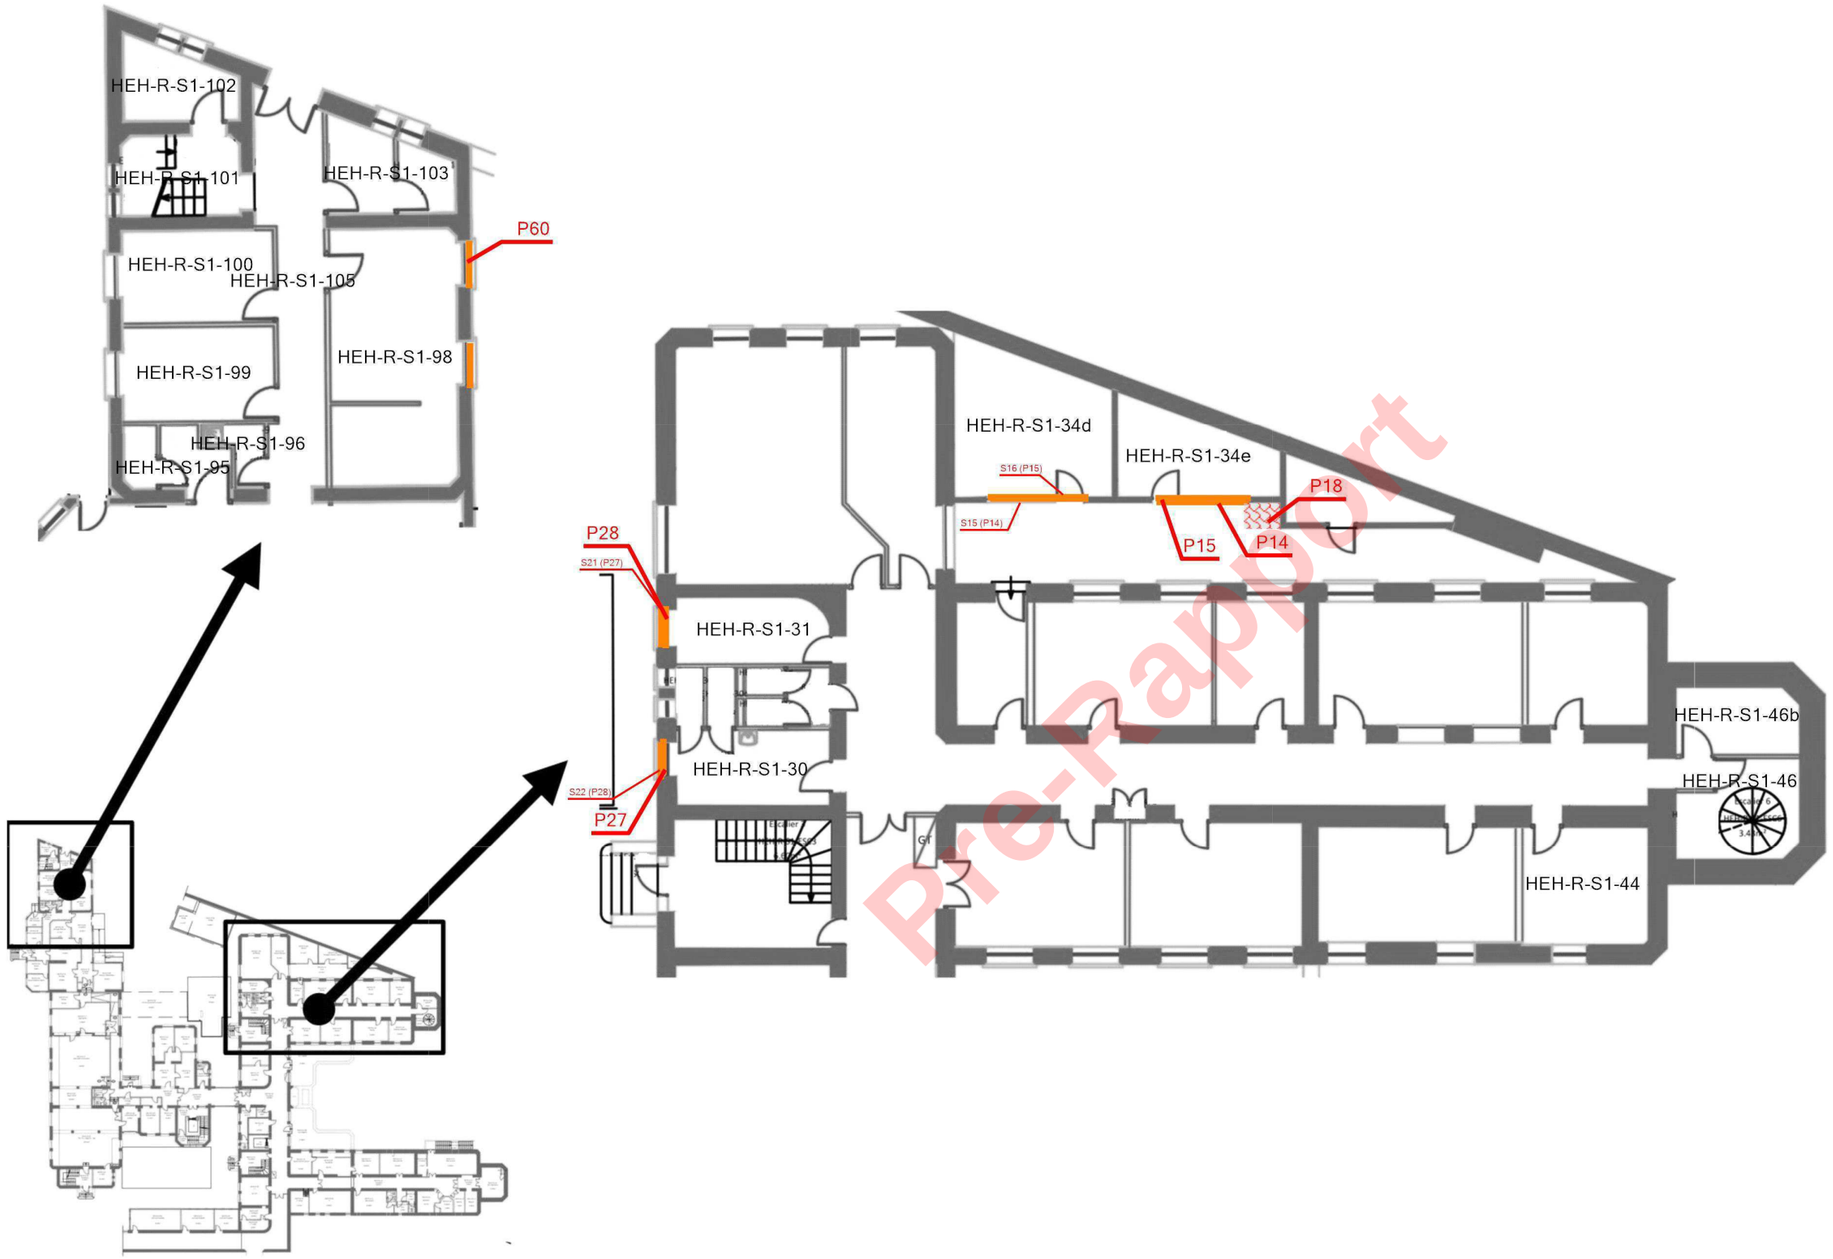

Légende


	P27 : Mastic vitrier
	P15 : Mastic vitrier
	P60 : Mastic vitrier
	P14 : Mastic vitrier
	P28 : Mastic vitrier
	P18 : Plaques en fibres-ciment

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Pavillon R	21/09/2026	SABRE Mathieu

SOUS SOL 1 - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002EX530495

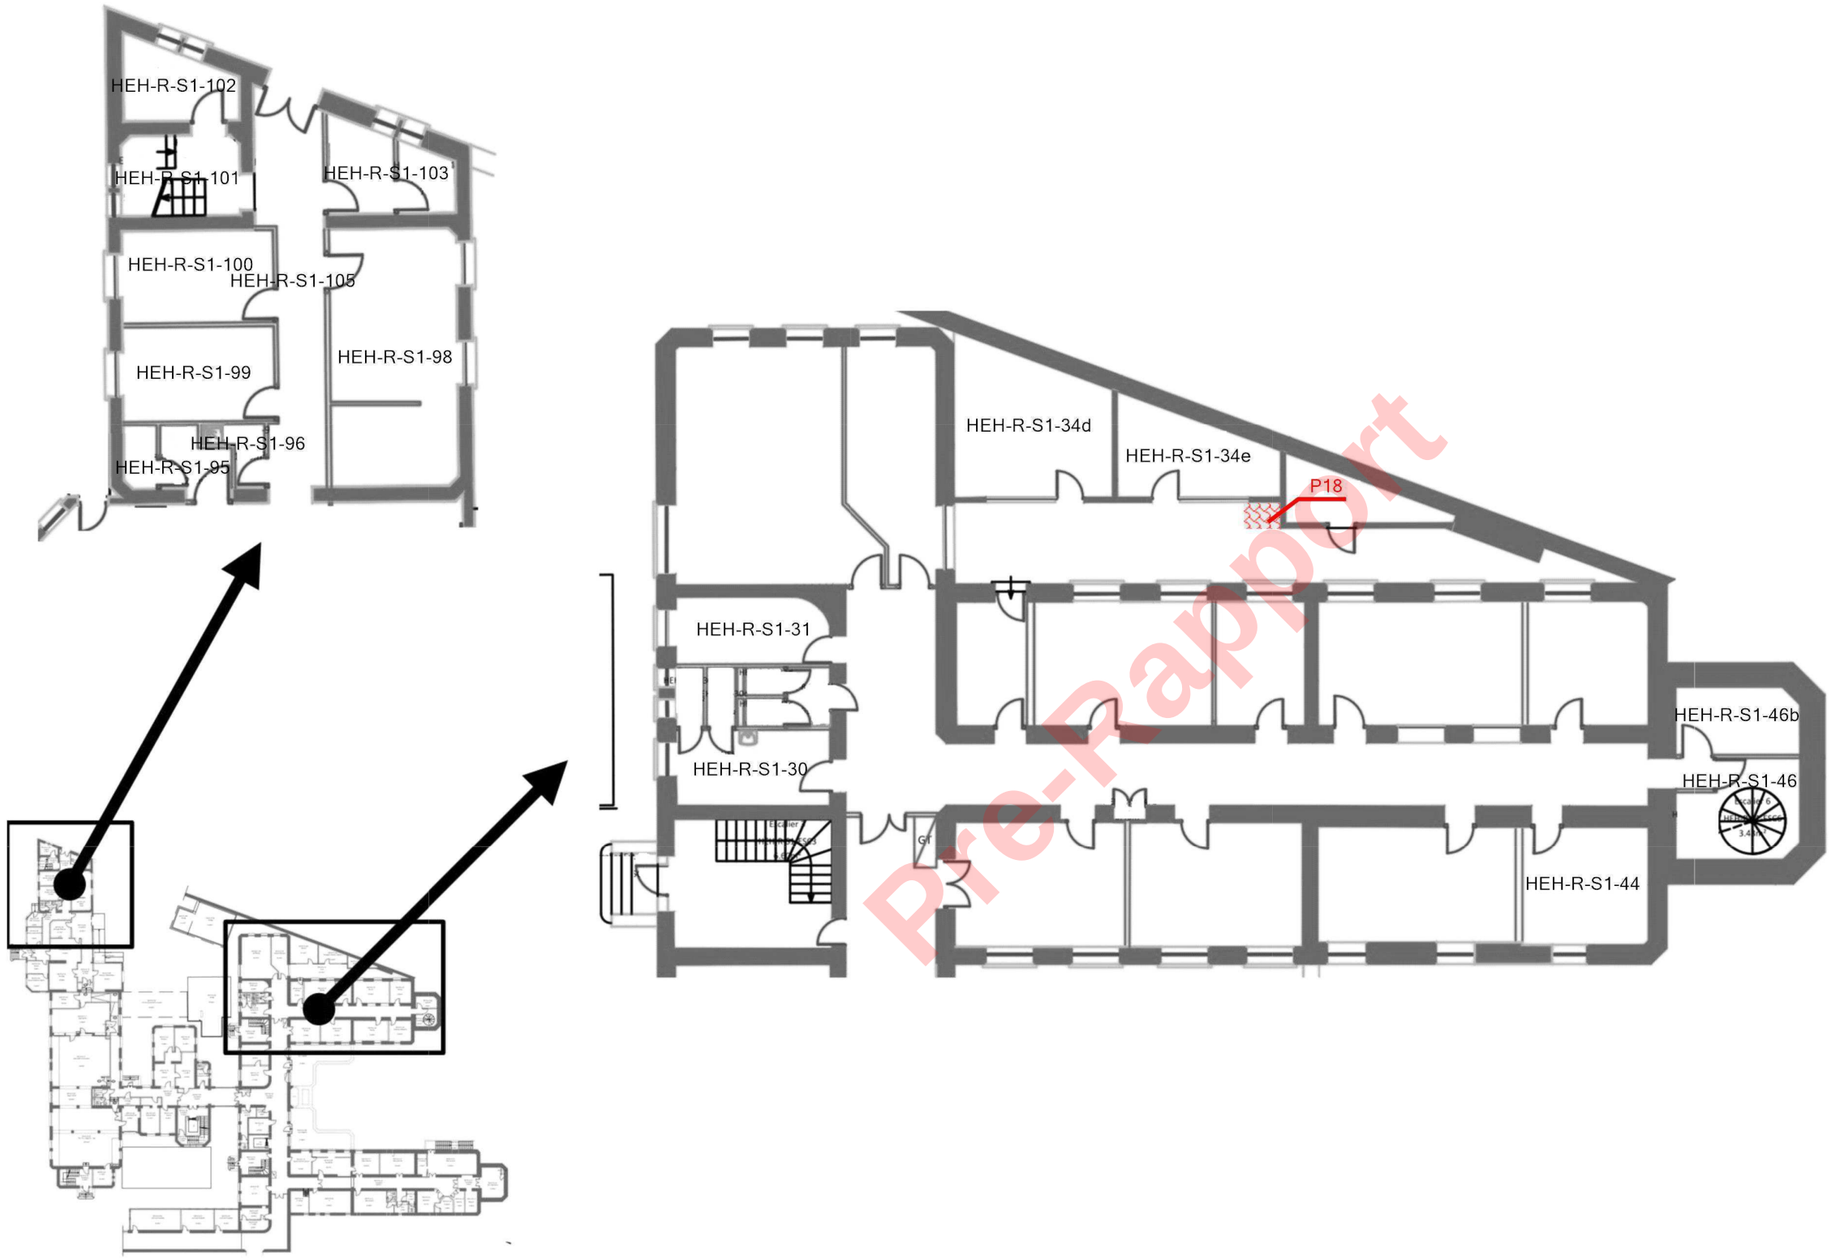

Légende


	P18 : Plaques en fibres-ciment

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Pavillon R	21/09/2026	SABRE Mathieu

SOUS SOL 1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX530495

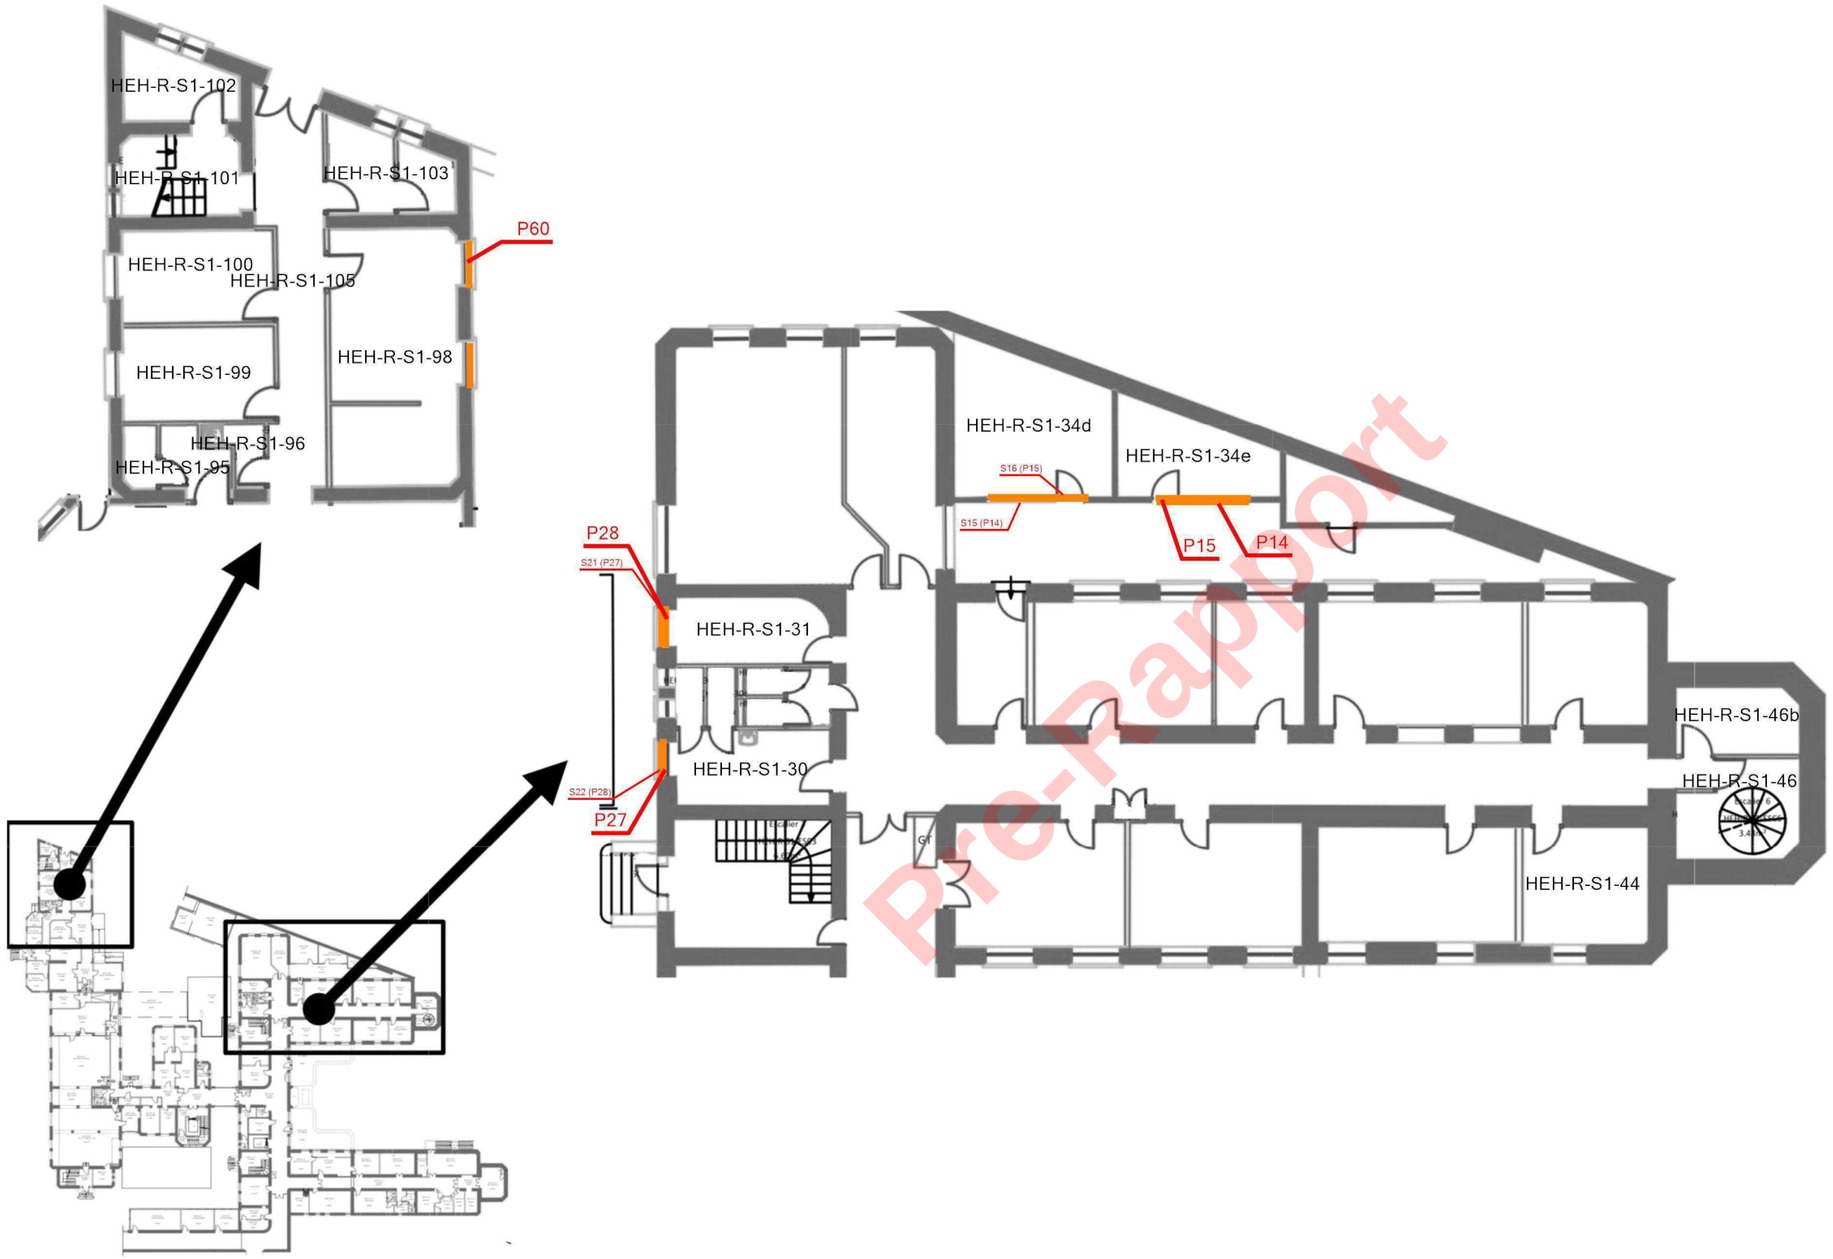

Légende


	P27 : Mastic vitrier
	P15 : Mastic vitrier
	P60 : Mastic vitrier
	P14 : Mastic vitrier
	P28 : Mastic vitrier

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Pavillon R	21/09/2026	SABRE Mathieu

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX530495

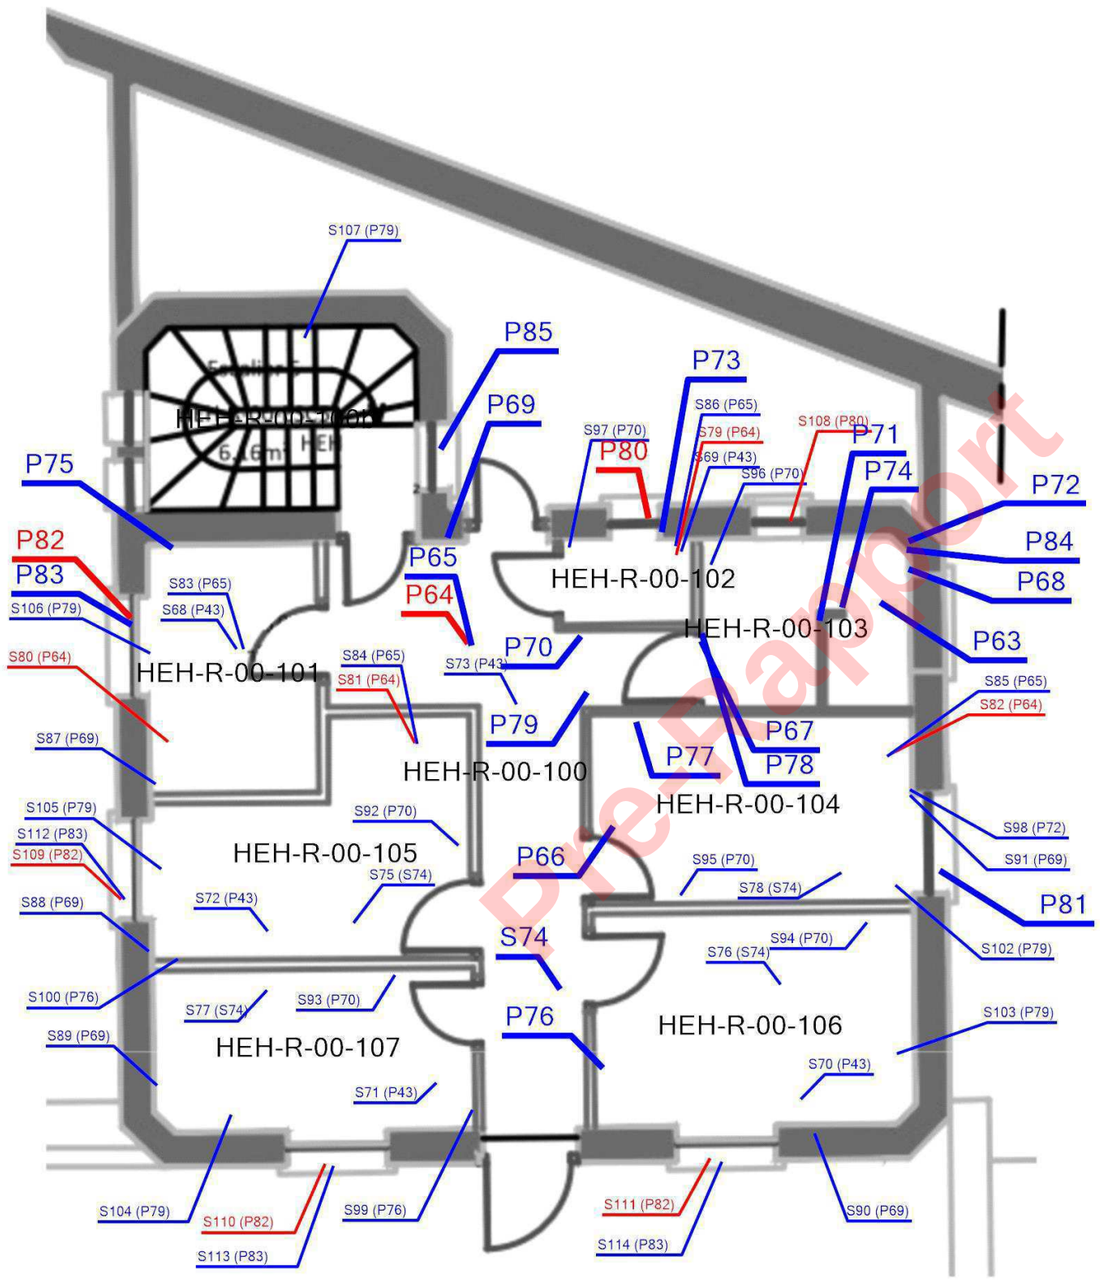

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Pré-Rapport

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Pavillon R	21/09/2026	SABRE Mathieu

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX530495

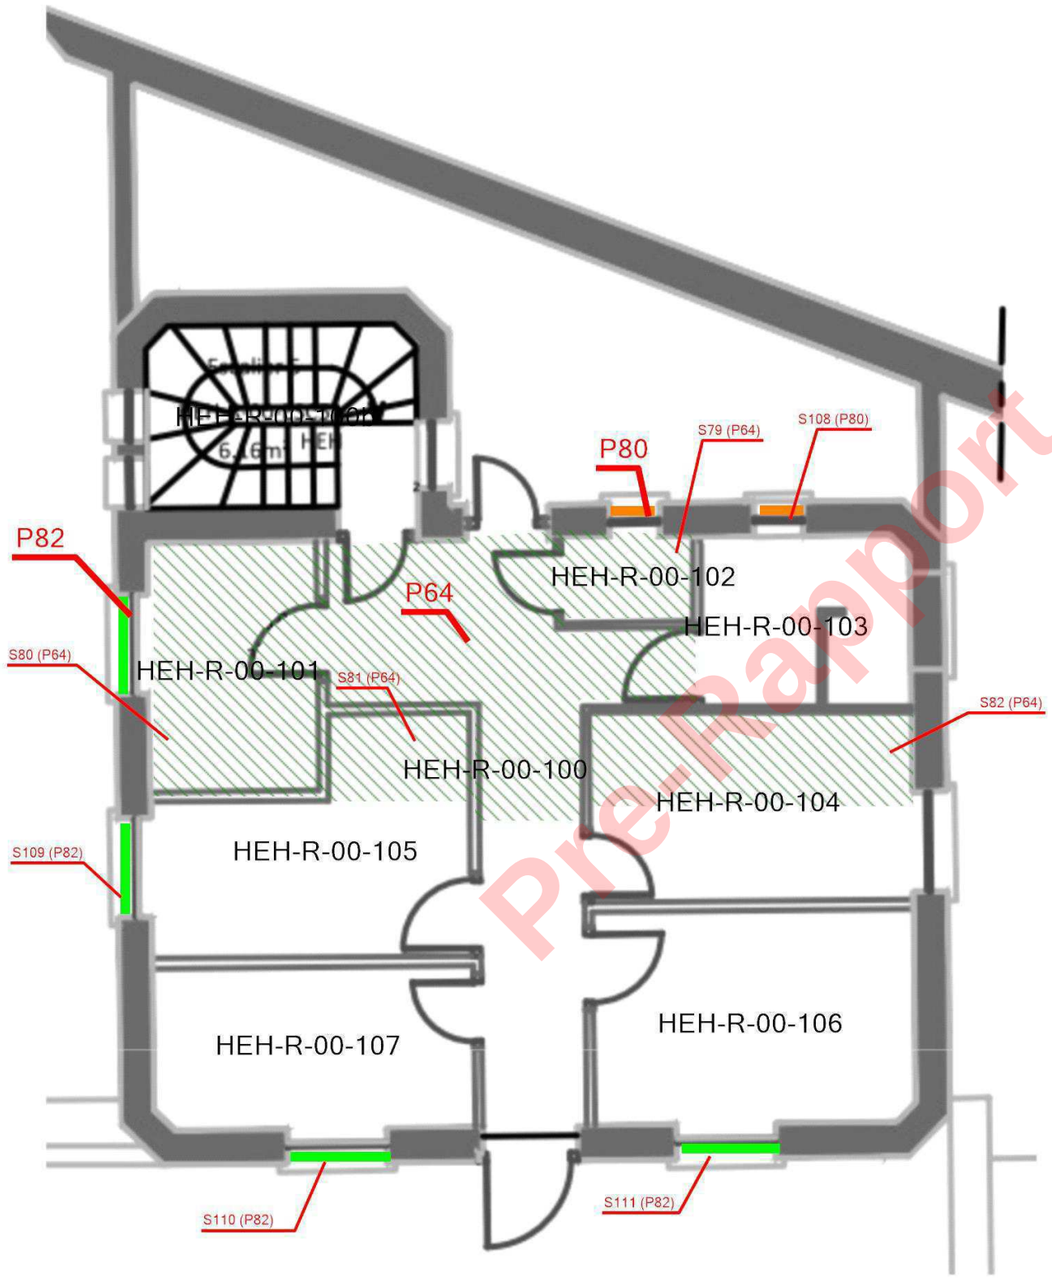

Pré-Rapport


Légende

	P64 : Ragréage
	P80 : Mastic vitrier
	P82 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Pavillon R	21/09/2026	SABRE Mathieu

RDC - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX530495

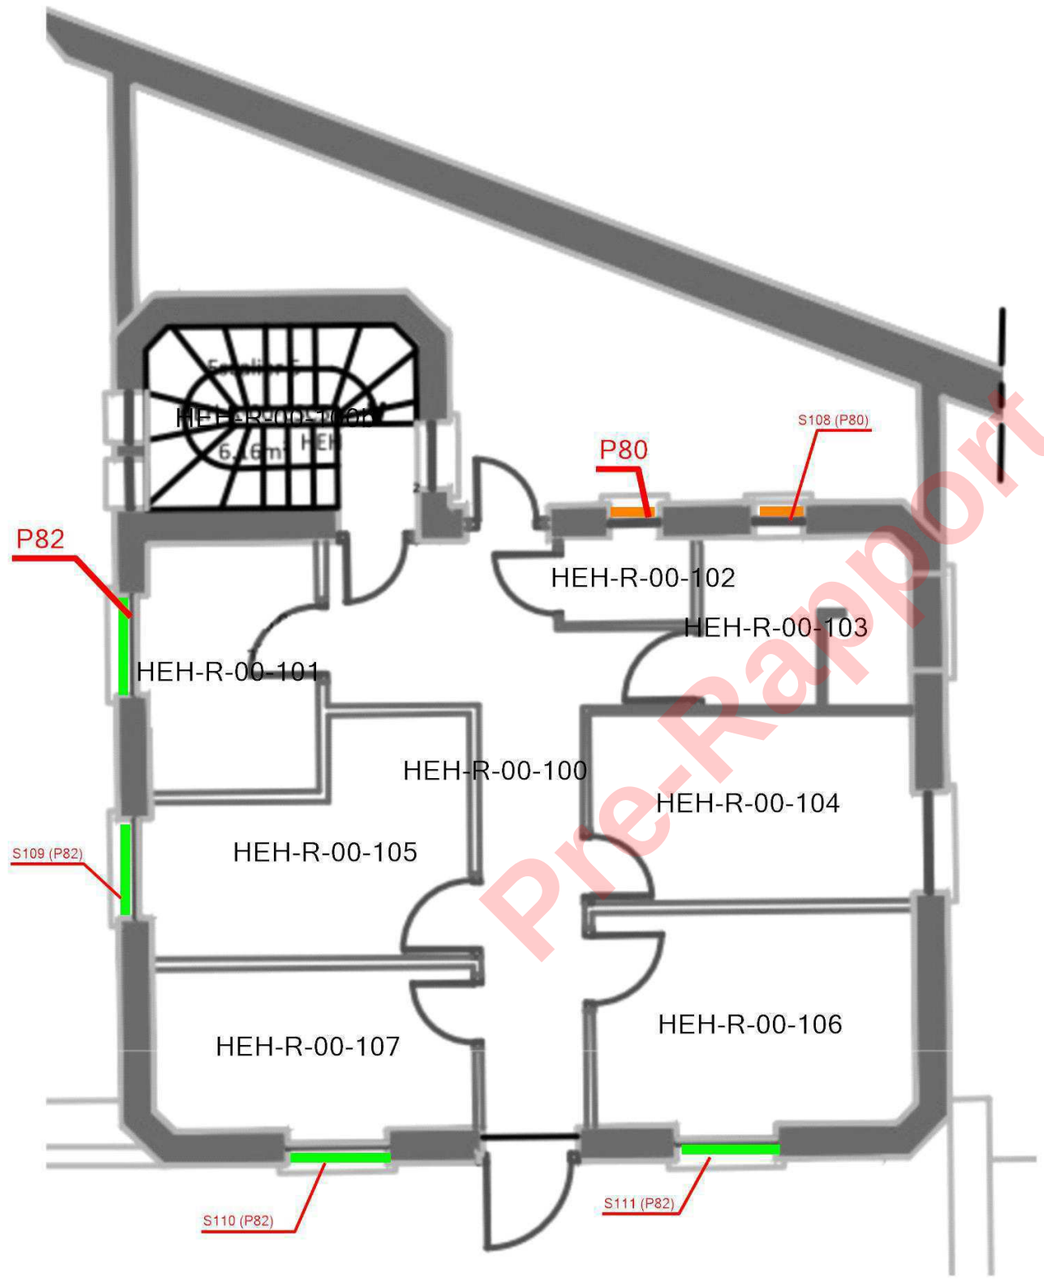


Pre-Rapport

Légende	
	P80 : Mastic vitrier
	P82 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Pavillon R	21/09/2026	SABRE Mathieu

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EX530495

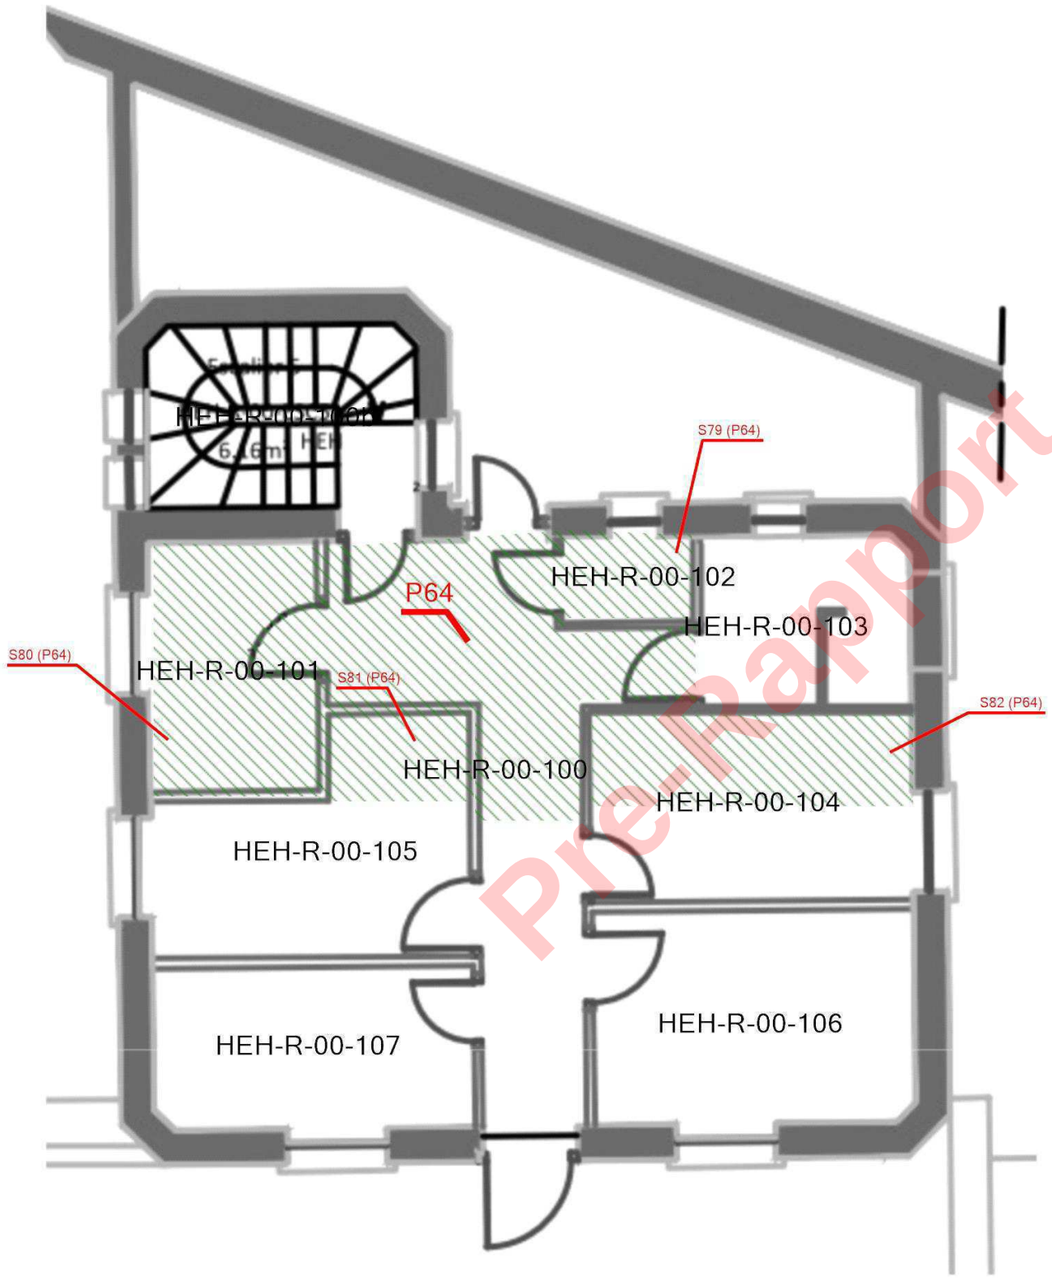

Pre-Rapport

Légende	
	P64 : Ragréage

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Pavillon R	21/09/2026	SABRE Mathieu

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX530495 n°63 - 1 (P63)	RDC - HEH-R-00-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°64 - 1 (P64)	RDC - HEH-R-00-100	Prélevement positif
002EX530495 n°65 - 1 (P65)	RDC - HEH-R-00-100	Prélevement négatif
002EX530495 n°66 - 1 (P66)	RDC - HEH-R-00-104	Prélevement négatif
002EX530495 n°67 - 1 (P67)	RDC - HEH-R-00-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°68 - 1 (P68)	RDC - HEH-R-00-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°69 - 1 (P69)	RDC - HEH-R-00-100	Prélevement négatif
002EX530495 n°70 - 1 (P70)	RDC - HEH-R-00-100	Prélevement négatif
002EX530495 n°71 - 1 (P71)	RDC - HEH-R-00-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°72 - 1 (P72)	RDC - HEH-R-00-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°73 - 1 (P73)	RDC - HEH-R-00-102	Prélevement négatif
002EX530495 n°74 - 1 (P74)	RDC - HEH-R-00-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°75 - 1 (P75)	RDC - HEH-R-00-101	Prélevement négatif
002EX530495 n°76 - 1 (P76)	RDC - HEH-R-00-106	Prélevement négatif
002EX530495 n°77 - 1 (P77)	RDC - HEH-R-00-104	Prélevement négatif
002EX530495 n°78 - 1 (P78)	RDC - HEH-R-00-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°79 - 1 (P79)	RDC - HEH-R-00-100	Prélevement négatif
002EX530495 n°80 - 1 (P80)	RDC - HEH-R-00-102	Prélevement positif
002EX530495 n°81 - 1 (P81)	RDC - HEH-R-00-104	Prélevement négatif
002EX530495 n°82 - 1 (P82)	RDC - HEH-R-00-101	Prélevement positif
002EX530495 n°83 - 1 (P83)	RDC - HEH-R-00-101	Prélevement négatif
002EX530495 n°84 - 1 (P84)	RDC - HEH-R-00-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°85 - 1 (P85)	RDC - HEH-R-00-100b	Prélevement négatif
S74 - 1 (S74)	RDC - HEH-R-00-100	Absence : pas d'amiante par nature
002EX530495 n°1 - 1 (P1)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-44	Prélevement négatif
002EX530495 n°2 - 1 (P2)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-46b	Prélevement négatif
002EX530495 n°3 - 1 (P3)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-44	Prélevement négatif
002EX530495 n°3 - 2 (P3)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-44	Prélevement négatif
002EX530495 n°5 - 1 (P5)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-44	Prélevement négatif
002EX530495 n°6 - 1 (P6)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-46b	Prélevement négatif
002EX530495 n°7 - 1 (P7)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-44	Prélevement négatif
002EX530495 n°8 - 1 (P8)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d	Prélevement négatif
002EX530495 n°9 - 1 (P9)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e	Prélevement négatif
002EX530495 n°10 - 1 (P10)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e	Prélevement négatif
002EX530495 n°11 - 1 (P11)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e	Prélevement négatif
002EX530495 n°12 - 1 (P12)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e	Prélevement négatif
002EX530495 n°13 - 1 (P13)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d	Prélevement négatif
002EX530495 n°14 - 1 (P14)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e	Prélevement positif
002EX530495 n°15 - 1 (P15)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e	Prélevement positif
002EX530495 n°16 - 1 (P16)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d	Prélevement négatif
002EX530495 n°17 - 1 (P17)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d	Prélevement négatif
002EX530495 n°18 - 1 (P18)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e	Prélevement positif
002EX530495 n°19 - 1 (P19)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e	Prélevement négatif
002EX530495 n°20 - 1 (P20)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-30	Prélevement négatif
002EX530495 n°21 - 1 (P21)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-30	Prélevement négatif
002EX530495 n°22 - 1 (P22)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-31	Prélevement négatif
002EX530495 n°23 - 1 (P23)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-31	Prélevement négatif
002EX530495 n°24 - 1 (P24)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-31	Prélevement négatif
002EX530495 n°25 - 1 (P25)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-30	Prélevement négatif
002EX530495 n°26 - 1 (P26)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-31	Prélevement négatif
002EX530495 n°27 - 1 (P27)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-30	Prélevement positif

Pré-Rapport

002EX530495 n°28 - 1 (P28)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-31	Prélevement positif
002EX530495 n°40 - 1 (P40)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°41 - 1 (P41)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-102	Prélevement négatif
002EX530495 n°42 - 1 (P42)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-98	Prélevement négatif
002EX530495 n°43 - 1 (P43)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°44 - 1 (P44)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-102	Prélevement négatif
002EX530495 n°45 - 1 (P45)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-98	Prélevement négatif
002EX530495 n°46 - 1 (P46)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-95	Prélevement négatif
002EX530495 n°47 - 1 (P47)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-105	Prélevement négatif
002EX530495 n°48 - 1 (P48)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-96	Prélevement négatif
002EX530495 n°49 - 1 (P49)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°50 - 1 (P50)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°51 - 1 (P51)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-96	Prélevement négatif
002EX530495 n°52 - 1 (P52)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-95	Prélevement négatif
002EX530495 n°53 - 1 (P53)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°54 - 1 (P54)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°55 - 1 (P55)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°56 - 1 (P56)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-102	Prélevement négatif
002EX530495 n°57 - 1 (P57)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-99	Prélevement négatif
002EX530495 n°58 - 1 (P58)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-98	Prélevement négatif
002EX530495 n°60 - 1 (P60)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-98	Prélevement positif
002EX530495 n°61 - 1 (P61)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°62 - 1 (P62)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-99	Prélevement négatif
	Sous sol 1 - HEH-R-S1-30	I1
S9 - 1 (S9)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-44	Absence sur présentation de documents
S10 - 1 (S10)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-46b	Absence : pas d'amiante par nature
S23 - 1 (S23)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-30	Absence : pas d'amiante par nature
S59 - 1 (S59)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-98	Absence sur marquage du materiau
S66 - 1 (S66)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-98	Absence : pas d'amiante par nature
002EX530495 n°59 - 2 (P59)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103	Prélevement négatif
002EX530495 n°29 - 1 (P29)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-02	Prélevement négatif
002EX530495 n°30 - 1 (P30)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-ESC6	Prélevement négatif
002EX530495 n°31 - 1 (P31)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-03	Prélevement négatif
002EX530495 n°32 - 1 (P32)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-ESC6	Prélevement négatif
002EX530495 n°33 - 1 (P33)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d	Prélevement négatif
002EX530495 n°34 - 1 (P34)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d	Prélevement négatif
002EX530495 n°35 - 1 (P35)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d	Prélevement négatif
002EX530495 n°36 - 1 (P36)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d	Prélevement négatif
002EX530495 n°37 - 1 (P37)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d	Prélevement positif
002EX530495 n°38 - 1 (P38)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d	Prélevement négatif
002EX530495 n°39 - 1 (P39)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d	Prélevement négatif
S30 - 1 (S30)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-03	Absence : pas d'amiante par nature
S31 - 1 (S31)	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d	Absence : pas d'amiante par nature

Pré-rapport



002EX530495 n°1 - 1 (P1) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-44



002EX530495 n°2 - 1 (P2) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-46b




002EX530495 n°3 - 1 (P3) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-44



002EX530495 n°3 - 2 (P3) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-44




002EX530495 n°5 - 1 (P5) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-44

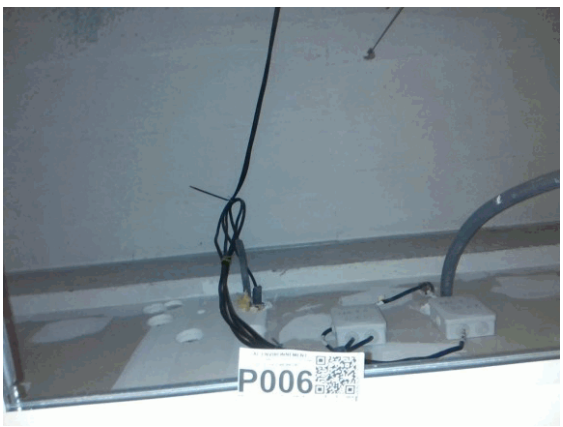

002EX530495 n°6 - 1 (P6) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-46b

Pre-Rapport

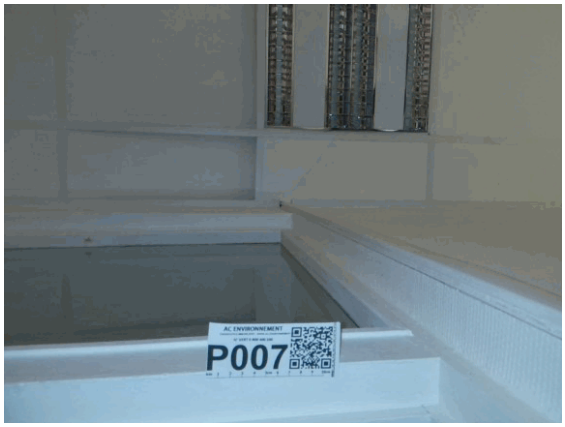

002EX530495 n°7 - 1 (P7) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-44



002EX530495 n°8 - 1 (P8) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d



002EX530495 n°9 - 1 (P9) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e



002EX530495 n°10 - 1 (P10) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e



002EX530495 n°11 - 1 (P11) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e



002EX530495 n°12 - 1 (P12) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e

Pre-Rapport



002EX530495 n°13 - 1 (P13) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d



002EX530495 n°14 - 1 (P14) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e



002EX530495 n°15 - 1 (P15) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e



002EX530495 n°16 - 1 (P16) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d



002EX530495 n°17 - 1 (P17) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d



002EX530495 n°18 - 1 (P18) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e

Pre-Rapport



002EX530495 n°19 - 1 (P19) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e




002EX530495 n°20 - 1 (P20) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-30




002EX530495 n°21 - 1 (P21) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-30



002EX530495 n°22 - 1 (P22) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-31

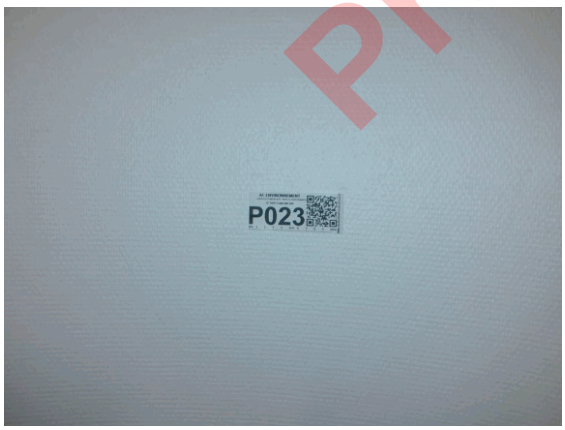

002EX530495 n°23 - 1 (P23) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-31

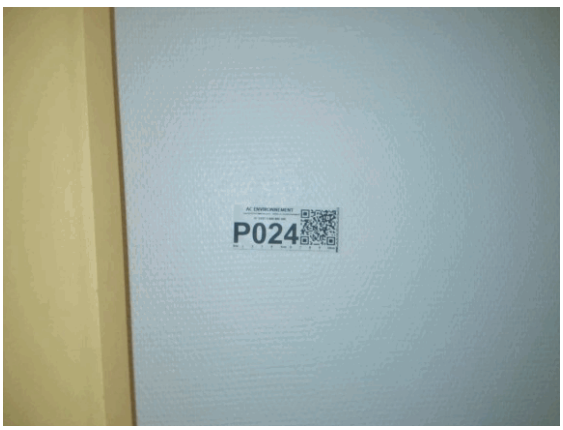

002EX530495 n°24 - 1 (P24) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-31

Pre-Rapport



002EX530495 n°25 - 1 (P25) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-30



002EX530495 n°26 - 1 (P26) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-31



002EX530495 n°27 - 1 (P27) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-30



002EX530495 n°28 - 1 (P28) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-31



002EX530495 n°29 - 1 (P29) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-02



002EX530495 n°30 - 1 (P30) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-ESC6

Pré-Rapport



002EX530495 n°31 - 1 (P31) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-03



002EX530495 n°32 - 1 (P32) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-ESC6



002EX530495 n°33 - 1 (P33) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d



002EX530495 n°34 - 1 (P34) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d



002EX530495 n°35 - 1 (P35) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d



002EX530495 n°36 - 1 (P36) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d

Pre-Rapport



002EX530495 n°37 - 1 (P37) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d



002EX530495 n°38 - 1 (P38) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d



002EX530495 n°39 - 1 (P39) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d



002EX530495 n°40 - 1 (P40) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-103



002EX530495 n°41 - 1 (P41) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-102



002EX530495 n°42 - 1 (P42) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-98

Pre-Rapport



002EX530495 n°43 - 1 (P43) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-103



002EX530495 n°44 - 1 (P44) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-102




002EX530495 n°45 - 1 (P45) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-98



002EX530495 n°46 - 1 (P46) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-95



002EX530495 n°47 - 1 (P47) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-105

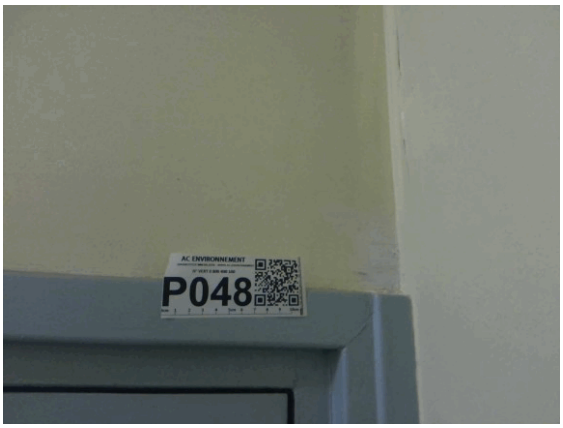

002EX530495 n°48 - 1 (P48) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-96


Pre-Rapport



002EX530495 n°49 - 1 (P49) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-103




002EX530495 n°50 - 1 (P50) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-103

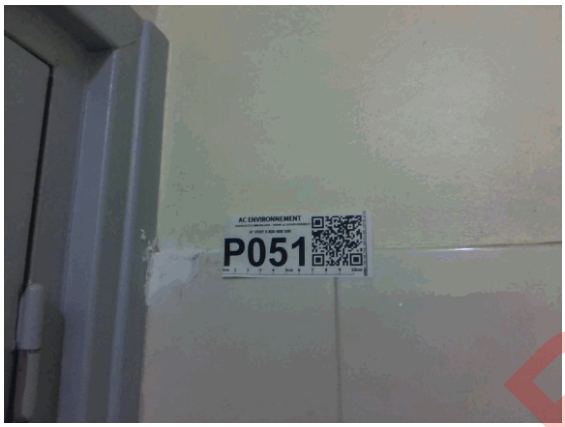

002EX530495 n°51 - 1 (P51) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-96



002EX530495 n°52 - 1 (P52) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-95

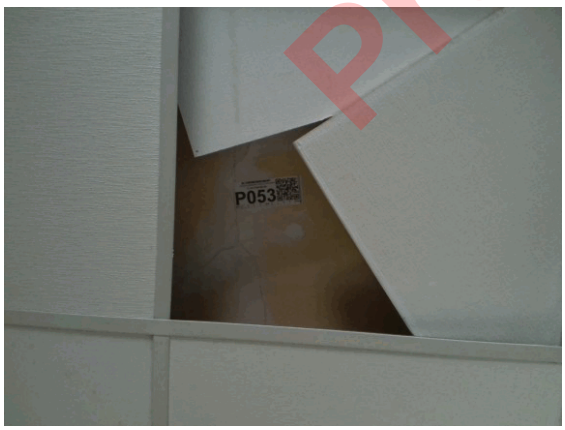

002EX530495 n°53 - 1 (P53) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-103



002EX530495 n°54 - 1 (P54) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-103

Pre-Rapport



002EX530495 n°55 - 1 (P55) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-103



002EX530495 n°56 - 1 (P56) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-102



002EX530495 n°57 - 1 (P57) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-99



002EX530495 n°58 - 1 (P58) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-98



002EX530495 n°60 - 1 (P60) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-98



002EX530495 n°61 - 1 (P61) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-103


Pre-Rapport



002EX530495 n°62 - 1 (P62) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-99



002EX530495 n°63 - 1 (P63) - RDC - HEH-R-00-103

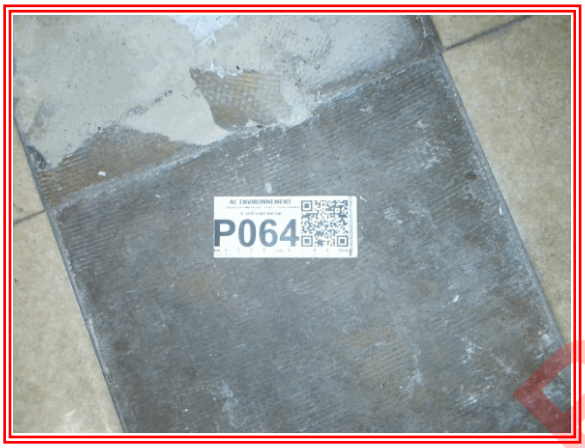

002EX530495 n°64 - 1 (P64) - RDC - HEH-R-00-100



002EX530495 n°65 - 1 (P65) - RDC - HEH-R-00-100



002EX530495 n°66 - 1 (P66) - RDC - HEH-R-00-104



002EX530495 n°67 - 1 (P67) - RDC - HEH-R-00-103

Pré-Rapport



002EX530495 n°68 - 1 (P68) - RDC - HEH-R-00-103




002EX530495 n°69 - 1 (P69) - RDC - HEH-R-00-100



002EX530495 n°70 - 1 (P70) - RDC - HEH-R-00-100



002EX530495 n°71 - 1 (P71) - RDC - HEH-R-00-103

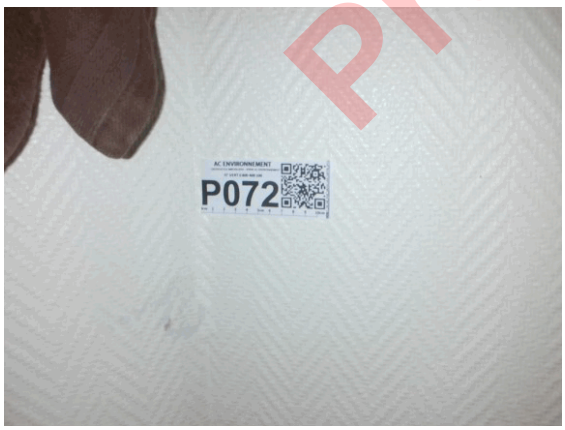

002EX530495 n°72 - 1 (P72) - RDC - HEH-R-00-103



002EX530495 n°73 - 1 (P73) - RDC - HEH-R-00-102

Pre-Rapport



002EX530495 n°74 - 1 (P74) - RDC - HEH-R-00-103



002EX530495 n°75 - 1 (P75) - RDC - HEH-R-00-101



002EX530495 n°76 - 1 (P76) - RDC - HEH-R-00-106



002EX530495 n°77 - 1 (P77) - RDC - HEH-R-00-104



002EX530495 n°78 - 1 (P78) - RDC - HEH-R-00-103



002EX530495 n°79 - 1 (P79) - RDC - HEH-R-00-100

Pre-Rapport



002EX530495 n°80 - 1 (P80) - RDC - HEH-R-00-102



002EX530495 n°81 - 1 (P81) - RDC - HEH-R-00-104



002EX530495 n°82 - 1 (P82) - RDC - HEH-R-00-101



002EX530495 n°83 - 1 (P83) - RDC - HEH-R-00-101



002EX530495 n°84 - 1 (P84) - RDC - HEH-R-00-103



002EX530495 n°85 - 1 (P85) - RDC - HEH-R-00-100b

Pré-Rapport



I1 - 1 - Sous sol 1 - HEH-R-S1-30



S9 - 1 (S9) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-44



S10 - 1 (S10) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-46b



S23 - 1 (S23) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-30



S30 - 1 (S30) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-03



S31 - 1 (S31) - Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d

Pre-Rapport



S59 - 1 (S59) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-98



S66 - 1 (S66) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-98



S74 - 1 (S74) - RDC - HEH-R-00-100



002EX530495 n°59 - 2 (P59) - Sous sol 1 - HEH-R-S1-103

Pre-Rapport

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Gris - Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	Sous sol 1 - HEH-R-S1-44	
P1 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	Sous sol 1 - HEH-R-S1-44	
P2 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Jaune - Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	Sous sol 1 - HEH-R-S1-46b	
P2 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	Sous sol 1 - HEH-R-S1-46b	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-44	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Colle de panneaux de plâtre	Sous sol 1 - HEH-R-S1-46b	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Beige - Enduit de rebouchage	Sous sol 1 - HEH-R-S1-44	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris - Enduit ciment	Sous sol 1 - HEH-R-S1-46b	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune - Panneaux faux plafonds	Sous sol 1 - HEH-R-S1-44	
P8 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Colle - Dur / Dur - Beige / Gris - Carrelage + colle beige	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d	
P8 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris - Carrelage + colle beige	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d	

Pre-Rapport

P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - Enduit ciment sur porteur	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit / Ciment - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Gris - Faïence + colle beige	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - Enduit ciment	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Vert / Blanc - Peinture bleue	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Noir / Blanc / Gris - Peinture verte	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d
P14	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige - Mastic vitrier effritable	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e
P15	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige - Mastic vitrier effritable	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e
P16	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Peinture - Effritable - Gris Orange - Peinture anti-condensation	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d
P17	Façades	Murs	Enduit / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris - Enduit ciment	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34d
P18	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Plaques ondulées	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e
P19	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir - Bande type "Paxalu"	Sous sol 1 - HEH-R-S1-34e
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Carrelage inférieur + colle grise	Sous sol 1 - HEH-R-S1-30
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Peinture / Ragréage - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Noir / Gris - Carrelage supérieur + colle grise	Sous sol 1 - HEH-R-S1-30
P22 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Plinthe + colle grise	Sous sol 1 - HEH-R-S1-31

Pre-Rapport

P22 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Plinthe + colle grise	Sous sol 1 - HEH-R-S1-31
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre sur porteur	Sous sol 1 - HEH-R-S1-31
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - Peinture + enduit plâtre sur cloisons	Sous sol 1 - HEH-R-S1-31
P25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Faïence + colle grise	Sous sol 1 - HEH-R-S1-30
P26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Peinture + enduit plâtre	Sous sol 1 - HEH-R-S1-31
P27	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige - Mastic vitrier effritable	Sous sol 1 - HEH-R-S1-30
P28	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris - Mastic vitrier effritable	Sous sol 1 - HEH-R-S1-31
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Dur - Gris - Chape ciment	Sous sol 2 - HEH-R-S2-02
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc Beige / Gris - Enduit ciment sur porteur	Sous sol 2 - HEH-R-S2-ESC6
P31	Equipements divers et accessoires	Cables électriques	Matériau / Matériau / Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Souple / Souple / Souple - Noir / Bleu / Rouge / Noir	Sous sol 2 - HEH-R-S2-03
P32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc Beige / Gris - Enduit ciment	Sous sol 2 - HEH-R-S2-ESC6
P33	Equipements divers et accessoires	Cables électriques	Matériau - Fibreux Souple - Noir	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d
P34	Equipements divers et accessoires	Cables électriques	Matériau - Dur - Jaune	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d
P35	Equipements divers et accessoires	Cables électriques	Peinture / Matériau - Effritable / Fibreux Bitumineux - Gris / Noir	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris - Enduit ciment sur porteur	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d

Pre-Rapport

P37	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Toile / Enduit - Bitumineux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Noir / Beige / Blanc - Enveloppe de calorifuge sur liège	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d
P38	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Souple - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Marron - Enveloppe de calorifuge sur liège	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d
P39 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine - Souple Fibreux - Orange - Enveloppe de calorifuge sur laine rose	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d
P39 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile - Souple Fibreux - Beige - Enveloppe de calorifuge sur laine rose	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d
P39 Phase 3	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - Enveloppe de calorifuge sur laine rose	Sous sol 2 - HEH-R-S2-01d
P40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige - Carrelage blanc inferieur + colle beige	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103
P41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Peinture / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Rouge Blanc / Blanc - Carrelage + colle marron	Sous sol 1 - HEH-R-S1-102
P42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage + colle grise	Sous sol 1 - HEH-R-S1-98
P43 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103
P43 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Dalles plastiques + colle jaune + ragréage	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103
P44	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Plinthe + colle grise	Sous sol 1 - HEH-R-S1-102

Pre-Rapport

P45	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit / Peinture - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Blanc / Gris - Plinthe + colle grise	Sous sol 1 - HEH-R-S1-98
P46	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Plinthe + colle grise	Sous sol 1 - HEH-R-S1-95
P47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Fibres / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre sur porteur	Sous sol 1 - HEH-R-S1-105
P48	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Matériau / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Blanc - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	Sous sol 1 - HEH-R-S1-96
P49	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Faïence + colle beige	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103
P50	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Faïence + colle beige	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103
P51	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit / Plâtre - Dur / Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige Blanc / Beige / Blanc - Faïence + colle beige	Sous sol 1 - HEH-R-S1-96
P52	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Multicolore - Faïence + colle beige	Sous sol 1 - HEH-R-S1-95
P53	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103
P54	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Mastic - Effritable - Beige - Mastic sur pipe d'évacuation	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103
P55	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Gris - Mastic vitrier effritable	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103
P56	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris - Mastic vitrier effritable	Sous sol 1 - HEH-R-S1-102

Pre-Rapport

P57	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige - Mastic vitrier effritable	Sous sol 1 - HEH-R-S1-99
P58	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Panneaux faux plafonds	Sous sol 1 - HEH-R-S1-98
P59	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit - Effritable - Blanc - Panneaux faux plafonds BA13	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103
P60	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris - Mastic vitrier effritable	Sous sol 1 - HEH-R-S1-98
P61	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Peinture - Effritable - Multicolore - Peinture anti-condensation	Sous sol 1 - HEH-R-S1-103
P62	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Multicolore - Faïence + colle beige	Sous sol 1 - HEH-R-S1-99
P63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Papier / Colle / Ciment - Souple Fibreux / Dur / Dur - Beige / Gris / Gris - Carrelage + colle grise	RDC - HEH-R-00-103
P64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Bitumineux / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Noir / Gris / Blanc - colle + ragréage	RDC - HEH-R-00-100
P65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Marron / Beige - Ragréage marron	RDC - HEH-R-00-100
P66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Semi-dur - Beige - Dalles plastiques	RDC - HEH-R-00-104
P67	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Plinthe + colle grise	RDC - HEH-R-00-103
P68	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit / Carton - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Vert - Plinthe + colle beige	RDC - HEH-R-00-103

Pre-Rapport

P69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Papier / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre sur porteur	RDC - HEH-R-00-100
P70 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Plaque type BA13 + bande à joint	RDC - HEH-R-00-100
P70 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Plaque type BA13 + bande à joint	RDC - HEH-R-00-100
P71 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Beige / Blanc - Plaque type BA13 + bande à joint	RDC - HEH-R-00-103
P71 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Plaque type BA13 + bande à joint	RDC - HEH-R-00-103
P72 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Fibres / Enduit / Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Plaque type BA13 + bande à joint (ITI)	RDC - HEH-R-00-103
P72 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Plaque type BA13 + bande à joint (ITI)	RDC - HEH-R-00-103
P73	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Enduit / Colle - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Beige - Faïence + colle beige	RDC - HEH-R-00-102
P74	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Blanc Beige / Beige - Faïence + colle beige	RDC - HEH-R-00-103
P75	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - Faïence + colle beige	RDC - HEH-R-00-101

Pre-Rapport

P76	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc Beige - Faïence + colle beige	RDC - HEH-R-00-106
P77	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Enduit / Colle - Effritable / Dur - Blanc / Blanc Beige - Faïence + colle beige	RDC - HEH-R-00-104
P78	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Faïence + colle grise	RDC - HEH-R-00-103
P79	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre	RDC - HEH-R-00-100
P80	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige - Mastic vitrier effritable	RDC - HEH-R-00-102
P81	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Gris - Mastic vitrier effritable	RDC - HEH-R-00-104
P82	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Gris - Mastic vitrier effritable	RDC - HEH-R-00-101
P83	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Gris - Mastic vitrier résineux	RDC - HEH-R-00-101
P84	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc - Colle de panneaux de plâtre	RDC - HEH-R-00-103
P85	Façades	Menuiseries	Mastic / Matériau - Dur / Effritable - Beige / Gris Marron - Mastic vitrier effritable	RDC - HEH-R-00-100b

Pre-Report

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022026356754**
Adresse	Commande : 002EX530495 Affaire : HEH-PAV-R 5 PLACE D'ARSONVAL 69003 LYON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 07/10/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356754
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX530495_001

Référence labo	42PM02936553
Date du prélèvement	25/09/2026
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-44
Remarque concernant le prélèvement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	06/10/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Fibreux Gris	2	2	VCG	-	-	-	-	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_002

Référence labo	42PM02936554	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-46b		
Remarque concernant le prélèvement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Jaune	2	2	VCG	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EX530495_003

Référence labo	42PM02936555	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-44		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_004

Référence labo	42PM02936556	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de panneaux de plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-46b		
Remarque concernant le prélèvement	Colle de panneaux de plâtre		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_005

Référence labo	42PM02936557	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-44		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit de rebouchage		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
	2	Ciment Dur Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_006

Référence labo	42PM02936558	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-46b		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX530495_007

Référence labo	42PM02936559	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-44		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux faux plafonds		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	VCG	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche non-analysée : Matériau Effritable Blanc

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_008

Référence labo	42PM02936560	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-34d		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
	2	Colle Dur Gris	-	-	-						
2	3	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX530495_009

Référence labo	42PM02936561	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-34e		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_010

Référence labo	42PM02936562	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-34e		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	3	3	VMD	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_011

Référence labo	42PM02936563	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-34e		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_012

Référence labo	42PM02936564	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-34e		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture bleue		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_013

Référence labo	42PM02936565	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-34d		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture verte		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Noir	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_014

Référence labo	42PM02936566	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-34e		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Multicolore

Référence échantillon : 002EX530495_015

Référence labo	42PM02936567	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-34e		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	3	3	ETG	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Référence échantillon : 002EX530495_016

Référence labo	42PM02936568	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Radiateurs - Peinture anti-condensation		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-34d		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture anti-condensation		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris Orange	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_017

Référence labo	42PM02936569	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-34d		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_018

Référence labo	42PM02936570	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Plaques ondulées - Plaques en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-34e		
Remarque concernant le prélèvement	Plaques ondulées		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	VCG	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530495_019

Référence labo	42PM02936571	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-34e		
Remarque concernant le prélèvement	Bande type "Paxalu" Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	2	2	VCG	Chloroforme	1	1	LDF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_020

Référence labo	42PM02936572	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-30		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage inférieur + colle grise Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EX530495_021

Référence labo	42PM02936573	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-30		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage supérieur + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté ●
	2	Peinture Effritable Noir	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EX530495_022

Référence labo	42PM02936574	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-31		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
2	3	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté ●
	5	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche 5 non dissociable(***) analysée avec la couche 3.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Beige

Pré-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_023

Référence labo	42PM02936575	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-31		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530495_024

Référence labo	42PM02936576	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-31		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_025

Référence labo	42PM02936577	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-30		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pré-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356754
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530495_026

Référence labo	42PM02936578	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-31		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_027

Référence labo	42PM02936579	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-30		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	3	3	DRV	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Référence échantillon : 002EX530495_028

Référence labo	42PM02936580	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-31		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Gris	-	-	-	Acétone	3	3	ETG	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_029

Référence labo	42PM02936581	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S2-02		
Remarque concernant le prélèvement	Chape ciment		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530495_030

Référence labo	42PM02936582	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S2-ESC6		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_031

Référence labo	42PM02936583	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Cables électriques - Isolant		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S2-03		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	2	BOD	Non détecté ●
	2	Matériau Souple Bleu	-	-	-					
	3	Matériau Souple Rouge	-	-	-					
	5	Matériau Souple Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Métal Dur Gris

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_032

Référence labo	42PM02936584	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S2-ESC6		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_033

Référence labo	42PM02936585	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Cables électriques - Isolant		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S2-01d		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Fibreux Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530495_034

Référence labo	42PM02936586	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Cables électriques - Isolant		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S2-01d		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_035

Référence labo	42PM02936587	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Cables électriques - Isolant		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S2-01d		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Non détecté ●
	2	Matériau Fibreux Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_036

Référence labo	42PM02936588	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S2-01d		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_037

Référence labo	42PM02936589	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S2-01d		
Remarque concernant le prélèvement	Enveloppe de calorifuge sur liège		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	CVR	Grunerite-amiante (Amosite) ●
	2	Toile Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Fibreux Blanc	1	1	DGC					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_038

Référence labo	42PM02936590	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S2-01d		
Remarque concernant le prélèvement	Enveloppe de calorifuge sur liège		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	DRV	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	5	Matériau Souple Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX530495_039

Référence labo	42PM02936591	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S2-01d		
Remarque concernant le prélèvement	Enveloppe de calorifuge sur laine rose		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Laine Souple Fibreux Orange	2	2	DGC	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Toile Souple Fibreux Beige	2	2	DGC	-	-	-	-	Non détecté	●
3	3	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	BOD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530495_040

Référence labo	42PM02936592	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-103		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage blanc inferieur + colle beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356754
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530495_041

Référence labo	42PM02936593	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-102		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage + colle marron Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Pulvérulent Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Rouge Blanc	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX530495_042

Référence labo	42PM02936594	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-98		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage + colle grise Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002EX530495_043

Référence labo	42PM02936595	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-103		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques + colle jaune + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356754
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530495_044

Référence labo	42PM02936596	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-102		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530495_045

Référence labo	42PM02936597	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-98		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Peinture Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX530495_046

Référence labo	42PM02936598	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-95		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Marron

Pré-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_047

Référence labo	42PM02936599	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-105		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX530495_048

Référence labo	42PM02936600	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-96		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Pulvérulent Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	CVR	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Matériau Souple Fibreux Blanc	2	2	DGC					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Papier Souple Fibreux Beige
Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_049

Référence labo	42PM02936601	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-103		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Gris

Référence échantillon : 002EX530495_050

Référence labo	42PM02936602	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-103		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Beige

Référence échantillon : 002EX530495_051

Référence labo	42PM02936603	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-96		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté ●
	2	Peinture Effritable Beige Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_052

Référence labo	42PM02936604	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-95		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
	2	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX530495_053

Référence labo	42PM02936605	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-103		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Beige

Référence échantillon : 002EX530495_054

Référence labo	42PM02936606	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Mastics		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-103		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic sur pipe d'évacuation Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_055

Référence labo	42PM02936607	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-103		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	ETG	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Référence échantillon : 002EX530495_056

Référence labo	42PM02936608	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-102		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Référence échantillon : 002EX530495_057

Référence labo	42PM02936609	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-99		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	2	ELF	Non détecté ●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_058

Référence labo	42PM02936610	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-98		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux faux plafonds		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Fibreux Effritable Blanc	2	2	DGC	Acétone	1	1	CVR	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	DGC					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX530495_059

Référence labo	42PM02936611	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-103		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux faux plafonds BA13		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530495_060

Référence labo	42PM02936612	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-98		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	NGD	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_061

Référence labo	42PM02936613	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Radiateurs - Peinture anti-condensation		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-103		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture anti-condensation		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530495_062

Référence labo	42PM02936614	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-S1-99		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
	2	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX530495_063

Référence labo	42PM02936615	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-103		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
	2	Colle Dur Gris	-	-	-					
	3	Ciment Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Pré-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_064

Référence labo	42PM02936616	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-100		
Remarque concernant le prélèvement	colle + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	NGD	Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	4	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	5	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX530495_065

Référence labo	42PM02936617	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-100		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage marron		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Marron	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	2	BOD	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530495_066

Référence labo	42PM02936618	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-104		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Semi-dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356754
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530495_067

Référence labo	42PM02936619	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-103		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530495_068

Référence labo	42PM02936620	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-103		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Vert	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse :
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Noir

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356754
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530495_069

Référence labo	42PM02936621	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-100		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté ●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX530495_070

Référence labo	42PM02936622	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-100		
Remarque concernant le prélèvement	Plaque type BA13 + bande à joint Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Pulvérulent Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté ●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
2	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356754
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530495_071

Référence labo	42PM02936623	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-103		
Remarque concernant le prélèvement	Plaque type BA13 + bande à joint Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Pulvérulent Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Vert Marron

Référence échantillon : 002EX530495_072

Référence labo	42PM02936624	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-103		
Remarque concernant le prélèvement	Plaque type BA13 + bande à joint (ITI) Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Pulvérulent Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse

La couche Peinture / Effritable / Beige n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
La couche Fibres / Souple Fibreux / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Beige, Carton Souple Fibreux Vert Marron

Pré-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356754
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530495_073

Référence labo	42PM02936625	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026		
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	06/10/2026
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-102		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Colle Dur Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX530495_074

Référence labo	42PM02936626	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026		
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	06/10/2026
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-103		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Papier / Souple Fibreux / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc Beige

Référence échantillon : 002EX530495_075

Référence labo	42PM02936627	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026		
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Analyse réglementaire	Oui
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Date d'analyse	06/10/2026
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-101		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc Beige, Ciment Effritable Gris

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356754
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530495_076

Référence labo	42PM02936628	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-106		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Beige n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche non-analysée : Peinture Effritable Beige

Référence échantillon : 002EX530495_077

Référence labo	42PM02936629	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-104		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
	2	Colle Dur Blanc Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc Beige

Référence échantillon : 002EX530495_078

Référence labo	42PM02936630	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-103		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pré-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_079

Référence labo	42PM02936631	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-100		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Beige

Référence échantillon : 002EX530495_080

Référence labo	42PM02936632	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-102		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Référence échantillon : 002EX530495_081

Référence labo	42PM02936633	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-104		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	ETG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc Gris, Bois Effritable Fibreux Marron

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530495_082

Référence labo	42PM02936634	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-101		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Beige Blanc, Bois Effritable Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EX530495_083

Référence labo	42PM02936635	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-101		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier résineux		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	ETG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530495_084

Référence labo	42PM02936636	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de panneaux de plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-103		
Remarque concernant le prélèvement	Colle de panneaux de plâtre		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	1	AJV	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356754
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530495_085

Référence labo	42PM02936637	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon R - HEH-R-00-100b		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	2	ETG	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Gris Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence dossier: RSC022026356754

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 11 MOLP et 89 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 95/95

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Pre-Rapport


Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

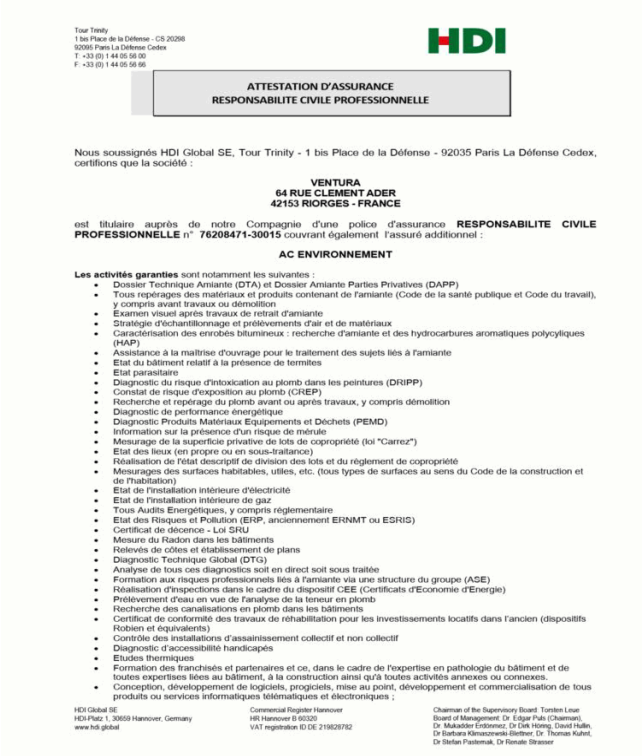

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 58 00
F : +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maitrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hornig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2

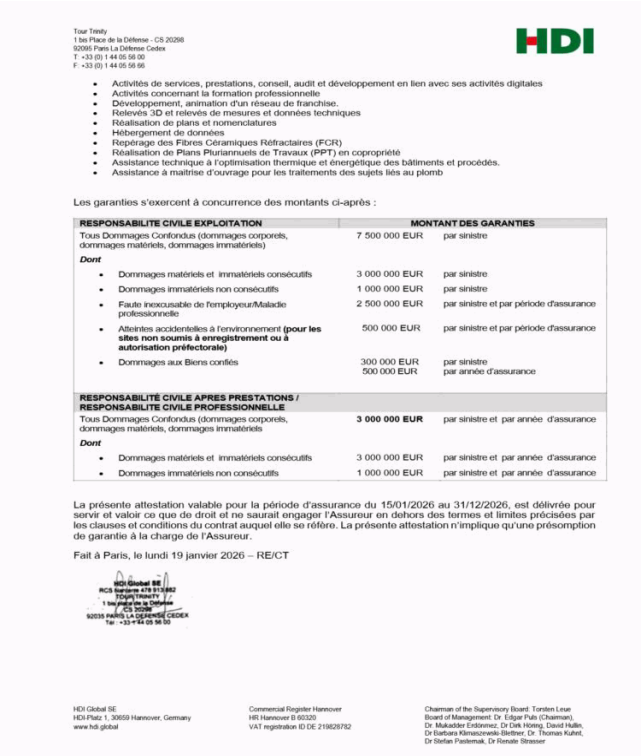

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 58 00
F : +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	**MONTANT DES GARANTIES**	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT


HDI Global SE
RCS Nanterre 479 513 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hornig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur

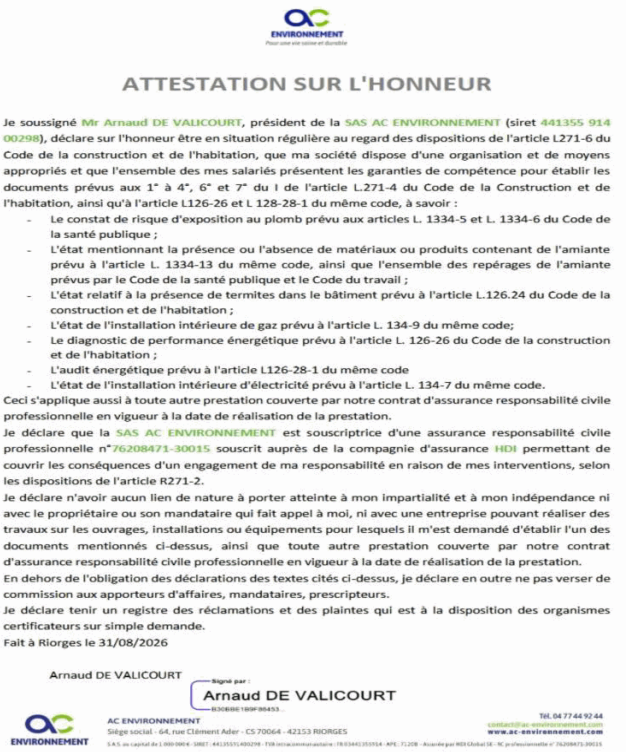

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mr Arnaud DE VALICOURT, président de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 31/08/2026

Arnaud DE VALICOURT

Signé par :
Arnaud DE VALICOURT
B30BE8E1B9F86453...

ENVIRONNEMENT
AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44
contact@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI4978



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4978 Version 010

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (1) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

COFRAC ACCREDITATION CERTIFICATION DE PERSONNES PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev23

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI4978



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4978 Version 010

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (1) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23
