ECO
BUREAU D'ÉTUDES EN BÂTIMENT


# MINISTERE DES ARMEES représenté par l'ESID DE BORDEAUX

## Réhabilitation du bâtiment 080 du 48 REGIMENT DE TRANSMISSION

## QUARTIER TOUSSAINT - Avenue Jean Jaurés 47 000 AGEN

**Planning Prévisionnel GENERAL**
**Phase DCE de Juillet 2026**

| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **OS DE DEMARRAGE ENTREPRISES** | **0 jour** | **Lun 04/01/27** | **Lun 04/01/27** |
| 2 | **PHASE D'EXECUTION (19 mois)** | **385 jours** | **Lun 04/01/27** | **Ven 28/07/28** |
| 3 | **PHASE DE PREPARATION - 3 Mois** | **65 jours** | **Lun 04/01/27** | **Ven 02/04/27** |
| 4 | **INSTALLATIONS DE CHANTIER** | **40 jours** | **Lun 04/01/27** | **Ven 26/02/27** |
| 5 | Recollement des besoins entreprises | 10 jours | Lun 04/01/27 | Ven 15/01/27 |
| 6 | Production du PIC | 10 jours | Lun 04/01/27 | Ven 15/01/27 |
| 7 | Remarques et validation du PIC | 10 jours | Lun 18/01/27 | Ven 29/01/27 |
| 8 | Mise à jour du PIC | 5 jours | Lun 01/02/27 | Ven 05/02/27 |
| 9 | Dernière MAJ du PIC | 5 jours | Lun 08/02/27 | Ven 12/02/27 |
| 10 | **Mise en œuvre des installations** | **10 jours** | **Lun 15/02/27** | **Ven 26/02/27** |
| 11 | Panneau de chantier | 10 jours | Lun 15/02/27 | Ven 26/02/27 |
| 12 | Clotures | 10 jours | Lun 15/02/27 | Ven 26/02/27 |
| 13 | Base de vie | 10 jours | Lun 15/02/27 | Ven 26/02/27 |
| 14 | Raccordement ELE/AEP/EU | 10 jours | Lun 15/02/27 | Ven 26/02/27 |
| 15 | **GESTION PRORATA** | **45 jours** | **Lun 04/01/27** | **Ven 05/03/27** |
| 16 | Rédaction du projet de convention | 15 jours | Lun 04/01/27 | Ven 22/01/27 |
| 17 | Remarques et validation entreprises | 15 jours | Lun 25/01/27 | Ven 12/02/27 |
| 18 | Mise à jour de convention | 10 jours | Lun 15/02/27 | Ven 26/02/27 |
| 19 | Signature de la convetion PRORATA | 0 jour | Ven 05/03/27 | Ven 05/03/27 |
| 20 | **PLANNINGS D'EXECUTION** | **45 jours** | **Lun 04/01/27** | **Ven 05/03/27** |
| 21 | Retours de fiche OPC et détails des délais entreprises | 15 jours | Lun 04/01/27 | Ven 22/01/27 |
| 22 | Production du planning d'exécution | 20 jours | Jeu 14/01/27 | Mer 10/02/27 |
| 23 | Remarques et validation entreprises | 15 jours | Lun 25/01/27 | Ven 12/02/27 |
| 24 | Mise à jour de planning | 10 jours | Lun 15/02/27 | Ven 26/02/27 |
| 25 | Signature du planning pour notification | 0 jour | Ven 05/03/27 | Ven 05/03/27 |
| 26 | **PROTOTYPES et ECHANTILLONS** | **65 jours** | **Lun 04/01/27** | **Ven 02/04/27** |
| 27 | Recollement des demandes MOA et Architecte | 20 jours | Lun 04/01/27 | Ven 29/01/27 |
| 28 | Fourniture des échantillons | 40 jours | Lun 04/01/27 | Ven 26/02/27 |
| 29 | Exécution d'un prototype | 10 jours | Lun 15/02/27 | Ven 26/02/27 |
| 30 | Choix Architecte | 10 jours | Lun 01/03/27 | Ven 12/03/27 |
| 31 | Validation des choix MOA | 0 jour | Ven 02/04/27 | Ven 02/04/27 |
| 32 | **ETUDES D'EXECUTION** | **65 jours** | **Lun 04/01/27** | **Ven 02/04/27** |
| 33 | Retour des listes prévisionnelles | 15 jours | Lun 04/01/27 | Ven 22/01/27 |
| 34 | Confirmation des hypothèses de démarrage | 15 jours | Lun 04/01/27 | Ven 22/01/27 |
| 35 | Production des études d'exécutions (indA) | 25 jours | Lun 04/01/27 | Ven 05/02/27 |
| 36 | Visas MOE et BCT | 10 jours | Lun 01/02/27 | Ven 12/02/27 |
| 37 | Mise à jour des études d'exécutions (indB) | 20 jours | Lun 08/02/27 | Ven 05/03/27 |
| 38 | Visas MOE et BCT | 10 jours | Lun 01/03/27 | Ven 12/03/27 |
| 39 | Mise à jour des études d'exécution (indC) | 15 jours | Lun 08/03/27 | Ven 26/03/27 |
| 40 | Synthèse des études d'exécution | 35 jours | Lun 08/02/27 | Ven 26/03/27 |
| 41 | Recollement de fin de période de préparation | 10 jours | Lun 22/03/27 | Ven 02/04/27 |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | **PREPARATION AUX TRAVAUX (1 mois)** | **25 jours** | **Lun 04/01/27** | **Ven 05/02/27** |
| 45 | Lot 01A-Désamiantage-Plan de retrait | 5 jours | Lun 04/01/27 | Ven 08/01/27 |
| 46 | Lot 01A-Désamiantage-Instruction au plan de retrait (1mois) | 20 jours | Lun 11/01/27 | Ven 05/02/27 |
| 47 | Lots techniques-Investigations aux coupures | 25 jours | Lun 04/01/27 | Ven 05/02/27 |

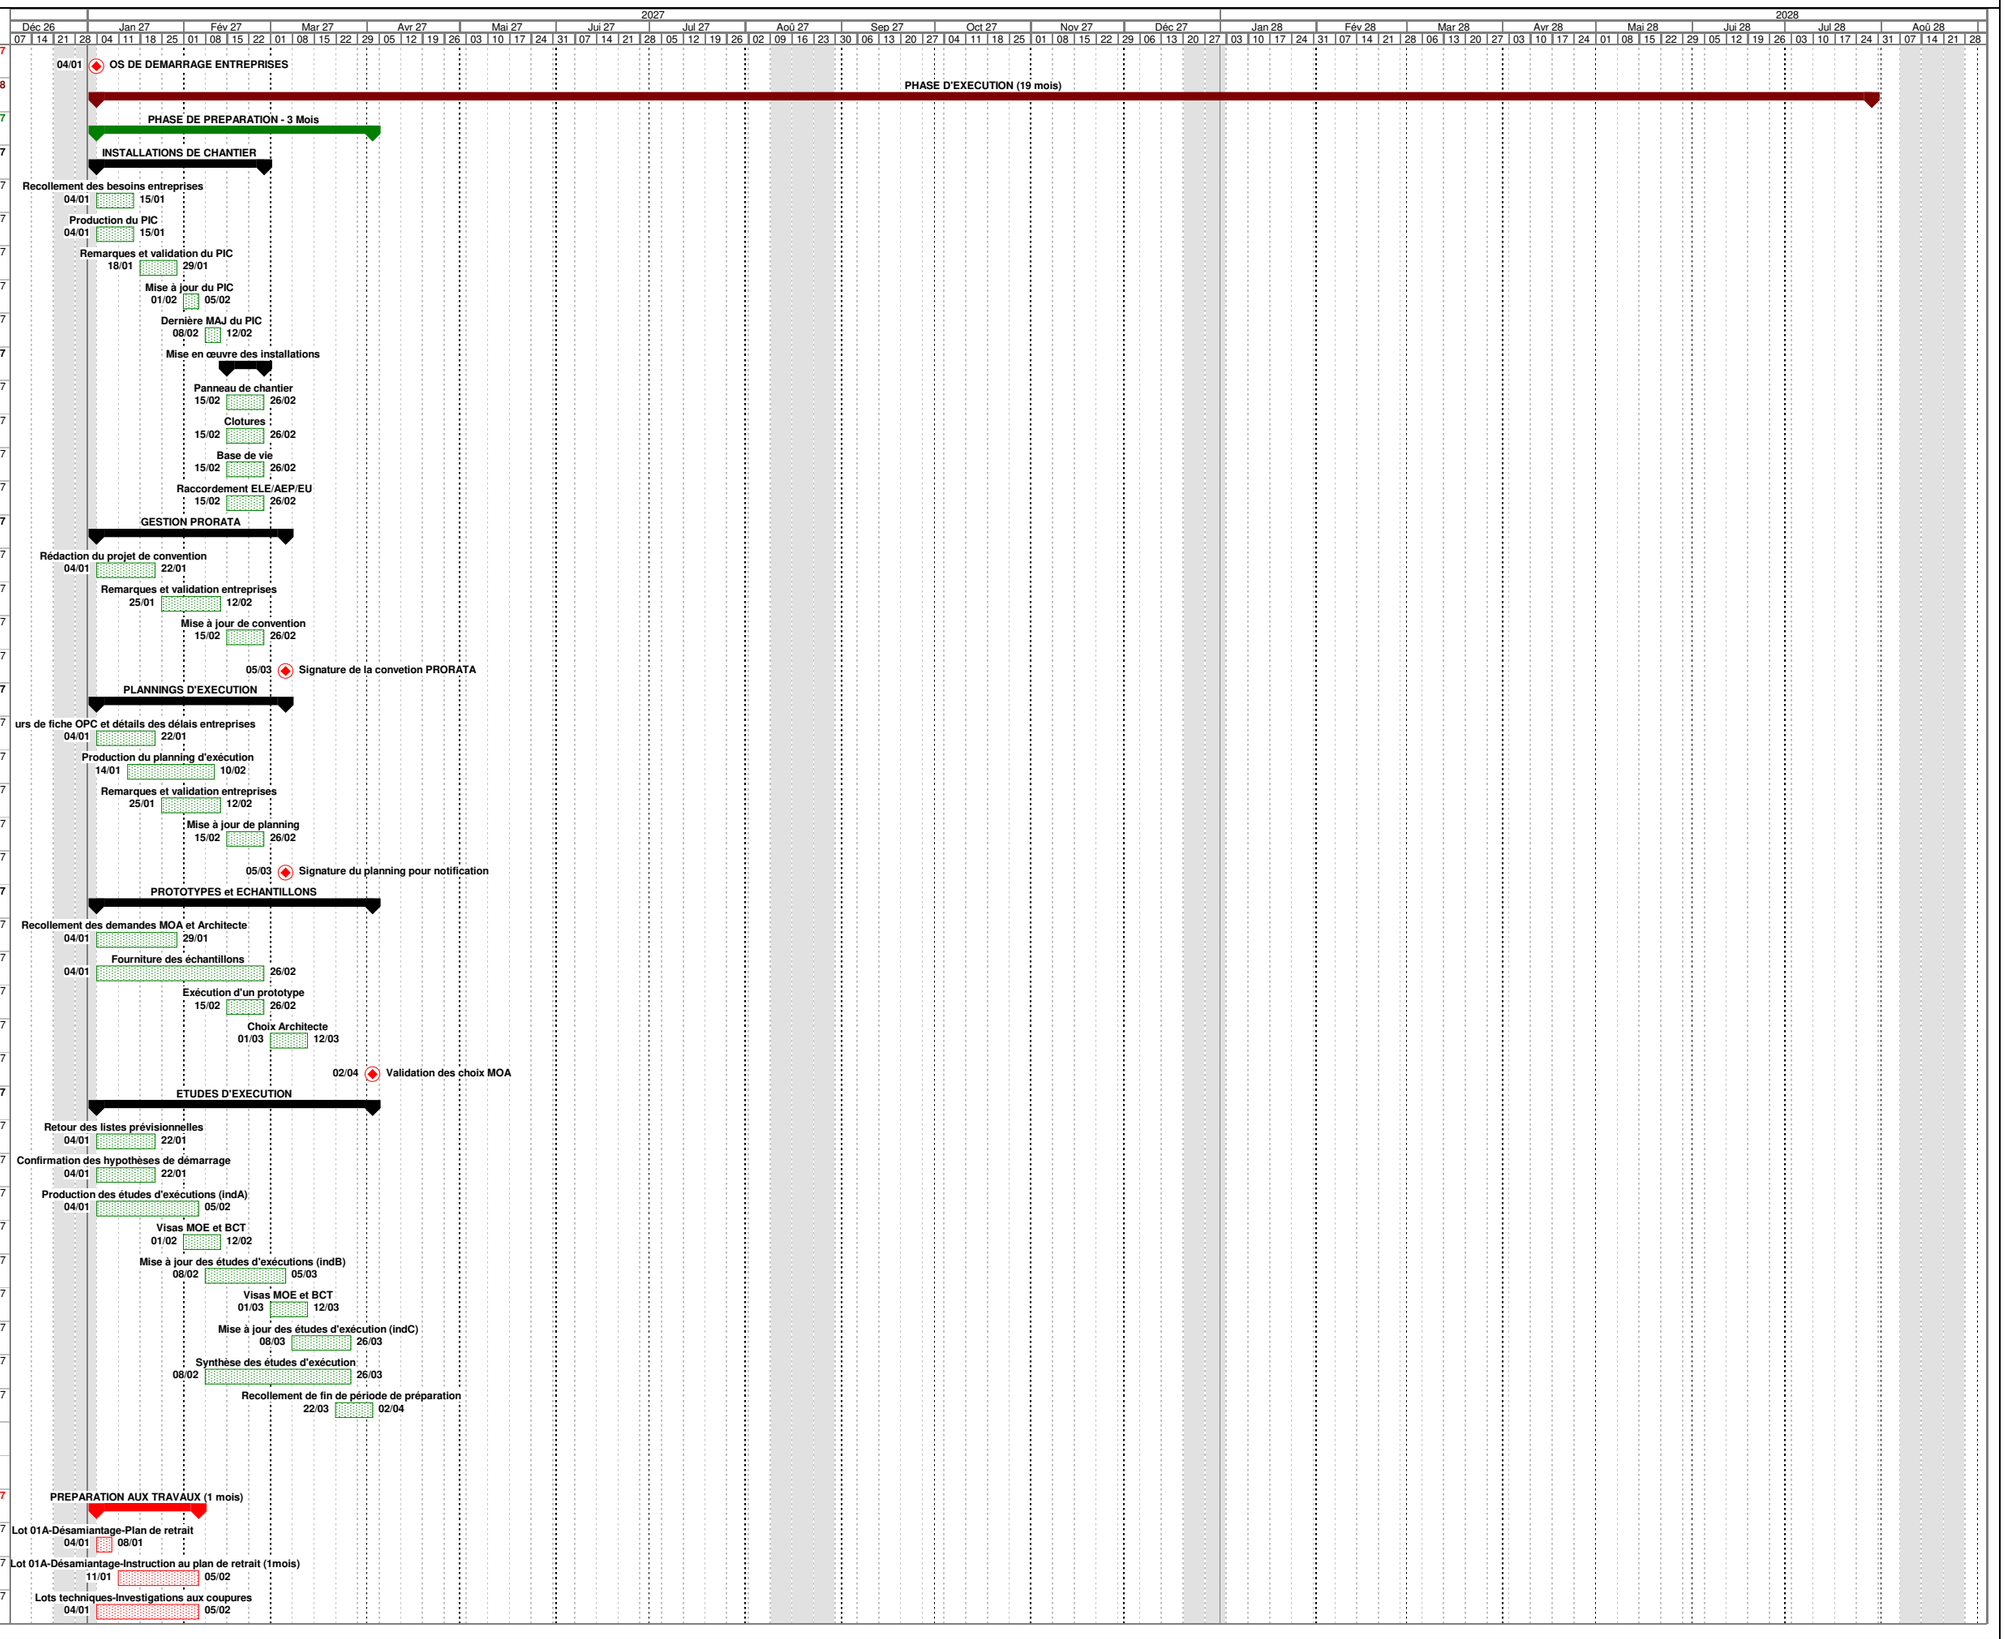

ECO
BUREAU D'ÉTUDES EN BÂTIMENT


# MINISTERE DES ARMEES représenté par l'ESID DE BORDEAUX

## Réhabilitation du bâtiment 080 du 48 REGIMENT DE TRANSMISSION

## QUARTIER TOUSSAINT - Avenue Jean Jaurés 47 000 AGEN

**Planning Prévisionnel GENERAL**
**Phase DCE de Juillet 2026**

| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Lot 04A-Plomberie, sanitaires et CVC-Consignation | 0 jour | Ven 05/02/27 | Ven 05/02/27 |
| 49 | Lot 04B-Electricité-Consignation | 0 jour | Ven 05/02/27 | Ven 05/02/27 |
| 50 | Lot 04D-Levages-Consignation | 0 jour | Ven 05/02/27 | Ven 05/02/27 |
| 51 | | | | |
| 52 | **FIN DE LA PREPARATION** | **0 jour** | **Ven 02/04/27** | **Ven 02/04/27** |
| 53 | | | | |
| 54 | **PHASE DE TRAVAUX - 16 Mois** | **320 jours** | **Lun 08/02/27** | **Ven 02/06/28** |
| 55 | **Lot 01A-Désamiantage et Déplombage** | **65 jours** | **Lun 08/02/27** | **Ven 07/05/27** |
| 56 | Désamiantage Intérieur selon diagnostic | 15 jours | Lun 08/02/27 | Ven 26/02/27 |
| 57 | Déplombage selon diagnostic | 15 jours | Lun 08/02/27 | Ven 26/02/27 |
| 58 | Désamiantage extérieur selon diagnostic | 50 jours | Lun 01/03/27 | Ven 07/05/27 |
| 59 | **Lot 01B-Démolitions et Curages** | **20 jours** | **Lun 01/03/27** | **Ven 26/03/27** |
| 60 | Curages et démolitions intérieures selon CCTP | 20 jours | Lun 01/03/27 | Ven 26/03/27 |
| 61 | Démolitions extérieures selon CCTP | 10 jours | Lun 15/03/27 | Ven 26/03/27 |
| 62 | Démolitions en toiture selon CCTP | 10 jours | Lun 15/03/27 | Ven 26/03/27 |
| 63 | **Lot 02A-Gros Œuvre** | **50 jours** | **Lun 29/03/27** | **Ven 04/06/27** |
| 64 | Démolitions selon CCTP | 10 jours | Lun 29/03/27 | Ven 09/04/27 |
| 65 | Travaux neufs intérieurs et en toiture selon CCTP | 30 jours | Lun 29/03/27 | Ven 07/05/27 |
| 66 | Travaux de renforcement et réparation selon CCTP | 10 jours | Lun 26/04/27 | Ven 07/05/27 |
| 67 | Travaux neufs extérieurs selon CCTP | 20 jours | Lun 10/05/27 | Ven 04/06/27 |
| 68 | **Lot 02B-Etanchéité** | **65 jours** | **Lun 29/03/27** | **Ven 25/06/27** |
| 69 | Dépose du complexe existant selon CCTP | 20 jours | Lun 29/03/27 | Ven 23/04/27 |
| 70 | Réfection d'étanchéité selon CCTP | 35 jours | Lun 10/05/27 | Ven 25/06/27 |
| 71 | **HORS D'EAU** | **0 jour** | **Ven 25/06/27** | **Ven 25/06/27** |
| 72 | **Lot 02C-Menuiseries Extérieures** | **60 jours** | **Lun 10/05/27** | **Ven 30/07/27** |
| 73 | Dépose des menuiseries existantes selon CCTP | 10 jours | Lun 10/05/27 | Ven 21/05/27 |
| 74 | Mise en œuvre des menuiseries selon CCTP | 25 jours | Lun 24/05/27 | Ven 25/06/27 |
| 75 | Essais de perméabilités intermédiaires | 5 jours | Lun 26/07/27 | Ven 30/07/27 |
| 76 | **HORS D'AIR** | **0 jour** | **Ven 25/06/27** | **Ven 25/06/27** |
| 77 | **Lot 02D-Serrurerie** | **210 jours** | **Lun 28/06/27** | **Ven 19/05/28** |
| 78 | Prestations selon CCTP | 210 jours | Lun 28/06/27 | Ven 19/05/28 |
| 79 | **Lot 02E-Ravalement de facades** | **95 jours** | **Lun 28/06/27** | **Ven 26/11/27** |
| 80 | Prestations selon CCTP (Rotation échaffaudage à définir) | 95 jours | Lun 28/06/27 | Ven 26/11/27 |
| 81 | **Lot 03A-Platrerie et Faux plafonds** | **150 jours** | **Lun 28/06/27** | **Ven 25/02/28** |
| 82 | Prestations de plâtrerie selon CCTP | 95 jours | Lun 28/06/27 | Ven 26/11/27 |
| 83 | Prestations de faux plafonds selon CCTP | 40 jours | Lun 03/01/28 | Ven 25/02/28 |
| 84 | **Lot 03B-Menuiseries Intérieures** | **220 jours** | **Lun 28/06/27** | **Ven 02/06/28** |
| 85 | Fourniture des huisseries | 0 jour | Lun 28/06/27 | Lun 28/06/27 |
| 86 | Prestations selon CCTP | 125 jours | Lun 29/11/27 | Ven 02/06/28 |
| 87 | **Lot 03C-Revetements de sols souples** | **90 jours** | **Lun 31/01/28** | **Ven 02/06/28** |
| 88 | Prestations de ragréages selon CCTP | 20 jours | Lun 31/01/28 | Ven 25/02/28 |
| 89 | Prestations de sols souples selon CCTP | 60 jours | Lun 13/03/28 | Ven 02/06/28 |
| 90 | **Lot 03D-Résine de sol** | **210 jours** | **Lun 28/06/27** | **Ven 19/05/28** |
| 91 | Prestations de préparation selon CCTP | 20 jours | Lun 28/06/27 | Ven 23/07/27 |
| 92 | Prestations selon CCTP | 20 jours | Lun 24/04/28 | Ven 19/05/28 |
| 93 | **Lot 03E-Peinture et nettoyage** | **125 jours** | **Lun 29/11/27** | **Ven 02/06/28** |
| 94 | Prestations selon CCTP | 125 jours | Lun 29/11/27 | Ven 02/06/28 |

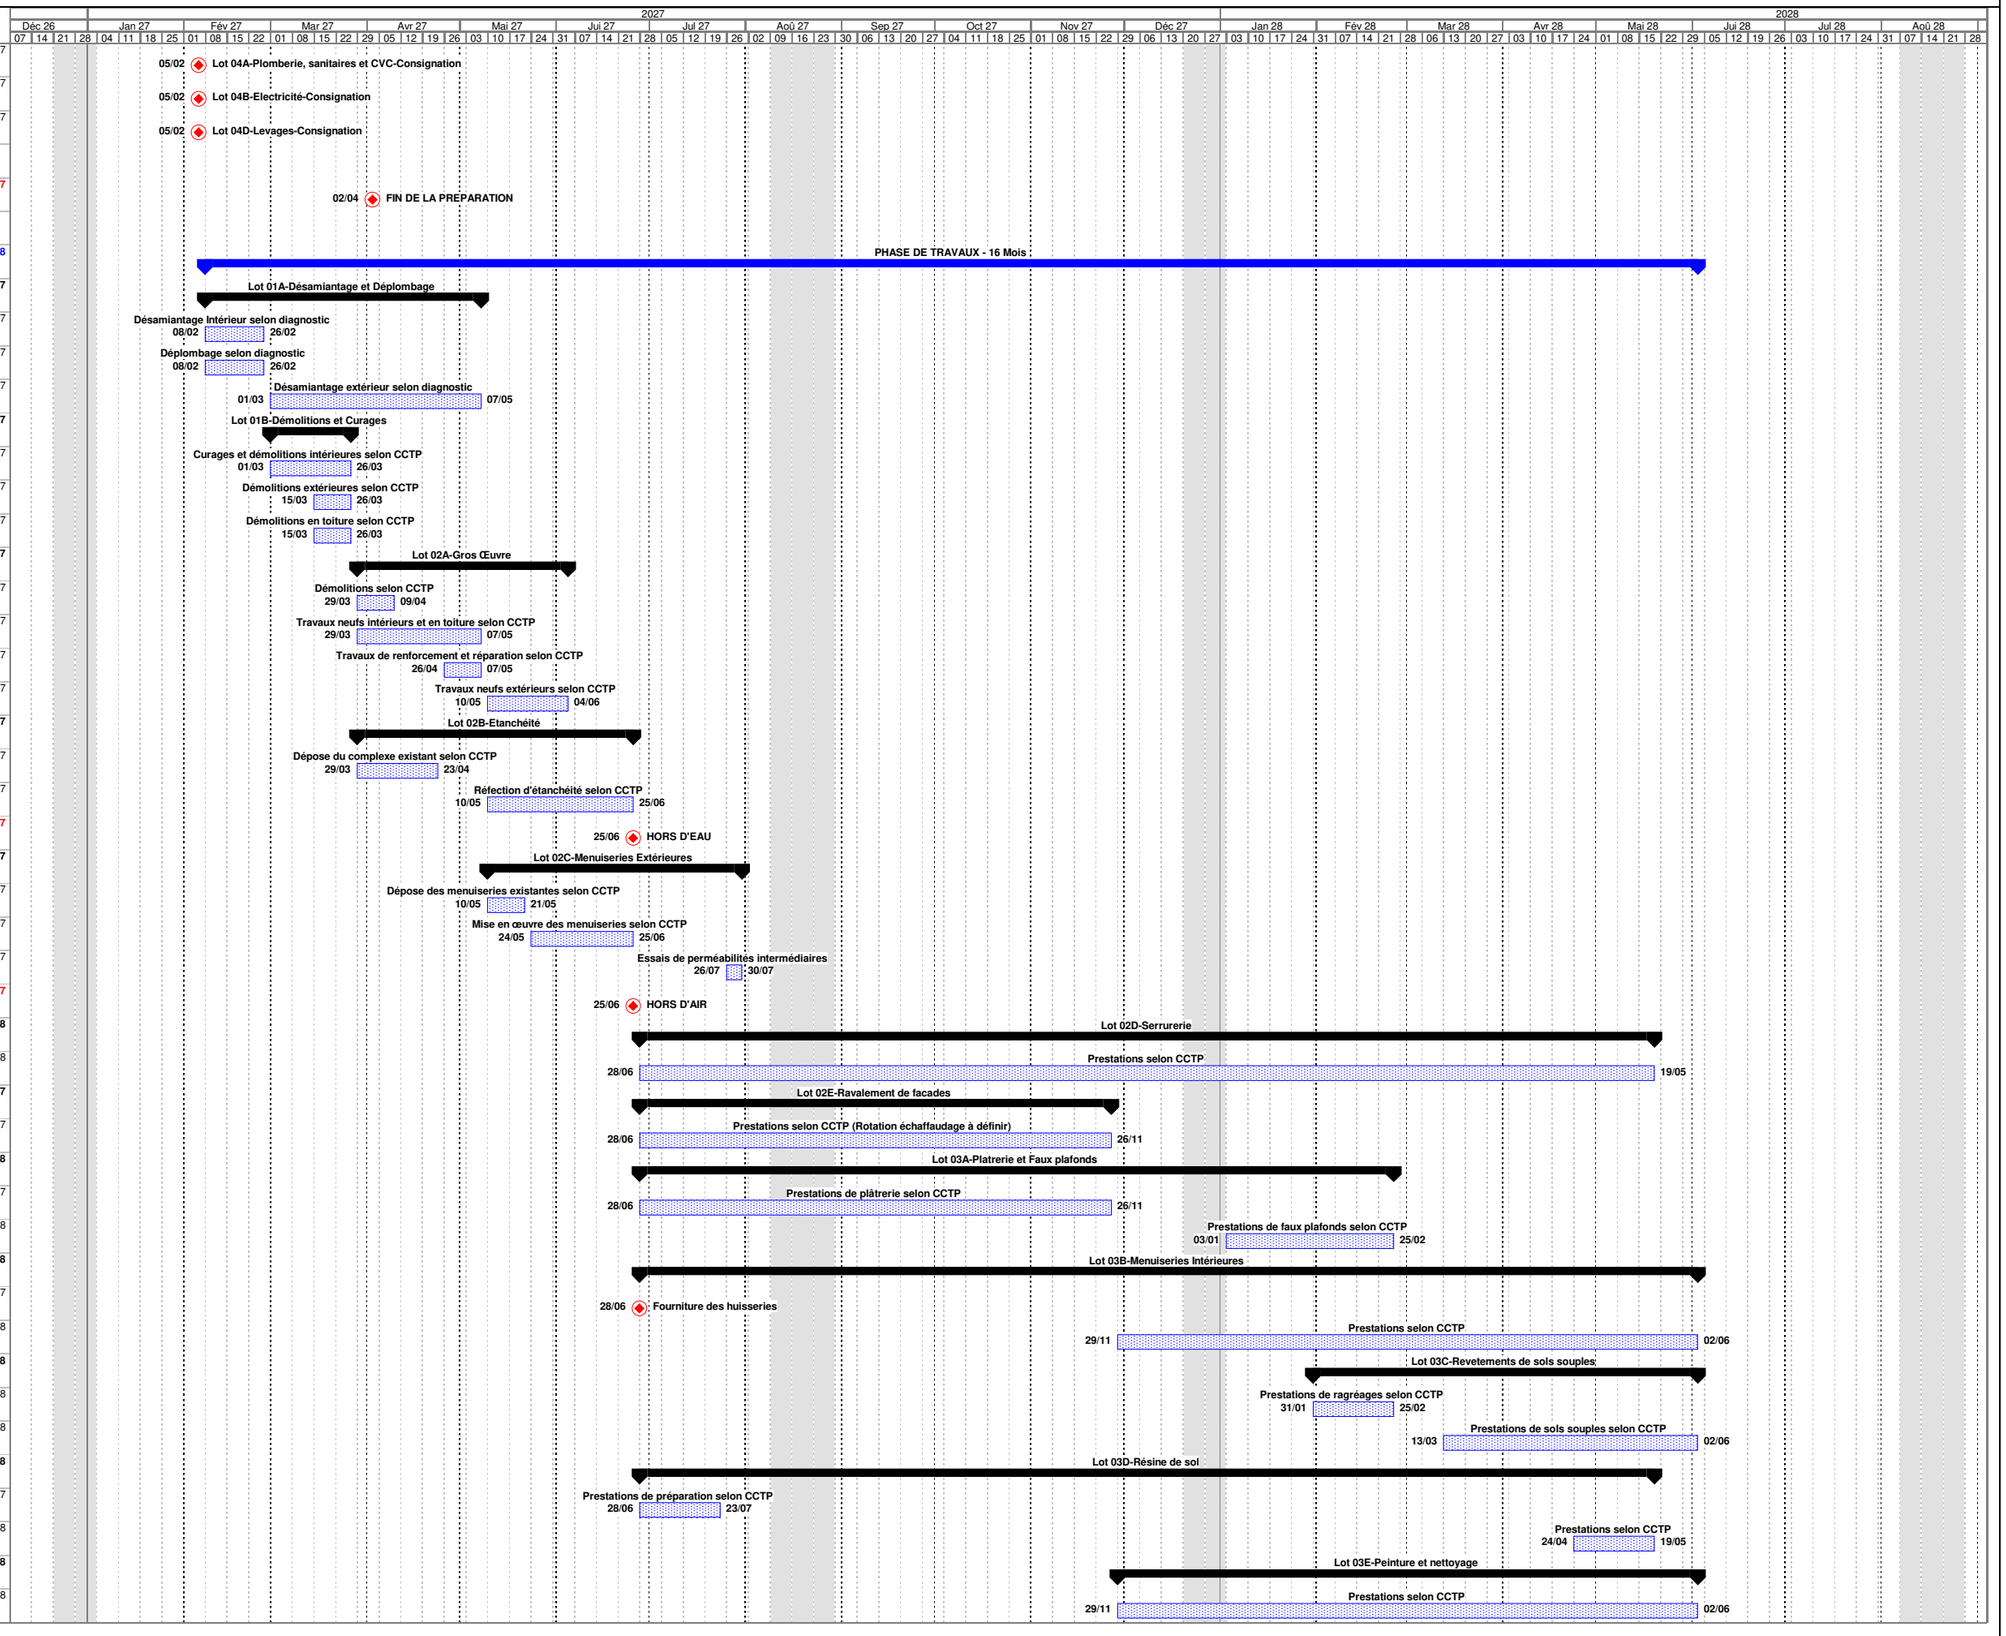

ECO
BUREAU D'ÉTUDES EN BÂTIMENT

# MINISTERE DES ARMEES représenté par l'ESID DE BORDEAUX

## Réhabilitation du bâtiment 080 du 48 REGIMENT DE TRANSMISSION

## QUARTIER TOUSSAINT - Avenue Jean Jaurés 47 000 AGEN

**Planning Prévisionnel GENERAL**
**Phase DCE de Juillet 2026**

| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 95 | **Lot 04A-Plomberie, sanitaires et CVC** | **255 jours** | **Lun 10/05/27** | **Ven 02/06/28** |
| 96 | Prestations avant platrerie selon CCTP | 35 jours | Lun 10/05/27 | Ven 25/06/27 |
| 97 | Prestations à l'avancement platrerie selon CCTP | 110 jours | Lun 28/06/27 | Ven 17/12/27 |
| 98 | Prestations d'appareillages selon CCTP | 90 jours | Lun 31/01/28 | Ven 02/06/28 |
| 99 | Prestations des locaux techniques selon CCTP | 230 jours | Lun 10/05/27 | Ven 28/04/28 |
| 100 | Autocontrôles et mises en services anticipées | 24 jours | Lun 01/05/28 | Ven 02/06/28 |
| 101 | **Lot 04B-Electricité CFO / CFA** | **255 jours** | **Lun 10/05/27** | **Ven 02/06/28** |
| 102 | Prestations avant platrerie selon CCTP | 35 jours | Lun 10/05/27 | Ven 25/06/27 |
| 103 | Prestations à l'avancement platrerie selon CCTP | 110 jours | Lun 28/06/27 | Ven 17/12/27 |
| 104 | Prestations d'appareillages selon CCTP | 90 jours | Lun 31/01/28 | Ven 02/06/28 |
| 105 | Prestations des locaux techniques selon CCTP | 230 jours | Lun 10/05/27 | Ven 28/04/28 |
| 106 | Autocontrôles et mises en services anticipées | 24 jours | Lun 01/05/28 | Ven 02/06/28 |
| 107 | **Lot 04D-Photovoltaïque** | **30 jours** | **Lun 28/06/27** | **Ven 06/08/27** |
| 108 | Prestations selon CCTP | 30 jours | Lun 28/06/27 | Ven 06/08/27 |
| 109 | **Lot 04E-Ascenseurs monte charge** | **25 jours** | **Lun 28/06/27** | **Ven 30/07/27** |
| 110 | Prestations selon CCTP | 25 jours | Lun 28/06/27 | Ven 30/07/27 |
| 111 | **Lot 05-VRD et Espaces Verts** | **110 jours** | **Lun 03/01/28** | **Ven 02/06/28** |
| 112 | Prestations selon CCTP | 110 jours | Lun 03/01/28 | Ven 02/06/28 |
| 113 | | | | |
| 114 | **ESSAIS ET MISE EN SERVICES** | **19 jours** | **Lun 08/05/28** | **Ven 02/06/28** |
| 115 | **NETTOYAGE AVANT OPR** | **4 jours** | **Lun 29/05/28** | **Ven 02/06/28** |
| 116 | **FIN DES TRAVAUX** | **0 jour** | **Ven 02/06/28** | **Ven 02/06/28** |
| 117 | | | | |
| 118 | **PHASE DE RECEPTION - 2 Mois** | **41 jours** | **Ven 02/06/28** | **Ven 28/07/28** |
| 119 | **GESTION ADMINISTRATIVE** | **36 jours** | **Ven 02/06/28** | **Ven 21/07/28** |
| 120 | **GESTION DES TS et TM** | **35 jours** | **Lun 05/06/28** | **Ven 21/07/28** |
| 121 | Recolement des derniers devis | 10 jours | Lun 05/06/28 | Ven 16/06/28 |
| 122 | Arbitrages MOA/MOE | 15 jours | Lun 19/06/28 | Ven 07/07/28 |
| 123 | Notification des derniers avenants | 10 jours | Lun 10/07/28 | Ven 21/07/28 |
| 124 | **DOE** | **35 jours** | **Lun 05/06/28** | **Ven 21/07/28** |
| 125 | Recolement des projets de DOE | 10 jours | Lun 05/06/28 | Ven 16/06/28 |
| 126 | VISAS MOE | 15 jours | Lun 19/06/28 | Ven 07/07/28 |
| 127 | Mise à jour entreprise | 10 jours | Lun 10/07/28 | Ven 21/07/28 |
| 128 | **RFCT** | **36 jours** | **Ven 02/06/28** | **Ven 21/07/28** |
| 129 | Dernière synthèse des observations chantier | 10 jours | Ven 02/06/28 | Jeu 15/06/28 |
| 130 | Réponses entreprises | 15 jours | Lun 19/06/28 | Ven 07/07/28 |
| 131 | RFCT et attestations fin de chantier | 10 jours | Lun 10/07/28 | Ven 21/07/28 |
| 132 | **OPR TECHNIQUES** | **40 jours** | **Lun 05/06/28** | **Ven 28/07/28** |
| 133 | BET-Vérification des installations techniques | 10 jours | Lun 05/06/28 | Ven 16/06/28 |
| 134 | Entreprises-Réglages des installations techniques | 20 jours | Lun 19/06/28 | Ven 14/07/28 |
| 135 | MOA-Réception des installations techniques | 15 jours | Lun 10/07/28 | Ven 28/07/28 |
| 136 | **OPR ARCHITECTURALES** | **40 jours** | **Lun 05/06/28** | **Ven 28/07/28** |
| 137 | Liste des OPR | 10 jours | Lun 05/06/28 | Ven 16/06/28 |
| 138 | Levée des réserves | 25 jours | Lun 19/06/28 | Ven 21/07/28 |
| 139 | Nettoyage avant réception | 5 jours | Lun 24/07/28 | Ven 28/07/28 |
| 140 | **RECEPTION et LIVRAISON** | **0 jour** | **Ven 28/07/28** | **Ven 28/07/28** |

