

PLANNING PRO DCE " LA P'TITE FAC " UNIVERSITE DE BOURGOGNE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**LA P'TITE FAC UB**	**378 jours**	**Lun 24/08/26**	**Jeu 23/03/28**
2	**PROCEDURE APPEL D'OFFRES**			
3	ENTREPRISES			
4	consultation	19 jours	Lun 24/08/26	Jeu 17/09/26
5	Analyse des offres et négociation	10 jours	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26
6	mise au point et notifications marché	15 jours	Lun 05/10/26	Ven 23/10/26
7				
8	**PREPARATION DE CHANTIER**			
9	synthèse plans	40 jours	Lun 26/10/26	Ven 18/12/26
10	établissement des plans	40 jours	Lun 26/10/26	Ven 18/12/26
11				
12	**INSTALLATION DE CHANTIER**	5 jours	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26
13	mise en place clôtures de chantier	2 jours	Lun 14/12/26	Mar 15/12/26
14	mise en place bungalows	3 jours	Mer 16/12/26	Ven 18/12/26
15	réalisation des branchements fluides	3 jours	Mer 16/12/26	Ven 18/12/26
16				
17	**TRAVAUX**			
18	**LOT TERRASSEMENTS / GO**	72 jours	Lun 04/01/27	Mar 13/04/27
19	terrassements pleine masse	5 jours	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27
20	fouilles fondations	5 jours	Lun 11/01/27	Ven 15/01/27
21	fondations GO	10 jours	Lun 18/01/27	Ven 29/01/27
22	structure béton / agglos	15 jours	Lun 01/02/27	Ven 19/02/27
23	canalisations + réseaux sous dallage	10 jours	Lun 22/02/27	Ven 05/03/27
24	dallage	2 jours	Lun 12/04/27	Mar 13/04/27
25				
26	**LOT STRUCTURE / CHARPENTE BOIS**	15 jours	Lun 22/02/27	Ven 12/03/27
27	mise en place	15 jours	Lun 22/02/27	Ven 12/03/27
28				
29	**LOT COUVERTURE / BARDAGE**	50 jours	Lun 15/03/27	Ven 21/05/27
30	mise en place couverture	20 jours	Lun 15/03/27	Ven 09/04/27

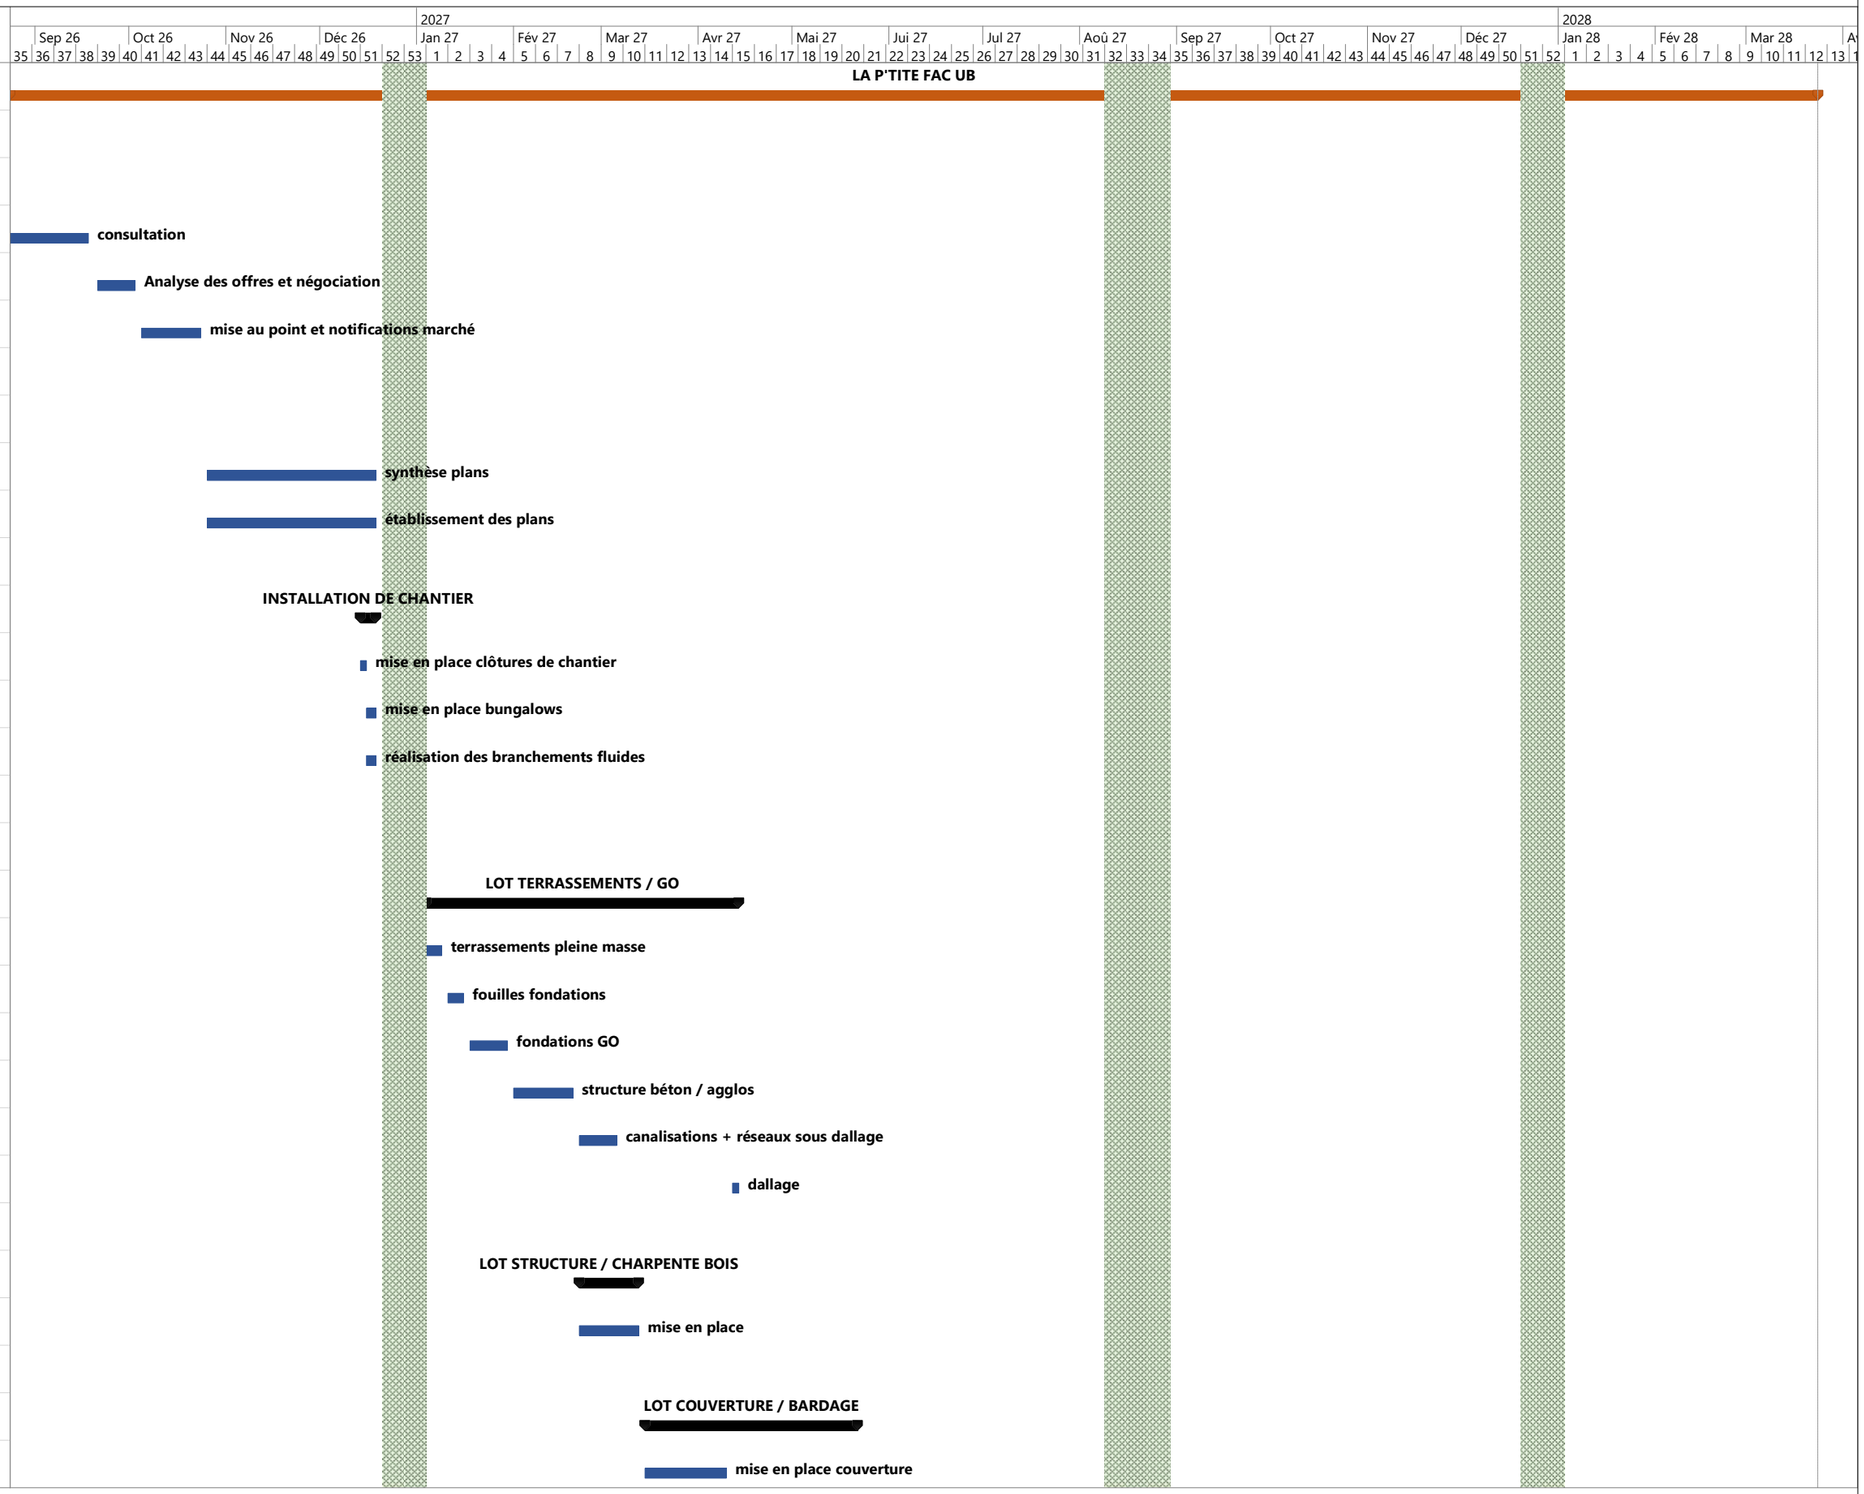

PLANNING PRO DCE " LA P'TITE FAC " UNIVERSITE DE BOURGOGNE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
31	mise en place bardage métallique	20 jours	Lun 26/04/27	Ven 21/05/27
32	mise en place bardage bois	5 jours	Lun 10/05/27	Ven 14/05/27
33				
34	**LOT PAILLE**	20 jours	Lun 12/04/27	Ven 07/05/27
35	mise en place murs paille	20 jours	Lun 12/04/27	Ven 07/05/27
36				
37	**LOT MEXT**	10 jours	Lun 12/04/27	Ven 23/04/27
38	mise en place	10 jours	Lun 12/04/27	Ven 23/04/27
39				
40	**LOT CLOISONS DOUBLAGES**	20 jours	Lun 10/05/27	Ven 04/06/27
41	mise en oeuvre	20 jours	Lun 10/05/27	Ven 04/06/27
42				
43	**LOT MIN**	55 jours	Lun 10/05/27	Ven 23/07/27
44	mise en oeuvre huisseries	20 jours	Lun 10/05/27	Ven 04/06/27
45	mise en oeuvre	15 jours	Lun 05/07/27	Ven 23/07/27
46				
47	**LOT CARRELAGE**	15 jours	Lun 07/06/27	Ven 25/06/27
48	mise en oeuvre	15 jours	Lun 07/06/27	Ven 25/06/27
49				
50	**LOT PEINTURE**	25 jours	Lun 28/06/27	Ven 30/07/27
51	préparation	10 jours	Lun 28/06/27	Ven 09/07/27
52	mise en oeuvre finale	15 jours	Lun 12/07/27	Ven 30/07/27
53				
54	**LOT FAUX PLAFONDS**	20 jours	Lun 12/07/27	Ven 06/08/27
55	mise en oeuvre	20 jours	Lun 12/07/27	Ven 06/08/27
56				
57	**LOT SOLS SOUPLES**	35 jours	Lun 12/07/27	Ven 17/09/27
58	ragréage	5 jours	Lun 12/07/27	Ven 16/07/27
59	mise en oeuvre	15 jours	Lun 30/08/27	Ven 17/09/27
60				

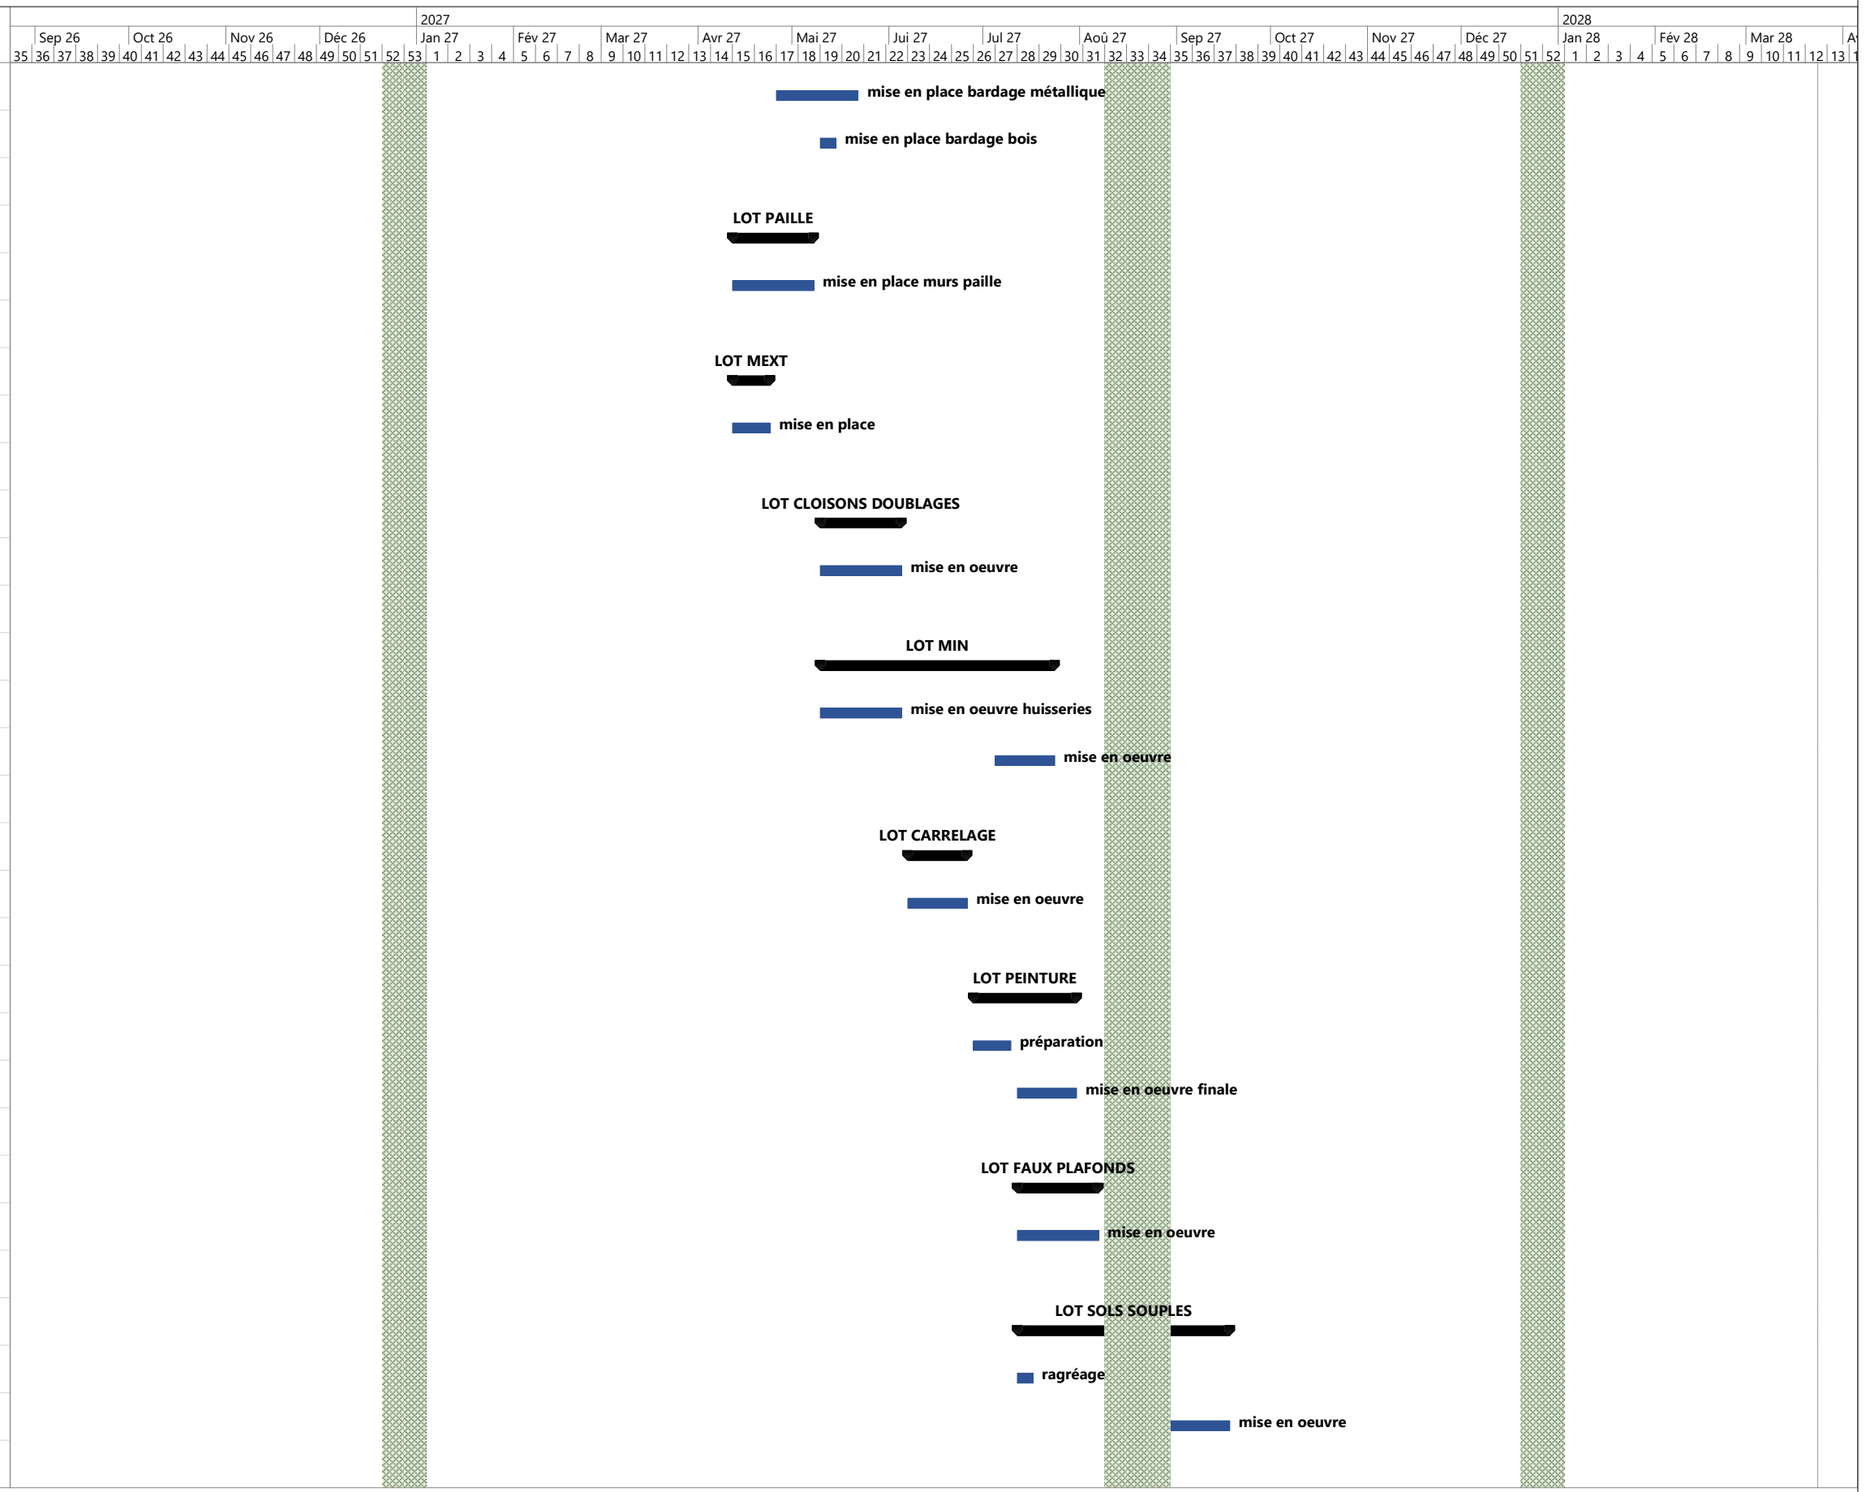

PLANNING PRO DCE " LA P'TITE FAC " UNIVERSITE DE BOURGOGNE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
61	**LOT ELECTRICITE**	90 jours	Lun 12/04/27	Ven 03/09/27
62	mise en oeuvre	90 jours	Lun 12/04/27	Ven 03/09/27
63				
64	**LOT PLOMBERIE -VMC**	90 jours	Lun 12/04/27	Ven 03/09/27
65	mise en oeuvre	90 jours	Lun 12/04/27	Ven 03/09/27
66				
67	**OPR RECEPTION**	20 jours	Lun 20/09/27	Ven 15/10/27
68	OPR	5 jours	Lun 20/09/27	Ven 24/09/27
69	LEVEE DES RESERVES	14 jours	Lun 20/09/27	Jeu 07/10/27
70	RECEPTION	1 jour	Ven 08/10/27	Ven 08/10/27
71				
72	**DEMENAGEMENT**	5 jours	Lun 11/10/27	Ven 15/10/27
73				
74	**RENOVATION CRECHE EXISTANTE**	90 jours	Lun 18/10/27	Lun 06/03/28
75	désamiantage	10 jours	Lun 18/10/27	Ven 29/10/27
76	démolition	10 jours	Lun 01/11/27	Ven 12/11/27
77	cloisons	10 jours	Lun 15/11/27	Ven 26/11/27
78	plomberie	10 jours	Lun 29/11/27	Ven 10/12/27
79	électricité	10 jours	Lun 29/11/27	Ven 10/12/27
80	faux plafond	10 jours	Lun 13/12/27	Lun 10/01/28
81	peinture	10 jours	Mar 11/01/28	Lun 24/01/28
82	min	10 jours	Mar 25/01/28	Lun 07/02/28
83	sols souple	10 jours	Mar 08/02/28	Lun 21/02/28
84	cuisine	10 jours	Mar 22/02/28	Lun 06/03/28
85				
86	**OPR RECEPTION**	13 jours	Mar 07/03/28	Jeu 23/03/28
87	OPR	2 jours	Mar 07/03/28	Mer 08/03/28
88	LEVEE DES RESERVES	10 jours	Jeu 09/03/28	Mer 22/03/28
89	RECEPTION	1 jour	Jeu 23/03/28	Jeu 23/03/28

