Repérage Amiante Avant Travaux

Réf. : DIA-BZR04-2601-008



Propriétaire : MINISTERE DE LA JUSTICE - Secrétariat général - DIRSG SUD,
Adresse du bien : 10 Place du Salin, 31000 TOULOUSE
Nature du bien : Tribunal
Localisation du bien : Sans objet
Numéro de lot : Sans objet
Date du permis de construire : Avant 1949
Date limite de validité : Validité illimitée (sauf travaux)
Référence client :

Amiante

Présence d'amiante : - Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il s'agit de :
- Joints de porte coupe-feu (sur dormant) (Après analyse n°036)
- Isolant intérieur de porte CF (Après analyse n°037)

Des ouvrages/zones/linéaires n'ont pu être repérés avant l'engagement des travaux et doivent en conséquence faire l'objet de repérage en cours de travaux. A ce stade, il a (ou n'a pas) été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. L'opérateur de repérage doit alors justifier qu'il n'a pas pu repérer ces ouvrages/zones/linéaires et indiquer les investigations complémentaires qui devront être réalisées.

Les éléments suivants n'ont pu être visités :
- Parties du combles et de la Grand'Chambre définis comme non accessible par le plan fournis par Christophe AMIOT - A. C. M. H : Interdiction d'accès pour soucis structuel (risque d'effondrement)

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.
Elle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle.
*pour le cas où il est indiqué validité illimitée d'un des diagnostics, un rapport n'est plus valide en cas : de travaux, de changement de réglementation, dans le cas de diagnostic amiante pour les parties concernant des obligations ou recommandations issues des grilles d'évaluation d'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante ainsi que le contenu desdites grilles.

Note du MOA :
La porte de l'ex-chaufferie contenant des MCA a été retirée en 2026.

Les intervenants du dossier

Propriétaire : MINISTERE DE LA JUSTICE - Secrétariat général - DIRSG SUD,

2 IMPASSE BOUDEVILLE, 31047 TOULOUSE CEDEX 1

Votre cabinet : DIAGAMTER TOULOUSE SUD

55 avenue Louis Bréguet, 31400 TOULOUSE

05 32 09 79 09 thierry.bizouarne@aleacontroles.com

Technicien : Monsieur Thomas GARRIGOU

05 32 09 79 09 thomas.garrigou@aleacontroles.com



Monsieur Thomas GARRIGOU
Diagnostiqueur certifié

Synthèse dossier
Réf. : DIA-BZR04-2601-008

Sommaire

Rapport Amiante	4
Procès-verbal d'analyse	59
Attestation d'assurance Aléa du dossier	92
Certificat de compétences Aléa du dossier	95

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis

L'objet de la mission est l'établissement d'un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux portant sur tout ou partie de l'immeuble désigné ci-dessous. Il est réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution.
Il ne s'applique pas aux repérages de l'amiante dans les installations industrielles, les navires militaires, marchands, les aéronefs, les véhicules ferroviaires et terrestres dans lesquels l'amiante a pu être utilisée, ni aux sols et aux roches en place.

1. Donneur d'ordre

Si différent du propriétaire

2. Propriétaire

MINISTERE DE LA JUSTICE - Secrétariat général - DIRSG SUD,
2 IMPASSE BOUDEVILLE, 31047 TOULOUSE CEDEX 1

3. Identification de l'immeuble bâti

Adresse du bien	10 Place du Salin, 31000 TOULOUSE
Description Sommaire	Tribunal. Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	Section : 815 AB, N° parcelle(s) : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien non indépendant
Référence du programme de travaux	Restauration de la Grand'Chambre
Permis de construire délivré en	Avant 1949

4. Références de la mission

Commande effectuée le	29/12/2025
Visite réalisée le(s)	06/01/2026 à 09:00 13/01/2026 à 09:00
Rapport émis le	19/01/2026
Opérateur(s) de repérage, entité et certification	Monsieur Thomas GARRIGOU Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QUALIXPERT 17 rue des Capucins - 81100 CASTRES (Réf : C2131)
Assurances	AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 345 145 € (litige) / 2.000.000 € (an) - Date de validité : 31/12/2026
Laboratoire accrédité (analyse)	EUROFINS ANALYSE POUR BATIMENT EABSO,
Contact sur place	MINISTERE DE LA JUSTICE Monsieur LALANNE
Sous-traitance	Sans objet

Textes de référence : Arrêté du 23/01/2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis ; Norme NF X 46-020 version août 2017 ; Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 ; Décret n°2019-251 du 27 mars 2019.

5. Conclusion(s) de la mission de repérage

Les éléments suivants n'ont pu être visités :
- Parties de la combles et de la Grand'Chambre définis comme non accessible par le plan fournis par Christophe AMIOT - A. C. M. H : Interdiction d'accès pour soucis structurel (risque d'effondrement)

En Présence d'Amiante

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il s'agit de :

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	Quantité estimée	N° prélèvement ou Justification
Joints de porte coupe-feu (sur dormant)	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol	36	1 u	P036
Isolant intérieur de porte CF	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol	37	1 u	P037

Note du MOA :
La porte de l'ex-chaufferie contenant des MCA a été retirée en 2026.

En Absence d'Amiante

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante. Il s'agit de :

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	N° prélèvement ou Justification
Moulure	RDC Bât D : Grand Chambre	1	P001
Peintures décoratives sur moulure	RDC Bât D : Grand Chambre	2	P002
Colles moulure	RDC Bât D : Grand Chambre	3	P003
Colles moulure	RDC Bât D : Grand Chambre	3	P004
Moquette grise	RDC Bât D : Grand Chambre	5	P005
Moquette grise	RDC Bât D : Grand Chambre	5	P006
Colles non bitumineuses moquette grise	RDC Bât D : Grand Chambre	7	P007
Colles non bitumineuses moquette grise	RDC Bât D : Grand Chambre	7	P008
Tissus estrade pourpre voile	RDC Bât D : Grand Chambre	9	P009
Tissus estrade pourpre voile	RDC Bât D : Grand Chambre	9	P010
Tissus angles estrade pourpre cloué	RDC Bât D : Grand Chambre	11	P011
Tissus angles estrade pourpre cloué	RDC Bât D : Grand Chambre	11	P012
Tissus épais pied	RDC Bât D : Grand Chambre	13	P013


banquette			
Tissus épais pied banquette	RDC Bât D : Grand Chambre	13	P014
Tissus fin sous face banquettes	RDC Bât D : Grand Chambre	15	P015
Tissus fin sous face banquettes	RDC Bât D : Grand Chambre	15	P016
Peintures décoratives sur bois support luminaires	RDC Bât D : Grand Chambre	17	P017
Peintures décoratives sur bois support luminaires	RDC Bât D : Grand Chambre	17	P018
Enduits à base de plâtre sur brique forraine	R+3 Bât D : Combles - RDC Bât D : Grand Chambre, Vide Estrade	19	P019
Isolants anciens conducteurs sous estrade	RDC Bât D : Vide Estrade	20	P020
Dalles moquettes avec entrecouche noire	RDC Bât D : Grand Chambre	21	P021
Tresses filasse	RDC Bât D : Vide Estrade	22	P022
Ragréage haut	RDC Bât D : Vide Estrade	23	P023
Ragréage centre (blanc)	RDC Bât D : Vide Estrade	24	P024
Ragréage bas sur plancher	RDC Bât D : Vide Estrade	25	P025
Enduit de jointement ancien conduit de fumée	RDC Bât D : Vide Estrade	26	P026
Enduits à base de ciment	RDC Bât E : Couloir, Archives 1	27	P027
Enduits à base de ciment	RDC Bât E : Couloir, Archives 1	27	P028
Joints de vitrage	RDC Bât E : Archives 1	29	P029
Enduits à base de ciment	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol, Chaufferie	30	P030
Enduits à base de ciment	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol, Chaufferie	30	P031
Enduits à base de plâtre	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol, Chaufferie	32	P032
Enduits à base de plâtre	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol, Chaufferie	32	P033
Enduits à base de plâtre reprise porte cave	Sous-sol Bât D : Chaufferie, Cave	34	P034
Joints des portes coupe-	Sous-sol Bât D : Chaufferie	35	P035

feu (sur battant)			
Peinture porte CF	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol	38	P038
Enduits à base de plâtre lissé (de surface)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	39	P039
Enduits à base de plâtre lissé (de surface)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	39	P040
Enduits à base de ciment (sous-face)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	41	P041
Enduits à base de ciment (sous-face)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	41	P043
Enduits à base de ciment lissé (de surface)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	42	P042
Joints entre éléments ancien conduit de fumée maçonné	Sous-sol Bât D : Chaufferie	44	P044
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°1 extérieur)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	45	P045
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°2 extérieur)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	45	P046
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°3 centrale)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	45	P047
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°4 intérieur)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	45	P048
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°5 intérieur)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	45	P049
Enduits à base de plâtre poutres simple	Sous-sol Bât D : Chaufferie	50	P050
Enduits à base de plâtre couche basse	Sous-sol Bât D : Chaufferie	51	P051
Enduits à base de plâtre couche basse	Sous-sol Bât D : Chaufferie	51	P052
Enduits à base de plâtre couche intermédiaire	Sous-sol Bât D : Chaufferie	53	P053
Enduits à base de plâtre couche intermédiaire	Sous-sol Bât D : Chaufferie	53	P054
Enduits à base de plâtre couche interne	Sous-sol Bât D : Chaufferie	55	P055

Enduits à base de plâtre couche interne	Sous-sol Bât D : Chaufferie	55	P056
Enveloppes de calorifugeage	Sous-sol Bât D : Chaufferie	57	P057
Calorifuges jaune	Sous-sol Bât D : Chaufferie	57	P058
Enveloppes de calorifugeage bituminée	Sous-sol Bât D : Chaufferie, Cave	59	P059
Calorifuges rouge	Sous-sol Bât D : Chaufferie, Cave	59	P060
Peintures intumescentes rouge sur fixations	R+3 Bât D : Combles	61	P061
Peintures intumescentes rouge sur fixations	R+3 Bât D : Combles	61	P062
Enduits à base de plâtre latis (dans sondages existant)	R+3 Bât D : Combles	63	P063
Mortier de fixation tuiles ancien	R+3/Extérieur Bât D : Toiture	64	P064
Mortier de fixation tuiles récent	R+3/Extérieur Bât D : Toiture	65	P065
Enduits extérieurs	R+3/Extérieur Bât D : Toiture	66	P066
Enduits de jointoiement et des plaques de plâtre	RDC Bât E : Archives 1	67	P067
Bandes calicot	RDC Bât E : Archives 1	68	P068
Flocages	RDC Bât E : Couloir, Archives 1	69	P069
Enduit de rebouchages du calfeutrements de clapets coupe-feu	RDC Bât E : Couloir - Sous-sol Bât D : Cave	70	P070
plaque de calfeutrements de clapets coupe-feu	RDC Bât E : Couloir - Sous-sol Bât D : Cave	71	P071
Clapets coupe feu de 2007	RDC Bât E : Couloir - Sous-sol Bât D : Cave	72	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Fait à TOULOUSE, le 19/01/2026

Monsieur Thomas GARRIGOU
Opérateur de repérage certifié



6. Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités

Les ouvrages suivants n'ont pas pu être visités.

Désignation	Justification
Parties de la combles et de la Grand'Chambre définis non accessible par le plan fournis par Christophe AMIOT - A. C. M. H	Interdiction d'accès pour soucis structurel (risque d'effondrement)

Attention, pour rappel, il est de la responsabilité du donneur d'ordre de s'assurer que l'opérateur de repérage puisse accéder à l'ensemble des ouvrages. **Les travaux de la partie de structure concernés ne peuvent en l'état être réalisés sans investigation supplémentaire.**

7. Sommaire

1 Donneur d'ordre
2 Propriétaire
3 Identification du bien immobilier et de ses annexes
4 Références de la mission
5 Conclusion(s) de la mission de repérage
6 Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités
7 Sommaire
8 Programme de travaux du donneur d'ordre
9 Programme de la mission de repérage
10 Périmètre de la mission de repérage
11 Autres interlocuteurs éventuels
12 Obligations des intervenants
13 Ecarts et adjonctions réalisées lors de la mission par rapport à la réglementation
14 Zones présentant des similitudes d'ouvrages
15 Liste et localisation des matériaux et produits repérés
16 Récapitulatif et estimation des quantités de matériaux ou produits contenant de l'amiante
17 Récapitulatif des matériaux ne contenant pas d'amiante
18 Schémas
19 Investigations complémentaires à mener
20 Documentation disponible
21 Observations
22 Modalités de repérage
23 Conditions particulières d'exécution
Et, le cas échéant en annexe :
Annexe 1 : Procès-verbaux d'analyse et documents utiles à la compréhension du présent rapport
Annexe 2 : Attestation d'assurance
Annexe 3 : Certificat de compétence

8. Programme de travaux du donneur d'ordre

Référence du document décrivant le programme des travaux transmis par le donneur d'ordre : Restauration de la Grand'Chambre
Description du programme des travaux : Périmètre de travaux vu avec Madame PRIE sur place : Renforcement structurel de la charpente en combles, dépose de toiture, intervention en locaux chaufferie en sous-sol et locaux annexes pour création d'une ventilation, vérification de l'ensemble des conduits et percements en plafond des sous-sols, dépose de la, totalité de l'estrade de la grand chambre, réalisation de percements en périphérie au sol de la grand chambre, investigations sur les fixations des luminaires grand chambre

9. Programme de la mission de repérage

Moquette, colle non bitumineuse, tissus muraux, enduit, isolant conducteurs, ragréage, tresse, calorifugeage, enduit de jointement, Flocage, reboucheage CF, joint porte CF, plaque CF,

Sont exclus du repérage :

Parties non accessibles définis par le Plan de Christophe AMIOT - A. C. M. H

10. Périmètre de la mission de repérage

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés :

R+3 Bât D : Combles

R+3/Extérieur Bât D : Toiture

RDC Bât D : Grand Chambre, Vide Estrade

RDC Bât E : Couloir, Archives 1

Sous-sol Bât D : Accès sous-sol, Chaufferie, Cave

11. Autres interlocuteurs éventuels

Maîtrise d'œuvre : non communiqué
Maître d'ouvrage délégué : MINISTERE DE LA JUSTICE - Secrétariat général - DIRSG SUD,
Coordonnateur : MINISTERE DE LA JUSTICE, Monsieur BERESCHEL
Accompagnateur désigné par le donneur d'ordre : MINISTERE DE LA JUSTICE Monsieur LALANNE

12. Obligations des intervenants

Pour rappel, ce présent document vient en complément des rapports existants de repérage antérieurs (Dossier Technique Amiante, Constat Vente, autres diagnostics avant-travaux, ...). Il appartient au maître d'ouvrage ou à l'employeur des salariés susceptibles d'être exposés aux fibres d'amiante de demander au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante. Ces documents doivent également être communiqués par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre et au coordinateur. Conformément au code du travail, ces rapports, y compris le présent document, doivent être joints au plan de prévention, PGSSPS, PGSCSPS, Dossier d'interventions ultérieures... Ils doivent être remis à l'ensemble des employeurs de salariés susceptibles d'être exposés à des fibres d'amiante dans le cadre du chantier de travaux. Ils doivent également être joints aux éventuels dossiers d'appel d'offre ou demande de devis concernant l'intervention de salariés susceptibles d'être exposés aux fibres d'amiante.

Le présent rapport doit faire partie intégrante de l'évaluation des risques à établir dans le cadre du chantier. Le repérage, objet du présent rapport, est, conformément à la norme NF X 46-020 de la version en vigueur, réalisé à l'initiative du donneur d'ordre ou, à défaut, du maître d'œuvre ou du responsable de l'entreprise des travaux.

Pour rappel, le maître d'ouvrage doit, à l'issue de travaux de désamiantage faire procéder à un examen visuel réglementaire par un diagnostiqueur certifié (se renseigner auprès de votre interlocuteur Aléa Contrôles).
Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, le donneur d'ordre adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

13. Ecarts et adjonctions réalisés lors de la mission par rapport à la réglementation

Sans Objet.

14. Zones présentant des similitudes d'ouvrages

ZPSO ET DESCRIPTION	Localisation(s)	MPCA repéré ?
ZPSO #1 : Moulure	RDC Bât D : Grand Chambre	Non
ZPSO #2 : Peintures décoratives sur moulure	RDC Bât D : Grand Chambre	Non
ZPSO #3 : Colles moulure	RDC Bât D : Grand Chambre	Non
ZPSO #5 : Moquette grise	RDC Bât D : Grand Chambre	Non
ZPSO #7 : Colles non bitumineuses moquette grise	RDC Bât D : Grand Chambre	Non
ZPSO #9 : Tissus estrade pourpre voile	RDC Bât D : Grand Chambre	Non
ZPSO #11 : Tissus angles estrade pourpre cloué	RDC Bât D : Grand Chambre	Non
ZPSO #13 : Tissus épais pied banquette	RDC Bât D : Grand Chambre	Non
ZPSO #15 : Tissus fin sous face banquettes	RDC Bât D : Grand Chambre	Non
ZPSO #17 : Peintures décoratives sur bois support luminaires	RDC Bât D : Grand Chambre	Non
ZPSO #19 : Enduits à base de plâtre sur brique forraine	R+3 Bât D : Combles RDC Bât D : Grand Chambre, Vide Estrade	Non
ZPSO #20 : Isolants anciens conducteurs sous estrade	RDC Bât D : Vide Estrade	Non
ZPSO #21 : Dalles moquettes avec entrecouche noire	RDC Bât D : Grand Chambre	Non
ZPSO #22 : Tresses filasse	RDC Bât D : Vide Estrade	Non
ZPSO #23 : Ragréage haut	RDC Bât D : Vide Estrade	Non
ZPSO #24 : Ragréage centre (blanc)	RDC Bât D : Vide Estrade	Non
ZPSO #25 : Ragréage bas sur plancher	RDC Bât D : Vide Estrade	Non

ZPSO #26 : Enduit de jointement ancien conduit de fumée	RDC Bât D : Vide Estrade	Non
ZPSO #27 : Enduits à base de ciment	RDC Bât E : Couloir, Archives 1	Non
ZPSO #29 : Joints de vitrage	RDC Bât E : Archives 1	Non
ZPSO #30 : Enduits à base de ciment	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol, Chaufferie	Non
ZPSO #32 : Enduits à base de plâtre	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol, Chaufferie	Non
ZPSO #34 : Enduits à base de plâtre reprise porte cave	Sous-sol Bât D : Chaufferie, Cave	Non
ZPSO #35 : Joints des portes coupe-feu (sur battant)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #36 : Joints de porte coupe-feu (sur dormant)	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol	Oui
ZPSO #37 : Isolant intérieur de porte CF	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol	Oui
ZPSO #38 : Peinture porte CF	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol	Non
ZPSO #39 : Enduits à base de plâtre lissé (de surface)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #41 : Enduits à base de ciment (sous-face)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #42 : Enduits à base de ciment lissé (de surface)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #44 : Joints entre éléments ancien conduit de fumée maçonné	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #45 : Enduits à base de plâtre poutres (couche n°1 extérieur)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #45 : Enduits à base de plâtre poutres (couche n°2 extérieur)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #45 : Enduits à base de plâtre poutres (couche n°3 centrale)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #45 : Enduits à base de plâtre poutres (couche n°4 intérieur)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #45 : Enduits à base de plâtre poutres (couche n°5 intérieur)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #50 : Enduits à base de plâtre poutres simple	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #51 : Enduits à base de plâtre couche basse	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #53 : Enduits à base de plâtre couche intermédiaire	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #55 : Enduits à base de plâtre couche interne	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #57 : Enveloppes de calorifugeage	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #57 : Calorifuges jaune	Sous-sol Bât D : Chaufferie	Non
ZPSO #59 : Enveloppes de calorifugeage bituminée	Sous-sol Bât D : Chaufferie, Cave	Non
ZPSO #59 : Calorifuges rouge	Sous-sol Bât D : Chaufferie, Cave	Non
ZPSO #61 : Peintures intumescentes rouge sur fixations	R+3 Bât D : Combles	Non
ZPSO #63 : Enduits à base de plâtre latis (dans sondages existant)	R+3 Bât D : Combles	Non
ZPSO #64 : Mortier de fixation tuiles ancien	R+3/Extérieur Bât D : Toiture	Non
ZPSO #65 : Mortier de fixation tuiles récent	R+3/Extérieur Bât D : Toiture	Non
ZPSO #66 : Enduits extérieurs	R+3/Extérieur Bât D : Toiture	Non

ZPSO #67 : Enduits de jointoiement et des plaques de plâtre	RDC Bât E : Archives 1	Non
ZPSO #68 : Bandes calicot	RDC Bât E : Archives 1	Non
ZPSO #69 : Flocages	RDC Bât E : Couloir, Archives 1	Non
ZPSO #70 : Enduit de rebouchages du calfeutrements de clapets coupe-feu	RDC Bât E : Couloir Sous-sol Bât D : Cave	Non
ZPSO #71 : plaque de calfeutrements de clapets coupe-feu	RDC Bât E : Couloir Sous-sol Bât D : Cave	Non
ZPSO #72 : Clapets coupe feu de 2007	RDC Bât E : Couloir Sous-sol Bât D : Cave	Non

15. Liste et localisation des matériaux et produits repérés

ZPSO #1	Plafonds et faux plafonds / Moulure		
Localisation : RDC Bât D : Grand Chambre			
Partie Inspectée / Description	**Photo**	**N° Ech.**	**Conclusion**
Moulure Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P001	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°001

ZPSO #2	Plafonds et faux plafonds / Peintures décoratives sur moulure		
Localisation : RDC Bât D : Grand Chambre			
Partie Inspectée / Description	**Photo**	**N° Ech.**	**Conclusion**
Peintures décoratives sur moulure Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P002	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°002

ZPSO #3	Plafonds et faux plafonds / Colles moulure

Localisation : RDC Bât D : Grand Chambre

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colles moulure Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P003	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°003
Colles moulure Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P004	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°004

ZPSO #5	Planchers et planchers techniques / Moquette grise

Localisation : RDC Bât D : Grand Chambre

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Moquette grise Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P005	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°005
Moquette grise Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P006	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°006

ZPSO #7	Planchers et planchers techniques / Colles non bitumineuses moquette grise

Localisation : RDC Bât D : Grand Chambre

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colles non bitumineuses moquette grise Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P007	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°007
Colles non bitumineuses moquette grise Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P008	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°008

ZPSO #9	Parois verticales intérieures / Tissus estrade pourpre voile

Localisation : RDC Bât D : Grand Chambre

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Tissus estrade pourpre voile Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre	 	P009	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°009
Tissus estrade pourpre voile Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre	 	P010	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°010

ZPSO #11	Parois verticales intérieures / Tissus angles estrade pourpre cloué

Localisation : RDC Bât D : Grand Chambre

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Tissus angles estrade pourpre cloué Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P011	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°011
Tissus angles estrade pourpre cloué Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P012	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°012

ZPSO #13	Équipements divers et accessoires / Tissus épais pied banquette

Localisation : RDC Bât D : Grand Chambre

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Tissus épais pied banquette Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P013	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°013
Tissus épais pied banquette Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P014	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°014


ZPSO #15	Équipements divers et accessoires / Tissus fin sous face banquettes

Localisation : RDC Bât D : Grand Chambre

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Tissus fin sous face banquettes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P015	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°015
Tissus fin sous face banquettes Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P016	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°016

ZPSO #17	Parois verticales intérieures / Peintures décoratives sur bois support luminaires

Localisation : RDC Bât D : Grand Chambre

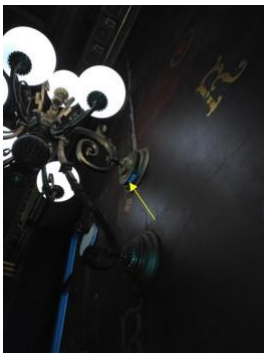Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Peintures décoratives sur bois support luminaires Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P017	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°017
Peintures décoratives sur bois support luminaires Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P018	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°018

ZPSO #19	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre sur brique forraine

Localisation : R+3 Bât D : Combles

RDC Bât D : Grand Chambre, Vide Estrade

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre sur brique forraine Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P019	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°019

ZPSO #20	Équipements divers et accessoires / Isolants anciens conducteurs sous estrade

Localisation : RDC Bât D : Vide Estrade

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Isolants anciens conducteurs sous estrade Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Vide Estrade		P020	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°020


ZPSO #21	Planchers et planchers techniques / Dalles moquettes avec entrecouche noire

Localisation : RDC Bât D : Grand Chambre

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Dalles moquettes avec entrecouche noire Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Grand Chambre		P021	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°021

ZPSO #22	Équipements divers et accessoires / Tresses filasse

Localisation : RDC Bât D : Vide Estrade

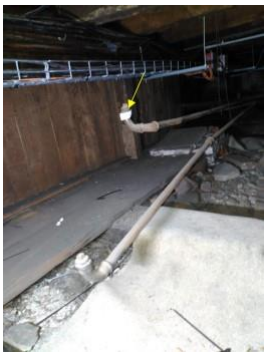Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Tresses filasse Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Vide Estrade		P022	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°022

ZPSO #23	Planchers et planchers techniques / Ragréage haut

Localisation : RDC Bât D : Vide Estrade

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Ragréage haut Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Vide Estrade		P023	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°023

ZPSO #24	Planchers et planchers techniques / Ragréage centre (blanc)

Localisation : RDC Bât D : Vide Estrade

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Ragréage centre (blanc) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Vide Estrade		P024	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°024

ZPSO #25	Planchers et planchers techniques / Ragréage bas sur plancher

Localisation : RDC Bât D : Vide Estrade

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Ragréage bas sur plancher Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Vide Estrade		P025	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°025

ZPSO #26	Conduits et accessoires intérieurs / Enduit de jointement ancien conduit de fumée

Localisation : RDC Bât D : Vide Estrade

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit de jointement ancien conduit de fumée Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât D Vide Estrade		P026	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°026

ZPSO #27	Parois verticales intérieures / Enduits à base de ciment

Localisation : RDC Bât E : Couloir, Archives 1

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de ciment Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât E Couloir		P027	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°027
Enduits à base de ciment Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât E Archives 1		P028	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°028

ZPSO #29	Parois verticales extérieures et Façades / Joints de vitrage

Localisation : RDC Bât E : Archives 1

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Joints de vitrage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât E Archives 1		P029	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°029

ZPSO #30	Parois verticales intérieures / Enduits à base de ciment

Localisation : Sous-sol Bât D : Accès sous-sol, Chaufferie

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de ciment Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Accès sous-sol		P030	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°030
Enduits à base de ciment Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P031	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°031

ZPSO #32	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre

Localisation : Sous-sol Bât D : Accès sous-sol, Chaufferie

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P032	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°032
Enduits à base de plâtre Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P033	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°033

ZPSO #34	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre reprise porte cave

Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie, Cave

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre reprise porte cave Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Cave	 	P034	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°034


ZPSO #35	Parois verticales intérieures / Joints des portes coupe-feu (sur battant)

Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Joints des portes coupe-feu (sur battant) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P035	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°035

ZPSO #36	Parois verticales intérieures / Joints de porte coupe-feu (sur dormant)

Localisation : Sous-sol Bât D : Accès sous-sol

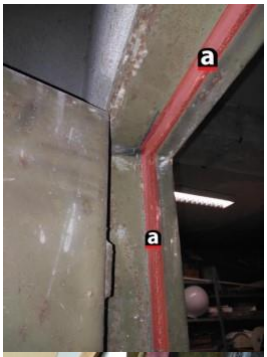Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Joints de porte coupe-feu (sur dormant) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Accès sous-sol	 	P036	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°036 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile

ZPSO #37	Parois verticales intérieures / Isolant intérieur de porte CF

Localisation : Sous-sol Bât D : Accès sous-sol

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Isolant intérieur de porte CF Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Accès sous-sol		P037	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°037 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite), riébeckite-amiante (crocidolite)

ZPSO #38	Parois verticales intérieures / Peinture porte CF

Localisation : Sous-sol Bât D : Accès sous-sol

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Peinture porte CF Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Accès sous-sol		P038	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°038

ZPSO #39	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre lissé (de surface)

Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre lissé (de surface) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P039	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°039
Enduits à base de plâtre lissé (de surface) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P040	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°040

ZPSO #41	Parois verticales intérieures / Enduits à base de ciment (sous-face)

Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de ciment (sous-face) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P041	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°041
Enduits à base de ciment (sous-face) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P043	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°043

ZPSO #42	Parois verticales intérieures / Enduits à base de ciment lissé (de surface)

Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de ciment lissé (de surface) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P042	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°042



ZPSO #44	Conduits et accessoires intérieurs / Joints entre éléments ancien conduit de fumée maçonné


Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie


Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Joints entre éléments ancien conduit de fumée maçonné Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P044	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°044

ZPSO #45	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre poutres (couche n°1 extérieur) + (couche n°2 extérieur) + (couche n°3 centrale) + (couche n°4 intérieur) + (couche n°5 intérieur)

Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie

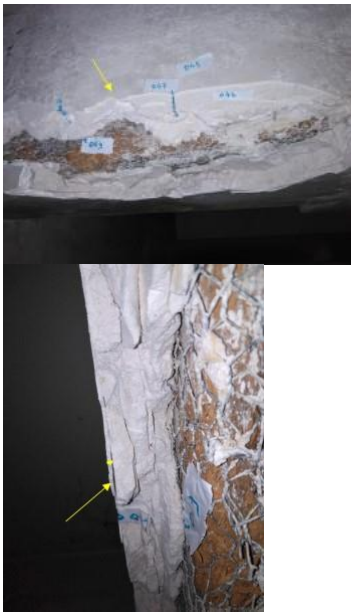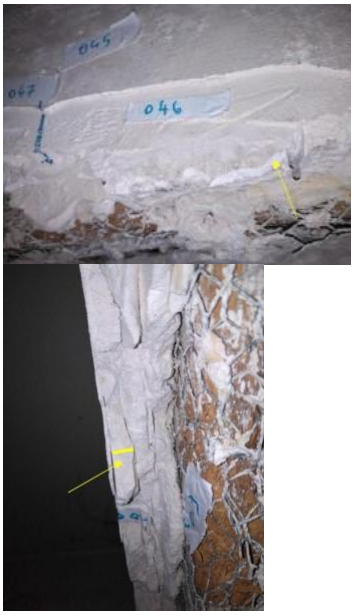Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°1 extérieur) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P045	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°045
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°2 extérieur) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P046	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°046

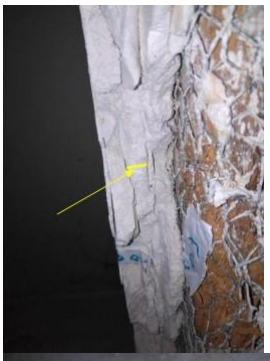
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°3 centrale) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie	 	P047	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°047
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°4 intérieur) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie	 	P048	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°048

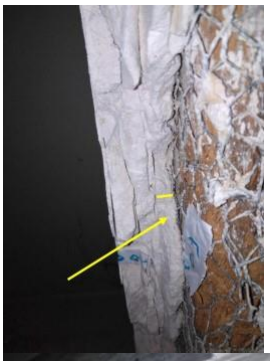Enduits à base de plâtre poutres (couche n°5 intérieur) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie	 	P049	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°049

ZPSO #50	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre poutres simple		
Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie			
Partie Inspectée / Description	**Photo**	**N° Ech.**	**Conclusion**
Enduits à base de plâtre poutres simple Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P050	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°050

ZPSO #51	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre couche basse

Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie

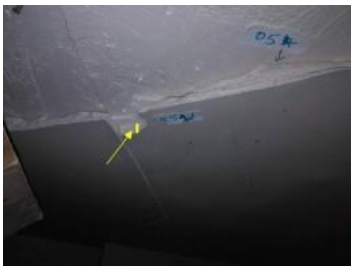Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre couche basse Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P051	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°051
Enduits à base de plâtre couche basse Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P052	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°052

ZPSO #53	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre couche intermédiaire

Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre couche intermédiaire Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P053	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°053
Enduits à base de plâtre couche intermédiaire Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P054	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°054

ZPSO #55	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre couche interne

Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre couche interne Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P055	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°055
Enduits à base de plâtre couche interne Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P056	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°056


ZPSO #57	Conduits et accessoires intérieurs / Enveloppes de calorifugeage + Calorifuges jaune

Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enveloppes de calorifugeage Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P057	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°057
Calorifuges jaune Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Chaufferie		P058	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°058

ZPSO #59	Conduits et accessoires intérieurs / Enveloppes de calorifugeage bituminée + Calorifuges rouge

Localisation : Sous-sol Bât D : Chaufferie, Cave

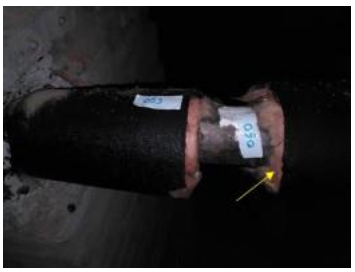Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enveloppes de calorifugeage bituminée Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Cave		P059	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°059
Calorifuges rouge Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol Bât D Cave		P060	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°060

ZPSO #61	Plafonds et faux plafonds / Peintures intumescentes rouge sur fixations

Localisation : R+3 Bât D : Combles

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Peintures intumescentes rouge sur fixations Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bât D Combles		P061	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°061
Peintures intumescentes rouge sur fixations Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bât D Combles		P062	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°062

ZPSO #63	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre latis (dans sondages existant)

Localisation : R+3 Bât D : Combles

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre latis (dans sondages existant) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bât D Combles		P063	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°063

ZPSO #64	Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités / Mortier de fixation tuiles ancien

Localisation : R+3/Extérieur Bât D : Toiture

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Mortier de fixation tuiles ancien Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3/Extérieur Bât D Toiture		P064	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°064

ZPSO #65	Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités / Mortier de fixation tuiles récent

Localisation : R+3/Extérieur Bât D : Toiture

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Mortier de fixation tuiles récent Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3/Extérieur Bât D Toiture		P065	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°065

ZPSO #66	Parois verticales extérieures et Façades / Enduits extérieurs

Localisation : R+3/Extérieur Bât D : Toiture

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits extérieurs Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3/Extérieur Bât D Toiture		P066	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°066

ZPSO #67	Plafonds et faux plafonds / Enduits de jointoiement et des plaques de plâtre

Localisation : RDC Bât E : Archives 1

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits de jointoiement et des plaques de plâtre Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât E Archives 1		P067	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°067

ZPSO #68	Plafonds et faux plafonds / Bandes calicot

Localisation : RDC Bât E : Archives 1

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Bandes calicot Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât E Archives 1		P068	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°068

ZPSO #69	Plafonds et faux plafonds / Flocages

Localisation : RDC Bât E : Couloir, Archives 1

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Flocages Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât E Couloir		P069	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°069

ZPSO #70	Conduits et accessoires intérieurs / Enduit de rebouchages du calfeutrements de clapets coupe-feu

Localisation : RDC Bât E : Couloir

Sous-sol Bât D : Cave

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit de rebouchages du calfeutrements de clapets coupe-feu Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât E Couloir		P070	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°070

ZPSO #71	Conduits et accessoires intérieurs / plaque de calfeutrements de clapets coupe-feu

Localisation : RDC Bât E : Couloir

Sous-sol Bât D : Cave

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
plaque de calfeutrements de clapets coupe-feu Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : RDC Bât E Couloir		P071	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°071

ZPSO #72	Conduits et accessoires intérieurs / Clapets coupe feu de 2007

Localisation : RDC Bât E : Couloir

Sous-sol Bât D : Cave

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Clapets coupe feu de 2007			Absence d'amiante Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

16. Récapitulatif et estimation des quantités de matériaux ou produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	Type de fibre	Quantité estimée	N° prélèvement ou Justification
Joints de porte coupe-feu (sur dormant)	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol	36	Fibres d'amiante de type chrysotile	1 u	P036
Isolant intérieur de porte CF	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol	37	Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite), riébeckite-amiante (crocidolite)	1 u	P037

17. Récapitulatif des matériaux ne contenant pas d'amiante

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	N° prélèvement ou Justification
Moulure	RDC Bât D : Grand Chambre	1	P001
Peintures décoratives sur moulure	RDC Bât D : Grand Chambre	2	P002
Colles moulure	RDC Bât D : Grand Chambre	3	P003
Colles moulure	RDC Bât D : Grand Chambre	3	P004

Moquette grise	RDC Bât D : Grand Chambre	5	P005
Moquette grise	RDC Bât D : Grand Chambre	5	P006
Colles non bitumineuses moquette grise	RDC Bât D : Grand Chambre	7	P007
Colles non bitumineuses moquette grise	RDC Bât D : Grand Chambre	7	P008
Tissus estrade pourpre voile	RDC Bât D : Grand Chambre	9	P009
Tissus estrade pourpre voile	RDC Bât D : Grand Chambre	9	P010
Tissus angles estrade pourpre cloué	RDC Bât D : Grand Chambre	11	P011
Tissus angles estrade pourpre cloué	RDC Bât D : Grand Chambre	11	P012
Tissus épais pied banquette	RDC Bât D : Grand Chambre	13	P013
Tissus épais pied banquette	RDC Bât D : Grand Chambre	13	P014
Tissus fin sous face banquettes	RDC Bât D : Grand Chambre	15	P015
Tissus fin sous face banquettes	RDC Bât D : Grand Chambre	15	P016
Peintures décoratives sur bois support luminaires	RDC Bât D : Grand Chambre	17	P017
Peintures décoratives sur bois support luminaires	RDC Bât D : Grand Chambre	17	P018
Enduits à base de plâtre sur brique forraine	R+3 Bât D : Combles - RDC Bât D : Grand Chambre, Vide Estrade	19	P019
Isolants anciens conducteurs sous estrade	RDC Bât D : Vide Estrade	20	P020
Dalles moquettes avec entrecouche noire	RDC Bât D : Grand Chambre	21	P021
Tresses filasse	RDC Bât D : Vide Estrade	22	P022
Ragréage haut	RDC Bât D : Vide Estrade	23	P023
Ragréage centre (blanc)	RDC Bât D : Vide Estrade	24	P024
Ragréage bas sur plancher	RDC Bât D : Vide Estrade	25	P025
Enduit de jointement ancien conduit de fumée	RDC Bât D : Vide Estrade	26	P026
Enduits à base de ciment	RDC Bât E : Couloir, Archives 1	27	P027
Enduits à base de ciment	RDC Bât E : Couloir, Archives 1	27	P028
Joints de vitrage	RDC Bât E : Archives 1	29	P029
Enduits à base de ciment	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol, Chaufferie	30	P030
Enduits à base de ciment	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol, Chaufferie	30	P031
Enduits à base de plâtre	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol,	32	P032

	Chaufferie		
Enduits à base de plâtre	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol, Chaufferie	32	P033
Enduits à base de plâtre reprise porte cave	Sous-sol Bât D : Chaufferie, Cave	34	P034
Joints des portes coupe-feu (sur battant)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	35	P035
Peinture porte CF	Sous-sol Bât D : Accès sous-sol	38	P038
Enduits à base de plâtre lissé (de surface)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	39	P039
Enduits à base de plâtre lissé (de surface)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	39	P040
Enduits à base de ciment (sous-face)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	41	P041
Enduits à base de ciment (sous-face)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	41	P043
Enduits à base de ciment lissé (de surface)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	42	P042
Joints entre éléments ancien conduit de fumée maçonné	Sous-sol Bât D : Chaufferie	44	P044
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°1 extérieur)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	45	P045
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°2 extérieur)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	45	P046
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°3 centrale)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	45	P047
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°4 intérieur)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	45	P048
Enduits à base de plâtre poutres (couche n°5 intérieur)	Sous-sol Bât D : Chaufferie	45	P049
Enduits à base de plâtre poutres simple	Sous-sol Bât D : Chaufferie	50	P050
Enduits à base de plâtre couche basse	Sous-sol Bât D : Chaufferie	51	P051
Enduits à base de plâtre couche basse	Sous-sol Bât D : Chaufferie	51	P052
Enduits à base de plâtre couche intermédiaire	Sous-sol Bât D : Chaufferie	53	P053
Enduits à base de plâtre couche intermédiaire	Sous-sol Bât D : Chaufferie	53	P054
Enduits à base de plâtre couche interne	Sous-sol Bât D : Chaufferie	55	P055
Enduits à base de plâtre couche interne	Sous-sol Bât D : Chaufferie	55	P056
Enveloppes de calorifugeage	Sous-sol Bât D : Chaufferie	57	P057
Calorifuges jaune	Sous-sol Bât D : Chaufferie	57	P058
Enveloppes de calorifugeage bituminée	Sous-sol Bât D : Chaufferie, Cave	59	P059
Calorifuges rouge	Sous-sol Bât D : Chaufferie, Cave	59	P060

Peintures intumescentes rouge sur fixations	R+3 Bât D : Combles	61	P061
Peintures intumescentes rouge sur fixations	R+3 Bât D : Combles	61	P062
Enduits à base de plâtre latis (dans sondages existant)	R+3 Bât D : Combles	63	P063
Mortier de fixation tuiles ancien	R+3/Extérieur Bât D : Toiture	64	P064
Mortier de fixation tuiles récent	R+3/Extérieur Bât D : Toiture	65	P065
Enduits extérieurs	R+3/Extérieur Bât D : Toiture	66	P066
Enduits de jointoiement et des plaques de plâtre	RDC Bât E : Archives 1	67	P067
Bandes calicot	RDC Bât E : Archives 1	68	P068
Flocages	RDC Bât E : Couloir, Archives 1	69	P069
Enduit de rebouchages du calfeutrements de clapets coupe-feu	RDC Bât E : Couloir - Sous-sol Bât D : Cave	70	P070
plaque de calfeutrements de clapets coupe-feu	RDC Bât E : Couloir - Sous-sol Bât D : Cave	71	P071
Clapets coupe feu de 2007	RDC Bât E : Couloir - Sous-sol Bât D : Cave	72	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante


18. Schémas

Voir pages suivantes :

- RDC Bât E (1/2) Sondages et prélèvements
- Sous-sol Grand'Chambre (1/2) Sondages et prélèvements
- RDC Grand'Chambre (1/2) Sondages et prélèvements
- Combles Grand'Chambre (1/2) Sondages et prélèvements
- Toiture Grand'Chambre (1/2) Sondages et prélèvements

- RDC Bât E (2/2) MCPA
- Sous-sol Grand'Chambre (2/2) MCPA
- RDC Grand'Chambre (2/2) MCPA
- Combles Grand'Chambre (2/2) MPCA
- Toiture Grand'Chambre (2/2) MPCA

Planche de localisation des sondages et prélèvements	RDC Bât E (1/2)

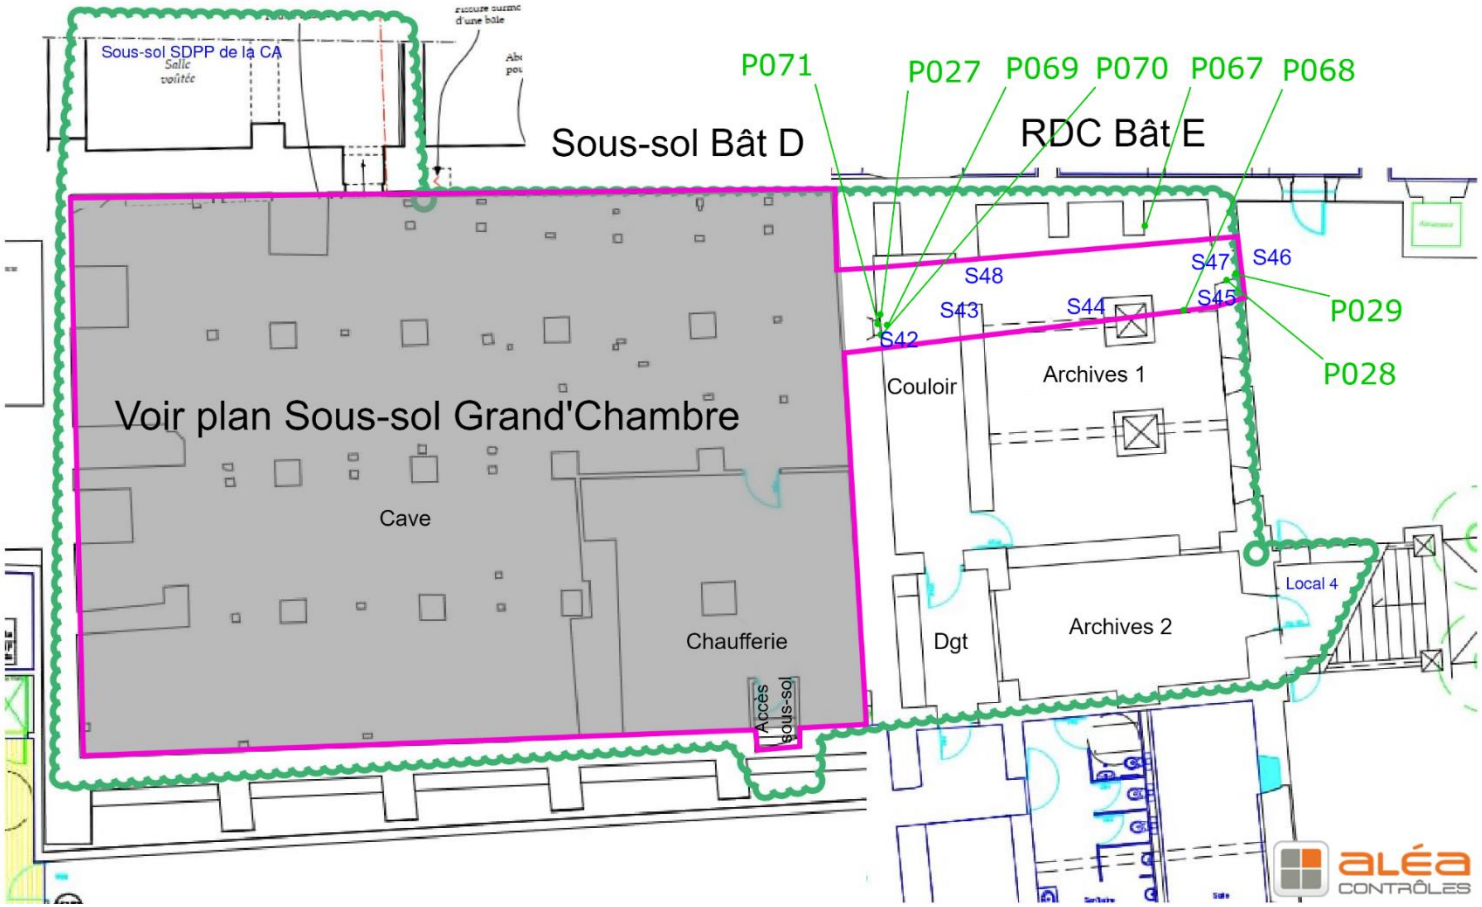

Matériaux et produits sans amiante


P027	Enduits à base de ciment	P028	Enduits à base de ciment
P029	Joints de vitrage	P067	Enduits de jointoiement et des plaques de plâtre
P068	Bandes calicot	P069	Flocages
P070	Enduit de rebouchages du calfeutrements de clapets coupe-feu	P071	plaque de calfeutrements de clapets coupe-feu

- Périmètre d'investigations
- Voir plan sous-sol Grand'Chambre
- elm — Examen en présence
- elm — Examen en absence
- P00X — Prélèvement
- S — Sondage

10 Place du Salin, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2601-008	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des sondages et prélèvements

Sous-sol Grand'Chambre (1/2)

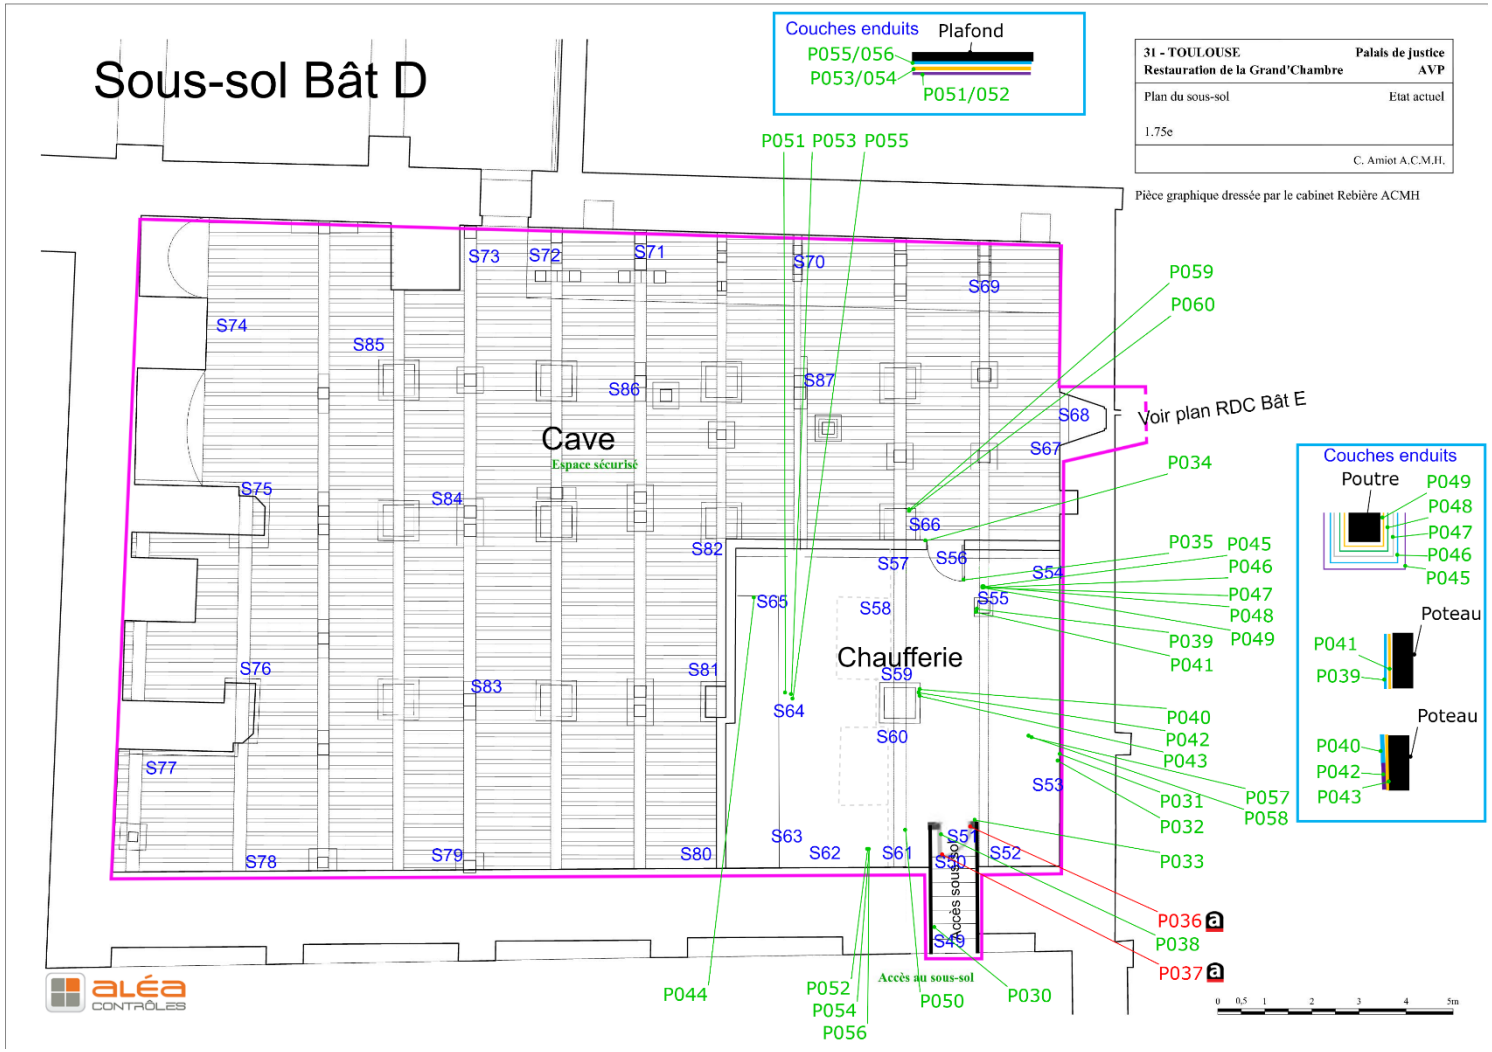

Matériaux et produits contenant de l'amiante

P036	Joints de porte coupe-feu (sur dormant)	P037	Isolant intérieur de porte CF

Matériaux et produits sans amiante

P030	Enduits à base de ciment	P031	Enduits à base de ciment
P032	Enduits à base de plâtre	P033	Enduits à base de plâtre
P034	Enduits à base de plâtre reprise porte cave	P035	Joints des portes coupe-feu (sur battant)
P038	Peinture porte CF	P039	Enduits à base de plâtre lissé (de surface)
P040	Enduits à base de plâtre lissé (de surface)	P041	Enduits à base de ciment (sous-face)
P042	Enduits à base de ciment lissé (de surface)	P043	Enduits à base de ciment (sous-face)
P044	Joints entre éléments ancien conduit de fumée maçonné	P045	Enduits à base de plâtre poutres (couche n°1 extérieur)
P046	Enduits à base de plâtre poutres (couche n°2 extérieur)	P047	Enduits à base de plâtre poutres (couche n°3 centrale)
P048	Enduits à base de plâtre poutres (couche n°4 intérieur)	P049	Enduits à base de plâtre poutres (couche n°5 intérieur)
P050	Enduits à base de plâtre poutres simple	P051	Enduits à base de plâtre couche basse
P052	Enduits à base de plâtre couche basse	P053	Enduits à base de plâtre couche intermédiaire
P054	Enduits à base de plâtre couche intermédiaire	P055	Enduits à base de plâtre couche interne
P056	Enduits à base de plâtre couche interne	P057	Enveloppes de calorifugeage
P058	Calorifuges jaune	P059	Enveloppes de calorifugeage bituminée
P060	Calorifuges rouge		

Périmètre d'intervention

elm Examen en présence

elm Examen en absence

P00X Prélèvement


S Sondage

Présence d'amiante

10 Place du Salin, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2601-008	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des sondages et prélèvements

Grand'Chambre (1/2)

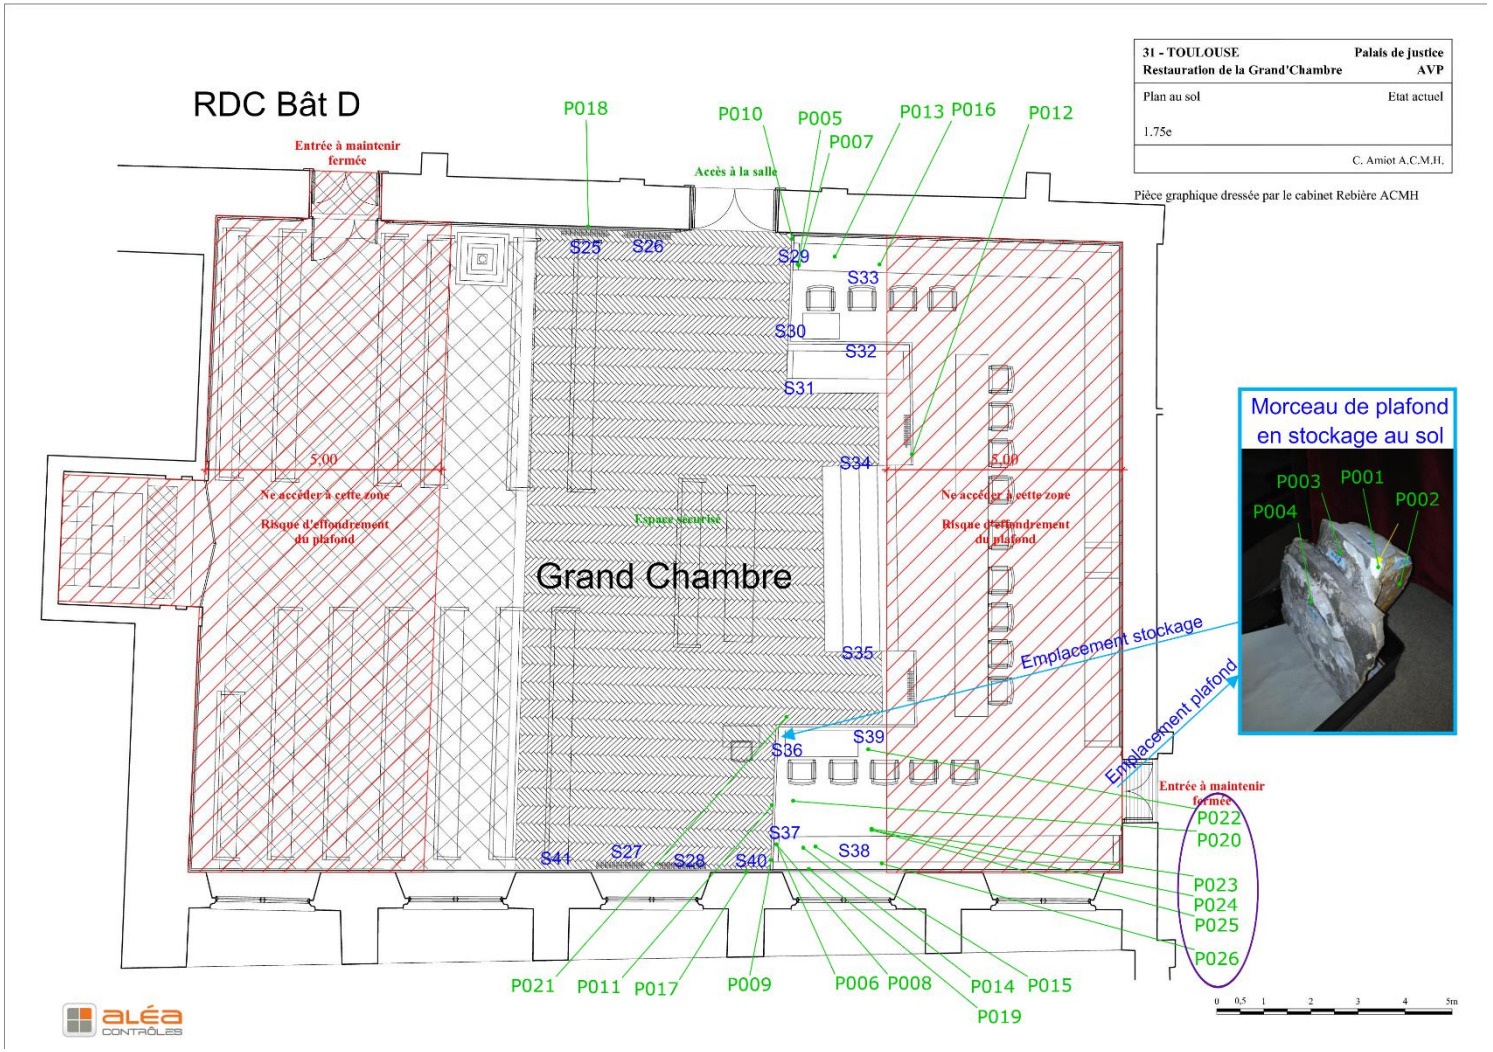

Matériaux et produits sans amiante

P001	Moulure	P002	Peintures décoratives sur moulure
P003	Colles moulure	P004	Colles moulure
P005	Moquette grise	P006	Moquette grise
P007	Colles non bitumineuses	P008	Colles non bitumineuses
P009	Tissus estrade	P010	Tissus estrade
P011	Tissus angles estrade	P012	Tissus angles estrade
P013	Tissus épais pied banquette	P014	Tissus épais pied banquette
P015	Tissus fin sous face banquettes	P016	Tissus fin sous face banquettes
P017	Peintures luminaires	P018	Peintures luminaires
P019	Enduits à base de plâtre sur brique forraine	P020	Isolants
P021	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P022	Tresses filasse
P023	Ragréage haut	P024	Ragréage centre (blanc)
P025	Ragréage bas sur plancher	P026	Enduit de jointement ancien conduit de fumée

Prélèvements dans "espace sous estrade"

elm Examen en présence


elm Examen en absence

P00X Prélèvement

S Sondage

10 Place du Salin, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2601-008	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des sondages et prélèvements	Combles Grand'Chambre (1/2)

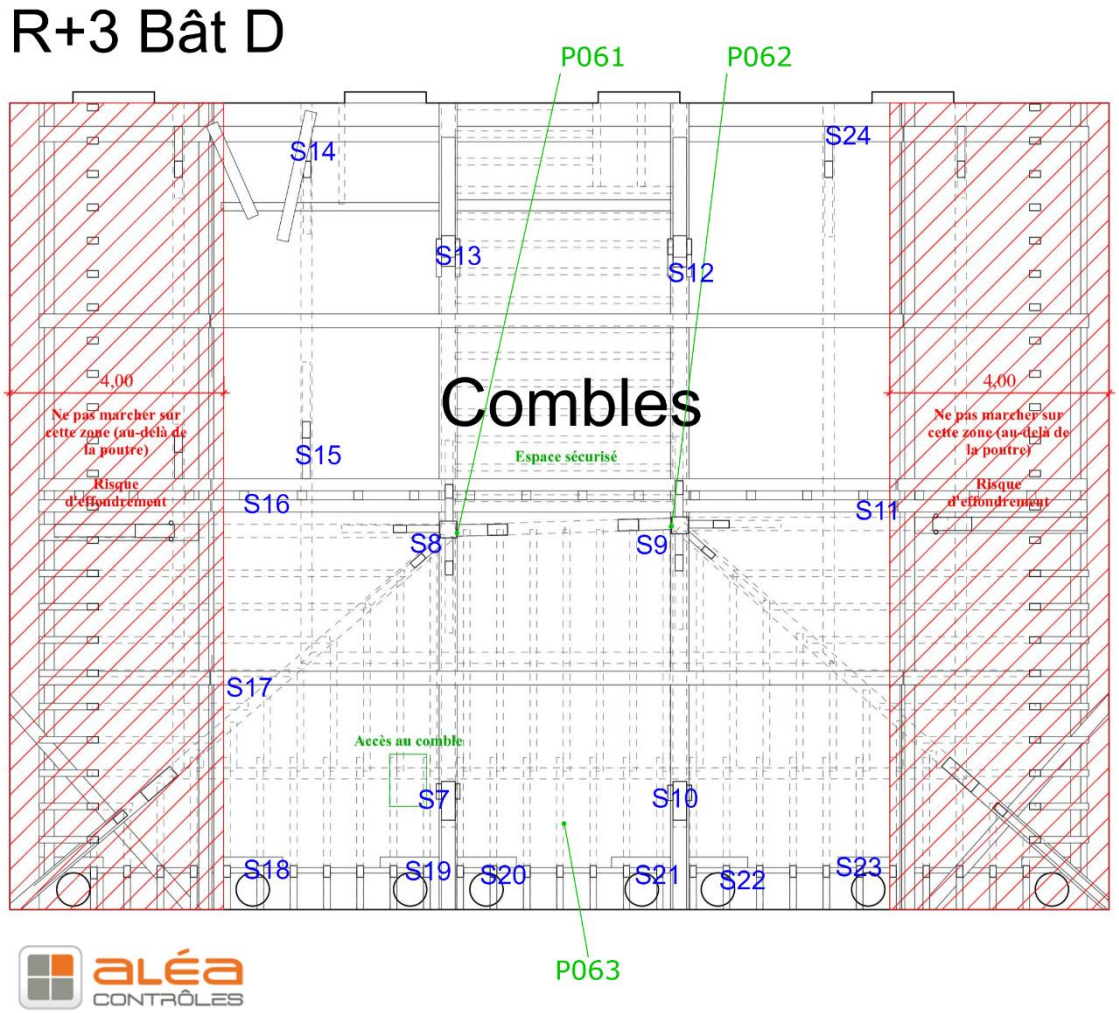

Matériaux et produits sans amiante

P061 Peintures rouge

P062 Peintures rouge

P063 Enduits à base de plâtre latis (dans sondages existant)


elm Examen en absence

P00X Prélèvement

S Sondage

10 Place du Salin, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2601-008	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des sondages et prélèvements	Toiture Grand'Chambre (1/2)

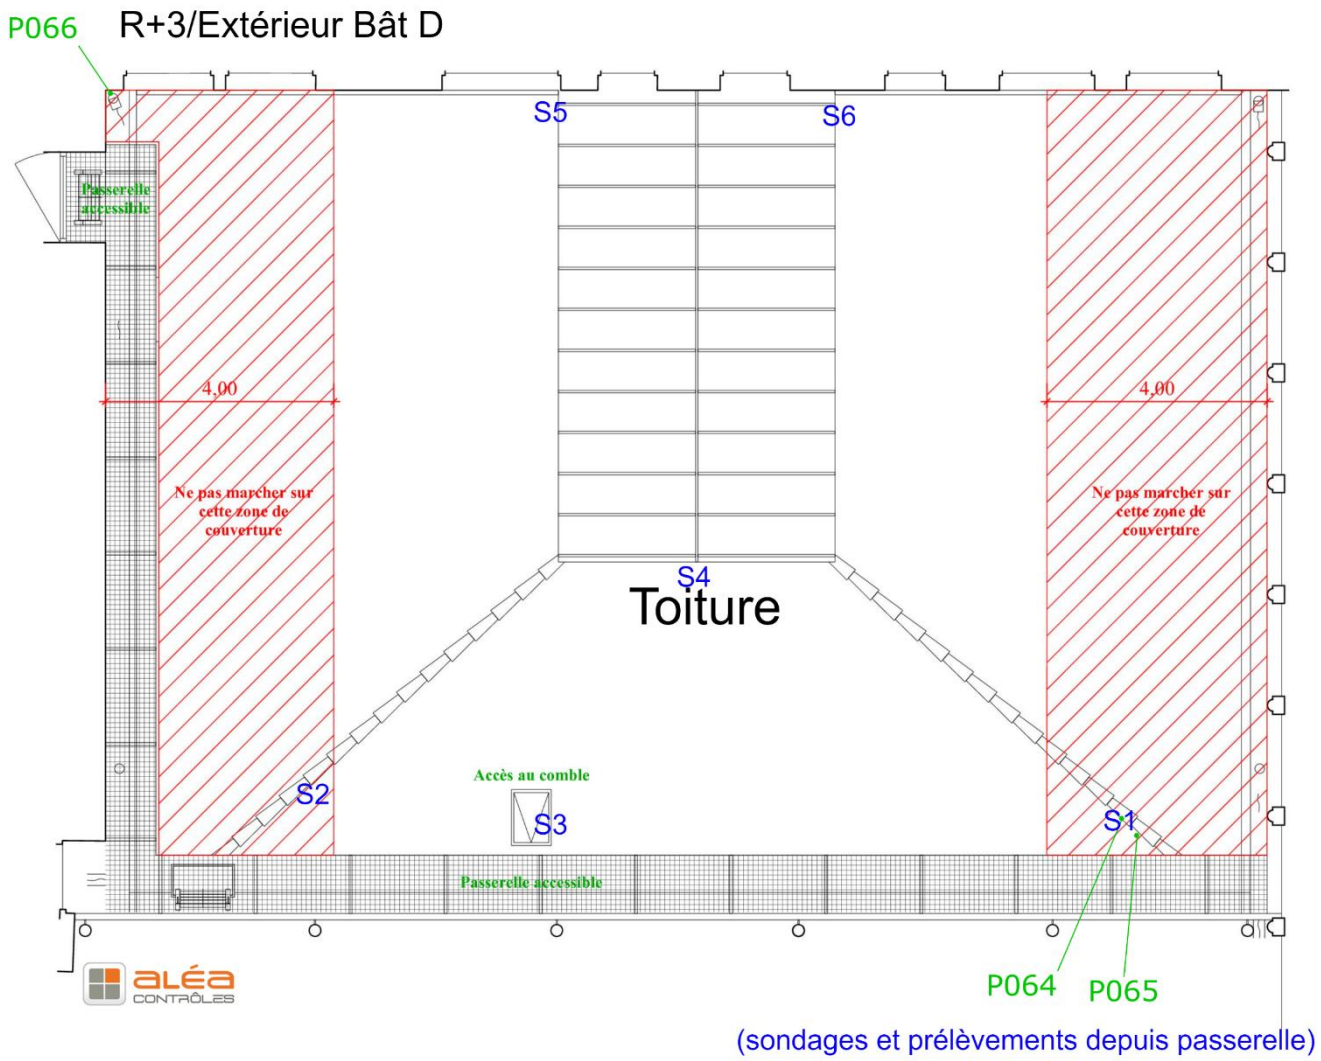


Matériaux et produits sans amiante

P066 Enduits extérieurs
P064 Mortier de fixation tuiles
P065 Mortier de fixation tuiles

elm Examen en absence
P00X Prélèvement
S Sondage

10 Place du Salin, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2601-008	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des étendues MPCA	RDC Bât E (2/2)

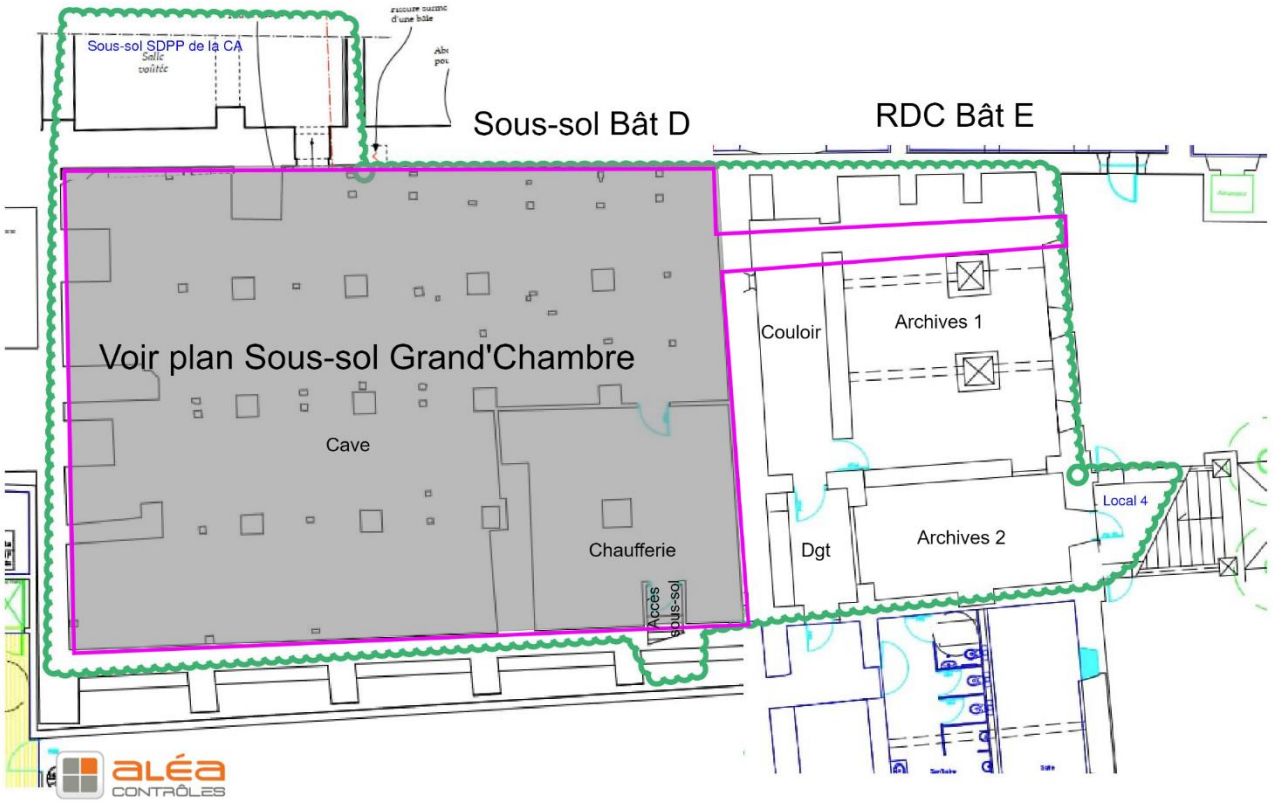

Périmètre d'investigations

Voir plan sous-sol Grand'Chambre


Examen en présence

Présence d'amiante

10 Place du Salin, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2601-008	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des étendues MPCA

Sous-sol Grand'Chambre (2/2)

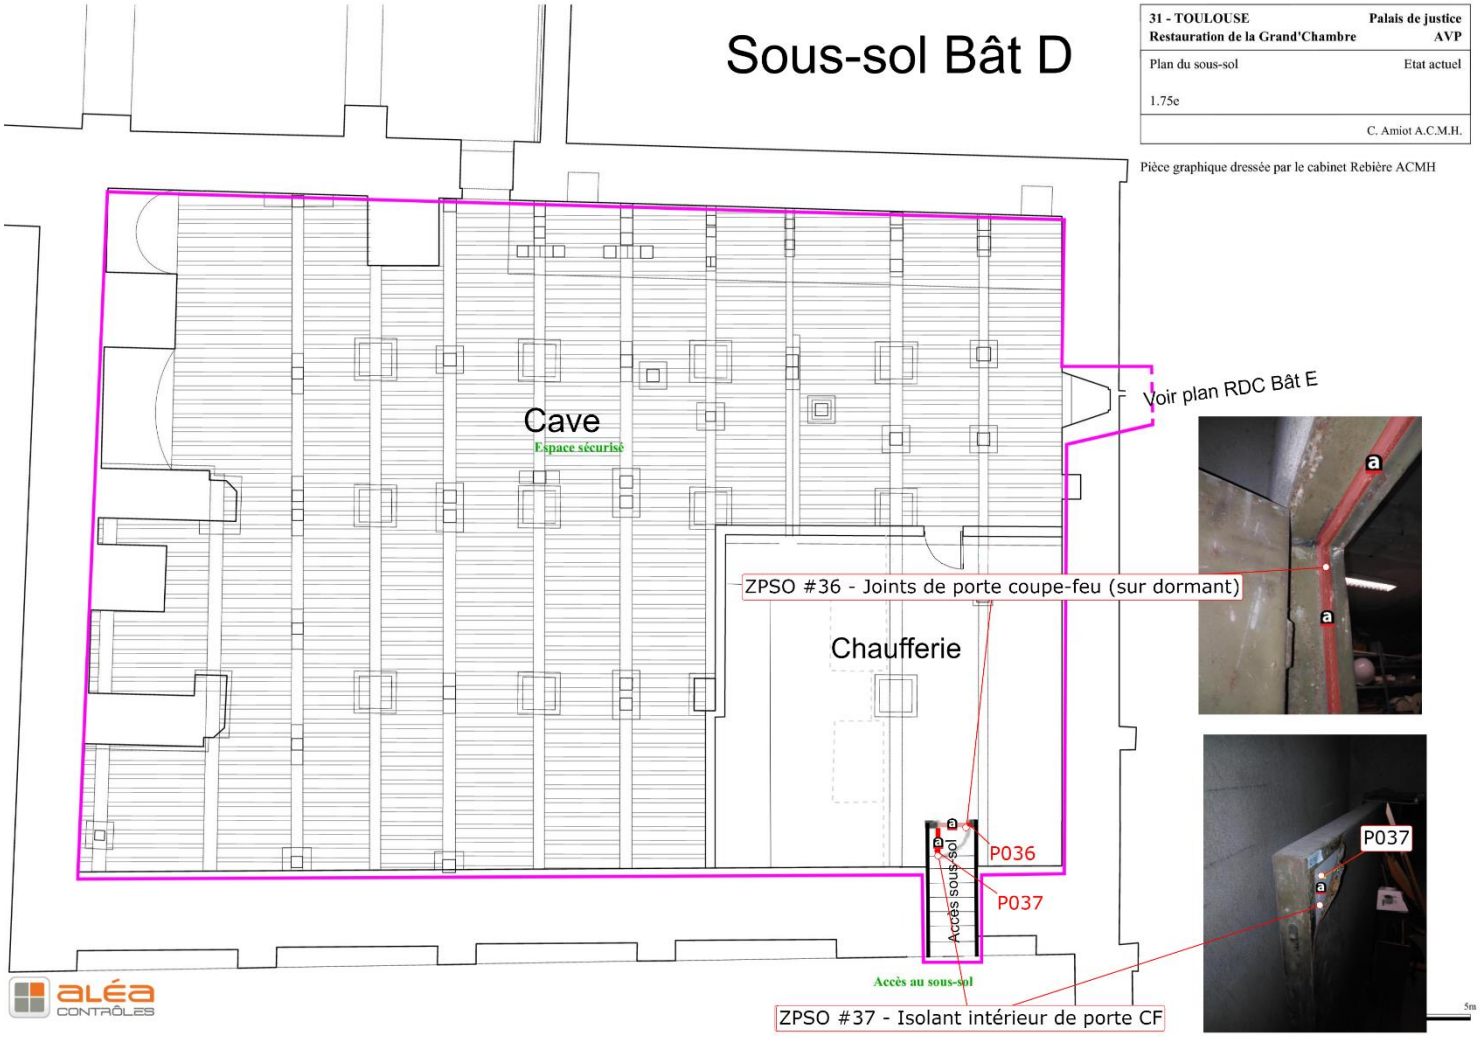

Matériaux et produits contenant de l'amiante

P036 Joints de porte coupe-feu (sur dormant)

P037 Isolant intérieur de porte CF

ZPSO #36 - Joints de porte coupe-feu (sur dormant)

ZPSO #37 - Isolant intérieur de porte CF

Périmètre d'intervention

elm Examen en présence

P00X Prélèvement

ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage


Présence d'amiante

10 Place du Salin, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2601-008	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des étendues MPCA	Grand'Chambre (2/2)

elm Examen en présence


a Présence d'amiante

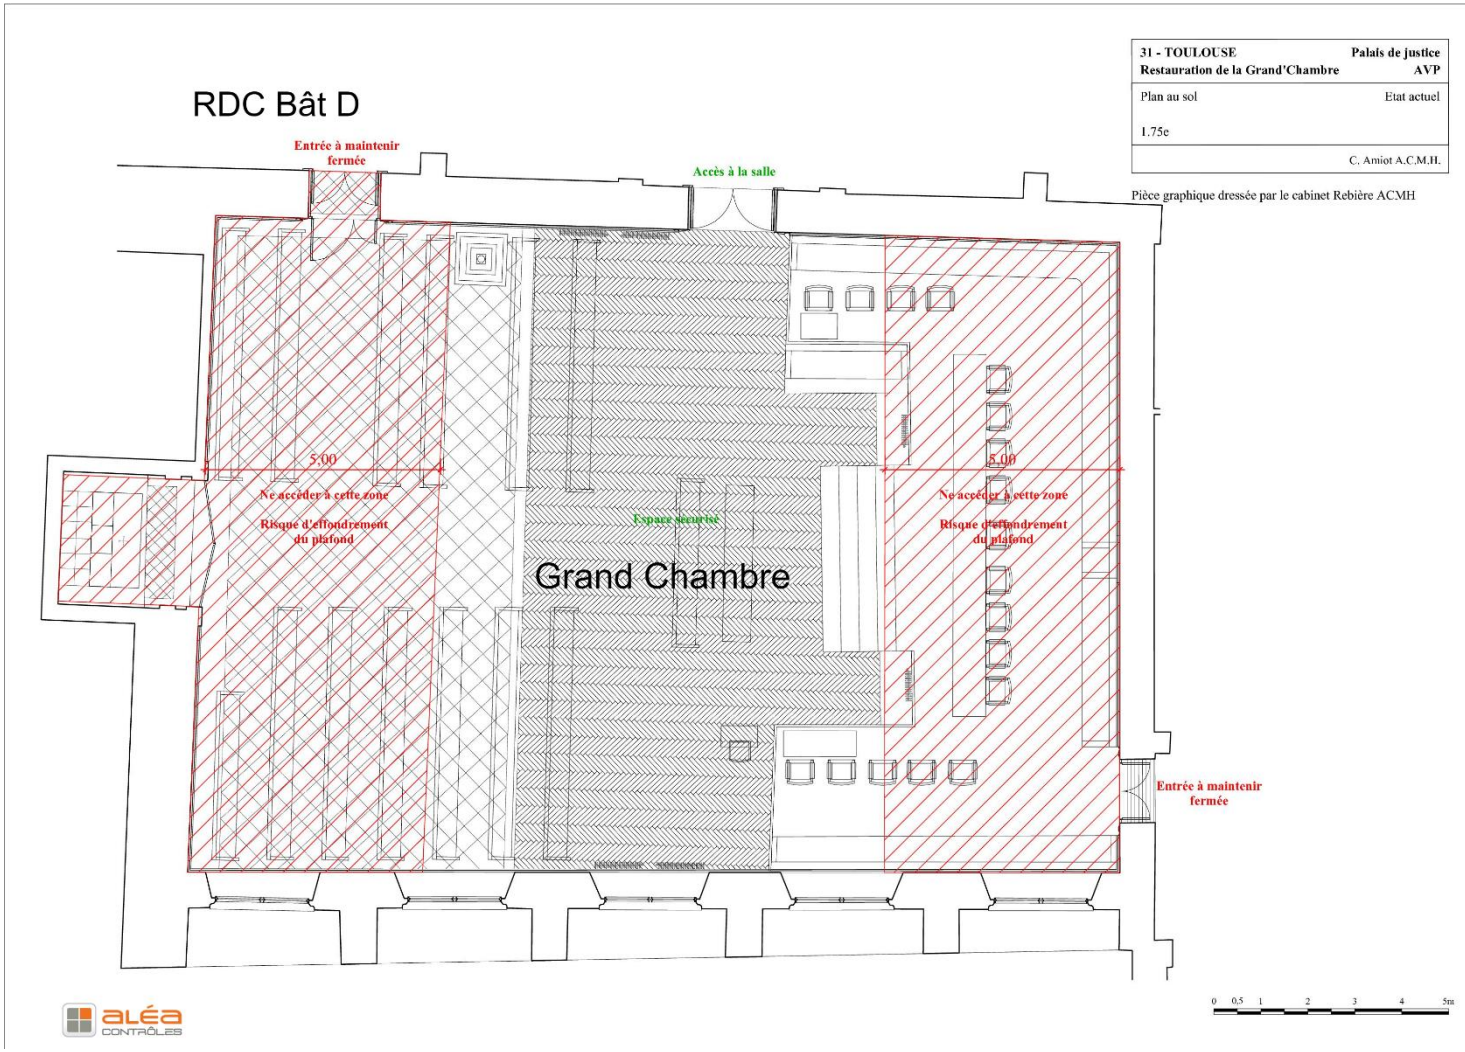

10 Place du Salin, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2601-008	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des étendues MPCA	Combles Grand'Chambre (2/2)

R+3 Bât D

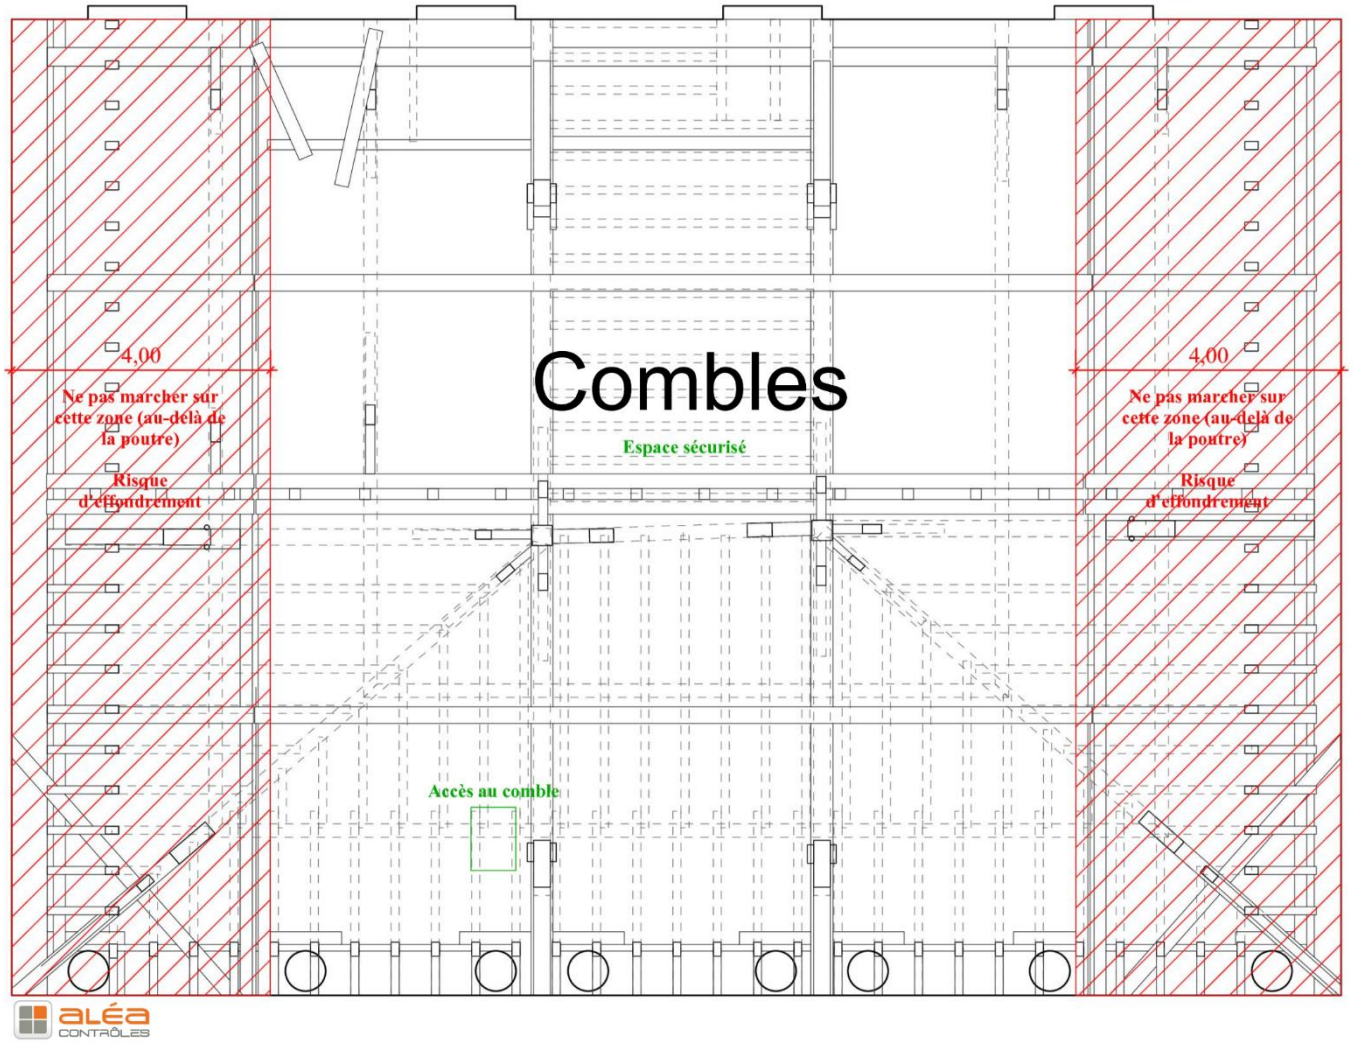


elm Examen en présence

Présence d'amiante

10 Place du Salin, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2601-008	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des étendues MPCA	Toiture Grand'Chambre (2/2)

R+3/Extérieur Bât D

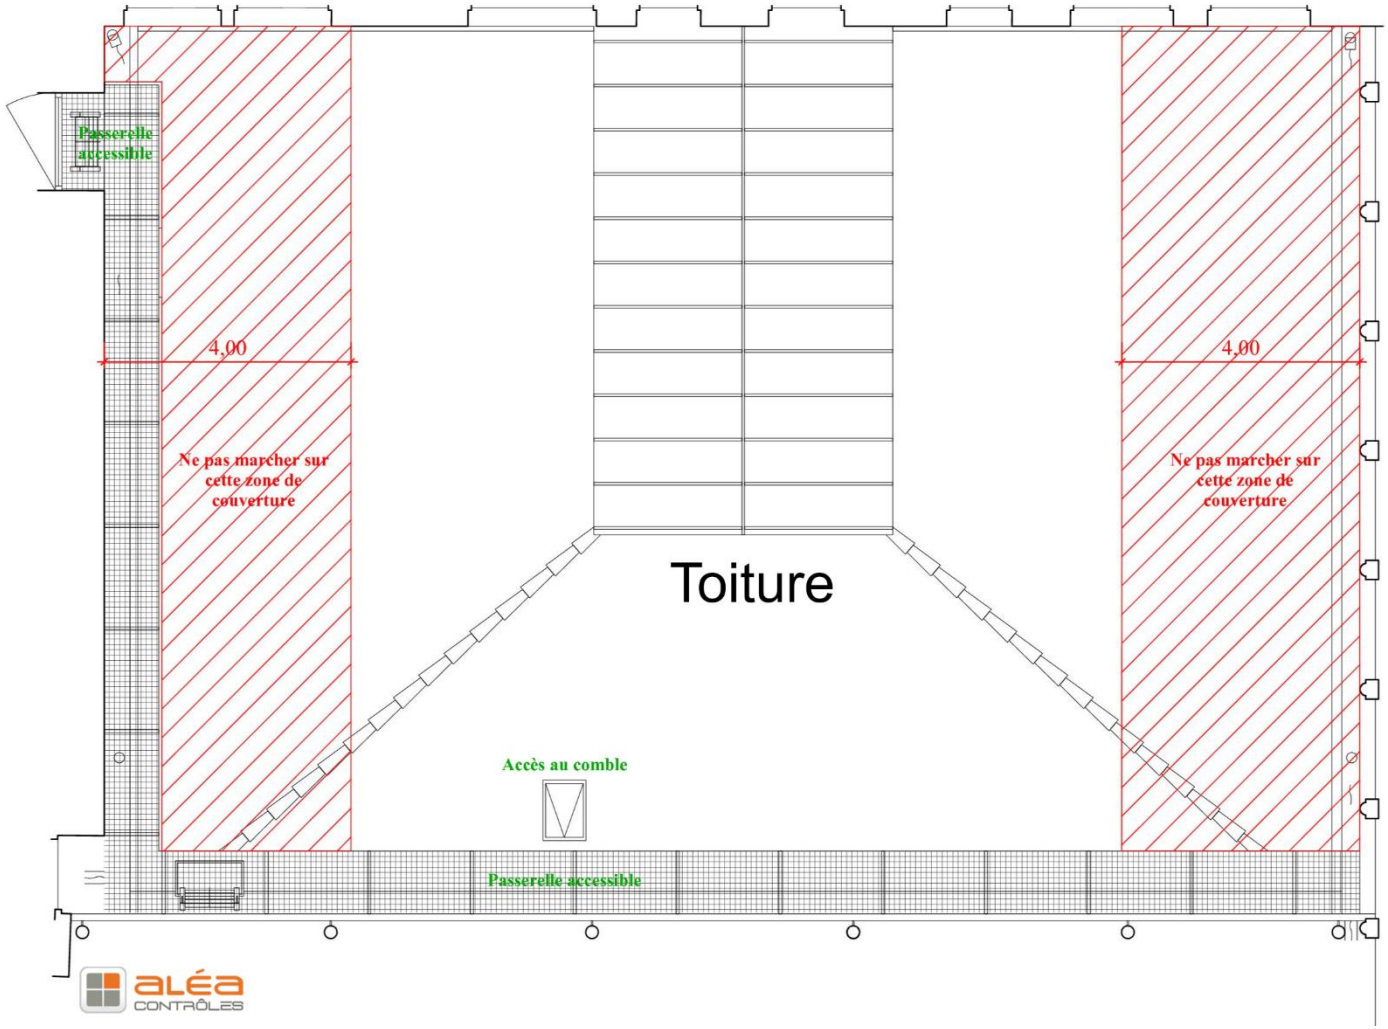

elm Examen en présence

Présence d'amiante

10 Place du Salin, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2601-008	Monsieur Thomas GARRIGOU

19. Investigations complémentaires à mener

Zones, surfaces ou linéaires	Justification	Actions à réaliser
Parties du combles et de la Grand'Chambre définis non accessible par le plan fournis par Christophe AMIOT - A. C. M. H	Interdiction d'accès pour soucis structurel (risque d'effondrement)	Après stabilisation de la structure investigation ou extension des zones d'investigation

20. Documentation disponible

Type de document technique	Nom du document technique	Date	Opérateur et société	Utilisable
Date de délivrance du permis de construire - les années de construction - modifications - réhabilitation				Non fourni
Destination des locaux (actuelles et passées)				Non fourni
Documents concernant la construction - les caractéristiques particulières des locaux - les modifications survenues dans les locaux - les dates et la nature des travaux réalisés (réparations - restaurations - entretiens - réhabilitation - ...)				Non fourni
Eléments d'information nécessaire à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Plan avec zones d'exclusions	01/12/2025	C. AMIOT - A. C. M. H	oui
Liste des immeubles ou parties d'immeuble bâtis concernés				Non fourni
Plans ou croquis à jour de l'immeuble bâti	Plan	04/02/2026	C. AMIOT - A. C. M. H	oui
Programme détaillé des travaux				Non fourni
Rapports antérieurs amiante				Non fourni

(*) Le donneur d'ordre doit établir et finaliser ce document à l'aide de l'opérateur de repérage. Ce document, relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, doit notamment tenir compte des modalités d'accès des locaux.

21. Observations

Présence d'un risque d'effondrement du plafond de la Grand'chambre définis par le donneur d'ordre. Il nous a fournis un plan d'interdiction d'accès dans lesquels les investigations des matériaux n'as pu être réalisé.

22. Modalités de repérage

Le repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante, d'après l'arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, porte sur les produits et matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble suivant la liste définie en annexe I de l'arrêté précité (voir conditions particulières du présent document).

Le repérage est réalisé si possible après évacuation et enlèvement des mobiliers des parties du bâtiment concernées par les travaux, de manière que tous les composants soient accessibles.

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe I de l'arrêté du 23 janvier 2020 et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection de l'ouvrage est exhaustive au regard du programme des travaux. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers (les plénums, gaines techniques, gaines maçonnées, joints de cloisons et cloisons démontables par exemple doivent être examinés).

Le repérage ne se limite pas à la zone où les travaux sont envisagés. Il s'étend aux locaux contigus et à ceux des niveaux inférieurs.

Lorsque l'opérateur de repérage à la connaissance des matériaux ou produits qui contiennent effectivement de l'amiante, il peut revenir sur site pour estimer leurs quantités. Les quantités données dans ce rapport sont estimatives et sont données à titre indicatives.

23. Conditions particulières d'exécution

Liste des matériaux à repérer dans le cadre du repérage amiante avant travaux (liste non exhaustive)
(Annexe I : Liste minimale des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer de l'arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis)

Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») – Plaques en matériaux bitumineux - Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises en fibrociment - Bardeaux bitumineux (« shingles »).
Éléments de sous-toiture	Pare-vapeur, pare pluie - Isolants fibreux en sous toiture - Flocages, enduits projetés
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation - Conduits d'eaux pluviales - Garnissage des joints de dilatation - Joints de dilatation - Couvre-joints - Tresses d'étanchéité à l'air - Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.) - Jonctions bitumineuses - Solins en fibre ciment - Colle des solins en fibre ciment
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur - Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) - Parties planes ou relevés : complexes asphaltés - Colles, produits d'accrochage
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) - Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature - Garnitures de friction sur fenêtres basculantes

Parois verticales extérieures et Façades	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou**

	à sonder
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage - Ardoises composites hors fibrociment - Ardoises en fibrociment - Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses - Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) - Peintures des bardages métalliques Flocages, enduits projetés - Carton-amiante - Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs - Revêtements plastiques épais (RPE) - Peintures sur béton - Enduits pelliculaires de lissage/débullage - Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants - Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire - Garnissage des joints de dilatation - Joints de dilatation - Couvre-joints - Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - Garnitures de friction sur fenêtres basculantes - Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.) - Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation - Conduits d'eaux (pluviales et usées) - Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

Parois verticales intérieures	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Murs et cloisons maçonnés	Flocages. – Enduits à base de plâtre ou ciment ou projetés, lissés ou talochés - Enduits de ragréage, débullage, lissage - Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu – Fourreaux (carton, fibres ciment...)
Poteaux	Flocages. – Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) – Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison – Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non – Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés – Flocages - Plots de colle fixant les cloisons au mur - Bandes calicot - enduits de jointoiement des plaques de plâtre - Sous couches des tissus muraux - Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac - Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment -
Gaines et coffres verticaux	Flocages - Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) - Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) - Bandes calicot - enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné - Panneaux (fibres-ciment, ...) - Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) - Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite - Isolants intérieurs des portes

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles - Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment - Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) - Revêtements bitumineux - Peintures intumescentes

Plafonds et faux plafond	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Plafonds.	Flocages. – Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés - Panneaux collés vissés ou cloués - Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) - Bandes calicot - Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - Sous couches des tissus muraux - Peintures intumescentes - Revêtements bitumineux - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) – Résines - Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages - Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) - Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich) - Peintures intumescentes - Revêtements bitumineux - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) - Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure) -
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages - Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) - Bandes calicot - Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné - Panneaux (fibres-ciment, ...) - Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques. – Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux - Pare vapeur - Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond - Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur) -
Suspentes et contrevents	Flocage – Protections en plâtre – Peintures intumescentes

Planchers et planchers techniques	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Revêtements de sols	Dalles de sol - Nez de marche - Dalles moquettes avec entre couche noire - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - Colles bitumineuses - Colles non bitumineuses – Moquette - Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.) - Peintures de sol - Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage - Revêtements de sols sportifs - Joints de dilatation et d'assemblage - Joints de cantonnement sur faux planchers - Enduit de cuvelage - Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

Conduits et accessoires intérieurs	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...) – Matelas - Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage - Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides - Rubans adhésifs – Mastics - Conduits en fibres-ciment, manchons - Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage) - Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets/volets coupe-feu.	Clapets (tunnels, lames, joints) - Volets coupe-feu y compris ossature - Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures.	Conduits et vidoirs en fibres-ciment - Joints d'étanchéité des trappes

Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...) - Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre) – Isolants – Colles - Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs - Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits... - Tresses - Joints plats

Équipements divers et accessoires	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois, à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages – Bourres – Tresses – Calorifugeages - Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides - Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.) - Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques.
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés -Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment

Fondations et soubassements	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie

Aménagements, voiries et réseaux divers	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

Le repérage amiante en cas de démolition peut donner lieu à des démontages et sondages destructifs.

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

HABITAT CONSEIL DIAGNOSTIC
Monsieur Thomas GARRIGOU
55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment Hermes
31400 TOULOUSE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 — Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 — Page1/33
Dossier N° : 26K001069 — Date de réception : 15/01/2026 — Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	DIA-BZR04-2601-008-001 Plafond Moulure Moulure Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Moulure	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	DIA-BZR04-2601-008-002 Plafonds Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes.) Peintures décoratives sur moulure Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Peintures décoratives sur moulure	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page2/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	DIA-BZR04-2601-008-003 Plafonds Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage Colles moulure Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Colles moulure	Matériau de type colle (blanc) (plâtreux)(i)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	DIA-BZR04-2601-008-004 Plafonds Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage Colles moulure Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Colles moulure	Matériau de type colle (blanc) (plâtreux)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	DIA-BZR04-2601-008-005 Revêtements de sols Moquette Moquette grise Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Moquette grise	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) (clair)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page3/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	DIA-BZR04-2601-008-006 Revêtements de sols Moquette Moquette grise Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Moquette grise	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) (clair)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	DIA-BZR04-2601-008-007 Revêtements de sols Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses moquette grise Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Colles non bitumineuses moquette grise	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron) (fibreux)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	DIA-BZR04-2601-008-008 Revêtements de sols Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses moquette grise Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Colles non bitumineuses moquette grise	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron) (fibreux)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page4/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009 (1)	DIA-BZR04-2601-008-009 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Tissus estrade pourpre voile Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Tissus estrade pourpre voile	Matériau de type maillage de fibres (rouge) (violet)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	DIA-BZR04-2601-008-010 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Tissus estrade pourpre voile Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Tissus estrade pourpre voile	Matériau de type maillage de fibres (rouge) (violet)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page5/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011 (1)	DIA-BZR04-2601-008-011 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Tissus angles estrade pourpre cloué Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Tissus angles estrade pourpre cloué	Matériau de type maillage de fibres (rouge) (violet)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
012 (1)	DIA-BZR04-2601-008-012 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Tissus angles estrade pourpre cloué Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Tissus angles estrade pourpre cloué	Matériau de type maillage de fibres (rouge) (violet)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page6/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013 (1)	DIA-BZR04-2601-008-013 Banquette Tissus Tissus épais pied banquette Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Tissus épais pied banquette	Matériau de type maillage de fibres (marron)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
014 (1)	DIA-BZR04-2601-008-014 Banquette Tissus Tissus épais pied banquette Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Tissus épais pied banquette	Matériau de type maillage de fibres (marron)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
015	DIA-BZR04-2601-008-015 Banquette Tissus Tissus fin sous face banquettes Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Tissus fin sous face banquettes	Matériau de type maillage de fibres (marron)(ii)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page7/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (1)	DIA-BZR04-2601-008-016 Banquette Tissus Tissus fin sous face banquettes Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Tissus fin sous face banquettes	Matériau de type maillage de fibres	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
017 (2)	DIA-BZR04-2601-008-017 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, .) Peintures décoratives sur bois support luminaires Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Peintures décoratives sur bois support luminaires	Matériau de type peinture (beige) (jaune) (brillant)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page8/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018 (2)	DIA-BZR04-2601-008-018 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, .) Peintures décoratives sur bois support luminaires Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Peintures décoratives sur bois support luminaires	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	DIA-BZR04-2601-008-019 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre sur brique forraine Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre sur brique forraine	Matériau semi-dur de type enduit (jaune)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page9/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020 (2)	DIA-BZR04-2601-008-020 canalisations électriques préfabriquées Isolants Isolants anciens conducteurs sous estrade Pièce concernée : Vide Estrade(RDC Bât D) – Couche à analyser : Isolants anciens conducteurs sous estrade	Matériau semi-dur (noir) ; matériau de type maillage de fibres (marron)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	DIA-BZR04-2601-008-021 Revêtements de sols Dalles moquettes avec entrecouche noire Dalles moquettes avec entrecouche noire Pièce concernée : Grand Chambre(RDC Bât D) – Couche à analyser : Dalles moquettes avec entrecouche noire	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) (bitumineux)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page10/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	DIA-BZR04-2601-008-022 Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Tresses Tresses filasse Pièce concernée : Vide Estrade(RDC Bât D) – Couche à analyser : Tresses filasse	Matériau de type tresse de fibres ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	DIA-BZR04-2601-008-023 Plancher Ragréage Ragréage haut Pièce concernée : Vide Estrade(RDC Bât D) – Couche à analyser : Ragréage haut	Matériau semi-dur de type ragréage (marron)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	DIA-BZR04-2601-008-024 Plancher Ragréage Ragréage centre (blanc) Pièce concernée : Vide Estrade(RDC Bât D) – Couche à analyser : Ragréage centre (blanc)	Matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page11/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	DIA-BZR04-2601-008-025 Plancher Ragréage Ragréage bas sur plancher Pièce concernée : Vide Estrade(RDC Bât D) – Couche à analyser : Ragréage bas sur plancher	Matériau semi-dur de type ragréage (marron)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	DIA-BZR04-2601-008-026 Conduit Enduit de jointement Enduit de jointement ancien conduit de fumée Pièce concernée : Vide Estrade(RDC Bât D) – Couche à analyser : Enduit de jointement ancien conduit de fumée	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau (orange) en traces	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	DIA-BZR04-2601-008-027 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment Pièce concernée : Couloir(RDC Bât E) – Couche à analyser : Enduits à base de ciment	Matériau semi-dur de type joint (blanc) (cémenteux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page12/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	DIA-BZR04-2601-008-028 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment Pièce concernée : Archives 1(RDC Bât E) – Couche à analyser : Enduits à base de ciment	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	DIA-BZR04-2601-008-029 Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints de vitrage Pièce concernée : Archives 1(RDC Bât E) – Couche à analyser : Joints de vitrage	Matériau souple de type joint (blanc)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page13/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	DIA-BZR04-2601-008-030 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment Pièce concernée : Accès sous-sol(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de ciment	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	DIA-BZR04-2601-008-031 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de ciment	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page14/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	DIA-BZR04-2601-008-032 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	DIA-BZR04-2601-008-033 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / LP5L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page15/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	DIA-BZR04-2601-008-034 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre reprise porte cave Pièce concernée : Cave(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre reprise porte cave	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	DIA-BZR04-2601-008-035 Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) Joints des portes coupe-feu (sur battant) Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Joints des portes coupe-feu (sur battant)	Matériau souple de type joint (marron) ; matériau semi-dur (blanc) (fibreux)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page16/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	DIA-BZR04-2601-008-036 Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) Joints de porte coupe-feu (sur dormant) Pièce concernée : Accès sous-sol(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Joints de porte coupe-feu (sur dormant)	Matériau de type maillage de fibres	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
037	DIA-BZR04-2601-008-037 Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Isolants intérieurs des portes Isolant intérieur de porte CF Pièce concernée : Accès sous-sol(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Isolant intérieur de porte CF	Matériau semi-dur (blanc) (fibreux)	**MOLP** * / F437	6 / 6 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite), riébeckite-amiante (crocidolite) *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page17/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	DIA-BZR04-2601-008-038 Porte coupe-feu Peinture Peinture porte CF Pièce concernée : Accès sous-sol(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Peinture porte CF	Matériau de type peinture (vert)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	DIA-BZR04-2601-008-039 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre lissé (de surface) Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre lissé (de surface)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / LP5L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	DIA-BZR04-2601-008-040 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre lissé (de surface) Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre lissé (de surface)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / LP5L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page18/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	DIA-BZR04-2601-008-041 Poteaux Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Enduits à base de ciment (sous-face) Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de ciment (sous-face)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	DIA-BZR04-2601-008-042 Poteaux Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Enduits à base de ciment lissé (de surface) Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de ciment lissé (de surface)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page19/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	DIA-BZR04-2601-008-043 Poteaux Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Enduits à base de ciment (sous-face) Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de ciment (sous-face)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) (cémenteux)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	DIA-BZR04-2601-008-044 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides Joints entre éléments ancien conduit de fumée maçonné Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Joints entre éléments ancien conduit de fumée maçonné	Matériau semi-dur (beige)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page20/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	DIA-BZR04-2601-008-045 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre poutres (couche n°1 extérieur) Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre poutres (couche n°1 extérieur)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	DIA-BZR04-2601-008-046 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre poutres (couche n°2 extérieur) Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre poutres (couche n°2 extérieur)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page21/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	DIA-BZR04-2601-008-047 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre poutres (couche n°3 centrale) Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre poutres (couche n°3 centrale)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	DIA-BZR04-2601-008-048 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre poutres (couche n°4 intérieur) Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre poutres (couche n°4 intérieur)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page22/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	DIA-BZR04-2601-008-049 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre poutres (couche n°5 intérieur) Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre poutres (couche n°5 intérieur)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	DIA-BZR04-2601-008-050 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre poutres simple Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre poutres simple	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page23/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	DIA-BZR04-2601-008-051 Plafonds Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre couche basse Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre couche basse	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	DIA-BZR04-2601-008-052 Plafonds Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre couche basse Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre couche basse	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page24/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	DIA-BZR04-2601-008-053 Plafonds Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre couche intermédiaire Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre couche intermédiaire	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / LP5L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	DIA-BZR04-2601-008-054 Plafonds Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre couche intermédiaire Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre couche intermédiaire	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page25/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	DIA-BZR04-2601-008-055 Plafonds Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre couche interne Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre couche interne	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)(i)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	DIA-BZR04-2601-008-056 Plafonds Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre couche interne Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre couche interne	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page26/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057 (3)	DIA-BZR04-2601-008-057 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage Enveloppes de calorifugeage Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enveloppes de calorifugeage	Matériau (noir) (bitumineux) ; matériau fibreux de type isolant (beige)(i)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058 (3)	DIA-BZR04-2601-008-058 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Calorifuges (tresses, coquilles, matelas.) Calorifuges jaune Pièce concernée : Chaufferie(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Calorifuges jaune	Matériau (noir) (bitumineux) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page27/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	DIA-BZR04-2601-008-059 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage Enveloppes de calorifugeage bituminée Pièce concernée : Cave(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Enveloppes de calorifugeage bituminée	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060 (1) (3)	DIA-BZR04-2601-008-060 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Calorifuges (tresses, coquilles, matelas.) Calorifuges rouge Pièce concernée : Cave(Sous-sol Bât D) – Couche à analyser : Calorifuges rouge	Matériau fibreux de type isolant (orange)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page28/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	DIA-BZR04-2601-008-061 Poutres et charpentes Peintures intumescentes Peintures intumescentes rouge sur fixations Pièce concernée : Combles(R+3 Bât D) – Couche à analyser : Peintures intumescentes rouge sur fixations	Matériau de type peinture (marron) (rouge)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	DIA-BZR04-2601-008-062 Poutres et charpentes Peintures intumescentes Peintures intumescentes rouge sur fixations Pièce concernée : Combles(R+3 Bât D) – Couche à analyser : Peintures intumescentes rouge sur fixations	Matériau de type peinture (marron) (rouge)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page29/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	DIA-BZR04-2601-008-063 Plafonds Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre latis (dans sondages existant) Pièce concernée : Combles(R+3 Bât D) – Couche à analyser : Enduits à base de plâtre latis (dans sondages existant)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	DIA-BZR04-2601-008-064 Toiture Mortier de fixation tuiles Mortier de fixation tuiles ancien Pièce concernée : Toiture(R+3/Extérieur Bât D) – Couche à analyser : Mortier de fixation tuiles ancien	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	DIA-BZR04-2601-008-065 Toiture Mortier de fixation tuiles Mortier de fixation tuiles récent Pièce concernée : Toiture(R+3/Extérieur Bât D) – Couche à analyser : Mortier de fixation tuiles récent	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page30/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	DIA-BZR04-2601-008-066 Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Enduits extérieurs Pièce concernée : Toiture(R+3/Extérieur Bât D) – Couche à analyser : Enduits extérieurs	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	DIA-BZR04-2601-008-067 Plafonds Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre Enduits de jointoiement et des plaques de plâtre Pièce concernée : Archives 1(RDC Bât E) – Couche à analyser : Enduits de jointoiement et des plaques de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
068 (2)	DIA-BZR04-2601-008-068 Plafonds Bandes calicot Bandes calicot Pièce concernée : Archives 1(RDC Bât E) – Couche à analyser : Bandes calicot	Matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page31/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** * / F437	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
069 (3)	DIA-BZR04-2601-008-069 Plafonds Flocages Flocages Pièce concernée : Couloir(RDC Bât E) – Couche à analyser : Flocages	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	DIA-BZR04-2601-008-070 Clapets / volets coupe-feu Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu Enduit de rebouchages du calfeutrements de clapets coupe-feu Pièce concernée : Couloir(RDC Bât E) – Couche à analyser : Enduit de rebouchages du calfeutrements de clapets coupe-feu	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page32/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071	DIA-BZR04-2601-008-071 Clapets / volets coupe-feu Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu plaque de calfeutrements de clapets coupe-feu Pièce concernée : Couloir(RDC Bât E) – Couche à analyser : plaque de calfeutrements de clapets coupe-feu	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau de type poussières est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(3) Des fibres minérales susceptibles d'être inhalées (l<3 µm) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres sont de nature non-asbestiforme

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(ii) Un matériau de type poussières est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-002164-01 | Date d'émission de rapport : 19/01/2026 17:57 | Page33/33
Dossier N° : 26K001069 | Date de réception : 15/01/2026 | Date d'analyse : 16/01/2026
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2601-008

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Ines NOUYA
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Attestation d'assurance

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 11442952504

Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

HABITAT CONSEIL DIAGNOSTIC
55 AVENUE LOUIS BREGUET
BATIMENT HERMÈS
31400 TOULOUSE

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° **11442952504**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées au contrat, ***sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément, de Qualification au sens contractuel.***

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

2 000 000 € PAR SINISTRE ET PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/12/2026 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 12 décembre 2025
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 388 123 069 - N° ORIAS 07 000 473

Activités assurées

Activités assurées : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification, autres diagnostics et missions d'expertises :

- AMIANTE aéronef
- AMIANTE avant démolition
- AMIANTE avant travaux immeubles bâtis dont enrobé
- AMIANTE environnemental
- AMIANTE génie civil
- AMIANTE industrie
- AMIANTE matériel ferroviaire
- AMIANTE navire
- Assainissement collectif
- Attestation de respect de la RT2012 – RE 2020
- Audit énergétique
- Building Information Modeling (BIM)
- Certificat de qualité de vie (CQV)
- Certificat d'ensoleillement
- Constat amiante vente sans mention
- Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties communes)
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic de Performance Energétique avec Mention (vente, location, collectif, projeté avant/après travaux)
- Diagnostic de Performance Energétique sans Mention (vente, location, collectif, projeté avant/après travaux)
- Diagnostic défiscalisation ancien
- Diagnostic du Risque d'Intoxication par le plomb dans les peintures DRIPP
- Diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD)
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Dossier Amiante Parties Privatives
- Dossier Technique Amiante avec mention
- Dossier Technique Amiante sans mention
- Etat des installations intérieures de Gaz
- Etat des installations intérieures d'Electricité
- Etat des Risques de pollution des sols (ERPS)
- Etat des Risques et Pollutions
- Etat descriptif de division (EDD) et calcul de tantièmes de copropriété
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de Termites dans le bâti
- Etats des lieux
- Examen DRIPP après travaux
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Logement décent
- Mérules
- Mérules avant démolition
- Photo 360 et visite virtuelle

- Plan 2D/3D
- Contrôle plomb après ou lors de travaux
- PLOMB avant démolition
- PLOMB avant travaux
- PLOMB dans l'eau
- Projet de Plan Pluriannuel de Travaux
- Qualité de l'air (benzène, CO2, formaldéhyde)
- Mission de mesure d'activité volumique de radon prévus à l'article 1333-33 du code de la santé publique dans les bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux
- Mission de mesures d'activité volumique de radon dans les bâtiments et activités prévus à l'article R 4451-44 du code du travail et chez les particuliers
- Règlement de copropriété (Création/modification)
- Repérage polluants BTP avant travaux (fibres céramiques réfractaires, chrome VI, silice, particules minérales allongées)
- Sécurité piscine
- Superficie Carrez/Habitable et autres
- TERMITES avant démolition
- HAP enrobé
- Etat des Nuisances Sonores Aériennes (ENSA)
- Tutorat DPE

Certificat de compétence

La certification QUALIXPERT des diagnostiqueurs

Certificat N° C2131

Monsieur Thomas GARRIGOU

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREDITATION N° 4-0094 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	**Certificat valable Du 08/10/2023 au 07/10/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	**Certificat valable Du 08/10/2023 au 07/10/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	**Certificat valable Du 24/09/2023 au 23/09/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Amiante avec mention	**Certificat valable Du 05/11/2023 au 04/11/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	**Certificat valable Du 07/02/2024 au 06/02/2031**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	**Certificat valable Du 18/03/2024 au 17/03/2031**	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.

Date d'établissement le lundi 03 février 2025

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC QUALIXPERT 17 rue des capucins - 81100 Castres
Tél. : 05 63 73 06 13 - www.qualixpert.com
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018
