BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Réglementaire Nouvelle Aquitaine
ZAE des Quatre Chevaliers
17-19, avenue Bernard Moitessier
17180 PERIGNY

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 32797198/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 22/07/2026

Référence au programme de travaux :
Mail client Néant réalisé le 26/05/2026 par DDFiP 16 SOYAUX
M. BAILLIARD Thomas

DONNEUR D'ORDRE

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS

- -
1 rue de la Combe
16800 SOYAUX

SITE D'INTERVENTION

DDFIP SOYAUX

1 rue de la Combe
16800 SOYAUX

Batiment B 2eme etage

Latitude : 45.650000 / Longitude : 0.194200

Date(s) d'intervention(s) :
Le 02/07/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
MICKAEL RICONNEAU	DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER	Certification N° 14532279	MICKAEL RICONNEAU

Le présent rapport comporte 107 pages, dont 55 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 6
2.2. Remarque(s) complémentaire(s) 10
2.3. Obligations réglementaires 11

3. INFORMATIONS GENERALES **12**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 12
3.2. Parties prenantes 12


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **12**
4.1. Références réglementaires 12

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **13**
5.1. Date(s) de visite(s) 13
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 13
5.3. Conditions spécifiques 13
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 13

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **14**
6.1. Matériaux et produits repérés 14
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 52

7. ANNEXES **53**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 53
7.2. Photos observations 55
7.3. Attestation d'assurance 56
7.4. Certificat de compétence 58
7.5. Croquis de repérage 59
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire 69

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

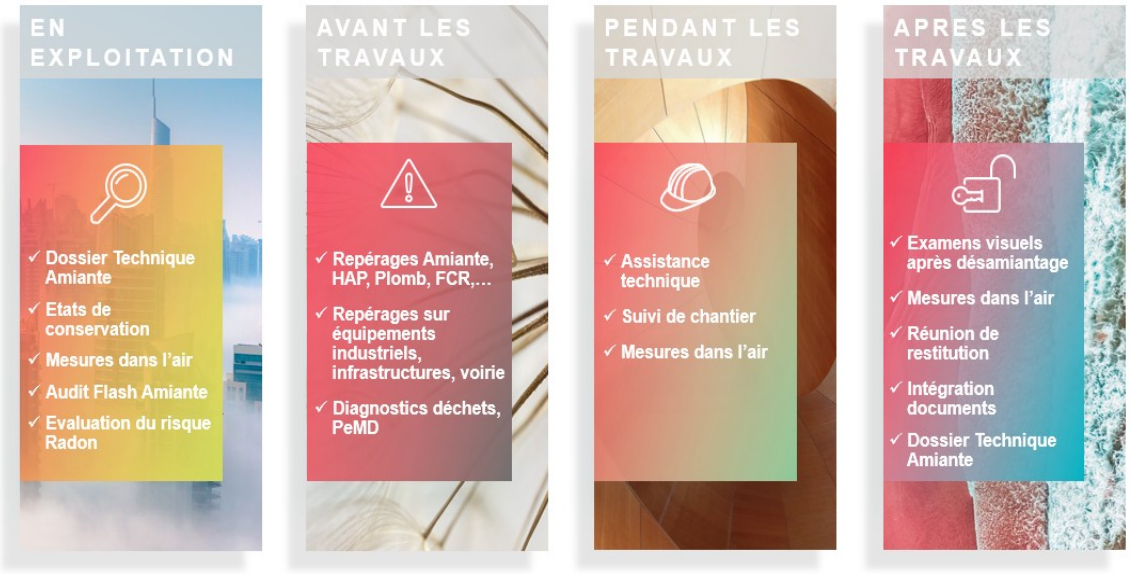

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Mail du client du L'ensemble des éléments intérieurs vont être démolis pour mise à nu du plateau.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs
Plinthes	Peintures plinthes
Portes	Peintures
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs portes, Joints bandes portes, Joints portes, Joints tresses portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits projetés charpente, Enduits projetés/talochés charpente, Flocages charpente, Joints charpentes, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures charpente, Peintures intumescentes charpente, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions entre panneaux, Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds
Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres, Enduits projetés poutres, Enduits projetés/talochés poutres, Entourages de poutres, Flocages poutres, Joints poutres, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures poutres, Revêtements bitumineux poutres
Suspentes et contrevents	Flocages suspentes, Peintures suspentes, Projections en plâtre suspentes
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints cantonnement planchers, Joints carrelage, Joints dilatation/assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures sol, Plaques fibrociment sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous couche moquette, Sous-couches revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements clapets CF, Clapets CF, Joints clapets CF, Lames clapets CF, Rebouchages clapets CF, Tunnels clapets CF
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité trappes, Vidoirs en fibrociment
Volets coupe-feu	Calfeutrements volets CF, Ossature volets CF, Rebouchages volets CF, Volets CF
08 - Equipements divers et accessoires	
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints brides, Joints d'étanchéité, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques antivibratiles éviers
Portes de placard	Plaques antivibratiles placards
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

DDFiP 16 SOYAUX : Bâtiment B Plateau R+2 (870 M²)

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> GT1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> Sanitaire F				
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC1				
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC2				
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> Sanitaire H				
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC3				
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC4				
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> GT1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> Sanitaire F				
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC1				
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC2				
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> Sanitaire H				
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC3				
16	Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC4				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Circulation 2	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Circulation 1	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 212				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 211				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 209/210				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 208				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 207				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 206				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 205				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 204				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 203				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 202				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 201				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 229				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 228				
5	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 228				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 227				
5	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 226				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 226				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 225				
5	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 225				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 224				
5	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 224				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 223				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 222/221				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 220	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 219				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 218				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 217				
5	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 216				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 216				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Circulation 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Circulation 1				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 212				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 211				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 209/210				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 208				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 207				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 206				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 205				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 204				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 203				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 202				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 201				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 229				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 228				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 227				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 226				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 225				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 224	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 223				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 222/221				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 220				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 219				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 218				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 217				
2	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 216				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Circulation 2	Revêtements de sol	Ragréages	/	/
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Circulation 1				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 212				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 211				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 209/210				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 208				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 207				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 206				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 205				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 204				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 203				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 202				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 201				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 229				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 228				
5	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 228				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 227	Revêtements de sol	Ragréages	/	/
5	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 226				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 226				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 225				
5	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 225				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 224				
5	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 224				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 223				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 222/221				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 220				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 219				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 218				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 217				
5	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 216				
3	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 216				
22	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 211	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/
22	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 208				
22	Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 218				

2.2. Remarque(s) complémentaire(s)

Les revêtements de sol du plateau R+2 du bâtiment A, concernant les locaux (circulation, DGT, zone 1 et zone 2, ainsi qu'une partie de la circulation du plateau R+2 du bâtiment B), ont été exclus, car les revêtements ont été posés fin 2022, suite à un retrait des revêtements contenant de l'amiante.
Voir en annexe le constat suite à la première étape d'examen visuel.

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DDFIP SOYAUX
1 rue de la Combe
16800 SOYAUX

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DDFIP SOYAUX	Administrations, bureaux	ERP de la 5ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
- -	Donneur d'ordre	UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS	1 rue de la Combe 16800 SOYAUX	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 02/07/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Mail client	DDFiP 16 SOYAUX M. BAILLIARD Thomas	26/05/2026	Néant	/
Rapport d'examen visuel / Constat suite à la première étape d'examen visuel	Bureau Véritas	26/08/2022	Phase 1 - R+2 bâtiment A - EV1 15858445	/
Rapport d'examen visuel / Constat suite à la première étape d'examen visuel	Bureau Véritas	26/08/2022	Phase 2 - R+2 bâtiment A - EV1 15858445	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Circulation 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	/	S5	AN	Sous le revêtement Lé-plastique	*Oui*
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	1	P2* N	/	AN	Revêtement type Lé-plastique	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	P17* N	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	P22* N	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Circulation 2	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Circulation 1	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	/	S4	AN	Sous le revêtement Lé-plastique	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	1	P1 N	/	AN	Revêtement type Lé-plastique	Non
	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	P15* N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	P15* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Circulation 1	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	P18 N	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	P21 N	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	P23* N	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 212	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 212	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 211	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	P34* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	P35* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	P35* N	/	AN	/	Non
	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	22	P39* P	/	AN	/	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	P25* N	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	P25* N	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 209/210	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 209/210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 208	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	22	P40 P	/	AN	/	***Oui***
	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	P16 N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	P16 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 208	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	*Oui*
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	*Oui*
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 207	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3 (i)	P6* N	/	AN	Sous les DDS	*Oui*

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 207	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3 (i)	P6* N	/	AN	Sous les DDS	*Oui*
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	P4* P	/	AN	/	*Oui*
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	P19* N	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 206	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 206	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 205	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 205	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 204	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	6	P12* N	/	AN	Revêtement type Lé-plastique (Dalles souples 60x60)	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	7	P13* N	/	AN	Sous dalles souples 60X60	Non
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 204	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 203	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	/	S18	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	/	S18	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	P30* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	P30* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	P33* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	6	Idem P 12	/	AN	Revêtement type Lé-plastique (Dalles souples 60x60)	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	7	Idem P 13	/	AN	Sous dalles souples 60X60	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 202	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	6	Idem P 12	/	AN	Revêtement type Lé-plastique (Dalles souples 60x60)	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	7	Idem P 13	/	AN	Sous dalles souples 60X60	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 201	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	6	P11 N	/	AN	Revêtement type Lé-plastique (Dalles souples 60x60)	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	7	P14 N	/	AN	Sous dalles souples 60X60	Non
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 201	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	*Oui*
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	*Oui*
	Poteaux	Enduits projetés poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures poteaux	/	/	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 229	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	P3 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	P5 P	/	AN	Sous les DDS	*Oui*

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 229	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	P5 P	/	AN	Sous les DDS	*Oui*
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	P24 N	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	P24 N	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 228	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 228	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	4	Idem P 7	/	AN	Revêtement type Lé-plastique	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	5	Idem P 10	/	AN	Ragrèage + colle : Entre l'ancien revêtement de sol (Dalles de sol) et le revêtement type lé-plastique	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	5	Idem P 10	/	AN	Ragrèage + colle : Entre l'ancien revêtement de sol (Dalles de sol) et le revêtement type lé-plastique	***Oui***
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 228	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 227	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 226	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	4	P7* N	/	AN	Revêtement type Lé-plastique	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	5	P10* P	/	AN	Ragrèage + colle : Entre l'ancien revêtement de sol (Dalles de sol) et le revêtement type lé-plastique	*Oui*
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	5	P10* P	/	AN	Ragrèage + colle : Entre l'ancien revêtement de sol (Dalles de sol) et le revêtement type lé-plastique	*Oui*
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	*Oui*
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	*Oui*
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 226	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 225	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	/	S9	AN	Dalles de sol encapsuler sous revêtement Lé-plastique et ragréages	***Oui***
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	4	Idem P 7	/	AN	Revêtement type Lé-plastique	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	5	Idem P 10	/	AN	Ragrèage + colle : Entre l'ancien revêtement de sol (Dalles de sol) et le revêtement type lé-plastique	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	5	Idem P 10	/	AN	Ragrèage + colle : Entre l'ancien revêtement de sol (Dalles de sol) et le revêtement type lé-plastique	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 225	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 224	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	4	Idem P 7	/	AN	Revêtement type Lé-plastique	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 224	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	5	Idem P 10	/	AN	Ragrèage + colle : Entre l'ancien revêtement de sol (Dalles de sol) et le revêtement type lé-plastique	*Oui*
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	5	Idem P 10	/	AN	Ragrèage + colle : Entre l'ancien revêtement de sol (Dalles de sol) et le revêtement type lé-plastique	*Oui*
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 223	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	1	/	S1	AN	Revêtement type Lé-plastique	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	/	S6	AN	Sous le revêtement Lé-plastique	*Oui*
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 223	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 222/221	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 222/221	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 222/221	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 220	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	P20 N	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 219	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	1	/	S2	AN	Revêtement type Lé-plastique	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	/	S7	AN	Sous le revêtement Lé-plastique	***Oui***
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 218	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	P36 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	P36 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	22	P37 P	/	AN	/	***Oui***
	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	22	P38 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	1	/	S3	AN	Revêtement type Lé-plastique	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	/	S8	AN	Sous le revêtement Lé-plastique	***Oui***
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 218	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 217	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	/	S17	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	/	S17	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	/	S16	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	/	S16	AN	Sous les DDS	***Oui***
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	***Oui***
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 216	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	4	P8 N	/	AN	Revêtement type Lé-plastique	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	5	P9 P	/	AN	Ragrèage + colle : Entre l'ancien revêtement de sol (Dalles de sol) et le revêtement type lé-plastique	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	5	P9 P	/	AN	Ragrèage + colle : Entre l'ancien revêtement de sol (Dalles de sol) et le revêtement type lé-plastique	***Oui***
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 216	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	2	Idem P 4	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	*Oui*
	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	/	3	Idem P 5	/	AN	Sous les DDS	*Oui*
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Métallique	/	12	/	/	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture cloisons	/	/	13	Idem P 22	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bourre en vrac cloisons	/	/	14	Idem P 23	/	AN	Cloisons amovible	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment A Plateau R+2 -> Circulation	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	P31 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	P31 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	P32 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment A Plateau R+2 -> Circulation	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment A Plateau R+2 -> DGT	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment A Plateau R+2 -> Zone 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment A Plateau R+2 -> Zone 1	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment A Plateau R+2 -> Zone 2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	20	Idem P 34	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Isolants	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	21	Idem P 35	/	AN	/	Non
	Plinthes	Peintures plinthes	/	/	10	Idem P 17	/	AN	Divers couleurs non sépable	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits finition plaques de plâtre verticales	/	/	18	Idem P 30	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Plaque de plâtre	/	19	Idem P 33	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> GT1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	16	Idem P 27	/	AN	/	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> GT1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	16	Idem P 27	/	AN	/	***Oui***
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> Sanitaire F	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	16 (i)	P26* N	/	AN	/	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	16 (i)	P26* N	/	AN	/	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	16	Idem P 27	/	AN	/	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	16	Idem P 27	/	AN	/	***Oui***
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	16	Idem P 27	/	AN	/	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	16	Idem P 27	/	AN	/	***Oui***
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> Sanitaire H	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	16	P27 P	/	AN	/	*Oui*
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	16	P27 P	/	AN	/	*Oui*
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	16	Idem P 27	/	AN	/	*Oui*
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	16	Idem P 27	/	AN	/	*Oui*
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	16	Idem P 27	/	AN	/	*Oui*
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	16	Idem P 27	/	AN	/	*Oui*
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> GT2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	17	Idem P 28	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	17	Idem P 28	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> GT2	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> Sanitaire F 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	17	P28* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	17	P28* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> WC5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	17	Idem P 28	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	17	Idem P 28	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> WC6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	17	Idem P 28	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	17	Idem P 28	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> Sanitaire H 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	17	P29 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> Sanitaire H 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	17	P29 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Ciment, Compact, Plâtre	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	15	Idem P 25	/	AN	Murs vers extérieurs et refends	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> WC7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	17	Idem P 28	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	17	Idem P 28	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> WC8	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	Peint, Plâtre	/	17	Idem P 28	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	/	/	17	Idem P 28	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	11	Idem P 19	/	AN	Divers couleur non séparable	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
16	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés murs	90 m²
16	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture murs	90 m²
22	Conduits	Conduits	4 U
2	Revêtements de sol	Dalles de sol	745 m²
3	Revêtements de sol	Ragréages	745 m²
3	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	745 m²
5	Revêtements de sol	Ragréages	88 m²
5	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	88 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment B Plateau R+2	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Circulation 2	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Circulation 1	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 212	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 211	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 209/210	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 208	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 207	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 206	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 205	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 204	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 203	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 202	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 201	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 229	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 228	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 227	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 226	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 225	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 224	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 223	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 222/221	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 220	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 219	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 218	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 217	/
Bâtiment B Plateau R+2 -> Bureau 216	/
Bâtiment A Plateau R+2	/
Bâtiment A Plateau R+2 -> Circulation	/
Bâtiment A Plateau R+2 -> DGT	/
Bâtiment A Plateau R+2 -> Zone 1	/
Bâtiment A Plateau R+2 -> Zone 2	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> GT1	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> Sanitaire F	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC1	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC2	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> Sanitaire H	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC3	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 -> WC4	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> GT2	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> Sanitaire F 2	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> WC5	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> WC6	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> Sanitaire H 2	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> WC7	/
Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 -> WC8	/
Bâtiment B Plateau R+2.	/
Bâtiment B Plateau R+2..	/
Bâtiment B Plateau R+2...	/

7.2. Photos observations

Bâtiment B Plateau R+2	OBS 1
04 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	
	Observation : Béton branché

Bâtiment A Plateau R+2	OBS 2
04 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	
	Observation : Béton branché

7.3. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.4. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat attribué à

Mickael RICONNEAU

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	18/02/2020	17/02/2027
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	18/02/2020	17/02/2027
Termites metropole	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	19/09/2022	18/09/2029

Date : 31/03/2026
Numéro du certificat : **15620211**

Samuel DUPRIEU - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

7.5. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DDFIP SOYAUX 1 rue de la Combe 16800 SOYAUX	
Localisation Bâtiment B Plateau R+2	Date visite	Le 02/07/2026
	Auteur	MICKAEL RICONNEAU
	N° dossier	32797198/S1/1
	Planche	1 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

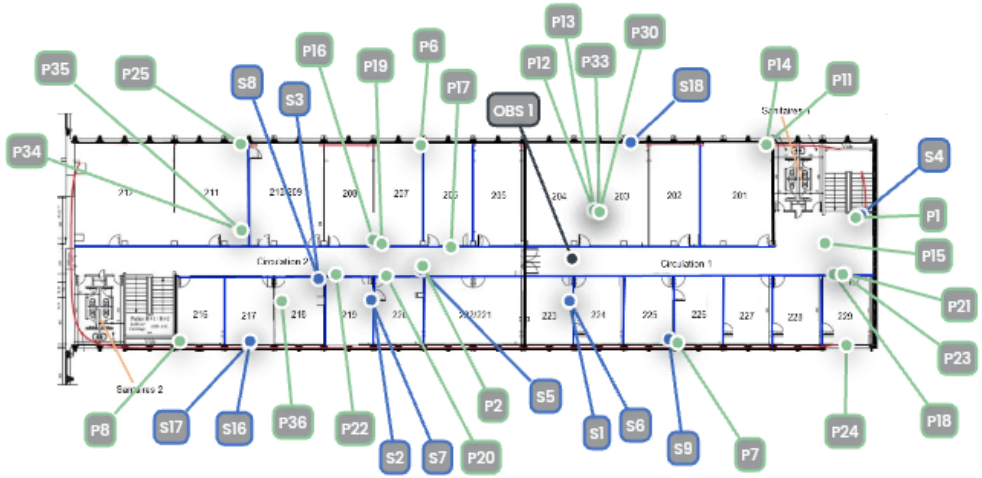

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DDFIP SOYAUX 1 rue de la Combe 16800 SOYAUX	
Localisation Bâtiment B Plateau R+2	Date visite	Le 02/07/2026
	Auteur	MICKAEL RICONNEAU
	N° dossier	32797198/S1/1
	Planche	2 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Sol

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DDFIP SOYAUX 1 rue de la Combe 16800 SOYAUX	
Localisation Bâtiment B Plateau R+2	Date visite	Le 02/07/2026
	Auteur	MICKAEL RICONNEAU
	N° dossier	32797198/S1/1
	Planche	3 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Autre

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Conduits (Liste B)



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DDFIP SOYAUX 1 rue de la Combe 16800 SOYAUX	
Localisation Bâtiment A Plateau R+2	Date visite	Le 02/07/2026
	Auteur	MICKAEL RICONNEAU
	N° dossier	32797198/S1/1
	Planche	4 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

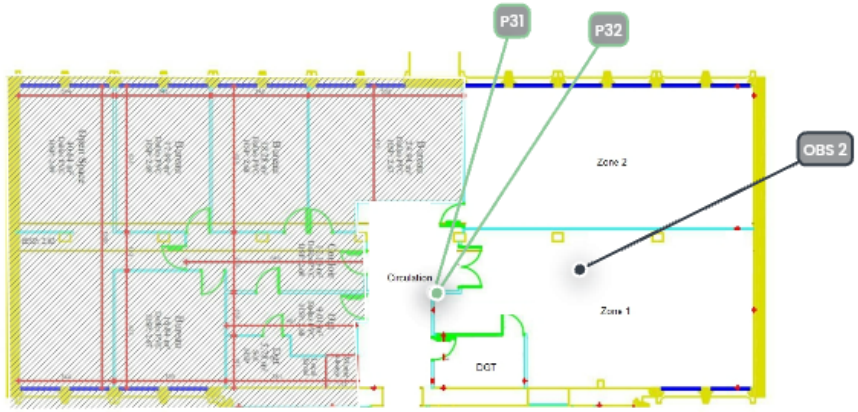

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DDFIP SOYAUX 1 rue de la Combe 16800 SOYAUX	
Localisation Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1	Date visite	Le 02/07/2026
	Auteur	MICKAEL RICONNEAU
	N° dossier	32797198/S1/1
	Planche	5 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

— — Enduits projetés murs (Liste B),Peinture murs

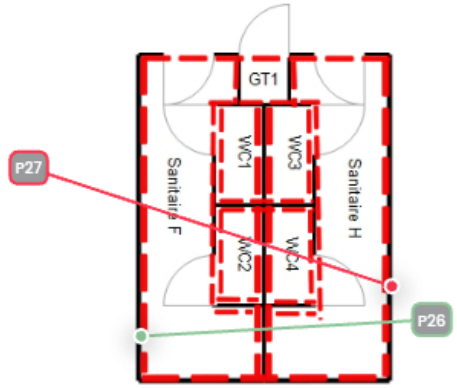

Sanitaires 1

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DDFIP SOYAUX 1 rue de la Combe 16800 SOYAUX	
Localisation Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2	Date visite	Le 02/07/2026
	Auteur	MICKAEL RICONNEAU
	N° dossier	32797198/S1/1
	Planche	6 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

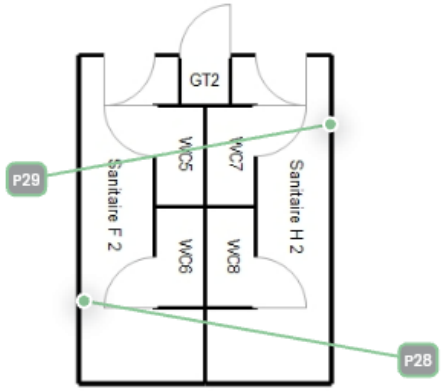

Sanitaires 2

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	DDFIP SOYAUX 1 rue de la Combe 16800 SOYAUX	
Localisation Bâtiment B Plateau R+2.	Date visite	Le 02/07/2026
	Auteur	MICKAEL RICONNEAU
	N° dossier	32797198/S1/1
	Planche	7 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dalles de sol (Liste B)

Dalles de sol (Liste B)

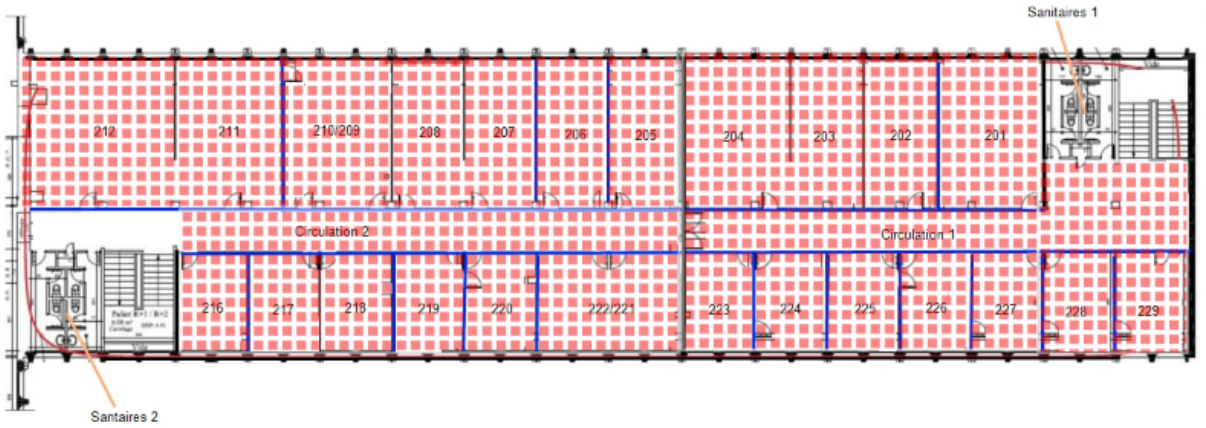

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DDFIP SOYAUX 1 rue de la Combe 16800 SOYAUX	
Localisation Bâtiment B Plateau R+2..	Date visite	Le 02/07/2026
	Auteur	MICKAEL RICONNEAU
	N° dossier	32797198/S1/1
	Planche	8 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Ragréages,Colles bitumineuses

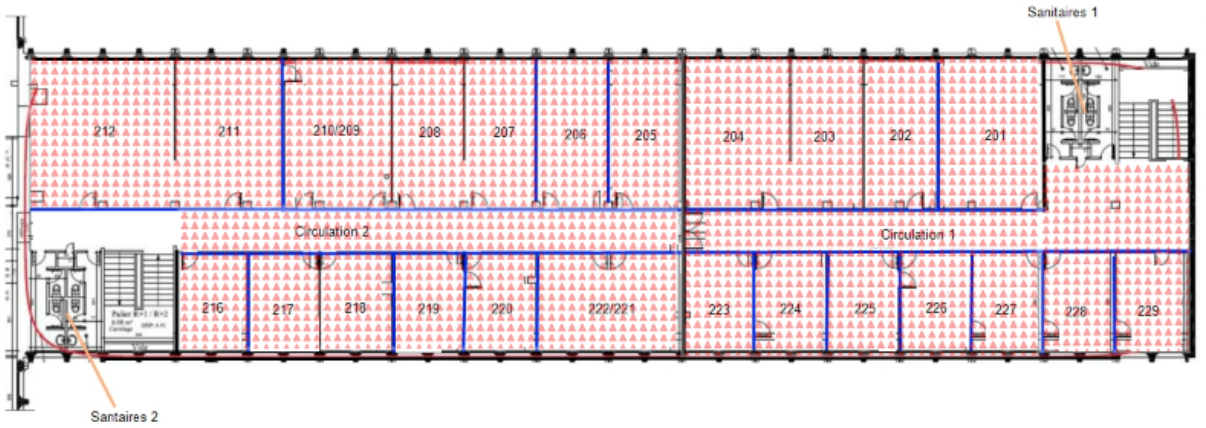

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DDFIP SOYAUX 1 rue de la Combe 16800 SOYAUX	
Localisation Bâtiment B Plateau R+2...	Date visite	Le 02/07/2026
	Auteur	MICKAEL RICONNEAU
	N° dossier	32797198/S1/1
	Planche	9 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Ragréages,Colles bitumineuses



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Mickael RICONNEAU
17-19 Rue Bernard Moitessier
17180 PERIGNY

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-043385-01 | Date d'émission de rapport : 16/07/2026 14:27 | Page1/12
Dossier N° : 26K024810 | Date de réception : 09/07/2026 | Date d'analyse : 14/07/2026
Référence dossier Client:1510797383/32797198/S1/1/1_32797198/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	EUROFINS25000003 7558 Réf. Prel : P1 Bâtiment B Plateau R+2 - Circulation 1/Revêtements de sol Colles non bitumineuses	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	EUROFINS25000003 7559 Réf. Prel : P2 Bâtiment B Plateau R+2 - Circulation 2/Revêtements de sol Colles non bitumineuses	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	EUROFINS25000003 7557 Réf. Prel : P3 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 229/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004 (2)	EUROFINS25000003 7365 Réf. Prel : P4 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 207/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-043385-01 | Date d'émission de rapport : 16/07/2026 14:27 | Page2/12
Dossier N° : 26K024810 | Date de réception : 09/07/2026 | Date d'analyse : 14/07/2026
Référence dossier Client:1510797383/32797198/S1/1/1_32797198/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	EUROFINS250000037369 Réf. Prel : P5 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 229/Revêtements de sol : Ragréages / Colles bitumineuses	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)(i)	**MOLP** * / Z2J2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	EUROFINS250000037366 Réf. Prel : P6 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 207/Revêtements de sol : Ragréages / Colles bitumineuses	Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)(ii)	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	EUROFINS250000037548 Réf. Prel : P7 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 226/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces(iii)	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	EUROFINS250000037549 Réf. Prel : P8 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 216/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-043385-01 | Date d'émission de rapport : 16/07/2026 14:27 | Page3/12
Dossier N° : 26K024810 | Date de réception : 09/07/2026 | Date d'analyse : 14/07/2026
Référence dossier Client:1510797383/32797198/S1/1/1_32797198/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune)(iii)	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	EUROFINS250000037546 Réf. Prel : P9 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 216/Revêtements de sol : Ragréages / Colles bitumineuses	Matériau de type colle bitumineux (noir) + (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	**MOLP** * / Z2J2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
010	EUROFINS250000037547 Réf. Prel : P10 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 226/Revêtements de sol : Ragréages / Colles bitumineuses	Matériau de type colle bitumineux (noir) + (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)(i)	**MOLP** * / Z2J2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011	EUROFINS250000037551 Réf. Prel : P11 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 201/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(iii)	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-043385-01 | Date d'émission de rapport : 16/07/2026 14:27 | Page4/12
Dossier N° : 26K024810 | Date de réception : 09/07/2026 | Date d'analyse : 14/07/2026
Référence dossier Client:1510797383/32797198/S1/1/1_32797198/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (3)	EUROFINS250000037552 Réf. Prel : P12 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 204/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	EUROFINS250000037550 Réf. Prel : P13 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 204/Revêtements de sol : Ragréages	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	EUROFINS250000037553 Réf. Prel : P14 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 201/Revêtements de sol : Ragréages	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	EUROFINS250000037556 Réf. Prel : P15 Bâtiment B Plateau R+2 - Circulation 1/Poteaux : Enduits projetés poteaux (Liste B) / Peintures poteaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-043385-01 | Date d'émission de rapport : 16/07/2026 14:27 | Page5/12
Dossier N° : 26K024810 | Date de réception : 09/07/2026 | Date d'analyse : 14/07/2026
Référence dossier Client:1510797383/32797198/S1/1/1_32797198/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	EUROFINS250000037364 Réf. Prel : P16 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 208/Poteaux : Enduits projetés poteaux (Liste B) / Peintures poteaux	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) (granulaire)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	EUROFINS250000037543 Réf. Prel : P17 Bâtiment B Plateau R+2 - Circulation 2/Plinthes : Peintures plinthes	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP** * / Z2J2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
018	EUROFINS250000037545 Réf. Prel : P18 Bâtiment B Plateau R+2 - Circulation 1/Plinthes : Peintures plinthes	Matériau de type peinture (rouge) + (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP** * / 8OEU	1 / 1 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
019	EUROFINS250000037544 Réf. Prel : P19 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 207/Menuiseries intérieures : Peintures décoratives	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-043385-01 | Date d'émission de rapport : 16/07/2026 14:27 | Page6/12
Dossier N° : 26K024810 | Date de réception : 09/07/2026 | Date d'analyse : 14/07/2026
Référence dossier Client:1510797383/32797198/S1/1/1_32797198/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	EUROFINS250000037541 Réf. Prel : P20 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 220/Menuiseries intérieures : Peintures décoratives	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	EUROFINS250000037539 Réf. Prel : P21 Bâtiment B Plateau R+2 - Circulation 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Peinture cloisons	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	EUROFINS250000037540 Réf. Prel : P22 Bâtiment B Plateau R+2 - Circulation 2/Cloisons (légères et préfabriquées) : Peinture cloisons	Matériau de type peinture (blanc) (gris) ; ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	EUROFINS250000037542 Réf. Prel : P23 Bâtiment B Plateau R+2 - Circulation 1/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bourre en vrac cloisons	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (gris) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-043385-01 Date d'émission de rapport : 16/07/2026 14:27 Page7/12
Dossier N° : 26K024810 Date de réception : 09/07/2026 Date d'analyse : 14/07/2026
Référence dossier Client:1510797383/32797198/S1/1/1_32797198/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	EUROFINS250000037554 Réf. Prel : P24 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 229/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés murs (Liste B) / Peinture murs - (Compact, Ciment, Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	EUROFINS250000037555 Réf. Prel : P25 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 211/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés murs (Liste B) / Peinture murs - (Compact, Ciment, Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	EUROFINS250000037367 Réf. Prel : P26 Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 - Sanitaire F/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés murs (Liste B) / Peinture murs - (Plâtre, Peint/)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-043385-01 | Date d'émission de rapport : 16/07/2026 14:27 | Page8/12
Dossier N° : 26K024810 | Date de réception : 09/07/2026 | Date d'analyse : 14/07/2026
Référence dossier Client:1510797383/32797198/S1/1/1_32797198/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	EUROFINS250000037368 Réf. Prel : P27 Bâtiment B R+2 / Sanitaires 1 - Sanitaire H/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés murs (Liste B) / Peinture murs - (Plâtre, Peint/)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)(ii)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** * / 8OEU	1 / 1 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
028	EUROFINS250000037534 Réf. Prel : P28 Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 - Sanitaire F 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés murs (Liste B) / Peinture murs - (Plâtre, Peint/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	EUROFINS250000037533 Réf. Prel : P29 Bâtiment B R+2 / Sanitaires 2 - Sanitaire H 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés murs (Liste B) / Peinture murs - (Plâtre, Peint/)	Matériau de type peinture (blanc) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-043385-01 | Date d'émission de rapport : 16/07/2026 14:27 | Page9/12
Dossier N° : 26K024810 | Date de réception : 09/07/2026 | Date d'analyse : 14/07/2026
Référence dossier Client:1510797383/32797198/S1/1/1_32797198/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	EUROFINS250000037531 Réf. Prel : P30 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 203/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	EUROFINS250000037535 Réf. Prel : P31 Bâtiment A Plateau R+2 - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales / Enduits finition plaques de plâtre verticales	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032	EUROFINS250000037537 Réf. Prel : P32 Bâtiment A Plateau R+2 - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux cloisons (Liste B) - (Plaque de plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / WPM6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-043385-01 | Date d'émission de rapport : 16/07/2026 14:27 | Page10/12
Dossier N° : 26K024810 | Date de réception : 09/07/2026 | Date d'analyse : 14/07/2026
Référence dossier Client:1510797383/32797198/S1/1/1_32797198/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	EUROFINS250000037538 Réf. Prel : P33 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 203/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux cloisons (Liste B) - (Plaque de plâtre/)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	EUROFINS250000037529 Réf. Prel : P34 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 211/Faux plafonds : Panneaux (Liste A)	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** * / WPM6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
035	EUROFINS250000037530 Réf. Prel : P35 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 211/Faux plafonds : Isolants / Pare-vapeur	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** * / WPM6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / WPM6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
036	EUROFINS250000037526 Réf. Prel : P36 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 218/Faux plafonds : Isolants / Pare-vapeur	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / ZD6P	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** * / WPM6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-043385-01 | Date d'émission de rapport : 16/07/2026 14:27 | Page11/12
Dossier N° : 26K024810 | Date de réception : 09/07/2026 | Date d'analyse : 14/07/2026
Référence dossier Client:1510797383/32797198/S1/1/1_32797198/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / WPM6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
037	EUROFINS250000037527 Réf. Prel : P37 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 218/Conduits : Conduits (Liste B) - (Fibres-ciment/)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** * / WPM6	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
038	EUROFINS250000037528 Réf. Prel : P38 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 218/Conduits : Conduits (Liste B) - (Fibres-ciment/)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** * / WPM6	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
039	EUROFINS240000019570 Réf. Prel : P39 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 211/Conduits : Conduits (Liste B) - (Fibres-ciment/)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** * / WPM6	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
040	EUROFINS240000019571 Réf. Prel : P40 Bâtiment B Plateau R+2 - Bureau 208/Conduits : Conduits (Liste B) - (Fibres-ciment/)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** * / WPM6	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-043385-01 | Date d'émission de rapport : 16/07/2026 14:27 | Page12/12
Dossier N° : 26K024810 | Date de réception : 09/07/2026 | Date d'analyse : 14/07/2026
Référence dossier Client:1510797383/32797198/S1/1/1_32797198/1/1

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) Un matériau de type colle noir bitumineux est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(3) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle bitumineux noir ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(iii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Ines NOUYA
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

Constat suite à la première étape d'examen visuel

Norme NF X46-021
Article R1334-29-3 du Code de la santé Publique

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
30 avenue Gustave Eiffel
33600 Pessac

A l'attention de **:**
Monsieur ERIC BERTHON
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES

Référence : Phase 1 - R+2 bâtiment A - EV1 15858445	**Donneur d'ordre :** *Madame :* ERIC BERTHON *Adresse : 3 RUE PIERRE LABACHOT 16022 ANGOULEME CEDEX*
Identification du chantier : **Phase 1 - R+2 bâtiment A** **1 Rue de la Combe** **16800 Soyaux**	
Date de commande : 10/08/2022 **Date(s) de(s) visite(s) :** 12/08/2022 **Rédigé le :** 26/08/2022 **Date d'émission du constat :** 26/08/2022	

Opérateur(s) de repérage ayant réalisé la 1ère étape de l'examen visuel :

Nom	Prénom	Fonction	Compétence
BONAMY	Mathieu	Chargé d'affaires	Certificat de compétence n°9643080 obtenu le 14/12/2021 établi par Bureau Veritas certification valable jusqu'au 13/12/2028

Signataire(s) du rapport :

Nom	Prénom	Fonction	Compétence	Signature
BONAMY	Mathieu	Chargé d'affaires	Certificat de compétence n°9643080 obtenu le 14/12/2021 établi par Bureau Veritas certification valable jusqu'au 13/12/2028	BUREAU VERITAS EXPLOITATION 30 Avenue Gustave Eiffel / Bât. A 33600 PESSAC Tél. : 05 57 26 24 00 SIRET : 730 184 675 01324

Ce rapport contient 13 pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

1.INFORMATIONS GENERALES 3

1.1 Identification du chantier 3

1.2 Objet du contrôle de l'examen visuel 3

1.3 Identification du (des) MPCA traités 3

1.4 Identification et coordonnées des intervenants 3

1.5 Dates des opérations d'examen visuel réalisées 3

2.RESPECT DES CONDITIONS PREALABLES 4

3.CONDITIONS D'INTERVENTION 4

4.VISITE GENERALE DE LA ZONE 4

5.SCHEMA SITUANT LES SECTEUR(S) EXAMINE(S) 5

6.FICHE(S) DE CONSTAT D'ETAT DES SURFACES TRAITEES 6

6.1 Critères de conformité 6

6.2 Résultats par secteur 8

7.PROCES VERBAL DE VISITE 9

8.CONCLUSION 9

9.PHOTOS 9

Copyright BUREAU VERITAS

1. INFORMATIONS GENERALES

1.1 Identification du chantier

Phase 1 - R+2 bâtiment A
1 Rue de la Combe
16800 Soyaux

1.2 Objet du contrôle de l'examen visuel

☒ Examen visuel externe effectué à la demande du commanditaire

1.3 Identification du (des) MPCA traités

Zone	Localisation zone	MPCA	Supports avec indication de sa nature si connue	Estimation de la zone traitée	Traitement prévu	Nb de secteurs définis
R+2 – Phase 1	Plancher	Dalle de sol + colle noire	Béton	185m2	Retrait total	Totalité de la zone

1.4 Identification et coordonnées des intervenants

Intervenant	Nom	Société	Adresse	Présent lors de la visite
Donneur d'ordre	M. Eric BERTHON	DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES	DIR DEP FINANCES PUBLIQUES 3 RUE PIERRE LABACHOT 16022 ANGOULEME CEDEX	NON
Propriétaire	M. Eric BERTHON	DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES	DIR DEP FINANCES PUBLIQUES 3 RUE PIERRE LABACHOT 16022 ANGOULEME CEDEX	NON
Entreprise de travaux de retrait de MPCA	M. Fabien DELRIEUX	DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION	19 Avenue de Berlincan 33160 Saint-Médard-en-Jalles	OUI

Opérateur de repérage				
Nom :	Mathieu BONAMY			
Société :	Bureau Veritas exploitation			
Adresse :	30 avenue Gustave Eiffel 33600 PESSAC			
Certification de compétence :	n°9643080	délivrée par Bureau Veritas certification	14/12/2021	valable jusqu'au 13/12/2028
Assurance :	MSIG	Police n°F210.16.0414	Valide jusqu'au 31/12/2022	

1.5 Dates des opérations d'examen visuel réalisées

Date constat	Référence	Objet
		Néant

Copyright BUREAU VERITAS

2. RESPECT DES CONDITIONS PREALABLES

❑ CCTP des travaux consulté	NON
❑ Dossier de Traçabilité consulté	NON
☒ Rapport de repérage des MPCA consulté	OUI
☒ Plans ou schémas des surfaces à traiter consultés	OUI
☒ Plan de retrait ou d'encapsulage de MPCA consulté Indice 00 Date : 01/06/2020	OUI
☒ Document écrit d'autocontrôle de l'entreprise consulté	OUI
☒ Rapport de mesure d'empoussièrement de la zone de traitement consulté	OUI

3. CONDITIONS D'INTERVENTION

☒ Contrôle avant repli du confinement	OUI
❑ Contrôle après repli du confinement	SO
❑ Absence de confinement	NON
☒ Moyens d'accès permettant d'accéder aux secteurs à contrôler fournis	OUI
☒ Eclairage d'ambiance supérieur à 200 lux	OUI
☒ Surfaces sèches et sans aucun fixateur	OUI
☒ Accompagnement de l'opérateur par l'entreprise de travaux de retrait de MPCA	OUI

4. VISITE GENERALE DE LA ZONE

☒ Le nettoyage est achevé	OUI
❑ Le traitement des MPCA est achevé	SO

Copyright BUREAU VERITAS

5. SCHEMA SITUANT LES SECTEUR(S) EXAMINE(S)

Secteur	Conforme
R+2 - Phase 1	OUI

Schéma situant les secteurs examinés avec en rouge ceux non conformes



R+2

Copyright BUREAU VERITAS

6. FICHE(S) DE CONSTAT D'ETAT DES SURFACES TRAITEES

6.1 Critères de conformité

Pour chaque élément constructif homogène identifié dans chacun des secteurs, le constat de conformité est établi selon le tableau ci-dessous :

Retrait : Classe de la surface traitée	Conforme	Non Conforme
SD : MPCA et son support déposés	Constat 1 : absence de surface traitée	Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu'il(s) aurai(en)t dû l'être
A1 : support lisse à surface continue	Constat 2 : absence de résidus de MPCA	Constat 4 : présence de résidus libres de MPCA ou Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu'il(s) aurai(en)t dû l'être
A2 : support lisse à surface discontinue	Constat 2 : absence de résidus de MPCA ou Constat 3 : présence de résidus incrustés de MPCA	Constat 4 : présence de résidus libres de MPCA ou Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu'il(s) aurai(en)t dû l'être
B1 : support avec pores ou aspérités et surface continue	Constat 2 : absence de résidus de MPCA ou Constat 3 : présence de résidus incrustés de MPCA	Constat 4 : présence de résidus libres de MPCA ou Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu'il(s) aurai(en)t dû l'être
B2 : support avec pores ou aspérités et surface discontinue	Constat 2 : absence de résidus de MPCA ou Constat 3 : présence de résidus incrustés de MPCA	constat 4 : présence de résidus libres de MPCA ou Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu'il(s) aurai(en)t dû l'être

Procédé d'encapsulage	Conforme	Non Conforme
E1 encoffrement	Constat 6 : application sur la totalité de la surface à traiter	Constat 7 : non-application sur tout ou partie de la surface à traiter
E2 doublage	Constat 6 : application sur la totalité de la surface à traiter	Constat 7 : non-application sur tout ou partie de la surface à traiter
E3 fixation par revêtement	Constat 6 : application sur la totalité de la surface à traiter	Constat 7 : non-application sur tout ou partie de la surface à traiter
E4 imprégnation	Constat 6 : application sur la totalité de la surface à traiter	Constat 7 : non-application sur tout ou partie de la surface à traiter

Copyright BUREAU VERITAS

Constat 1 : absence de surface traitée ; NOTE Dans le cas où le MPCA a été retiré avec son support (ex. cloison, conduit avec son calorifuge amiante, joint de bride…), le constat indiquera le retrait du MPCA et de son support.
Constat 2 : absence de résidus de MPCA
Constat 3 : présence de résidus incrustés de MPCA. L'opérateur décrit les résidus incrustés qu'il a constatés et précise s'ils sont ponctuels ou non en motivant son choix
Constat 4 : présence de résidus libres de MPCA
Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu'il(s) aurai(en)t dû l'être
Constat 6 : application sur la totalité de la surface à traiter et, le cas échéant, protections jointives et jointoyées
Constat 7 : non-application sur tout ou partie de la surface à traiter et, le cas échéant, protections non-jointives ou non-jointoyées en tout ou partie

Copyright BUREAU VERITAS

6.2 Résultats par secteur

Phase 1 au R+2								
MPCA	**Eléments constructifs homogènes/ jonction**	**Catégorie de constat (Retrait)**						**Résultat** C, ou NC, ou R
		Classe de surface traitée	**1 - Absence de surface traitée**	**2 - Absence de résidus**	**3 - Résidus incrustés**	**4 - Résidus libres**	**5 - MPCA non traité**	
Dalle de sol + linoléum	Plancher	Béton B2		X				C
Colle bitumineuse noire	Plancher	Béton B2		X				C
Commentaires : Néant								

7. PROCES VERBAL DE VISITE

Néant

8. CONCLUSION

LA PREMIERE ETAPE DE L'EXAMEN VISUEL EST :

☒ **CONFORME SANS REMARQUE**


9. PHOTOS

Légende photo : Photo 1,2



Copyright BUREAU VERITAS


CIRCULATIO
SALLE DE REUNION
1
CIRCUALTION
DEGAGEMENT
BUREAU
4
BUREAU
3
SALLE DE REUNION
2
SALLE DE REUNION
3
BUREAU
1
BUREAU


BUREAU
VERITAS
Légende
Zone Inspectée
Secteurs
Résidus

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) **Diagnostic amiante**
- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) **Autres diagnostics**
- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière
  - ERP
  - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

Copyright BUREAU VERITAS

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
  - En cas de location / vente
  - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**

4) **Conseil en performance énergétique.**

5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil**.

6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**

7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tel : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 00037 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

Copyright BUREAU VERITAS

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

BONAMY Mathieu

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**14/12/2021**	**13/12/2028**
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**14/12/2021**	**13/12/2028**
Electricité	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**03/04/2022**	**02/04/2029**
Gaz	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**13/12/2021**	**12/12/2028**
Plomb sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**12/12/2021**	**11/12/2028**
Termites métropole	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**14/12/2021**	**13/12/2028**

Date : 08/12/2021 Numéro de certificat : 9643080

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

Copyright BUREAU VERITAS

Constat n° : 15858445

Date du constat : 26/08/2022

Constat suite à la première étape d'examen visuel

Norme NF X46-021
Article R1334-29-3 du Code de la santé Publique

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
30 avenue Gustave Eiffel
33600 Pessac

A l'attention de **:**
Monsieur ERIC BERTHON
DIRECTION DEPARTEMENTALE
FINANCES PUBLIQUES

Référence : Phase 2 - R+2 bâtiment A - EV1 15858445	**Donneur d'ordre :** *Madame :* ERIC BERTHON *Adresse : 3 RUE PIERRE LABACHOT 16022 ANGOULEME CEDEX*
Identification du chantier : **Phase 2 - R+2 bâtiment A** **1 Rue de la Combe** **16800 Soyaux**	
Date de commande : 10/08/2022 **Date(s) de(s) visite(s) :** 18/08/2022 **Rédigé le :** 26/08/2022 **Date d'émission du constat :** 26/08/2022	

Opérateur(s) de repérage ayant réalisé la 1ère étape de l'examen visuel :

Nom	Prénom	Fonction	Compétence
BONAMY	Mathieu	Chargé d'affaires	Certificat de compétence n°9643080 obtenu le 14/12/2021 établi par Bureau Veritas certification valable jusqu'au 13/12/2028

Signataire(s) du rapport :

Nom	Prénom	Fonction	Compétence	Signature
BONAMY	Mathieu	Chargé d'affaires	Certificat de compétence n°9643080 obtenu le 14/12/2021 établi par Bureau Veritas certification valable jusqu'au 13/12/2028	BUREAU VERITAS EXPLOITATION 30 Avenue Gustave Eiffel / Bât. A 33600 PESSAC Tél. : 05 57 26 24 00 SIRET : 730 184 675 01324

Ce rapport contient 13 pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

1.INFORMATIONS GENERALES 3

1.1 Identification du chantier 3

1.2 Objet du contrôle de l'examen visuel 3

1.3 Identification du (des) MPCA traités 3

1.4 Identification et coordonnées des intervenants 3

1.5 Dates des opérations d'examen visuel réalisées 3

2.RESPECT DES CONDITIONS PREALABLES 4

3.CONDITIONS D'INTERVENTION 4

4.VISITE GENERALE DE LA ZONE 4

5.SCHEMA SITUANT LES SECTEUR(S) EXAMINE(S) 5

6.FICHE(S) DE CONSTAT D'ETAT DES SURFACES TRAITEES 6

6.1 Critères de conformité 6

6.2 Résultats par secteur 8

7.PROCES VERBAL DE VISITE 9

8.CONCLUSION 9

9.PHOTOS 9

Copyright BUREAU VERITAS

1. INFORMATIONS GENERALES

1.1 Identification du chantier

Phase 1 - R+2 bâtiment A
1 Rue de la Combe
16800 Soyaux

1.2 Objet du contrôle de l'examen visuel

☒ Examen visuel externe effectué à la demande du commanditaire

1.3 Identification du (des) MPCA traités

Zone	Localisation zone	MPCA	Supports avec indication de sa nature si connue	Estimation de la zone traitée	Traitement prévu	Nb de secteurs définis
R+2 – Phase 2	Plancher	Dalle de sol + colle noire	Béton	140m2	Retrait total	Totalité de la zone

1.4 Identification et coordonnées des intervenants

Intervenant	Nom	Société	Adresse	Présent lors de la visite
Donneur d'ordre	M. Eric BERTHON	DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES	DIR DEP FINANCES PUBLIQUES 3 RUE PIERRE LABACHOT 16022 ANGOULEME CEDEX	NON
Propriétaire	M. Eric BERTHON	DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES	DIR DEP FINANCES PUBLIQUES 3 RUE PIERRE LABACHOT 16022 ANGOULEME CEDEX	NON
Entreprise de travaux de retrait de MPCA	M. Fabien DELRIEUX	DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION	19 Avenue de Berlincan 33160 Saint-Médard-en-Jalles	OUI

Opérateur de repérage				
Nom :	Mathieu BONAMY			
Société :	Bureau Veritas exploitation			
Adresse :	30 avenue Gustave Eiffel 33600 PESSAC			
Certification de compétence :	n°9643080	délivrée par Bureau Veritas certification	14/12/2021	valable jusqu'au 13/12/2028
Assurance :	MSIG	Police n°F210.16.0414	Valide jusqu'au 31/12/2022	

1.5 Dates des opérations d'examen visuel réalisées

Date constat	Référence	Objet
		Néant

Copyright BUREAU VERITAS

2. RESPECT DES CONDITIONS PREALABLES

❑ CCTP des travaux consulté	NON
❑ Dossier de Traçabilité consulté	NON
☒ Rapport de repérage des MPCA consulté	OUI
☒ Plans ou schémas des surfaces à traiter consultés	OUI
☒ Plan de retrait ou d'encapsulage de MPCA consulté 16-06-2022 PDRE & PPSPS 020-022	OUI
☒ Document écrit d'autocontrôle de l'entreprise consulté	OUI
☒ Rapport de mesure d'empoussièrement de la zone de traitement consulté	OUI

3. CONDITIONS D'INTERVENTION

☒ Contrôle avant repli du confinement	OUI
❑ Contrôle après repli du confinement	SO
❑ Absence de confinement	NON
☒ Moyens d'accès permettant d'accéder aux secteurs à contrôler fournis	OUI
☒ Eclairage d'ambiance supérieur à 200 lux	OUI
☒ Surfaces sèches et sans aucun fixateur	OUI
☒ Accompagnement de l'opérateur par l'entreprise de travaux de retrait de MPCA	OUI

4. VISITE GENERALE DE LA ZONE


☒ Le nettoyage est achevé	OUI
❑ Le traitement des MPCA est achevé	SO

Copyright BUREAU VERITAS

5. SCHEMA SITUANT LES SECTEUR(S) EXAMINE(S)

Secteur	Conforme
R+2 - Phase 2	OUI

Schéma situant les secteurs examinés avec en rouge ceux non conformes

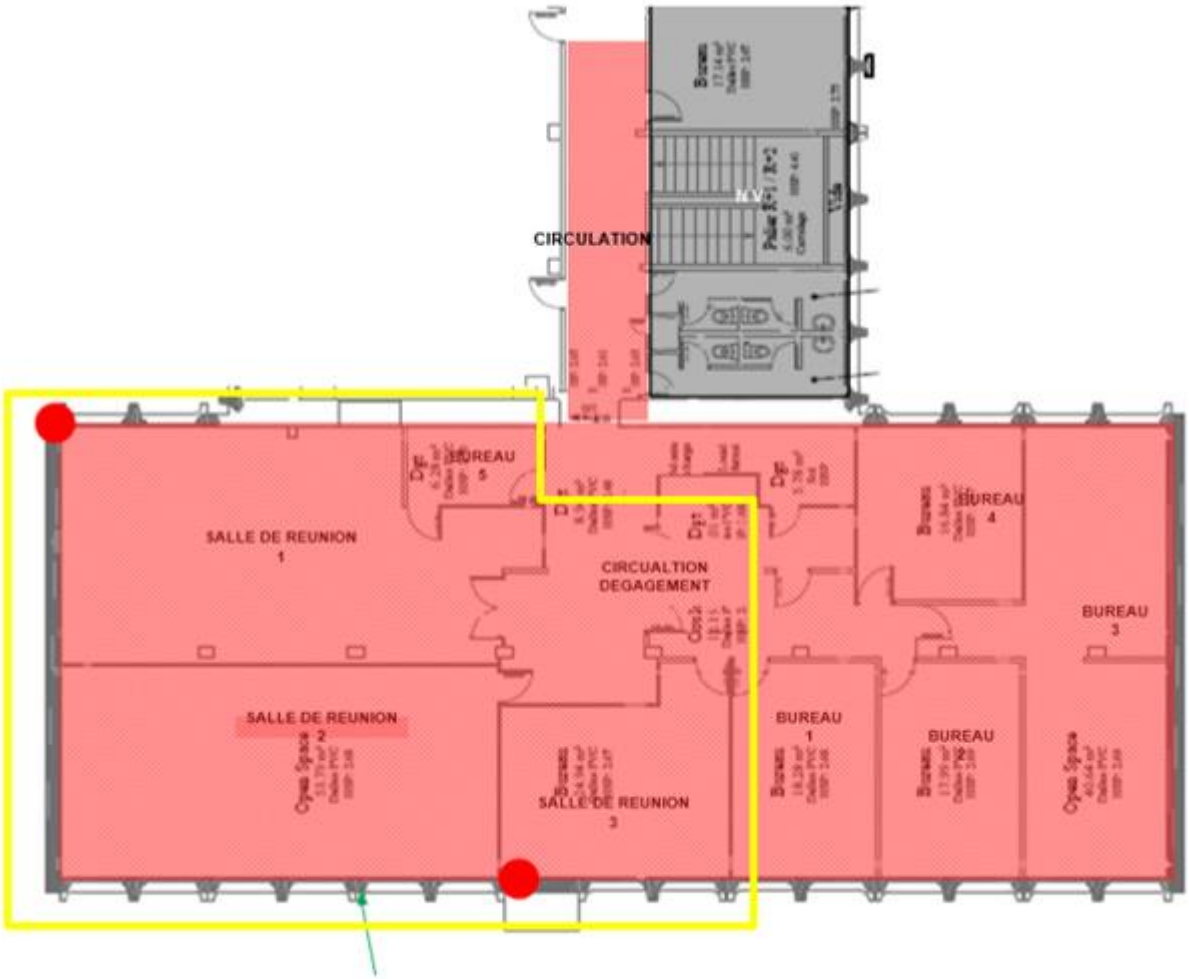

R+2

Copyright BUREAU VERITAS

6. FICHE(S) DE CONSTAT D'ETAT DES SURFACES TRAITEES

6.1 Critères de conformité

Pour chaque élément constructif homogène identifié dans chacun des secteurs, le constat de conformité est établi selon le tableau ci-dessous :

Retrait : Classe de la surface traitée	Conforme	Non Conforme
SD : MPCA et son support déposés	Constat 1 : absence de surface traitée	Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu'il(s) aurai(en)t dû l'être
A1 : support lisse à surface continue	Constat 2 : absence de résidus de MPCA	Constat 4 : présence de résidus libres de MPCA ou Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu'il(s) aurai(en)t dû l'être
A2 : support lisse à surface discontinue	Constat 2 : absence de résidus de MPCA ou Constat 3 : présence de résidus incrustés de MPCA	Constat 4 : présence de résidus libres de MPCA ou Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu'il(s) aurai(en)t dû l'être
B1 : support avec pores ou aspérités et surface continue	Constat 2 : absence de résidus de MPCA ou Constat 3 : présence de résidus incrustés de MPCA	Constat 4 : présence de résidus libres de MPCA ou Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu'il(s) aurai(en)t dû l'être
B2 : support avec pores ou aspérités et surface discontinue	Constat 2 : absence de résidus de MPCA ou Constat 3 : présence de résidus incrustés de MPCA	constat 4 : présence de résidus libres de MPCA ou Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu'il(s) aurai(en)t dû l'être

Procédé d'encapsulage	Conforme	Non Conforme
E1 encoffrement	Constat 6 : application sur la totalité de la surface à traiter	Constat 7 : non-application sur tout ou partie de la surface à traiter
E2 doublage	Constat 6 : application sur la totalité de la surface à traiter	Constat 7 : non-application sur tout ou partie de la surface à traiter
E3 fixation par revêtement	Constat 6 : application sur la totalité de la surface à traiter	Constat 7 : non-application sur tout ou partie de la surface à traiter
E4 imprégnation	Constat 6 : application sur la totalité de la surface à traiter	Constat 7 : non-application sur tout ou partie de la surface à traiter

Copyright BUREAU VERITAS

Constat 1 : absence de surface traitée ; NOTE Dans le cas où le MPCA a été retiré avec son support (ex. cloison, conduit avec son calorifuge amiante, joint de bride…), le constat indiquera le retrait du MPCA et de son support.
Constat 2 : absence de résidus de MPCA
Constat 3 : présence de résidus incrustés de MPCA. L'opérateur décrit les résidus incrustés qu'il a constatés et précise s'ils sont ponctuels ou non en motivant son choix
Constat 4 : présence de résidus libres de MPCA
Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu'il(s) aurai(en)t dû l'être
Constat 6 : application sur la totalité de la surface à traiter et, le cas échéant, protections jointives et jointoyées
Constat 7 : non-application sur tout ou partie de la surface à traiter et, le cas échéant, protections non-jointives ou non-jointoyées en tout ou partie

Copyright BUREAU VERITAS

6.2 Résultats par secteur

Phase 2 au R+2								
MPCA	**Eléments constructifs homogènes/ jonction**	**Catégorie de constat (Retrait)**						**Résultat** C, ou NC, ou R
		Classe de surface traitée	**1 - Absence de surface traitée**	**2 - Absence de résidus**	**3 - Résidus incrustés**	**4 - Résidus libres**	**5 - MPCA non traité**	
Dalle de sol + linoléum	Plancher	Béton B2		X				C
Colle bitumineuse noire	Plancher	Béton B2		X				C
Commentaires : Néant								

7. PROCES VERBAL DE VISITE

Néant

8. CONCLUSION

LA PREMIERE ETAPE DE L'EXAMEN VISUEL EST :


☒ **CONFORME SANS REMARQUE**

9. PHOTOS

Légende photo : Photo 1



Copyright BUREAU VERITAS

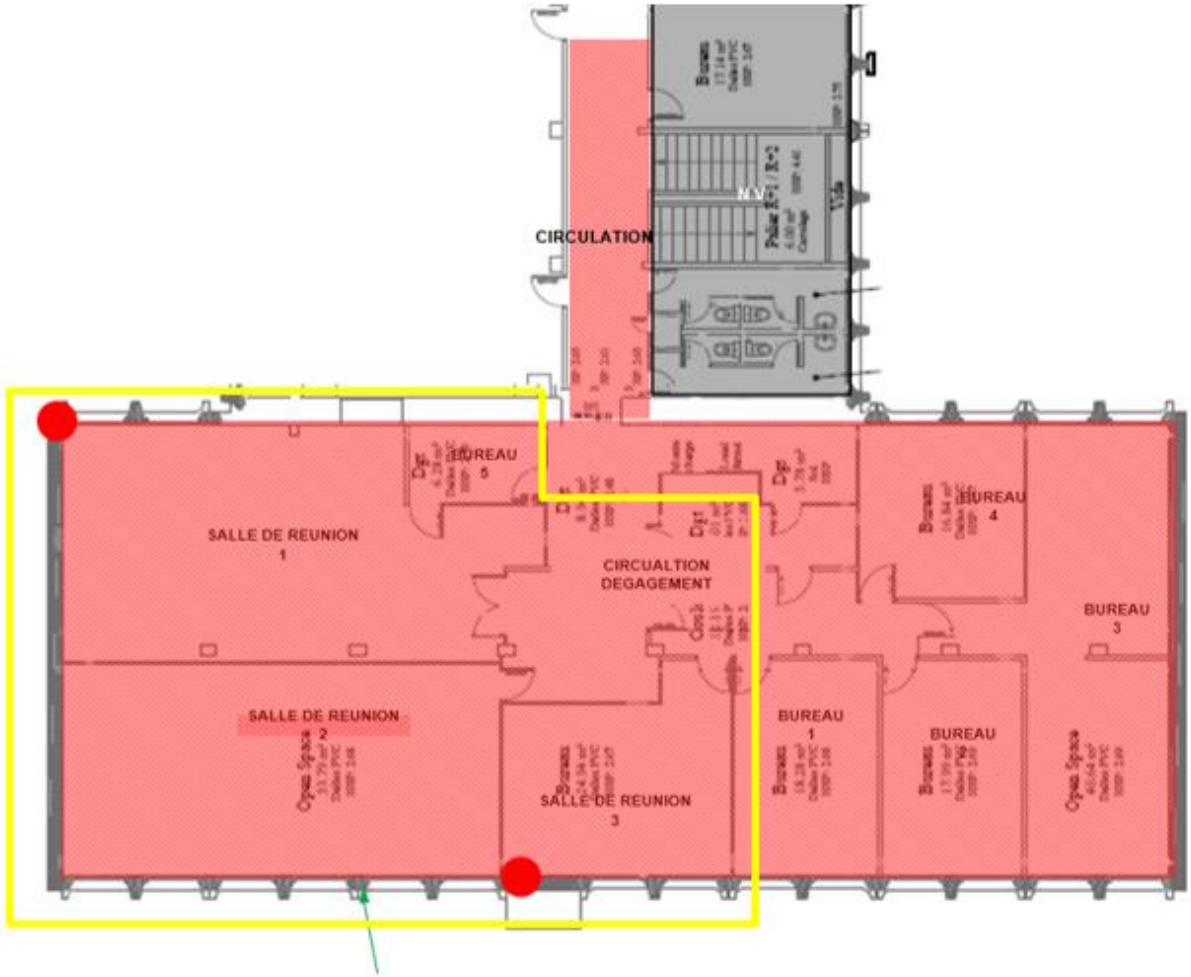

BUREAU VERITAS

Légende

Zone Inspectée

Secteurs

Résidus

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) **Diagnostic amiante**
- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) **Autres diagnostics**
- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière
  - ERP
  - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

Copyright BUREAU VERITAS

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
  - En cas de location / vente
  - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**

4) **Conseil en performance énergétique.**

5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil**.

6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**

7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tel : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 00037 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

Copyright BUREAU VERITAS

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

BONAMY Mathieu

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**14/12/2021**	**13/12/2028**
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**14/12/2021**	**13/12/2028**
Electricité	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**03/04/2022**	**02/04/2029**
Gaz	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**13/12/2021**	**12/12/2028**
Plomb sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**12/12/2021**	**11/12/2028**
Termites métropole	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	**14/12/2021**	**13/12/2028**

Date : 08/12/2021 Numéro de certificat : 9643080

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

Copyright BUREAU VERITAS

Constat n° : 15858445

Date du constat : 26/08/2022
