CS 58212 36 avenue Jean
Mermoz
69355 LYON CEDEX 08
Tel : 04.72.78.44.62
Fax : 04 72 78 44 68

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

A INFORMATIONS GENERALES

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : **Bâtiment**
Cat. du bâtiment : **Autre**
Nombre de Parties d'immeuble : **2**
Etage : **R + 6 avec un sous-sol**
Numéro de Lot : **NC**
Référence Cadastrale : **NC**
Date du Permis de Construire : **Non Communiquée**

Adresse : **247 avenue Jacques Cartier Bâtiment BRUN 83090 TOULON**
Escalier :
Bâtiment :
Porte :

Propriété de: **CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE**

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE**
Adresse : **247 AV. JACQUES CARTIER 83090 TOULON CEDEX 9**
Qualité :

Documents remis : **Plans**
Moyens mis à disposition : **Aucun**

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : 14-11-014296 A
Le repérage a été réalisé le : **24/11/2014**
Par : **HERNANDEZ EMMANUEL**
N° certificat de qualification : **CPDI 1957**
Date d'obtention : **20/07/2012**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
ICERT
Parc Edonia - Bât G
rue de la Terre Victoria
35760 SAINT-GRÉGOIRE

Date de commande : 21/11/2014

Date d'émission du rapport : **15/12/2014**
Accompagnateur : **PRADINES**
Laboratoire d'Analyses : **ITGA AIX EN PROVENCE**
Adresse laboratoire : **Arteparc Bât E Route de la côte d'Azur - CS 30012 13590 MEYREUIL**
Numéro d'accréditation : **1-1029**

Organisme d'assurance professionnelle :
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE – 4 rue Jules Lefevre – 75426 Paris Cedex 09

N° de contrat d'assurance et date de validité :
XFR0050627LI du 01/01/2014 au 31/12/2014
XFR0048625FI09A du 01/01/2014 au 31/12/2014AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE - 4 rue Jules Lefevre - 75426 PARIS CEDEX 09

NATURE DES TRAVAUX

CONSTAT AMIANTE

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Plafonds :
Dépose de tous les plafonds existants et intervention dans tous les plenums du N-1 au R +7.
Intervention sur locaux contenant du flocage en N-1
SOLS :
Depose et rebouchage des canalisation des terminaux existants dans chaque bureau, salle de réunion N-1 au R + 7.
Réalisation de carottages au pieds de gaines à chaque niveau pour passage de réseaux.
CLOISONS :
Création et rebouchage de traversées sur toutes les cloisons entre circulation et bureau.
Dépose des réseaux fixés sur les cloisons bureau, salle de réunion du N-1 au R-7 et locaux techniques.
RESEAUX : Intervention sur les chaudières et CTA conservées et autres matériels de ces locaux.Dépose de tous les réseaux hydrauliques et calorifugeages existants du N-1 au R+7.
Dépose de toutes les gaines d'extractions etr de soufflages du N-1 au R + 7.
TOITURE :
Dépose et réfection d'étanchéité de toutes les toitures, tous revêtements.

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise



Date d'établissement du rapport :
Fait à **LYON CEDEX 08** le **15/12/2014**

Nom du diagnostiqueur : **HERNANDEZ EMMANUEL**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Ce rapport original ne peut être reproduit sans notre autorisation et ne peut être utilisé de façon partielle.

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES 1

DESIGNATION DU BATIMENT 1

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 1

EXECUTION DE LA MISSION 1

NATURE DES TRAVAUX 1

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 2

SOMMAIRE 3

CONCLUSION(S) 4

LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION 13

LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION 13

PROGRAMME DE REPERAGE 14

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 15

RAPPORTS PRECEDENTS 15

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 15

LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION 16

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 22

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR 22

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE 23

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS. 24

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) 36

COMMENTAIRES 36

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 37

ANNEXE 2 – CROQUIS 54

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES 63

ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 175

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
1	**Escalier C**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
2	**B 801**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
3	**B 862**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
4	**Dégagements**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
5	**B 854**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
6	**B846**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
7	**Tunnel**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
8	**Couloir**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
9	**B 864**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
9	**B 864**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 16	
9	**B 864**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 17	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 1	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 2	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 3	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 4	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 5	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 6	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 7	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 8	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 9	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Plafond**	Plafond	Ciment composite - Flocage	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Plinthes**	Toutes zones	Plinthe - Colle	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Colle carrelage	
10	**Chaufferie**	1er SS	**Plancher**	Sol	Chape maigre	
11	**Groupe Froid B850**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 10	
11	**Groupe Froid B850**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 11	
11	**Groupe Froid B850**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 12	
11	**Groupe Froid B850**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 13	
11	**Groupe Froid B850**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 14	
11	**Groupe Froid B850**	1er SS	**Conduit de fluides**	Toutes zones	Calorifugeage 15	
13	**B 838**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
14	**B 834**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
15	**Couloir escalier B**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
16	**B 830**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
17	**B 826**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
18	**B 822**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
19	**Magasin**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
20	**B 814**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
21	**B 810**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
22	**Compo**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
23	**Compostage B 837**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
24	**B 806**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
25	**B 802**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
26	**B 861**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
27	**B 857**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
28	**B 853**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
29	**B 841**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
30	**B 839**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
31	**B 833**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
32	**B 827**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
33	**B 829**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
34	**B 825**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
35	**B 821**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
36	**B 817**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
37	**B 813**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
38	**B 809**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
39	**B 805**	1er SS	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifugeage	
41	**Accueil assurés**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
42	**Dégagements**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
42	**Dégagements**	RDC	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
42	**Dégagements**	RDC	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifuge	
43	**Couloir**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
44	**B 008**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
45	**B 006**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
46	**B 022**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
47	**B 073**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
48	**B 065 CFDT**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
48	**B 065 CFDT**	RDC	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
49	**B 063**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
50	**B 061**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
51	**B 057**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
52	**Sanitaires**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
53	**B 045**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
54	**B 041**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
55	**SAS**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
56	**Reunion B 037**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
57	**B 033**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
58	**B 029**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
59	**Dégagement**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
60	**Couloir esc B**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
61	**Dégagements**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
61	**Dégagements**	RDC	**Cloisons**	Toutes zones	Joint calicot - Enduit	
61	**Dégagements**	RDC	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifuge	
62	**B 021**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
63	**B 025**	RDC	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	
64	**Coin café**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
65	**B 013**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
65	**B 013**	RDC	**Cloisons**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
66	**B 009**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
67	**Dégagements**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
76	**Infirmerie**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
76	**Infirmerie**	RDC	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
77	**B 084**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
78	**B 080**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
79	**B 068**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
80	**B 076**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
81	**B 072**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
82	**B 060**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
82	**B 060**	RDC	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
83	**B 054**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
84	**B 050**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
85	**B 046**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
86	**B 044**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
87	**B 042**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
88	**B 040**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
89	**B 038**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
90	**B 034**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
91	**B 030**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
92	**B 026**	RDC	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
93	**Couloir escalier B**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
94	**Dégagements**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
95	**B 123**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
96	**B 121**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
97	**B 117**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
98	**B 113**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
99	**Couloir escalier C**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
100	**Sanitaires B109/B 105**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
101	**Dégagements**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
101	**Dégagements**	1er	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Béton - Enduit	
102	**Sanitaires B 146/B 150**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
103	**Escalier D**	1er	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
104	**B 158**	1er	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
104	**B 158**	1er	**Murs**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
105	**B 154**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
106	**B 142**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
106	**B 142**	1er	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
106	**B 142**	1er	**Cloisons**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
107	**B 138**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
108	**B 134**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
109	**B 126**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
109	**B 126**	1er	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
109	**B 126**	1er	**Cloisons**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
110	**B 130**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
110	**B 130**	1er	**Cloisons**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
111	**B 122**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
112	**B 118**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
113	**B 114**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
114	**B 110**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
115	**B 106**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
115	**B 106**	1er	**Conduit de fluides**	C	Mousse noire - Bitumineux	
116	**B 102**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
118	**Circulaion B 143**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
119	**B 140**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
120	**B 144**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
121	**B 148**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
122	**B 152**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
123	**B 147**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
124	**B 145**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
125	**B 139**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
125	**B 139**	1er	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
125	**B 139**	1er	**Cloisons**	Toutes zones	Plâtre - Peinture décorative	
126	**B 135**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
127	**B 131**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
128	**B 127**	1er	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
129	**B 125**	1er	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	
130	**Escalier B**	2ème	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
131	**Dégagements**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
131	**Dégagements**	2ème	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
131	**Dégagements**	2ème	**Cloisons circulation**	Toutes zones	joint calicot - Enduit	
132	**B 225**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
133	**B 229**	2ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	
134	**B 221**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
135	**B 217**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
136	**B 213**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
137	**Couloir Esc C**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
137	**Couloir Esc C**	2ème	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
138	**Sanitaires B 209/205**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
139	**B 230**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
140	**B 238**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
141	**B 242**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
142	**B 234**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
143	**B 228**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
144	**B 226**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
145	**B 222**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
146	**B 218**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
147	**B 214**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
148	**B 212**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
149	**B 210**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
150	**B 206**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
151	**B 202**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
151	**B 202**	2ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
151	**B 202**	2ème	**Cloisons**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
153	**B 257**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
154	**B 277**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
155	**B 273**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
156	**B 269**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
157	**B 265**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
158	**B 261**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
159	**Sanitaires B 251/253**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
160	**B 249**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
161	**B 247**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
162	**B 245**	2ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
163	**Couloir Esc B**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
163	**Couloir Esc B**	3ème	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
164	**Dégagements**	3ème	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
164	**Dégagements**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
165	**B 333**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
166	**B 335**	3ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
167	**B 329**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
168	**B 325**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
169	**Couloir Esc C**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
169	**Couloir Esc C**	3ème	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
170	**B 323**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
171	**B 300**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
172	**B 321**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
173	**B 313**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
174	**B 309**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
175	**B 305**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
176	**B 301**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
177	**B 358**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
177	**B 358**	3ème	**Plafond**	Plafond	Béton - Flocage	
178	**B 354**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
179	**B 342**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
180	**B 338**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
181	**B 334**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
182	**B 326**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
183	**B 322**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
183	**B 322**	3ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
183	**B 322**	3ème	**Murs**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
184	**B 318**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
185	**B 310**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
186	**B 306**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
187	**B 302**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
188	**Hall principal**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux-plafond	
189	**B 367**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
190	**B 369**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
191	**B 365**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
192	**B 363**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
193	**B 361**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
194	**B 349**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
195	**B 345**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
196	**B 341**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
197	**B 337**	3ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
198	**Couloir Esc B**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
199	**Dégagements**	4ème	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
199	**Dégagements**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
200	**B 441**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
201	**B 443**	4ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	
202	**B 439**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
203	**B 437**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
204	**B 435**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
204	**B 435**	4ème	**Plancher haut**	Plafond	Ciment composite	
205	**Couloir Esc C**	4ème	**Plancher haut**	Plafond	Ciment composite	
206	**B 429**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
207	**B 433**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
208	**Dégagements**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
209	**B 425**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
209	**B 425**	4ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B


N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
209	**B 425**	4ème	**Mur**	Toutes zones	Plâtre - Peinture	
210	**B 421**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
211	**B 417**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
212	**B 413**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
213	**B 409**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
214	**B 405**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
215	**B 401**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
216	**B 444**	4ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	
217	**B 440**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
218	**B 438**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
219	**B 434**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
220	**B 430**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
221	**B 426**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
222	**B 422**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
223	**B 418**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
224	**B 414**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
225	**B 412**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
226	**B 408**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
226	**B 408**	4ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
226	**B 408**	4ème	**Mur**	Toutes zones	Plâtre - Peinture	
227	**B 406**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
228	**Hall principal**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux-plafond	
229	**B 481**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
230	**B 404**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
231	**B 402**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
232	**B 400**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
233	**B 483**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
234	**B 477/473**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
235	**B 465**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
236	**B 461**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
237	**B 457**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
238	**B 453**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
239	**B 449**	4ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
240	**Couloir Esc B**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
240	**Couloir Esc B**	5ème	**Plancher haut**	Plafond	Ciment composite	
241	**Dégagements**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
241	**Dégagements**	5ème	**Plancher haut**	Plafond	Ciment composite	
242	**B 553**	5ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	
243	**B 539**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
244	**B 535**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
245	**B 537**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
246	**B 533**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
247	**B 531**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
248	**B 529**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
249	**Couloir Esc C**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
249	**Couloir Esc C**	5ème	**Plancher haut**	Plafond	Ciment composite	
250	**Dégagements**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
250	**Dégagements**	5ème	**Plancher haut**	Plafond	Ciment composite	
251	**Sanitaires**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
252	**B 521**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
253	**B 517**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
254	**B 513**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
255	**B 509**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
256	**B 505**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
257	**B 503**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
258	**B 501**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
259	**Escalier E**	5ème	**Plancher haut**	Plafond	Ciment composite	
260	**B 542**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
261	**B 538**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
261	**B 538**	5ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
261	**B 538**	5ème	**Murs**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
262	**B 534**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
263	**B 526**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
264	**B 522**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
264	**B 522**	5ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
264	**B 522**	5ème	**Murs**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
265	**B 518**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
266	**B 506**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
267	**B 502**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
268	**B 500**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
269	**B 567**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
270	**B 597**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
271	**B 595**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
271	**B 595**	5ème	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
271	**B 595**	5ème	**Cloisons bureau**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
272	**B 591**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
273	**B 589**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
274	**B 583/B 579**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
275	**B 575**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
276	**B 569**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
277	**B 565**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
278	**B 561**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
279	**B 557**	5ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
280	**Couloir Esc 6**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
280	**Couloir Esc 6**	6ème	**Plancher haut**	Plafond	Ciment composite	
281	**Dégagements**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
281	**Dégagements**	6ème	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
282	**B 637**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
283	**B 639**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
284	**B 633**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
285	**B 629**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
286	**B 625**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
287	**Couloir Esc C**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
288	**Dégagements**	6ème	**Cloisons**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
288	**Dégagements**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
288	**Dégagements**	6ème	**Plancher haut**	Plafond	Ciment composite	
288	**Dégagements**	6ème	**Cloisons**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
288	**Dégagements**	6ème	**Conduit de fluides**	Plafond	Calorifuge	
288	**Dégagements**	6ème	**Conduit de fluides**	Plafond	Plaques isolantes	
289	**B 609**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
290	**B 605**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
291	**B 601**	6ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
291	**B 601**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
292	**B 626**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
293	**B 622**	6ème	**Mur**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
293	**B 622**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
294	**B 618**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
295	**B 614**	6ème	**Cloisons circulation**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
295	**B 614**	6ème	**Cloisons bureaux**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
295	**B 614**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
296	**B 612**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
297	**B 610**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
298	**B 606**	6ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
298	**B 606**	6ème	**Murs**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
299	**B 657**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
299	**B 657**	6ème	**Mur**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
300	**Toit terrasse**	6ème	**Toiture n°1**	Sol	Relevé d'étanchéité	
300	**Toit terrasse**	6ème	**Toiture n°2**	Sol	Etanchéité + isolant	
301	**B 661**	6ème	**Murs**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
301	**B 661**	6ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	
302	**B 653**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
303	**B 649**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
304	**B 645**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
305	**B 702**	7ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage + joint + ragréage	
305	**B 702**	7ème	**Cloisons**	Toutes zones	Plâtre - Peinture	
305	**B 702**	7ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
305	**B 702**	7ème	**Gaine horizontale**	Plafond	Calorifuge	
306	**B 700**	7ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
307	**B 705**	7ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
308	**B 701**	7ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
309	**B 706**	7ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
310	**B 708**	7ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
311	**B 710**	7ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
312	**B 714**	7ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
313	**Terrasse**	7ème	**Plancher**	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	
314	**Toit terrasse**	7ème	**Toiture**	Acrotères	Etanchéité bitumineuse	
314	**Toit terrasse**	7ème	**Toiture**	Sol	Etanchéité bitumineuse + isolant	
314	**Toit terrasse**	7ème	**Toiture**	Sol	Etanchéité bitumineuse + isolant	
314	**Toit terrasse**	7ème	**Toiture**	Sol	Relevé d'étanchéité	
314	**Toit terrasse**	7ème	**Toiture**	Sol	Relevé d'étanchéité	
315	**Toiture vague**	7ème	**Toiture**	Sol	Etanchéité bitumineuse + isolant	
317	**Escalier**	6ème	**Faux-plafond**	Plafond	Panneaux de faux - plafond	
317	**Escalier**	6ème	**Plafond**	Plafond	Ciment composite	
317	**Escalier**	6ème	**Cloisons n°1**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
317	**Escalier**	6ème	**Cloisons n°2**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
317	**Escalier**	6ème	**Cloisons n°3**	Toutes zones	Plâtre - Enduit	
318	**Terrasse nord**	1er	**Toiture n°1**	Sol	Relevé d'étanchéité	

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Photo
318	**Terrasse nord**	1er	**Toiture n°2**	Sol	Etanchéité	
319	**Terrasse sud**	1er	**Toiture n°1**	Sol	Relevé d'étanchéité	
319	**Terrasse sud**	1er	**Toiture n°1**	Sol	Etanchéité bitumineuse	
320	**Toit terrasse**	3ème	**Toiture n°1**	Sol	Etanchéité bitumineuse	
320	**Toit terrasse**	3ème	**Toiture n°1**	Sol	Relevé d'étanchéité	
321	**Toit terrasse**	5ème	**Toiture**	Sol	Etanchéité bitumineuse	

Liste des Parties d'immeuble non visitées concernées par les travaux et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Eléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Eléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 24/11/2014

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 :

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

N°	Partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification	Travaux
1	Escalier C	1er SS	OUI		*Concernée*
2	B 801	1er SS	OUI		*Concernée*
3	B 862	1er SS	OUI		*Concernée*
4	Dégagements	1er SS	OUI		*Concernée*
5	B 854	1er SS	OUI		*Concernée*
6	B846	1er SS	OUI		*Concernée*
7	Tunnel	1er SS	OUI		*Concernée*
8	Couloir	1er SS	OUI		*Concernée*
9	B 864	1er SS	OUI		*Concernée*
10	Chaufferie	1er SS	OUI		*Concernée*
11	Groupe Froid B850	1er SS	OUI		*Concernée*
12	Traitement air B842	1er SS	OUI		*Concernée*
13	B 838	1er SS	OUI		*Concernée*
14	B 834	1er SS	OUI		*Concernée*
15	Couloir escalier B	1er SS	OUI		*Concernée*
16	B 830	1er SS	OUI		*Concernée*
17	B 826	1er SS	OUI		*Concernée*
18	B 822	1er SS	OUI		*Concernée*
19	Magasin	1er SS	OUI		*Concernée*
20	B 814	1er SS	OUI		*Concernée*
21	B 810	1er SS	OUI		*Concernée*
22	Compo	1er SS	OUI		*Concernée*
23	Compostage B 837	1er SS	OUI		*Concernée*
24	B 806	1er SS	OUI		*Concernée*
25	B 802	1er SS	OUI		*Concernée*
26	B 861	1er SS	OUI		*Concernée*
27	B 857	1er SS	OUI		*Concernée*
28	B 853	1er SS	OUI		*Concernée*
29	B 841	1er SS	OUI		*Concernée*
30	B 839	1er SS	OUI		*Concernée*
31	B 833	1er SS	OUI		*Concernée*
32	B 827	1er SS	OUI		*Concernée*
33	B 829	1er SS	OUI		*Concernée*
34	B 825	1er SS	OUI		*Concernée*
35	B 821	1er SS	OUI		*Concernée*
36	B 817	1er SS	OUI		*Concernée*
37	B 813	1er SS	OUI		*Concernée*
38	B 809	1er SS	OUI		*Concernée*
39	B 805	1er SS	OUI		*Concernée*
40	Accueil	RDC	OUI		*Concernée*
41	Accueil assurés	RDC	OUI		*Concernée*
42	Dégagements	RDC	OUI		*Concernée*
43	Couloir	RDC	OUI		*Concernée*
44	B 008	RDC	OUI		*Concernée*
45	B 006	RDC	OUI		*Concernée*
46	B 022	RDC	OUI		*Concernée*
47	B 073	RDC	OUI		*Concernée*
48	B 065 CFDT	RDC	OUI		*Concernée*
49	B 063	RDC	OUI		*Concernée*
50	B 061	RDC	OUI		*Concernée*
51	B 057	RDC	OUI		*Concernée*
52	Sanitaires	RDC	OUI		*Concernée*
53	B 045	RDC	OUI		*Concernée*
54	B 041	RDC	OUI		*Concernée*
55	SAS	RDC	OUI		*Concernée*
56	Reunion B 037	RDC	OUI		*Concernée*
57	B 033	RDC	OUI		*Concernée*
58	B 029	RDC	OUI		*Concernée*
59	Dégagement	RDC	OUI		*Concernée*
60	Couloir esc B	RDC	OUI		*Concernée*

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

N°	Partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification	Travaux
61	Dégagements	RDC	OUI		*Concernée*
62	B 021	RDC	OUI		*Concernée*
63	B 025	RDC	OUI		*Concernée*
64	Coin café	RDC	OUI		*Concernée*
65	B 013	RDC	OUI		*Concernée*
66	B 009	RDC	OUI		*Concernée*
67	Dégagements	RDC	OUI		*Concernée*
68	Couloir esc C	RDC	OUI		*Concernée*
69	Couloir sanitaires	RDC	OUI		*Concernée*
70	Toilettes H et F	RDC	OUI		*Concernée*
71	B 096	RDC	OUI		*Concernée*
72	B 098	RDC	OUI		*Concernée*
73	Couloir	RDC	OUI		*Concernée*
74	B 092	RDC	OUI		*Concernée*
75	B 088	RDC	OUI		*Concernée*
76	Infirmerie	RDC	OUI		*Concernée*
77	B 084	RDC	OUI		*Concernée*
78	B 080	RDC	OUI		*Concernée*
79	B 068	RDC	OUI		*Concernée*
80	B 076	RDC	OUI		*Concernée*
81	B 072	RDC	OUI		*Concernée*
82	B 060	RDC	OUI		*Concernée*
83	B 054	RDC	OUI		*Concernée*
84	B 050	RDC	OUI		*Concernée*
85	B 046	RDC	OUI		*Concernée*
86	B 044	RDC	OUI		*Concernée*
87	B 042	RDC	OUI		*Concernée*
88	B 040	RDC	OUI		*Concernée*
89	B 038	RDC	OUI		*Concernée*
90	B 034	RDC	OUI		*Concernée*
91	B 030	RDC	OUI		*Concernée*
92	B 026	RDC	OUI		*Concernée*
93	Couloir escalier B	1er	OUI		*Concernée*
94	Dégagements	1er	OUI		*Concernée*
95	B 123	1er	OUI		*Concernée*
96	B 121	1er	OUI		*Concernée*
97	B 117	1er	OUI		*Concernée*
98	B 113	1er	OUI		*Concernée*
99	Couloir escalier C	1er	OUI		*Concernée*
100	Sanitaires B109/B 105	1er	OUI		*Concernée*
101	Dégagements	1er	OUI		*Concernée*
102	Sanitaires B 146/B 150	1er	OUI		*Concernée*
103	Escalier D	1er	OUI		*Concernée*
104	B 158	1er	OUI		*Concernée*
105	B 154	1er	OUI		*Concernée*
106	B 142	1er	OUI		*Concernée*
107	B 138	1er	OUI		*Concernée*
108	B 134	1er	OUI		*Concernée*
109	B 126	1er	OUI		*Concernée*
110	B 130	1er	OUI		*Concernée*
111	B 122	1er	OUI		*Concernée*
112	B 118	1er	OUI		*Concernée*
113	B 114	1er	OUI		*Concernée*
114	B 110	1er	OUI		*Concernée*
115	B 106	1er	OUI		*Concernée*
116	B 102	1er	OUI		*Concernée*
117	Hall principal	1er	OUI		*Concernée*
118	Circulaion B 143	1er	OUI		*Concernée*
119	B 140	1er	OUI		*Concernée*
120	B 144	1er	OUI		*Concernée*
121	B 148	1er	OUI		*Concernée*

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

N°	Partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification	Travaux
122	B 152	1er	OUI		*Concernée*
123	B 147	1er	OUI		*Concernée*
124	B 145	1er	OUI		*Concernée*
125	B 139	1er	OUI		*Concernée*
126	B 135	1er	OUI		*Concernée*
127	B 131	1er	OUI		*Concernée*
128	B 127	1er	OUI		*Concernée*
129	B 125	1er	OUI		*Concernée*
130	Escalier B	2ème	OUI		*Concernée*
131	Dégagements	2ème	OUI		*Concernée*
132	B 225	2ème	OUI		*Concernée*
133	B 229	2ème	OUI		*Concernée*
134	B 221	2ème	OUI		*Concernée*
135	B 217	2ème	OUI		*Concernée*
136	B 213	2ème	OUI		*Concernée*
137	Couloir Esc C	2ème	OUI		*Concernée*
138	Sanitaires B 209/205	2ème	OUI		*Concernée*
139	B 230	2ème	OUI		*Concernée*
140	B 238	2ème	OUI		*Concernée*
141	B 242	2ème	OUI		*Concernée*
142	B 234	2ème	OUI		*Concernée*
143	B 228	2ème	OUI		*Concernée*
144	B 226	2ème	OUI		*Concernée*
145	B 222	2ème	OUI		*Concernée*
146	B 218	2ème	OUI		*Concernée*
147	B 214	2ème	OUI		*Concernée*
148	B 212	2ème	OUI		*Concernée*
149	B 210	2ème	OUI		*Concernée*
150	B 206	2ème	OUI		*Concernée*
151	B 202	2ème	OUI		*Concernée*
152	Hall principal	2ème	OUI		*Concernée*
153	B 257	2ème	OUI		*Concernée*
154	B 277	2ème	OUI		*Concernée*
155	B 273	2ème	OUI		*Concernée*
156	B 269	2ème	OUI		*Concernée*
157	B 265	2ème	OUI		*Concernée*
158	B 261	2ème	OUI		*Concernée*
159	Sanitaires B 251/253	2ème	OUI		*Concernée*
160	B 249	2ème	OUI		*Concernée*
161	B 247	2ème	OUI		*Concernée*
162	B 245	2ème	OUI		*Concernée*
163	Couloir Esc B	3ème	OUI		*Concernée*
164	Dégagements	3ème	OUI		*Concernée*
165	B 333	3ème	OUI		*Concernée*
166	B 335	3ème	OUI		*Concernée*
167	B 329	3ème	OUI		*Concernée*
168	B 325	3ème	OUI		*Concernée*
169	Couloir Esc C	3ème	OUI		*Concernée*
170	B 323	3ème	OUI		*Concernée*
171	B 300	3ème	OUI		*Concernée*
172	B 321	3ème	OUI		*Concernée*
173	B 313	3ème	OUI		*Concernée*
174	B 309	3ème	OUI		*Concernée*
175	B 305	3ème	OUI		*Concernée*
176	B 301	3ème	OUI		*Concernée*
177	B 358	3ème	OUI		*Concernée*
178	B 354	3ème	OUI		*Concernée*
179	B 342	3ème	OUI		*Concernée*
180	B 338	3ème	OUI		*Concernée*
181	B 334	3ème	OUI		*Concernée*
182	B 326	3ème	OUI		*Concernée*

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

N°	Partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification	Travaux
183	B 322	3ème	OUI		*Concernée*
184	B 318	3ème	OUI		*Concernée*
185	B 310	3ème	OUI		*Concernée*
186	B 306	3ème	OUI		*Concernée*
187	B 302	3ème	OUI		*Concernée*
188	Hall principal	3ème	OUI		*Concernée*
189	B 367	3ème	OUI		*Concernée*
190	B 369	3ème	OUI		*Concernée*
191	B 365	3ème	OUI		*Concernée*
192	B 363	3ème	OUI		*Concernée*
193	B 361	3ème	OUI		*Concernée*
194	B 349	3ème	OUI		*Concernée*
195	B 345	3ème	OUI		*Concernée*
196	B 341	3ème	OUI		*Concernée*
197	B 337	3ème	OUI		*Concernée*
198	Couloir Esc B	4ème	OUI		*Concernée*
199	Dégagements	4ème	OUI		*Concernée*
200	B 441	4ème	OUI		*Concernée*
201	B 443	4ème	OUI		*Concernée*
202	B 439	4ème	OUI		*Concernée*
203	B 437	4ème	OUI		*Concernée*
204	B 435	4ème	OUI		*Concernée*
205	Couloir Esc C	4ème	OUI		*Concernée*
206	B 429	4ème	OUI		*Concernée*
207	B 433	4ème	OUI		*Concernée*
208	Dégagements	4ème	OUI		*Concernée*
209	B 425	4ème	OUI		*Concernée*
210	B 421	4ème	OUI		*Concernée*
211	B 417	4ème	OUI		*Concernée*
212	B 413	4ème	OUI		*Concernée*
213	B 409	4ème	OUI		*Concernée*
214	B 405	4ème	OUI		*Concernée*
215	B 401	4ème	OUI		*Concernée*
216	B 444	4ème	OUI		*Concernée*
217	B 440	4ème	OUI		*Concernée*
218	B 438	4ème	OUI		*Concernée*
219	B 434	4ème	OUI		*Concernée*
220	B 430	4ème	OUI		*Concernée*
221	B 426	4ème	OUI		*Concernée*
222	B 422	4ème	OUI		*Concernée*
223	B 418	4ème	OUI		*Concernée*
224	B 414	4ème	OUI		*Concernée*
225	B 412	4ème	OUI		*Concernée*
226	B 408	4ème	OUI		*Concernée*
227	B 406	4ème	OUI		*Concernée*
228	Hall principal	4ème	OUI		*Concernée*
229	B 481	4ème	OUI		*Concernée*
230	B 404	4ème	OUI		*Concernée*
231	B 402	4ème	OUI		*Concernée*
232	B 400	4ème	OUI		*Concernée*
233	B 483	4ème	OUI		*Concernée*
234	B 477/473	4ème	OUI		*Concernée*
235	B 465	4ème	OUI		*Concernée*
236	B 461	4ème	OUI		*Concernée*
237	B 457	4ème	OUI		*Concernée*
238	B 453	4ème	OUI		*Concernée*
239	B 449	4ème	OUI		*Concernée*
240	Couloir Esc B	5ème	OUI		*Concernée*
241	Dégagements	5ème	OUI		*Concernée*
242	B 553	5ème	OUI		*Concernée*
243	B 539	5ème	OUI		*Concernée*

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

N°	Partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification	Travaux
244	B 535	5ème	OUI		*Concernée*
245	B 537	5ème	OUI		*Concernée*
246	B 533	5ème	OUI		*Concernée*
247	B 531	5ème	OUI		*Concernée*
248	B 529	5ème	OUI		*Concernée*
249	Couloir Esc C	5ème	OUI		*Concernée*
250	Dégagements	5ème	OUI		*Concernée*
251	Sanitaires	5ème	OUI		*Concernée*
252	B 521	5ème	OUI		*Concernée*
253	B 517	5ème	OUI		*Concernée*
254	B 513	5ème	OUI		*Concernée*
255	B 509	5ème	OUI		*Concernée*
256	B 505	5ème	OUI		*Concernée*
257	B 503	5ème	OUI		*Concernée*
258	B 501	5ème	OUI		*Concernée*
259	Escalier E	5ème	OUI		*Concernée*
260	B 542	5ème	OUI		*Concernée*
261	B 538	5ème	OUI		*Concernée*
262	B 534	5ème	OUI		*Concernée*
263	B 526	5ème	OUI		*Concernée*
264	B 522	5ème	OUI		*Concernée*
265	B 518	5ème	OUI		*Concernée*
266	B 506	5ème	OUI		*Concernée*
267	B 502	5ème	OUI		*Concernée*
268	B 500	5ème	OUI		*Concernée*
269	B 567	5ème	OUI		*Concernée*
270	B 597	5ème	OUI		*Concernée*
271	B 595	5ème	OUI		*Concernée*
272	B 591	5ème	OUI		*Concernée*
273	B 589	5ème	OUI		*Concernée*
274	B 583/B 579	5ème	OUI		*Concernée*
275	B 575	5ème	OUI		*Concernée*
276	B 569	5ème	OUI		*Concernée*
277	B 565	5ème	OUI		*Concernée*
278	B 561	5ème	OUI		*Concernée*
279	B 557	5ème	OUI		*Concernée*
280	Couloir Esc 6	6ème	OUI		*Concernée*
281	Dégagements	6ème	OUI		*Concernée*
282	B 637	6ème	OUI		*Concernée*
283	B 639	6ème	OUI		*Concernée*
284	B 633	6ème	OUI		*Concernée*
285	B 629	6ème	OUI		*Concernée*
286	B 625	6ème	OUI		*Concernée*
287	Couloir Esc C	6ème	OUI		*Concernée*
288	Dégagements	6ème	OUI		*Concernée*
289	B 609	6ème	OUI		*Concernée*
290	B 605	6ème	OUI		*Concernée*
291	B 601	6ème	OUI		*Concernée*
292	B 626	6ème	OUI		*Concernée*
293	B 622	6ème	OUI		*Concernée*
294	B 618	6ème	OUI		*Concernée*
295	B 614	6ème	OUI		*Concernée*
296	B 612	6ème	OUI		*Concernée*
297	B 610	6ème	OUI		*Concernée*
298	B 606	6ème	OUI		*Concernée*
299	B 657	6ème	OUI		*Concernée*
300	Toit terrasse	6ème	OUI		*Concernée*
301	B 661	6ème	OUI		*Concernée*
302	B 653	6ème	OUI		*Concernée*
303	B 649	6ème	OUI		*Concernée*
304	B 645	6ème	OUI		*Concernée*

N°	Partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification	Travaux
305	B 702	7ème	OUI		*Concernée*
306	B 700	7ème	OUI		*Concernée*
307	B 705	7ème	OUI		*Concernée*
308	B 701	7ème	OUI		*Concernée*
309	B 706	7ème	OUI		*Concernée*
310	B 708	7ème	OUI		*Concernée*
311	B 710	7ème	OUI		*Concernée*
312	B 714	7ème	OUI		*Concernée*
313	Terrasse	7ème	OUI		*Concernée*
314	Toit terrasse	7ème	OUI		*Concernée*
315	Toiture vague	7ème	OUI		*Concernée*
316	Toit terrasse	2ème	OUI		*Concernée*
317	Escalier	6ème	OUI		*Concernée*
318	Terrasse nord	1er	OUI		*Concernée*
319	Terrasse sud	1er	OUI		*Concernée*
320	Toit terrasse	3ème	OUI		*Concernée*
321	Toit terrasse	5ème	OUI		*Concernée*

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

N°	Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
1	Escalier C	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
2	B 801	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
3	B 862	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
4	Dégagements	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
5	B 854	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
6	B846	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
7	Tunnel	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
8	Couloir	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
12	Traitement air B842	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
13	B 838	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
14	B 834	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
15	Couloir escalier B	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
16	B 830	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
17	B 826	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
18	B 822	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
19	Magasin	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
20	B 814	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
21	B 810	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
22	Compo	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
23	Compostage B 837	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
24	B 806	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
25	B 802	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
26	B 861	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
27	B 857	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
28	B 853	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
29	B 841	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
30	B 839	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
31	B 833	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
32	B 827	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
33	B 829	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
34	B 825	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
35	B 821	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
36	B 817	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
37	B 813	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
38	B 809	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
39	B 805	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite
40	Accueil	RDC	Plafond	Plafond	Ciment composite
40	Accueil	RDC	Faux-plafond	Plafond	Métal
117	Hall principal	1er	Faux-plafond	Plafond	Métal
152	Hall principal	2ème	Faux-plafond	Plafond	Métal
188	Hall principal	3ème	Plafond	Plafond	Ciment composite
228	Hall principal	4ème	Plafond	Plafond	Ciment composite
288	Dégagements	6ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE
Néant

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
1	**Escalier C**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
2	**B 801**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
3	**B 862**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
4	**Dégagements**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
5	**B 854**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
6	**B846**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
7	**Tunnel**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
8	**Couloir**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
9	**B 864**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
9	**B 864**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 16	P087	Résultat d'analyse
9	**B 864**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 17	P088	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 1	P068	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 2	P069	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 3	P070	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 4	P071	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 5	P072	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 6	P073	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 7	P074	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 8	P076	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 9	P077	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Plafond	Plafond	Ciment composite - Flocage	P075	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Plinthes	Toutes zones	Plinthe - Colle	P078	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Plancher	Sol	Chape maigre - Colle carrelage	P079	Résultat d'analyse
10	**Chaufferie**	1er SS	Plancher	Sol	Chape maigre	P080	Résultat d'analyse
11	**Groupe Froid B850**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 10	P081	Résultat d'analyse
11	**Groupe Froid B850**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 11	P082	Résultat d'analyse
11	**Groupe Froid B850**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 12	P083	Résultat d'analyse
11	**Groupe Froid B850**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 13	P084	Résultat d'analyse
11	**Groupe Froid B850**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 14	P085	Résultat d'analyse
11	**Groupe Froid B850**	1er SS	Conduit de fluides	Toutes zones	Calorifugeage 15	P086	Résultat d'analyse
13	**B 838**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
14	**B 834**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
15	**Couloir escalier B**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
16	**B 830**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
17	**B 826**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
18	**B 822**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
19	**Magasin**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
20	**B 814**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
21	**B 810**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
22	**Compo**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
23	**Compostage B 837**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse

CONSTAT AMIANTE

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
24	**B 806**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
25	**B 802**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
26	**B 861**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
27	**B 857**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
28	**B 853**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
29	**B 841**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
30	**B 839**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
31	**B 833**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
32	**B 827**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
33	**B 829**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
34	**B 825**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
35	**B 821**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
36	**B 817**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
37	**B 813**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
38	**B 809**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
39	**B 805**	1er SS	Conduit de fluides	Plafond	Calorifugeage		Résultat d'analyse
41	**Accueil assurés**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
42	**Dégagements**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
42	**Dégagements**	RDC	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P058	Résultat d'analyse
42	**Dégagements**	RDC	Conduit de fluides	Plafond	Calorifuge	P059	Résultat d'analyse
43	**Couloir**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
44	**B 008**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
45	**B 006**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
46	**B 022**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
47	**B 073**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
48	**B 065 CFDT**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
48	**B 065 CFDT**	RDC	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P061	Résultat d'analyse
49	**B 063**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
50	**B 061**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
51	**B 057**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
52	**Sanitaires**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
53	**B 045**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
54	**B 041**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
55	**SAS**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
56	**Reunion B 037**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
57	**B 033**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
58	**B 029**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
59	**Dégagement**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
60	**Couloir esc B**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P060	Résultat d'analyse
61	**Dégagements**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
61	**Dégagements**	RDC	Cloisons	Toutes zones	Joint calicot - Enduit	P062	Résultat d'analyse
61	**Dégagements**	RDC	Conduit de fluides	Plafond	Calorifuge	P064	Résultat d'analyse
62	**B 021**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
63	**B 025**	RDC	Plancher	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	P017	Résultat d'analyse
64	**Coin café**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
65	**B 013**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
65	**B 013**	RDC	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P018	Résultat d'analyse
66	**B 009**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
67	**Dégagements**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
76	**Infirmerie**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P065	Résultat d'analyse
76	**Infirmerie**	RDC	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P066	Résultat d'analyse
77	**B 084**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P065	Résultat d'analyse
77	**B 084**	RDC	Plancher	Sol	Chape maigre - Dalles + colle + ragréage		
78	**B 080**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P065	Résultat d'analyse
79	**B 068**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P065	Résultat d'analyse
80	**B 076**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P067	Résultat d'analyse
81	**B 072**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P065	Résultat d'analyse
82	**B 060**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
82	**B 060**	RDC	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P067	Résultat d'analyse
83	**B 054**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
84	**B 050**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
85	**B 046**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
86	**B 044**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
87	**B 042**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
88	**B 040**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
89	**B 038**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
90	**B 034**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
91	**B 030**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
92	**B 026**	RDC	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P063	Résultat d'analyse
93	**Couloir escalier B**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
94	**Dégagements**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P105	Résultat d'analyse
95	**B 123**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P105	Résultat d'analyse

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
96	**B 121**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P105	Résultat d'analyse
97	**B 117**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P105	Résultat d'analyse
98	**B 113**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P105	Résultat d'analyse
99	**Couloir escalier C**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P105	Résultat d'analyse
100	**Sanitaires B109/B 105**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P105	Résultat d'analyse
101	**Dégagements**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
101	**Dégagements**	1er	Cloisons circulation	Toutes zones	Béton - Enduit	P055	Résultat d'analyse
102	**Sanitaires B 146/B 150**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
103	**Escalier D**	1er	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage		
103	**Escalier D**	1er	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Enduit		
103	**Escalier D**	1er	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P107	Résultat d'analyse
104	**B 158**	1er	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P047	Résultat d'analyse
104	**B 158**	1er	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Enduit		
104	**B 158**	1er	Murs	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P048	Résultat d'analyse
105	**B 154**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
105	**B 154**	1er	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage		
105	**B 154**	1er	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Enduit		
106	**B 142**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
106	**B 142**	1er	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage		Résultat d'analyse
106	**B 142**	1er	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Enduit		Résultat d'analyse
107	**B 138**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
108	**B 134**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
108	**B 134**	1er	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage		
108	**B 134**	1er	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Enduit		
109	**B 126**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P058	Résultat d'analyse
109	**B 126**	1er	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage		Résultat d'analyse
109	**B 126**	1er	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Enduit		Résultat d'analyse
110	**B 130**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
110	**B 130**	1er	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P057	Résultat d'analyse

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
111	**B 122**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
112	**B 118**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
113	**B 114**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
114	**B 110**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
115	**B 106**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
115	**B 106**	1er	Conduit de fluides	C	Mousse noire - Bitumineux	P046	Résultat d'analyse
116	**B 102**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
118	**Circulaion B 143**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
119	**B 140**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
120	**B 144**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
121	**B 148**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
122	**B 152**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
123	**B 147**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
124	**B 145**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
125	**B 139**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
125	**B 139**	1er	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P044	Résultat d'analyse
125	**B 139**	1er	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Peinture décorative	P045	Résultat d'analyse
126	**B 135**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
127	**B 131**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
128	**B 127**	1er	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P056	Résultat d'analyse
129	**B 125**	1er	Plancher	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	P023	Résultat d'analyse
130	**Escalier B**	2ème	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P107	Résultat d'analyse
131	**Dégagements**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
131	**Dégagements**	2ème	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P052	Résultat d'analyse
131	**Dégagements**	2ème	Cloisons circulation	Toutes zones	joint calicot - Enduit	P054	Résultat d'analyse
132	**B 225**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
133	**B 229**	2ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	P022	Résultat d'analyse
134	**B 221**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
135	**B 217**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
136	**B 213**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
137	**Couloir Esc C**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
137	**Couloir Esc C**	2ème	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P106	Résultat d'analyse
138	**Sanitaires B 209/205**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
139	**B 230**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
140	**B 238**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
141	**B 242**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
142	**B 234**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
143	**B 228**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
144	**B 226**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
145	**B 222**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
146	**B 218**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
147	**B 214**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
148	**B 212**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
149	**B 210**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
150	**B 206**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
151	**B 202**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
151	**B 202**	2ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P042	Résultat d'analyse
151	**B 202**	2ème	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P043	Résultat d'analyse
153	**B 257**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
154	**B 277**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
155	**B 273**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
156	**B 269**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
157	**B 265**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
158	**B 261**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
159	**Sanitaires B 251/253**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
160	**B 249**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
161	**B 247**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
162	**B 245**	2ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P053	Résultat d'analyse
163	**Couloir Esc B**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
163	**Couloir Esc B**	3ème	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P107	Résultat d'analyse
164	**Dégagements**	3ème	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P107	Résultat d'analyse
164	**Dégagements**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse

CONSTAT AMIANTE

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
165	**B 333**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
166	**B 335**	3ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	P021	Résultat d'analyse
167	**B 329**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
168	**B 325**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
169	**Couloir Esc C**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
169	**Couloir Esc C**	3ème	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P107	Résultat d'analyse
170	**B 323**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
171	**B 300**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
172	**B 321**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
173	**B 313**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
174	**B 309**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
175	**B 305**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
176	**B 301**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
177	**B 358**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
177	**B 358**	3ème	Plafond	Plafond	Béton - Flocage	P109	Résultat d'analyse
178	**B 354**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
179	**B 342**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
180	**B 338**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
181	**B 334**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
182	**B 326**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
183	**B 322**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
183	**B 322**	3ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P040	Résultat d'analyse
183	**B 322**	3ème	Murs	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P041	Résultat d'analyse
184	**B 318**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
185	**B 310**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
186	**B 306**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
187	**B 302**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
188	**Hall principal**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P108	Résultat d'analyse
189	**B 367**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
190	**B 369**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
191	**B 365**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
192	**B 363**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
193	**B 361**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
194	**B 349**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
195	**B 345**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
196	**B 341**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
197	**B 337**	3ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P108	Résultat d'analyse
198	**Couloir Esc B**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
199	**Dégagements**	4ème	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P110	Résultat d'analyse
199	**Dégagements**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
200	**B 441**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
201	**B 443**	4ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	P020	Résultat d'analyse
202	**B 439**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
203	**B 437**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
204	**B 435**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
206	**B 429**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
207	**B 433**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
208	**Dégagements**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
209	**B 425**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
209	**B 425**	4ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P038	Résultat d'analyse
209	**B 425**	4ème	Mur	Toutes zones	Plâtre - Peinture	P039	Résultat d'analyse
210	**B 421**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
211	**B 417**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
212	**B 413**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
213	**B 409**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
214	**B 405**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
215	**B 401**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
216	**B 444**	4ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	P024	Résultat d'analyse
217	**B 440**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
218	**B 438**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
219	**B 434**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
220	**B 430**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
221	**B 426**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
222	**B 422**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
223	**B 418**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
224	**B 414**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
225	**B 412**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
226	**B 408**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
226	**B 408**	4ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P036	Résultat d'analyse
226	**B 408**	4ème	Mur	Toutes zones	Plâtre - Peinture	P037	Résultat d'analyse
227	**B 406**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
228	**Hall principal**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P111	Résultat d'analyse
229	**B 481**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
230	**B 404**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
231	**B 402**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
232	**B 400**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
233	**B 483**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
234	**B 477/473**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
235	**B 465**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
236	**B 461**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
237	**B 457**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
238	**B 453**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
239	**B 449**	4ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P111	Résultat d'analyse
240	**Couloir Esc B**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
241	**Dégagements**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
242	**B 553**	5ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	P019	Résultat d'analyse
243	**B 539**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
244	**B 535**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
245	**B 537**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
246	**B 533**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
247	**B 531**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
248	**B 529**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
249	**Couloir Esc C**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
250	**Dégagements**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
251	**Sanitaires**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
252	**B 521**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
253	**B 517**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
254	**B 513**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
255	**B 509**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
256	**B 505**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
257	**B 503**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
258	**B 501**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
260	**B 542**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
261	**B 538**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
261	**B 538**	5ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P032	Résultat d'analyse
261	**B 538**	5ème	Murs	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P033	Résultat d'analyse
262	**B 534**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
263	**B 526**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
264	**B 522**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
264	**B 522**	5ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P034	Résultat d'analyse
264	**B 522**	5ème	Murs	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P035	Résultat d'analyse
265	**B 518**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
266	**B 506**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
267	**B 502**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
268	**B 500**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
269	**B 567**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
270	**B 597**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
271	**B 595**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
271	**B 595**	5ème	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P015	Résultat d'analyse
271	**B 595**	5ème	Cloisons bureau	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P016	Résultat d'analyse
272	**B 591**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
273	**B 589**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P016	Résultat d'analyse
274	**B 583/B 579**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
275	**B 575**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
276	**B 569**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
277	**B 565**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
278	**B 561**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
279	**B 557**	5ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P014	Résultat d'analyse
280	**Couloir Esc 6**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P009	Résultat d'analyse
281	**Dégagements**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
281	**Dégagements**	6ème	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P013	Résultat d'analyse
282	**B 637**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
283	**B 639**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
284	**B 633**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
285	**B 629**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
286	**B 625**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
287	**Couloir Esc C**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
288	**Dégagements**	6ème	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P112	Résultat d'analyse
288	**Dégagements**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
288	**Dégagements**	6ème	Plancher haut	Plafond	Ciment composite	P008	Résultat d'analyse
288	**Dégagements**	6ème	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P051	Résultat d'analyse
288	**Dégagements**	6ème	Conduit de fluides	Plafond	Calorifuge	P049	Résultat d'analyse
288	**Dégagements**	6ème	Conduit de fluides	Plafond	Plaques isolantes	P050	Résultat d'analyse
289	**B 609**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
290	**B 605**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
291	**B 601**	6ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P031	Résultat d'analyse
291	**B 601**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
292	**B 626**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
293	**B 622**	6ème	Mur	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P030	Résultat d'analyse
293	**B 622**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
294	**B 618**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
295	**B 614**	6ème	Cloisons circulation	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P011	Résultat d'analyse
295	**B 614**	6ème	Cloisons bureaux	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P012	Résultat d'analyse
295	**B 614**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
296	**B 612**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
297	**B 610**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
298	**B 606**	6ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P029	Résultat d'analyse

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
298	**B 606**	6ème	Murs	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P028	Résultat d'analyse
299	**B 657**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
299	**B 657**	6ème	Mur	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P025	Résultat d'analyse
300	**Toit terrasse**	6ème	Toiture n°1	Sol	Relevé d'étanchéité	P097	Résultat d'analyse
300	**Toit terrasse**	6ème	Toiture n°2	Sol	Etanchéité + isolant	P096	Résultat d'analyse
301	**B 661**	6ème	Murs	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P026	Résultat d'analyse
301	**B 661**	6ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	P027	Résultat d'analyse
302	**B 653**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
303	**B 649**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
304	**B 645**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P010	Résultat d'analyse
305	**B 702**	7ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage + joint + ragréage	P001	Résultat d'analyse
305	**B 702**	7ème	Cloisons	Toutes zones	Plâtre - Peinture	P002	Résultat d'analyse
305	**B 702**	7ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P003	Résultat d'analyse
305	**B 702**	7ème	Gaine horizontale	Plafond	Calorifuge	P004	Résultat d'analyse
306	**B 700**	7ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P003	Résultat d'analyse
307	**B 705**	7ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P003	Résultat d'analyse
308	**B 701**	7ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P003	Résultat d'analyse
309	**B 706**	7ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P003	Résultat d'analyse
310	**B 708**	7ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P003	Résultat d'analyse
311	**B 710**	7ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P003	Résultat d'analyse
312	**B 714**	7ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P003	Résultat d'analyse
313	**Terrasse**	7ème	Plancher	Sol	Chape maigre - Colle de carrelage	P098	Résultat d'analyse
314	**Toit terrasse**	7ème	Toiture	Acrotères	Etanchéité bitumineuse	P099	Résultat d'analyse
314	**Toit terrasse**	7ème	Toiture	Sol	Etanchéité bitumineuse + isolant	P100	Résultat d'analyse
314	**Toit terrasse**	7ème	Toiture	Sol	Etanchéité bitumineuse + isolant	P101	Résultat d'analyse
314	**Toit terrasse**	7ème	Toiture	Sol	Relevé d'étanchéité	P103	Résultat d'analyse
314	**Toit terrasse**	7ème	Toiture	Sol	Relevé d'étanchéité	P104	Résultat d'analyse
315	**Toiture vague**	7ème	Toiture	Sol	Etanchéité bitumineuse + isolant	P102	Résultat d'analyse
317	**Escalier**	6ème	Faux-plafond	Plafond	Panneaux de faux - plafond	P009	Résultat d'analyse
317	**Escalier**	6ème	Plafond	Plafond	Ciment composite	P008	Résultat d'analyse
317	**Escalier**	6ème	Cloisons n°1	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P005	Résultat d'analyse
317	**Escalier**	6ème	Cloisons n°2	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P006	Résultat d'analyse
317	**Escalier**	6ème	Cloisons n°3	Toutes zones	Plâtre - Enduit	P007	Résultat d'analyse
319	**Terrasse sud**	1er	Toiture n°1	Sol	Relevé d'étanchéité	P092	Résultat d'analyse

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

CONSTAT AMIANTE

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
319	**Terrasse sud**	1er	Toiture n°1	Sol	Etanchéité bitumineuse	P091	Résultat d'analyse
320	**Toit terrasse**	3ème	Toiture n°1	Sol	Etanchéité bitumineuse	P094	Résultat d'analyse
320	**Toit terrasse**	3ème	Toiture n°1	Sol	Relevé d'étanchéité	P093	Résultat d'analyse
321	**Toit terrasse**	5ème	Toiture	Sol	Etanchéité bitumineuse	P095	Résultat d'analyse

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

N°	partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère de décision	Référence prélèvement	Présence

LEGENDE			
Présence	**A** : Amiante	**N** : Non Amianté	**a?** : Probabilité de présence d'Amiante

COMMENTAIRES

Néant

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P095		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Toit terrasse - 5ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Etanchéité bitumineuse	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P001		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 702 - 7ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Colle de carrelage + joint + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P002		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 702 - 7ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Peinture	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P003		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 702 - 7ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux - plafond	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Faux-plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P004		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 702 - 7ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifuge	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Gaine horizontale - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Escalier - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons n°1 - Toutes zones		absence d'amiante

CONSTAT AMIANTE

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P006		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Escalier - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons n°2 - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P007		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Escalier - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons n°3 - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Escalier - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ciment composite	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P009		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Escalier - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux - plafond	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Faux-plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P010		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux - plafond	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Faux-plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P011		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 614 - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons circulation - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P012		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 614 - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons bureaux - Toutes zones		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P013		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons circulation - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P014		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 595 - 5ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux - plafond	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Faux-plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P015		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 595 - 5ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons circulation - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P016		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 595 - 5ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons bureau - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P017		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 025 - RDC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Colle de carrelage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P018		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 013 - RDC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P019		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 553 - 5ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Colle de carrelage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P020		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 443 - 4ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Colle de carrelage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P021		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 335 - 3ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Colle de carrelage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P022		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 229 - 2ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Colle de carrelage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P023		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 125 - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Colle de carrelage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P024		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 444 - 4ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Colle de carrelage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P025		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 657 - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Mur - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P026		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 661 - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Murs - Toutes zones		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P027		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 661 - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P028		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 606 - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Murs - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P029		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 606 - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P030		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 622 - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Mur - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P031		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 601 - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P032		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 538 - 5ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P033		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 538 - 5ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Murs - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P034		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 522 - 5ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P035		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 522 - 5ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Murs - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P036		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 408 - 4ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P037		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 408 - 4ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Peinture	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Mur - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P038		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 425 - 4ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P039		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 425 - 4ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Peinture	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Mur - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P040		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 322 - 3ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P041		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 322 - 3ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Murs - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P042		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 202 - 2ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P043		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 202 - 2ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P044		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 139 - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P045		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 139 - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Peinture décorative	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P046		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 106 - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mousse noire - Bitumineux	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - C		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P047		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 158 - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P048		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 158 - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Murs - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P049		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifuge	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P050		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaques isolantes	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P051		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P052		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 2ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons circulation - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P053		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 2ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux - plafond	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Faux-plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P054		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 2ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
joint calicot - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons circulation - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P055		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Béton - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons circulation - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P056		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux - plafond	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Faux-plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P057		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 130 - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P058		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - RDC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons circulation - Toutes zones		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P059		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - RDC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifuge	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P060		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - RDC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux - plafond	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Faux-plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P061		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 065 CFDT - RDC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P062		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - RDC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint calicot - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P063		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - RDC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux - plafond	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Faux-plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P064		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - RDC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifuge	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P065		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Infirmerie - RDC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux - plafond	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Faux-plafond - Plafond		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P066		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Infirmerie - RDC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Linoléum + colle + ragréage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P067		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 060 - RDC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons circulation - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P068		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 1	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P069		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 2	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P070		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 3	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P071		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 4	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P072		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 5	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

CONSTAT AMIANTE

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P073		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 6	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P074		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 7	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P075		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ciment composite - Flocage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P076		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 8	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P077		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 9	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P078		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plinthe - Colle	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P079		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Colle carrelage	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P080		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Chaufferie - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P081		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Groupe Froid B850 - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 10	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P082		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Groupe Froid B850 - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 11	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P083		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Groupe Froid B850 - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 12	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P084		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Groupe Froid B850 - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 13	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P085		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Groupe Froid B850 - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 14	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P086		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Groupe Froid B850 - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 15	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P088		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 864 - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 17	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P087		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 864 - 1er SS
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifugeage 16	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Conduit de fluides - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P089		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Terrasse nord - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Etanchéité	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture n°2 - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P090		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Terrasse nord - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Relevé d'étanchéité	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture n°1 - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P091		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Terrasse sud - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Etanchéité bitumineuse	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture n°1 - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P092		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Terrasse sud - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Relevé d'étanchéité	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture n°1 - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P093		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Toit terrasse - 3ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Relevé d'étanchéité	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture n°1 - Sol		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P094		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Toit terrasse - 3ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Etanchéité bitumineuse	18/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture n°1 - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P096		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Toit terrasse - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Etanchéité + isolant	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture n°2 - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P097		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Toit terrasse - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Relevé d'étanchéité	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture n°1 - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P098		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Terrasse - 7ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape maigre - Colle de carrelage	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P099		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Toit terrasse - 7ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Etanchéité bitumineuse	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture - Acrotères		absence d'amiante
Emplacement		



CONSTAT AMIANTE

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P100		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Toit terrasse - 7ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Etanchéité bitumineuse + isolant	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P101		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Toit terrasse - 7ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Etanchéité bitumineuse + isolant	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P102		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Toiture vague - 7ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Etanchéité bitumineuse + isolant	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P103		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Toit terrasse - 7ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Relevé d'étanchéité	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P104		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Toit terrasse - 7ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Relevé d'étanchéité	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Toiture - Sol		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P105		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 1er
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux - plafond	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Faux-plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P106		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Couloir Esc C - 2ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons circulation - Toutes zones		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PRELEVEMENT : P107		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Couloir Esc C - 3ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons circulation - Toutes zones		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P108		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 3ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux - plafond	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Faux-plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P109		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	B 358 - 3ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Béton - Flocage	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P110		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 4ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons circulation - Toutes zones		absence d'amiante


PRELEVEMENT : P111		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 4ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux - plafond	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Faux-plafond - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P112		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
	14-11-014296	Dégagements - 6ème
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre - Enduit	21/12/2014	HERNANDEZ EMMANUEL
Localisation		**Résultat**
Cloisons - Toutes zones		absence d'amiante

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

ANNEXE 2 – CROQUIS


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	247 avenue Jacques Cartier Bâtiment BRUN 83090 TOULON
N° dossier :	14-11-014296				
N° planche :	1/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Sous-sol

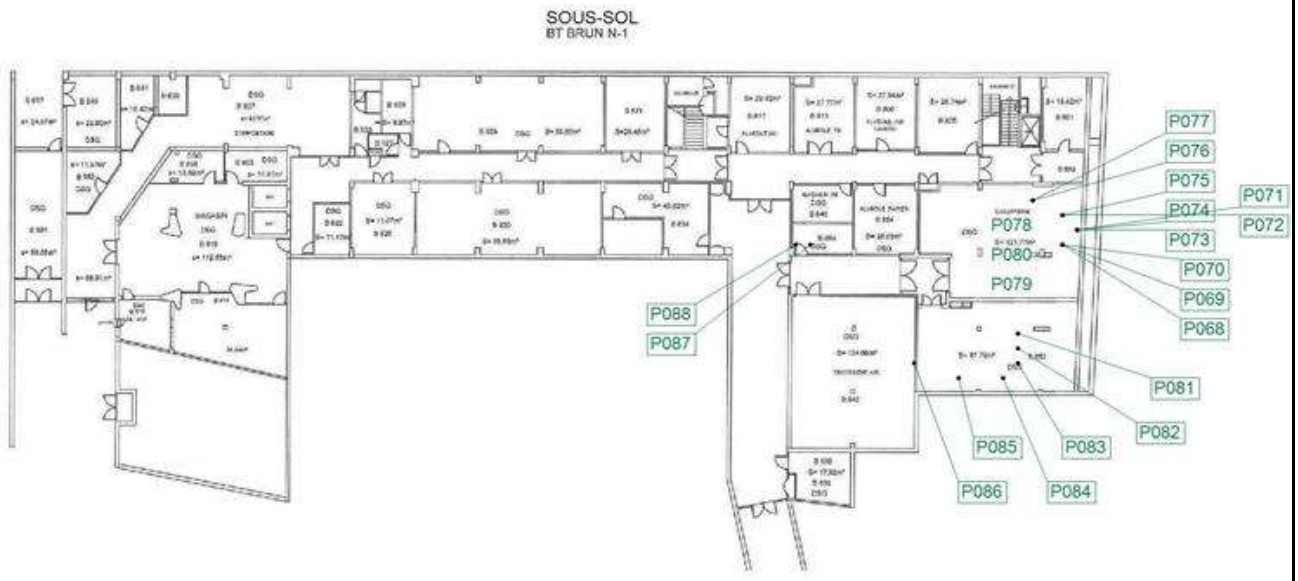

CONSTAT AMIANTE

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B


PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	14-11-014296			Adresse de l'immeuble :	247 avenue Jacques Cartier Bâtiment BRUN 83090 TOULON
N° planche :	2/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	REZ-DE-CHAUSSEE

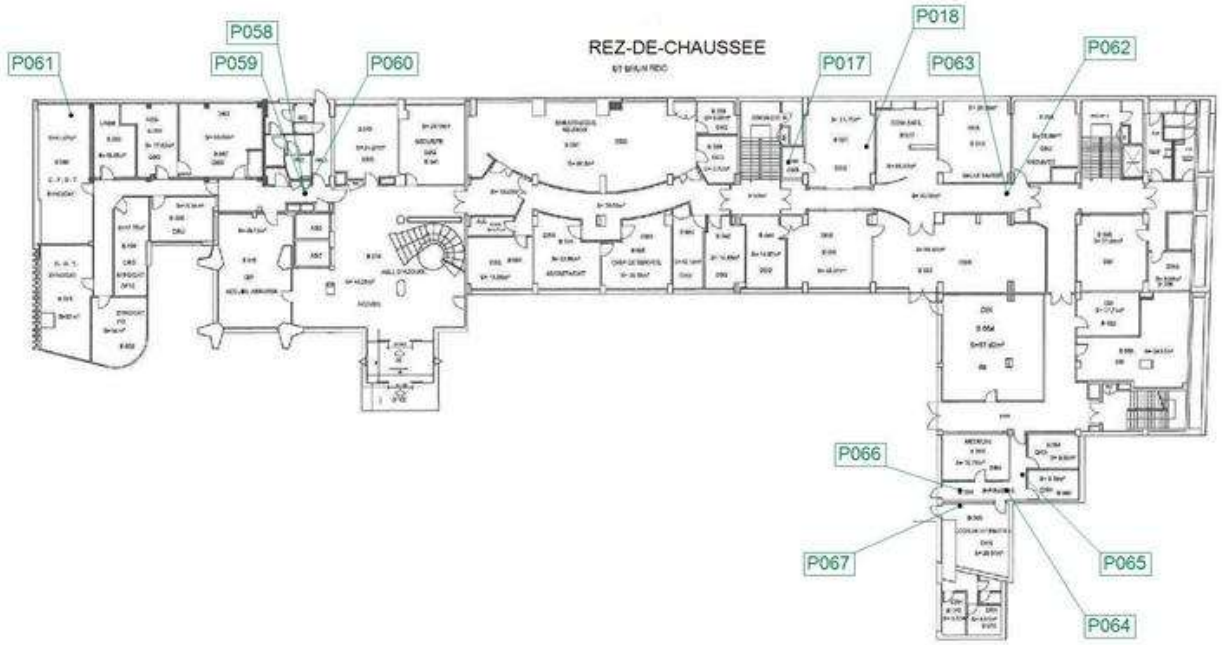

CONSTAT AMIANTE


DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	247 avenue Jacques Cartier Bâtiment BRUN 83090 TOULON
N° dossier :	14-11-014296				
N° planche :	3/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	1er ETAGE

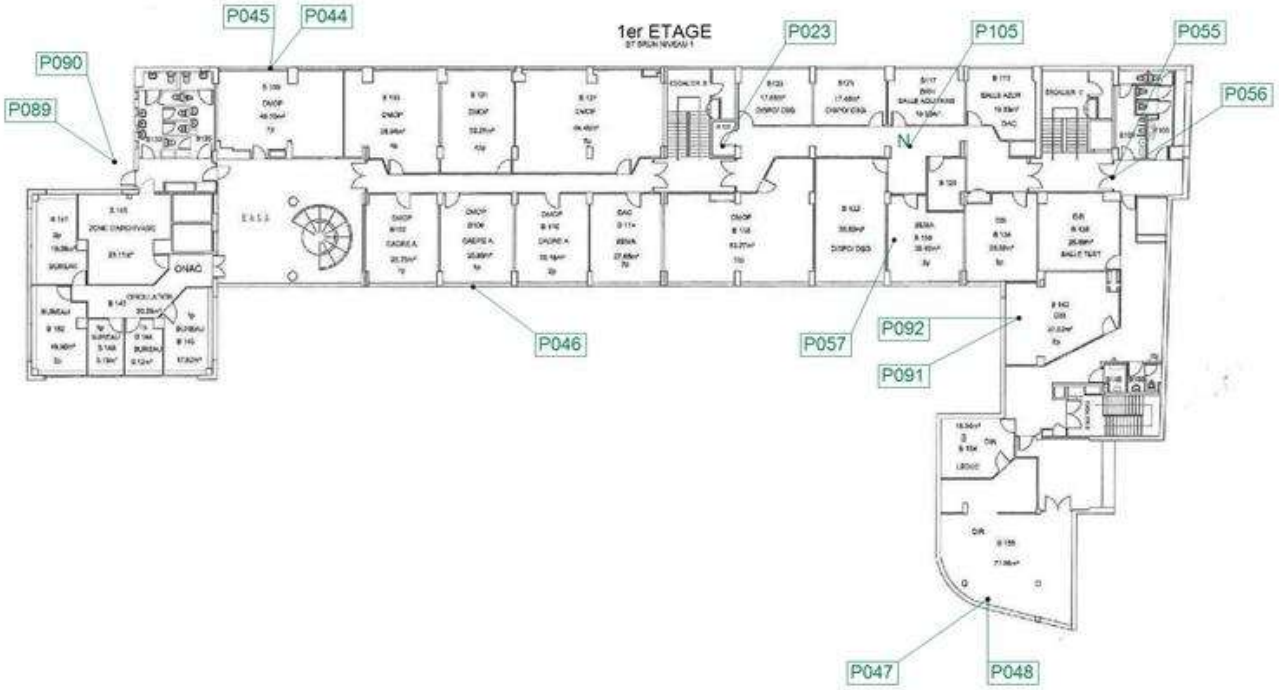

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B


PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	14-11-014296			Adresse de l'immeuble :	247 avenue Jacques Cartier Bâtiment BRUN 83090 TOULON
N° planche :	4/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	2ème ETAGE

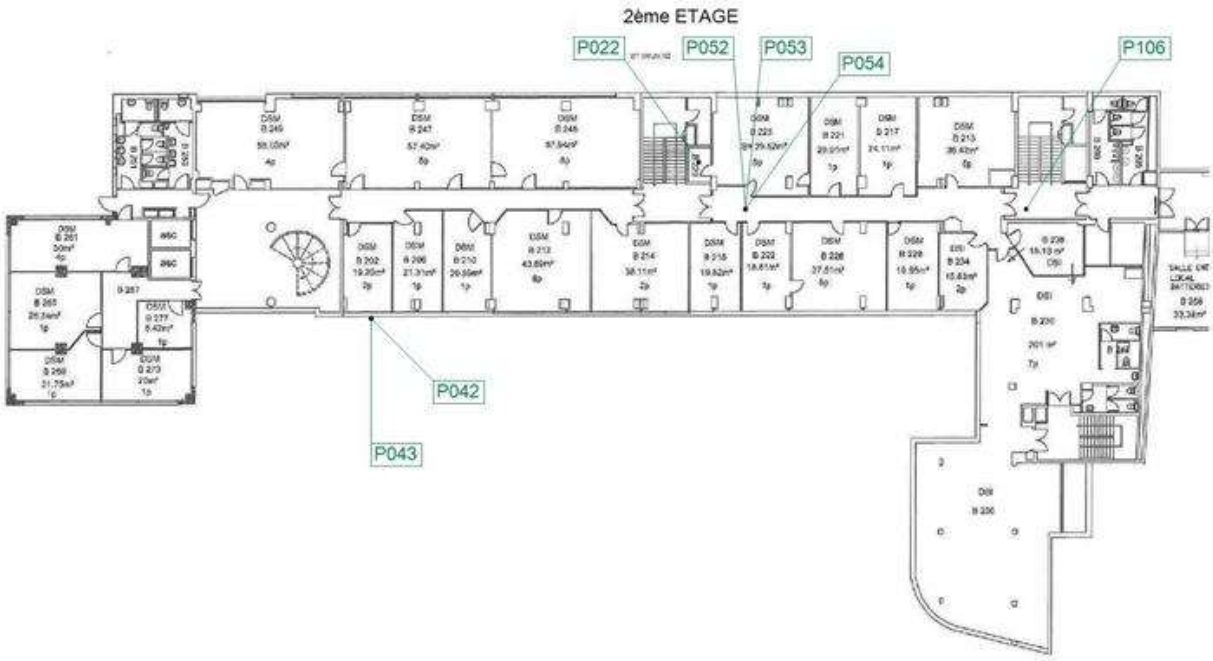

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B


CONSTAT AMIANTE

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	14-11-014296			Adresse de l'immeuble :	247 avenue Jacques Cartier Bâtiment BRUN 83090 TOULON
N° planche :	5/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	3ème ETAGE

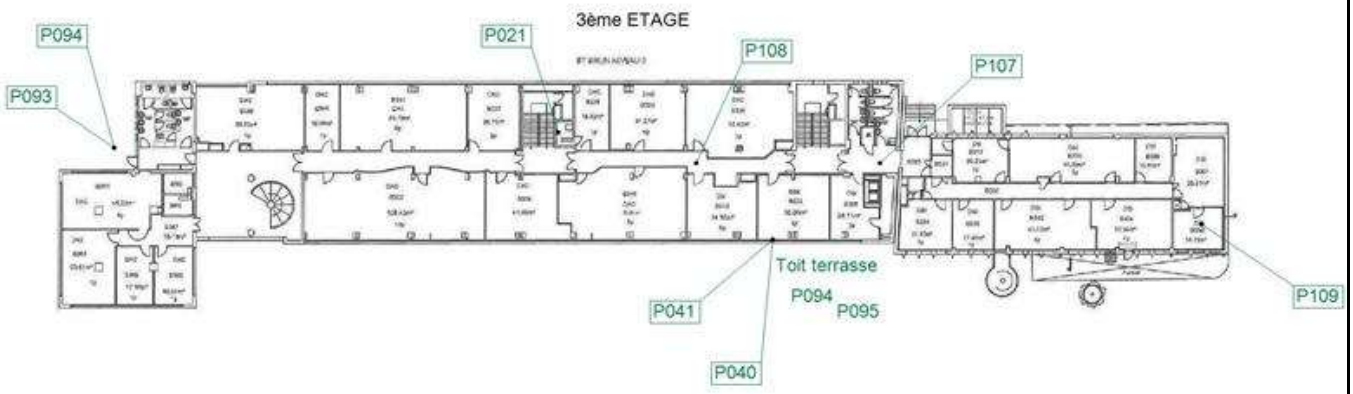

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	247 avenue Jacques Cartier Bâtiment BRUN 83090 TOULON
N° dossier :	14-11-014296				
N° planche :	6/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	4ème ETAGE

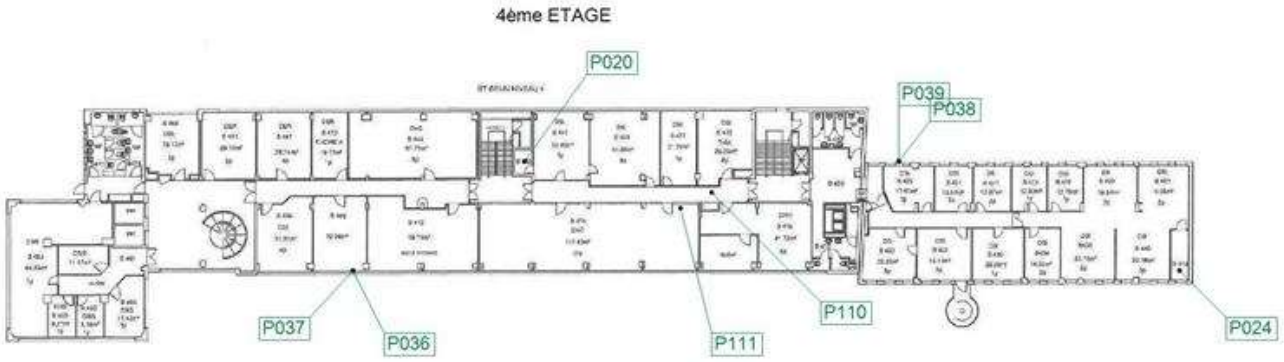

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	247 avenue Jacques Cartier Bâtiment BRUN 83090 TOULON
N° dossier :	14-11-014296				
N° planche :	7/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	5ème ETAGE


5ème ETAGE

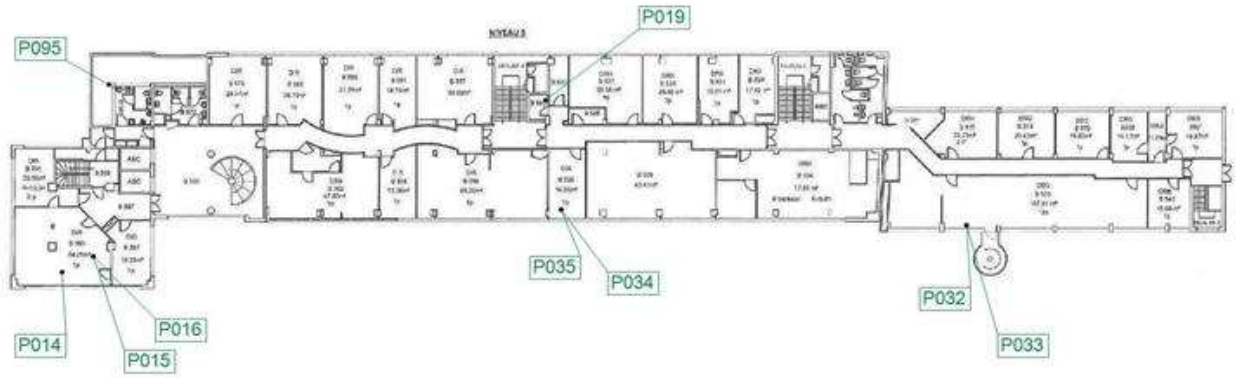

CONSTAT AMIANTE


DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	247 avenue Jacques Cartier Bâtiment BRUN 83090 TOULON
N° dossier :	14-11-014296				
N° planche :	8/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	6ème ETAGE

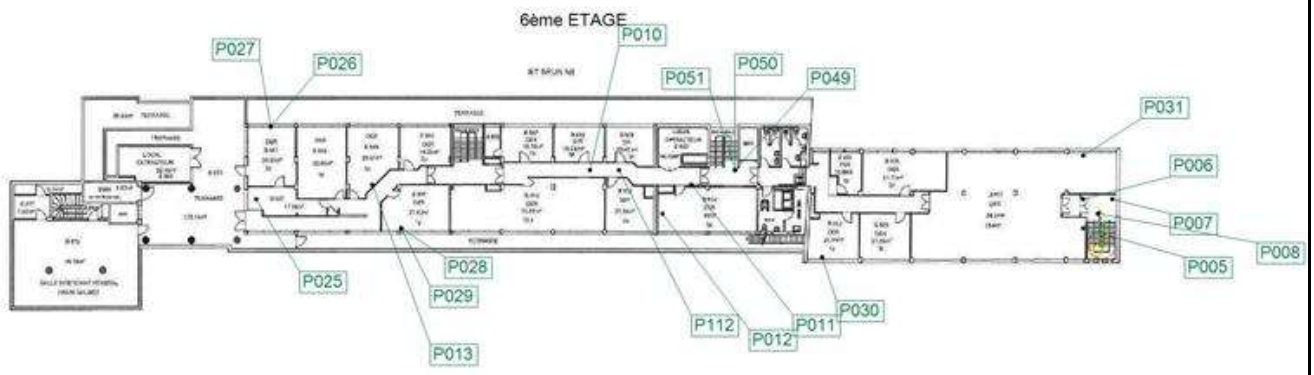

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	247 avenue Jacques Cartier Bâtiment BRUN 83090 TOULON
N° dossier :	14-11-014296				
N° planche :	9/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	7ème ETAGE

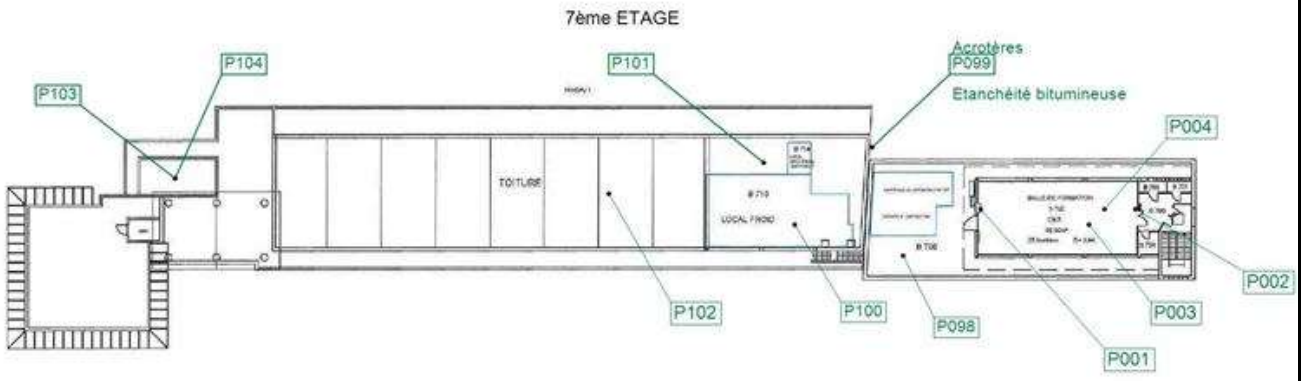

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Document 1

itga
Innovateur en Rabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1290 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P001 - Colle carrelage + joint + ragréage - 7ème étage Sol 14-11-014296_001	Echantillon	IT041412-1290
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Colle carrelage beige avec carrelage + revêtement souple gris avec colle platique jaune et ragréage rosâtre

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage beige	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1
Carrelage + revêtement souple gris avec colle platique jaune et ragréage rosâtre	---	Non Analysé		

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 2

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1291 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P002 - Cloison circulation - 7ème étage Mur 14-11-014296_002	Echantillon	IT041412-1291
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Plaque de plâtre blanc avec couche cartonnée + matériau fibreux jaune

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Plaque de plâtre blanc avec couche cartonnée + matériau fibreux jaune	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 3

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1292 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P003 - Faux plafond - 7ème étage Plafond 14-11-014296_003	Echantillon	IT041412-1292
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 4

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1293 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P004 - Gaine d'extraction / soufflage - 7ème étage Gaine 14-11-014296_004	Echantillon	IT041412-1293
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Matériau jaune fibreux homogène avec couches aluminium

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau jaune fibreux homogène avec couches aluminium	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 5

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1294 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P005 - Plâtre + enduit - 6ème étage Cloison 14-11-014296_005	Echantillon	IT041412-1294
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 6

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1295 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P006 - Plâtre + enduit - 6ème étage Cloison 14-11-014296_006	Echantillon	IT041412-1295
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et couche cartonnée

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et couche cartonnée	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 7

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1296 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P007 - Plâtre + enduit - 6ème étage Cloison 14-11-014296_007	Echantillon	IT041412-1296
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 8

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1297 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P008 - Ciment composite - 6ème étage Plafond 14-11-014296_008	Echantillon	IT041412-1297
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Matériau gris compact

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau gris compact	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 9

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1298 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P009 – Faux plafond - 6ème étage Plafond 14-11-014296_009	Echantillon	IT041412-1298
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 10

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1299 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P010 - Faux plafond - 6ème étage Plafond 14-11-014296_010	Echantillon	IT041412-1299
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 11

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1300 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P011 - Plâtre + enduit - 6ème étage Cloison circulation 14-11-014296_011	Echantillon	IT041412-1300
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit gris avec peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit gris avec peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 12

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1301 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P012 - Plâtre + enduit - 6ème étage Cloison bureau 14-11-014296_012	Echantillon	IT041412-1301
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 13

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1302 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P013 - Plâtre + enduit - 6ème étage Cloison circulation 14-11-014296_013	Echantillon	IT041412-1302
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Plaque de plâtre blanc avec couche cartonnée et peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Plaque de plâtre blanc avec couche cartonnée et peinture	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 14

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1303 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P014 - Faux plafond - 5ème étage Plafond 14-11-014296_014	Echantillon	IT041412-1303
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Matériau de plâtre blanc avec couche cartonnée et peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau de plâtre blanc avec couche cartonnée et peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 15

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1304 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P015 - Plâtre + enduit - 6ème étage Cloison circulation 14-11-014296_015	Echantillon	IT041412-1304
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse peinte

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse peinte	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 16

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1305 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P016 - Plâtre + enduit - 6ème étage Cloison bureau 14-11-014296_016	Echantillon	IT041412-1305
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et couche cartonnée

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et couche cartonnée	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 17

itga
Innovateur en Habitat

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

cofrac ESSAIS
Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1306 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P017 - Colle carrelage + joint + ragréage - RDC Local B025 14-11-014296_017	Echantillon	IT041412-1306
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Colle carrelage grise avec carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage grise	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	—	1
Carrelage	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	—	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 18

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1307 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P018 - Enduit + plâtre - RDC Bureau B013 mur 14-11-014296_018	Echantillon	IT041412-1307
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et matériau fibreux jaune

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et matériau fibreux jaune	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 19

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1308 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P019 - Colle carrelage + joint + ragréage - 5ème étage Local B553 14-11-014296_019	Echantillon	IT041412-1308
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Colle carrelage grise avec carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage grise	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	---	Non Analysé		

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 20

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1309 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P020 - Colle carrelage + joint + ragréage - 4ème étage Local B443 14-11-014296_020	Echantillon	IT041412-1309
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Colle carrelage grise avec carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage grise	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	---	Non Analysé		

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 21

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1310 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P021 - Colle carrelage + joint + ragréage - 3ème étage Local B335 14-11-014296_021	Echantillon	IT041412-1310
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Colle carrelage blanche avec carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage blanche	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	---	Non Analysé		

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 22

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1311 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P022 - Colle carrelage + joint + ragréage - 2ème étage Local B229 14-11-014296_022	Echantillon	IT041412-1311
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Colle carrelage grise avec carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage grise	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	---	Non Analysé		

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 23

itga
Innovateur en Habitat

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1312 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P023 - Colle carrelage + joint + ragréage - 1er étage Local B125 14-11-014296_023	Echantillon	IT041412-1312
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Colle carrelage grise avec carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage grise	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	---	Non Analysé		

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 24

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1431 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P024 - Colle carrelage + joint + ragréage - 4ème étage Local B444 14-11-014296_024	Echantillon	IT041412-1431
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Colle carrelage grise avec carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage grise	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	---	Non Analysé		

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 25

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1314 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P025 - Enduit + plâtre - 6ème étage Mur 14-11-014296_025	Echantillon	IT041412-1314
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et papier peint

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et papier peint	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 26

itga
Innovateur en Habitat

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1315 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P026 - Enduit + plâtre - 6ème étage Cloison 14-11-014296_026	Echantillon	IT041412-1315
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et papier peint

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et papier peint	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 27

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1316 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P027 - Linoléum + colle + ragréage - 6ème étage Sol 14-11-014296_027	Echantillon	IT041412-1316
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage gris

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage gris	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 28

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1317 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P028 - Enduit + plâtre - 6ème étage Cloison 14-11-014296_028	Echantillon	IT041412-1317
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 29

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1318 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P029 - Linoléum + colle + ragréage - 6ème étage Sol 14-11-014296_029	Echantillon	IT041412-1318
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage gris

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage gris	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 30

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1319 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P030 - Enduit + plâtre - 6éme étage Cloison 14-11-014296_030	Echantillon	IT041412-1319
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 31

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1321 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P031 - Linoléum + colle + ragréage - 6ème étage Sol 14-11-014296_031	Echantillon	IT041412-1321
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage gris

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage gris	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 32

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1322 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P032 - Linoléum + colle + ragréage - 5ème étage Sol 14-11-014296_032	Echantillon	IT041412-1322
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage gris + carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage gris + carrelage	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024 DTA 164 rev 09

Document 33

itga
Innovateur en Habitat

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1323 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P033 - Enduit + plâtre - 5ème étage Cloison 14-11-014296_033	Echantillon	IT041412-1323
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâre plâtreux avec toile fibreuse peinte

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâre plâtreux avec toile fibreuse peinte	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 34

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1324 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P034 - Linoléum + colle + ragréage - 5ème étage Sol 14-11-014296_034	Echantillon	IT041412-1324
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Revêtement souple gris avec matériau rose compact et carrelage beige

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Revêtement souple gris avec matériau rose compact et carrelage beige	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 35

itga
Innovateur en Rabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1325 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P035 - Enduit + plâtre - 5ème étage Cloison 14-11-014296_035	Echantillon	IT041412-1325
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse peinte

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse peinte	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Document 36

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1326 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P036 - Linoléum + colle + ragréage - 4ème étage Sol 14-11-014296_036	Echantillon	IT041412-1326
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage rosâtre + matériau compact gris

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage rosâtre + matériau compact gris	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 37

itga
Innovateur en Habitat

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

cofrac ESSAIS
Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1327 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P037 - Enduit + plâtre - 4éme étage Cloison 14-11-014296_037	Echantillon	IT041412-1327
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse peinte

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse peinte	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Document 38

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1328 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P038 - Linoléum + colle + ragréage - 4ème étage Sol 14-11-014296_038	Echantillon	IT041412-1328
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et carrelage	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 39

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1329 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P039 - Enduit + plâtre - 4ème étage Cloison 14-11-014296_039	Echantillon	IT041412-1329
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 40

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1330 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P040 - Linoléum + colle + ragréage - 3ème étage Sol 14-11-014296_040	Echantillon	IT041412-1330
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Matériau gris compact + matériau rosâtre compact

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau gris compact + matériau rosâtre compact	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 41

itga
Innovateur en Habitat

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

cofrac ESSAIS
Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1331 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P041 - Enduit + plâtre - 3éme étage Cloison 14-11-014296_041	Echantillon	IT041412-1331
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse blanche peinte

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse blanche peinte	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 42

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1332 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P042 - Colle + ragréage - 2ème étage Sol 14-11-014296_042	Echantillon	IT041412-1332
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage gris

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle plastique jaune et ragréage gris	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1
Ragréage gris	---	Non Analysé		

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 43

itga
Innovateur en Habitat

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1333 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P043 - Enduit + plâtre - 2ème étage Cloison 14-11-014296_043	Echantillon	IT041412-1333
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse peinte

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse peinte	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 44

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1334 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P044 - Colle + ragréage - 1er étage Sol 14-11-014296_044	Echantillon	IT041412-1334
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage gris+ matériau gris compact

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Revêtement souple gris + matériau compact gris	---	Non Analysé		
Colle plastique jaune et ragréage gris	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 45

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1335 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P045 - Enduit - 1er étage Allège 14-11-014296_045	Echantillon	IT041412-1335
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Eclats de peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Eclats de peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 46

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1336 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P046 - Mousse noire + bitumineux - 1er étage Convecteur 14-11-014296_046	Echantillon	IT041412-1336
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 47

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1337 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P047 - Linoléum + colle + ragréage - 1er étage B158 Sol 14-11-014296_047	Echantillon	IT041412-1337
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage gris

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Revêtement souple gris avec colle plastique jaune et ragréage gris	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 48

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1338 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P048 - Enduit + plâtre - 1er étage B158 Mur 14-11-014296_048	Echantillon	IT041412-1338
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 49

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1339 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P049 - Enveloppe calorifuge - 6ème étage Groupe froid Plenum 14-11-014296_049	Echantillon	IT041412-1339
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Calorifugeage jaune fibreux homogène avec couches aluminium

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage jaune fibreux homogène avec couches aluminium	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 50

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1340 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30474
Echantillon	P050 - Plaque isolante - 6ème étage Groupe froid Plenum 14-11-014296_050	Echantillon	IT041412-1340
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Plaque fibrociment grise compacte

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Plaque fibrociment grise compacte	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 51

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1446 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	51 - Ciment + plâtre - 6ème étage Circulation cloison 14-11-014296_051	Echantillon	IT041412-1446
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Matériau gris compact

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau gris compact	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 52

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1449 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		Réf. ITGA :	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	52 - Enduit + plâtre - 2ème étage Cloison 14-11-014296_052	Echantillon	IT041412-1449
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 53

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1450 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	53 - Faux plafond 2ème étage Plafond 14-11-014296_053	Echantillon	IT041412-1450
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 54

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1451 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	54 - Joint calicot 2ème étage Cloison 14-11-014296_054	Echantillon	IT041412-1451
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 55

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1452 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	55 - Enduit + plâtre - 1er étage Cloison 14-11-014296_055	Echantillon	IT041412-1452
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit gris avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit gris avec peinture	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 56

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1453 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	56 - Faux plafond - 1er étage plafond 14-11-014296_056	Echantillon	IT041412-1453
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 57

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1454 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	57 - Enduit + plâtre - 1er étage Cloison 14-11-014296_057	Echantillon	IT041412-1454
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 58

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1458 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	58 - Enduit + plâtre - RDC Cloison 14-11-014296_058	Echantillon	IT041412-1458
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit gris

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit gris	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 59

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1459 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	59 - Enveloppe de calorifuge RDC plafond 14-11-014296_059	Echantillon	IT041412-1459
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Calorifugeage jaune fibreux homogène avec couches aluminium

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage jaune fibreux homogène avec couches aluminium	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 60

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1460 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	60 - Faux plafond - RDC plafond 14-11-014296_060	Echantillon	IT041412-1460
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 61

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1461 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	61 - Linoléum + colle + ragréage - RDC sol 14-11-014296_061	Echantillon	IT041412-1461
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Revêtement souple bleu avec colle plastique jaune et ragréage gris

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Revêtement souple bleu avec colle plastique jaune et ragréage gris	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 62

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1462 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	62 - Joint calicot RDC cloison 14-11-014296_062	Echantillon	IT041412-1462
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 63

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1463 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	63 - Faux plafond - RDC plafond 14-11-014296_063	Echantillon	IT041412-1463
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Faux plafond gris fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond gris fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 64

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1465 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	64 - Enveloppe de calorifuge - RDC Infirmerie plafond 14-11-014296_064	Echantillon	IT041412-1465
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Calorifugeage jaune fibreux homogène avec couches aluminium

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage jaune fibreux homogène avec couches aluminium	MOLP le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 65

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1466 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	65 - Faux plafond - RDC Infirmerie plafond 14-11-014296_065	Echantillon	IT041412-1466
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 66

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1468 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	66 - Dalle de sol + colle + ragréage - RDC Infirmerie sol 14-11-014296_066	Echantillon	IT041412-1468
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Dalle dure blanche cassante compacte avec colle plastique jaune et ragréage rose

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Dalle dure blanche cassante compacte	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1
Colle plastique jaune et ragréage rose	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 67

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1470 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	67 - Joint calicot - RDC Infirmerie cloison 14-11-014296_067	Echantillon	IT041412-1470
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Plaque de plâtre blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Plaque de plâtre blanc avec couche cartonnée	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Document 68

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1472 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		Réf. ITGA :	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	68 - Calorifuge 1 – 1er Sous sol Chaufferie 14-11-014296_068	Echantillon	IT041412-1472
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Mousse bleue avec toile fibreuse peinte

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Mousse bleue avec toile fibreuse peinte	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 69

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1473 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	69 - Calorifuge 2 - 1er Sous sol Chaufferie 14-11-014296_069	Echantillon	IT041412-1473
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Toile fibreuse blanche plâtrée

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Toile fibreuse blanche plâtrée	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 70

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1474 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	70 - Calorifuge 3 - 1er Sous sol Chaufferie 14-11-014296_070	Echantillon	IT041412-1474
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Mousse noire avec toile fibreuse blanche peinte

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Mousse noire avec toile fibreuse blanche peinte	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 71

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1475 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	71 - Calorifuge 4 - 1er Sous sol Chaufferie 14-11-014296_071	Echantillon	IT041412-1475
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Calorifugeage multicolore fibreux homogène avec matériau blanchâtre plâtreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage multicolore fibreux homogène avec matériau blanchâtre plâtreux	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 72

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1477 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	72 - Calorifuge 5 - 1er Sous sol Chaufferie 14-11-014296_072	Echantillon	IT041412-1477
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Calorifugeage de morceaux de liège avec couche bitumineuse souple et toile fibreuse peinte

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage de morceaux de liège avec couche bitumineuse souple et toile fibreuse peinte	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 73

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1478 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	73 - Calorifuge 6 - 1er Sous sol Chaufferie 14-11-014296_073	Echantillon	IT041412-1478
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Calorifugeage de morceaux de liège avec toile fibreuse blanche plâtrée et peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage de morceaux de liège avec toile fibreuse blanche plâtrée et peinture	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Document 74

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1479 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	74 - Calorifuge 7 - 1er Sous sol Chaufferie 14-11-014296_074	Echantillon	IT041412-1479
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 75

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1480 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	75 - Flocage 1 - 1er Sous sol Plafond chaufferie 14-11-014296_075	Echantillon	IT041412-1480
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Flocage blanchâtre pelotonneux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Flocage blanchâtre pelotonneux	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 76

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1481 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	76 - Calorifuge 8 - 1er Sous sol Chaufferie 14-11-014296_076	Echantillon	IT041412-1481
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Calorifugeage jaune fibreux homogène avec toile fibreuse blanche plâtrée

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage jaune fibreux homogène avec toile fibreuse blanche plâtrée	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 77

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1483 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	77 - Calorifuge 9 - 1er Sous sol Chaufferie 14-11-014296_077	Echantillon	IT041412-1483
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Calorifugeage orange fibreux homogène avec toile fibreuse blanche plâtrée et papier

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage orange fibreux homogène avec toile fibreuse blanche plâtrée et papier	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 78

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1484 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	76 - Colle plinthe - 1er Sous sol Chaufferie 14-11-014296_076	Echantillon	IT041412-1484
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Colle blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle blanche	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 79

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1487 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	79 - Colle + joint + ragréage - 1er Sous sol Chaufferie 14-11-014296_079	Echantillon	IT041412-1487
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Colle carrelage grise avec carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage grise	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	---	Non Analysé		

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 80

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1490 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	80 - Chape machine 1er Sous sol Chaufferie 14-11-014296_080	Echantillon	IT041412-1490
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Matériau gris compact

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau gris compact	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 81

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1492 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	61 - Calorifuge 10 - 1er Sous sol Local groupe froid 14-11-014296_061	Echantillon	IT041412-1492
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse peinte

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse peinte	META le 05/12/2014	Amiante non détecté	---	7

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 82

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1493 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	62 - Calorifuge 11 - 1er Sous sol Local groupe froid 14-11-014296_062	Echantillon	IT041412-1493
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Toile fibreuse blanche plâtrée avec peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Toile fibreuse blanche plâtrée avec peinture	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Document 83

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1494 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	83 - Calorifuge 12 - 1er Sous sol Local groupe froid 14-11-014296_083	Echantillon	IT041412-1494
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse et peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse et peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Document 84

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1495 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	84 - Calorifuge 13 - 1er Sous sol Local groupe froid 14-11-014296_084	Echantillon	IT041412-1495
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 85

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1496 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	85 - Calorifuge 14 - 1er Sous sol Local groupe froid 14-11-014296_085	Echantillon	IT041412-1496
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Calorifugeage de morceaux de liège avec toile fibreuse blanche peinte

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage de morceaux de liège avec toile fibreuse blanche peinte	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 86

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1497 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	86 - Calorifuge 15 - 1er Sous sol Local groupe froid 14-11-014296_086	Echantillon	IT041412-1497
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Calorifugeage de morceaux de liège avec toile fibreuse blanche plâtrée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage de morceaux de liège avec toile fibreuse blanche plâtrée	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 87

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1498 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	87 - Calorifuge 16 - 1er Sous sol Local stockage 14-11-014296_087	Echantillon	IT041412-1498
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Calorifugeage de morceaux de liège avec toile fibreuse blanche peinte

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage de morceaux de liège avec toile fibreuse blanche peinte	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 88

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1499 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	88 - Calorifuge 17 - 1er Sous sol Local stockage 14-11-014296_088	Echantillon	IT041412-1499
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Calorifugeage de morceaux de liège avec couche bitumineuse souple et peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage de morceaux de liège avec couche bitumineuse souple et peinture	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 89

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1500 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	89 - Etanchéité - Toit terrasse 1er Nord 14-11-014296_089	Echantillon	IT041412-1500
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple	META le 05/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 90

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1501 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	90 - Relevé d'étanchéité - Toit terrasse 1er Nord 14-11-014296_090	Echantillon	IT041412-1501
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 91

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1502 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	91 - Etanchéité - Toit terrasse 1er Sud 14-11-014296_091	Echantillon	IT041412-1502
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 92

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1505 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	92 - Relevé d'étanchéité - Toit terrasse 1er Sud 14-11-014296_092	Echantillon	IT041412-1505
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium et fibres visibles

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium et fibres visibles	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024 — DTA 164 rev 09

Document 93

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1506 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	93 - Relevé d'étanchéité - Toit terrasse 3ème étage 14-11-014296_093	Echantillon	IT041412-1506
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Document 94

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1507 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	94 - Etanchéité - Toit terrasse 3ème étage 14-11-014296_094	Echantillon	IT041412-1507
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 95

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1508 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	95 - Etanchéité - Toit terrasse 5ème étage 14-11-014296_095	Echantillon	IT041412-1508
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec gravillons + mousse jaune

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple avec gravillons + mousse jaune	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 96

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1510 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	96 - Etanchéité + isolant - Toit terrasse 6ème étage 14-11-014296_096	Echantillon	IT041412-1510
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec mousse jaune + couche fibreuse blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple avec mousse jaune + couche fibreuse blanche	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 97

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1512 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	97 - Relevé d'étanchéité - Toit terrasse 6ème étage 14-11-014296_097	Echantillon	IT041412-1512
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium et fibres visibles

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium et fibres visibles	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Valérie NOYER – Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 98

itga
Innovateur en Habitat

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1513 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	96 - Colle carrelage + ragréage - Toit terrasse 7ème 14-11-014296_096	Echantillon	IT041412-1513
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Colle carrelage blanche avec carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage blanche	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	---	Non Analysé		

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 100

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1516 EN DATE DU 05/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30478
Echantillon	100 - Etanchéité - Toit terrasse 7ème 14-11-014296_100	Echantillon	IT041412-1516
Dossier client	CNMSS TOULON Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec matériau jaune fibreux homogène

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple avec matériau jaune fibreux homogène	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Valérie NOYER - Chef d'Equipe Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 101

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1433 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30479
Echantillon	101 - Etanchéité + isolant – Toit terrasse 7ème 14-11-014296_101	Echantillon	IT041412-1433
Dossier client	CNMSS Toulon Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple + mousse jaune

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple + mousse jaune	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 102

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1434 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		Réf. ITGA :	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30479
Echantillon	102 - Etanchéité + isolant - Toit terrasse vague 7ème 14-11-014296_102	Echantillon	IT041412-1434
Dossier client	CNMSS Toulon Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec gravillons + matériau jaune homogène fibreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple avec gravillons + matériau jaune homogène fibreux	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Document 103

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1435 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30479
Echantillon	103 - Relevé d'étanchéité – Toit terrasse 7ème 14-11-014296_103	Echantillon	IT041412-1435
Dossier client	CNMSS Toulon Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 104

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1436 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30479
Echantillon	104 - Relevé d'étanchéité - Toit terrasse 7ème 14-11-014296_104	Echantillon	IT041412-1436
Dossier client	CNMSS Toulon Bâtiment Brun	Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple avec couche d'aluminium	META le 04/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Document 105

itga
Innovateur en Fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1437 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30479
Echantillon	105 - Faux plafond - 1er étage Plafond 14-11-014296_105	Echantillon	IT041412-1437
Dossier client	CNMSS Toulon Bâtiment Brun	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 106

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1438 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30479
Echantillon	106 - Joint calicot + enduit - 2ème étage Cloison circulation 14-11-014296_106	Echantillon	IT041412-1438
Dossier client	CNMSS Toulon Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

Document 107

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1439 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30479
Echantillon	107 - Joint calicot + enduit - 3ème étage Cloison circulation 14-11-014296_107	Echantillon	IT041412-1439
Dossier client	CNMSS Toulon Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 108

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1440 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30479
Echantillon	108 - Faux plafond - 3ème étage Plafond 14-11-014296_108	Echantillon	IT041412-1440
Dossier client	CNMSS Toulon Bâtiment Brun	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 109

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1441 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30479
Echantillon	109 - Flocage - Local informatique 3ème étage Plafond 14-11-014296_109	Echantillon	IT041412-1441
Dossier client	CNMSS Toulon Bâtiment Brun	Description ITGA	Flocage blanchâtre pelotonneux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Flocage blanchâtre pelotonneux	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Emission avec : DTR024 DTA 164 rev 09

Document 110

itga
Innovateur en fiabilité

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1442 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30479
Echantillon	110 - Joint calicot + enduit - 4ème étage Cloison circulation 14-11-014296_110	Echantillon	IT041412-1442
Dossier client	CNMSS Toulon Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 111

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1443 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30479
Echantillon	111 – Faux plafond – 4ème étage Plafond 14-11-014296_111	Echantillon	IT041412-1443
Dossier client	CNMSS Toulon Bâtiment Brun	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

CONSTAT AMIANTE

Document 112

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1- 1029
Liste des sites et portée disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation

RAPPORT D'ESSAI N° IT041412-1444 EN DATE DU 04/12/2014
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page. Il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Emmanuel HERNANDEZ
Parc Valentine - Vallée Verte Bât Bourbon 1
41 chem Vicinal de la Millière
13011 MARSEILLE

Prélèvement :
Reçu au laboratoire le : 02/12/2014
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :		**Réf. ITGA :**	
Commande	14-11-014296 (CDP : 6006)	Commande	IT0414-30479
Echantillon	112 - Joint calicot + enduit - 6ème étage Cloison circulation 14-11-014296_112	Echantillon	IT041412-1444
Dossier client	CNMSS Toulon Bâtiment Brun	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture	META le 03/12/2014	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Paul SARR - Responsable de Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Document 099

FC_510.1.047 Rev.22
Rapport d'essai n° 137790.02 révision 0
Edition du samedi 10 janvier 2015

BJL LABORATOIRES D'ANALYSES ENVIRONNEMENTALES & INDUSTRIELLES

DEKRA INDUSTRIAL SAS AGENCE DE MARSEILLE
Parc Valentine Vallée Verte
13011 MARSEILLE

Rapport d'Essai MET
Identification de l'amiante dans les matériaux

Textes de référence : Méthode goutte en adaptation de la norme NFX 43 050

Rapport : **137790.02 révision 0**
Nbre d'échantillon(s) : **1**
Date d'arrivée : **29/12/2014**

Désignation affaire / adresse de prélèvement **DOSSIER: 14-11-014296 - BÂTIMENT BRUN**
247 avenue Jacques Cartier
83090 TOULON

INFORMATIONS SUR LE PRELEVEMENT n° P099

Organisme ayant réalisé la prestation de prélèvement : **DEKRA INDUSTRIAL SAS**
Référence du prélèvement : **P099**
Localisation / Désignation prélèvement :**Acrotère - 7ème étage Matériau revêtement d'étanchéité**

Les données indiquées ci-dessus sont de la responsabilité de la société de prélèvement.

RESULTATS DE L'ANALYSE * DE L'ECHANTILLON n° 448311

Nombre de préparations réalisées : **1**
Date d'analyse : **07/01/15**
Analyste: **GVA**
Description du matériau : **Aluminium + souple noir Multicouche**
Variété(s) de fibres : **Non Détecté**

cofrac ESSAIS N°1-0973 portée disponible sur www.cofrac.fr

L'analyse de l'échantillon a été réalisée à BJL LABORATOIRES Sèvres
L'accréditation Cofrac N°1-0973 porte sur la partie analyse de l'Essai.

ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

***a)* Dangerosité de l'amiante**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

***b)* Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation**

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

– perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;

– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

– travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : **www.amiante.inrs.fr**.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B

l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

– de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

– de la mairie ;

– ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : **www.sinoe.org.**

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr – TVA FR 44 433 250 834
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - Siren 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B
