
TECHNICONSULT

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX
DE RENOVATION STERILISATION - CHU MORVAN BREST // DCE

Lun 21/09/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**TRAVAUX DE RENOVATION DE LA STERILISATION**	**197 jours**	**Mar 02/02/27**	**Jeu 02/12/27**
2	Notification entreprises Travaux	1 jour	Mar 02/02/27	Mar 02/02/27
3	OS de démarrage	1 jour	Mer 03/02/27	Mer 03/02/27
4	Période de préparation de chantier	22 jours	Jeu 04/02/27	Ven 05/03/27
5	**Travaux**	**188 jours**	**Lun 15/02/27**	**Jeu 02/12/27**
6	**CHU**	**157 jours**	**Lun 15/02/27**	**Mar 19/10/27**
7	Déménagement/Evacuation mobiliers	2 jours	Lun 15/02/27	Mar 16/02/27
8	Mise en place laveurs & process attenant	7 jours	Lun 11/10/27	Mar 19/10/27
9	**DEMOLITION / GROS-OEUVRE**	175 jours	Jeu 18/02/27	Jeu 18/11/27
10	**Travaux préparatoires**	**4 jours**	**Jeu 18/02/27**	**Mar 23/02/27**
11	Installations de chantier (Heras, bungalows)	3 jours	Jeu 18/02/27	Lun 22/02/27
12	Branchements provisoires	1 jour	Mar 23/02/27	Mar 23/02/27
13	**Curage / Démolitions : RDC Bas**	**87 jours**	**Lun 15/03/27**	**Mar 20/07/27**
14	Curage intérieur	13 jours	Lun 15/03/27	Jeu 01/04/27
15	Démolition dallage	4 jours	Ven 02/04/27	Mer 07/04/27
16	Agrandissements d'ouvertures	5 jours	Jeu 08/04/27	Mer 14/04/27
17	Reprise empreintes cloisons	3 jours	Jeu 15/04/27	Lun 19/04/27
18	Démolition gaines coupe-feu type Promat	4 jours	Jeu 15/07/27	Mar 20/07/27
19	**Carottages / Sciages : RDC bas**	**35 jours**	**Jeu 15/04/27**	**Lun 07/06/27**
20	Carottages en élévations BA	4 jours	Jeu 15/04/27	Mar 20/04/27
21	Carottage/Sciage en planchers BA : Haut RDC bas	3 jours	Mer 21/04/27	Ven 23/04/27
22	Renforcements suite aux sciages : RDC bas	2 jours	Lun 26/04/27	Mar 27/04/27
23	Percements en élévations parpaings	3 jours	Jeu 03/06/27	Lun 07/06/27
24	**Réseaux sous dalle**	**12 jours**	**Jeu 15/04/27**	**Ven 30/04/27**
25	Création de saignées en dalle basse & pose réseaux	7 jours	Jeu 15/04/27	Ven 23/04/27
26	Reprises frangements de dalle BA	5 jours	Lun 26/04/27	Ven 30/04/27
27	**Dalle**	**12 jours**	**Mar 18/05/27**	**Mer 02/06/27**
28	Réfection dalle	8 jours	Mar 18/05/27	Jeu 27/05/27
29	Réfection de cuvette de monte-charge	4 jours	Ven 28/05/27	Mer 02/06/27
30	**Travaux en gaines techniques**	**47 jours**	**Jeu 08/04/27**	**Mer 16/06/27**
31	**RDC haut**	**25 jours**	**Jeu 08/04/27**	**Ven 14/05/27**
32	Sciage en élévations BA : RDC haut	3 jours	Jeu 08/04/27	Mar 27/04/27
33	Carottage/Sciage en planchers BA	3 jours	Mer 28/04/27	Ven 30/04/27
34	Renforcements suite aux sciages : RDC haut	3 jours	Lun 03/05/27	Mer 05/05/27
35	Reconstitution de plancher BA	5 jours	Lun 10/05/27	Ven 14/05/27
36	**R+1**	**8 jours**	**Mar 18/05/27**	**Jeu 27/05/27**
37	Sciage en élévations BA : R+1	3 jours	Mar 18/05/27	Jeu 20/05/27
38	Carottage/Sciage en planchers BA : Haut du R+1	2 jours	Ven 21/05/27	Lun 24/05/27
39	Renforcements suite aux sciages : R+1	3 jours	Mar 25/05/27	Jeu 27/05/27
40	**R+2**	**14 jours**	**Ven 28/05/27**	**Mer 16/06/27**
41	Sciage en élévations BA : R+2	4 jours	Ven 28/05/27	Mer 02/06/27
42	Carottage/Sciage en planchers BA : Haut du R+2	5 jours	Jeu 03/06/27	Mer 09/06/27
43	Renforcements suite aux sciages : R+2	5 jours	Jeu 10/06/27	Mer 16/06/27
44	**Finitions**	**71 jours**	**Mer 21/07/27**	**Jeu 18/11/27**
45	Finitions	5 jours	Mer 21/07/27	Mar 27/07/27
46	Repli installations de chantier	2 jours	Mer 17/11/27	Jeu 18/11/27
47	**CLOISONS**	**111 jours**	**Lun 01/03/27**	**Lun 30/08/27**
48	**Travaux de confinement**	**4 jours**	**Lun 01/03/27**	**Jeu 04/03/27**
49	Confinement provisoire intérieur	4 jours	Lun 01/03/27	Jeu 04/03/27
50	**Cloisons : RDC bas**	**36 jours**	**Mar 08/06/27**	**Mer 28/07/27**
51	Cloisons Placo ép. 10cm	15 jours	Mar 08/06/27	Lun 28/06/27
52	Cloisons Placo type S120	3 jours	Mar 29/06/27	Jeu 01/07/27
53	Cloisons Placo type S220	6 jours	Ven 02/07/27	Ven 09/07/27
54	Obturation de baies intérieures	4 jours	Lun 12/07/27	Ven 16/07/27
55	Bandes	12 jours	Lun 12/07/27	Mar 28/07/27
56	**Contre-cloisons**	**13 jours**	**Lun 19/07/27**	**Mer 25/08/27**
57	Contre-cloisons RDC bas	2 jours	Lun 19/07/27	Mar 20/07/27
58	Contre-cloisons RDC haut	3 jours	Ven 23/07/27	Mar 27/07/27
59	Contre-cloisons R+1	3 jours	Mer 28/07/27	Ven 30/07/27
60	Contre-cloisons R+2	3 jours	Lun 23/08/27	Mer 25/08/27
61	**Divers**	**37 jours**	**Jeu 17/06/27**	**Lun 30/08/27**
62	Coffre horizontal EI 120 : RDC bas	8 jours	Jeu 29/07/27	Lun 30/08/27
63	Cloison carreaux de plâtre EI120 : gaines techniques étages	10 jours	Jeu 17/06/27	Mar 30/06/27
64	Encoffrement chutes	3 jours	Lun 26/07/27	Mer 28/07/27
65	Habillages	3 jours	Mer 21/07/27	Ven 23/07/27
66	Plafond EI120 : SAS MC 58	2 jours	Jeu 29/07/27	Ven 30/07/27
67	**FAUX-PLAFONDS**	**169 jours**	**Ven 19/02/27**	**Jeu 11/11/27**
68	Dépose soignée faux-plafonds : RDC bas	6 jours	Ven 19/02/27	Ven 26/02/27
69	Dépose faux-plafonds : RDC haut / R+1 / R+2	1 jour	Lun 01/03/27	Lun 01/03/27
70	Pose ossatures Plafonds suspendus : RDC bas	15 jours	Mer 06/10/27	Mar 26/10/27
71	Pose dalles 600x600 : RDC bas	6 jours	Jeu 04/11/27	Jeu 11/11/27
72	Reposes faux-plafonds : RDC haut/R+1/R+2	2 jours	Jeu 26/08/27	Ven 27/08/27
73	**MENUISERIES INTERIEURES**	**132 jours**	**Jeu 08/04/27**	**Ven 05/11/27**
74	**Bloc-portes Int.**	**125 jours**	**Jeu 08/04/27**	**Mar 26/10/27**
75	Fourniture huisseries au plaquiste	40 jours	Jeu 08/04/27	Lun 07/06/27
76	Pose vantaux de bloc-portes	3 jours	Lun 18/10/27	Mer 20/10/27
77	Pose bloc-porte au sein cloisons Placo conservées	2 jours	Jeu 21/10/27	Ven 22/10/27
78	Pose bloc-porte au sein élévations maçonnées conservées	1 jour	Lun 25/10/27	Lun 25/10/27
79	Adaptation serrure électrique	1 jour	Mar 26/10/27	Mar 26/10/27
80	**Châssis vitrés**	**125 jours**	**Jeu 08/04/27**	**Mar 26/10/27**
81	Fourniture huisseries au plaquiste	40 jours	Jeu 08/04/27	Lun 07/06/27
82	Pose vitrages	1 jour	Mar 26/10/27	Mar 26/10/27
83	**Protections**	**3 jours**	**Mer 27/10/27**	**Ven 29/10/27**
84	Panneaux de protection murale	2 jours	Mer 27/10/27	Jeu 28/10/27
85	Protection murale pare-chocs	1 jour	Ven 29/10/27	Ven 29/10/27
86	**Divers**	**56 jours**	**Jeu 29/07/27**	**Ven 05/11/27**
87	Plinthes bois	2 jours	Jeu 29/07/27	Ven 30/07/27
88	Finitions	2 jours	Jeu 04/11/27	Ven 05/11/27
89	Passe-plat de transfert	2 jours	Mar 02/11/27	Mer 03/11/27
90	**PORTES AUTOMATIQUES**	**25 jours**	**Lun 11/10/27**	**Lun 15/11/27**
91	Pose Portes coulissantes automatiques	10 jours	Lun 11/10/27	Ven 22/10/27
92	Raccordements / fiinitions / MES	5 jours	Mar 09/11/27	Lun 15/11/27
93	**REVETEMENTS DE SOL & MUR**	**50 jours**	**Lun 19/07/27**	**Ven 15/10/27**
94	**Préparation de support des sols**	**5 jours**	**Mer 28/07/27**	**Mar 24/08/27**
95	Barrière anti-remontée d'humidité	2 jours	Mer 28/07/27	Jeu 29/07/27
96	Ragréage de rénovation	3 jours	Ven 30/07/27	Mar 24/08/27
97	**Revêtement de sol souple**	**21 jours**	**Jeu 26/08/27**	**Jeu 23/09/27**
98	lés type PVC type Mipolam Symbioz	12 jours	Mer 01/09/27	Jeu 16/09/27
99	lés type PVC type Taralay Premium Compact	5 jours	Ven 17/09/27	Jeu 23/09/27
100	Reprises de revêtement de sol : RDC haut/R+1/R+2	4 jours	Jeu 26/08/27	Mar 31/08/27
101	**Points singuliers / Finitions sols**	**2 jours**	**Ven 24/09/27**	**Lun 27/09/27**
102	Traitement du JD existant	1 jour	Ven 24/09/27	Ven 24/09/27
103	Protection provisoire des sols neufs	1 jour	Lun 27/09/27	Lun 27/09/27
104	**PVC mural**	**50 jours**	**Lun 19/07/27**	**Ven 15/10/27**
105	Préparation de support : élévations conservées	7 jours	Lun 19/07/27	Mar 27/07/27
106	lés type ProtectWall CR	13 jours	Ven 24/09/27	Mar 12/10/27
107	Finitions	3 jours	Mer 13/10/27	Ven 15/10/27
108	**Faience**	**3 jours**	**Mer 25/08/27**	**Ven 27/08/27**
109	Pose faience	3 jours	Mer 25/08/27	Ven 27/08/27
110	**PEINTURE**	**70 jours**	**Jeu 29/07/27**	**Jeu 25/11/27**
111	**Peinture murale**	**51 jours**	**Jeu 29/07/27**	**Jeu 28/10/27**
112	Préparation & impression : élévations Placo	10 jours	Jeu 29/07/27	Mer 01/09/27
113	Finitions : élévations Placo	4 jours	Jeu 02/09/27	Mar 07/09/27
114	Mise en peinture d'élévations maçonnées conservées	5 jours	Mer 08/09/27	Mar 14/09/27
115	Finitions	4 jours	Lun 25/10/27	Jeu 28/10/27
116	**Peinture sur plafonds**	**2 jours**	**Mer 15/09/27**	**Jeu 16/09/27**
117	Mise en peinture plafond Placo	2 jours	Mer 15/09/27	Jeu 16/09/27
118	**Peinture sur éléments bois**	**3 jours**	**Jeu 21/10/27**	**Lun 25/10/27**
119	Mise en vernis chants des vantaux bois	3 jours	Jeu 21/10/27	Lun 25/10/27
120	**Peinture sur éléments métalliques**	**16 jours**	**Ven 17/09/27**	**Ven 08/10/27**
121	Huisseries métalliques	4 jours	Ven 17/09/27	Mer 22/09/27
122	Tuyauteries	2 jours	Jeu 07/10/27	Ven 08/10/27
123	**Nettoyage de fin de chantier**	**19 jours**	**Ven 29/10/27**	**Jeu 25/11/27**
124	Nettoyage avant OPR	2 jours	Ven 12/11/27	Lun 15/11/27
125	Nettoyage avant Mise en service Ventilation	1 jour	Ven 29/10/27	Ven 29/10/27
126	Nettoyage avant opérations de Qualifications	1 jour	Jeu 25/11/27	Jeu 25/11/27
127	**CVP**	**174 jours**	**Mer 17/02/27**	**Mar 16/11/27**
128	**Travaux préparatoires**	**20 jours**	**Mer 17/02/27**	**Mar 16/03/27**
129	Consignations	1 jour	Mer 17/02/27	Mer 17/02/27
130	Identifications	3 jours	Lun 01/03/27	Mer 03/03/27
131	Déposes / Evacuations	9 jours	Jeu 04/03/27	Mar 16/03/27
132	**Travaux de ventilation**	**154 jours**	**Mer 17/03/27**	**Mar 16/11/27**
133	**Laveurs & auto-claves**	**91 jours**	**Ven 28/05/27**	**Lun 25/10/27**
134	Distribution gaines : plénum	13 jours	Ven 28/05/27	Mar 15/06/27
135	Distribution gaines : côté Archives	6 jours	Mer 07/07/27	Jeu 15/07/27
136	Mise en œuvre extracteurs	3 jours	Ven 16/07/27	Mar 20/07/27
137	Pose diffuseurs en faux-plafonds	4 jours	Mer 20/10/27	Lun 25/10/27
138	**Conditionnement / Préparation Lavage / Stock Stérile**	**83 jours**	**Mer 16/06/27**	**Mar 02/11/27**
139	Distribution gaines : plénum	15 jours	Mer 16/06/27	Mar 06/07/27
140	Distribution gaine technique : RDC bas vers Toiture-Terrasse	15 jours	Jeu 01/07/27	Jeu 22/07/27
141	Pose diffuseurs en faux-plafonds	5 jours	Mar 26/10/27	Mar 02/11/27
142	**Toiture-terrasse**	**66 jours**	**Ven 30/04/27**	**Jeu 26/08/27**
143	Délais Appro centrale	50 jours	Ven 30/04/27	Mar 13/07/27
144	Pose centrale	2 jours	Jeu 15/07/27	Ven 16/07/27
145	Distribution gaines en Toiture	9 jours	Mer 07/07/27	Mar 20/07/27
146	Calorifugeage & Tôle isoxal	7 jours	Mer 28/07/27	Jeu 26/08/27
147	**Bureaux / détentes / Vestiaires**	**147 jours**	**Mer 17/03/27**	**Ven 05/11/27**
148	Déposes gaines existantes	2 jours	Mer 17/03/27	Jeu 18/03/27
149	Distribution	8 jours	Ven 16/07/27	Mar 27/07/27
150	Pose diffuseurs en faux-plafonds	3 jours	Mer 03/11/27	Ven 05/11/27
151	**Divers**	**69 jours**	**Mer 21/07/27**	**Mar 16/11/27**
152	Modifications armoires	4 jours	Mer 21/07/27	Lun 26/07/27
153	Mise en services - Essais	7 jours	Lun 08/11/27	Mar 16/11/27
154	**GTB**	**7 jours**	**Ven 29/10/27**	**Mar 09/11/27**
155	Adaptation de l'installation existante	2 jours	Ven 29/10/27	Mar 02/11/27
156	Ajout des nouveaux équipements	2 jours	Mer 03/11/27	Jeu 04/11/27
157	Mise en services - Essais	3 jours	Ven 05/11/27	Mar 09/11/27
158	**Travaux de plomberie - Traitement d'eau**	**139 jours**	**Ven 02/04/27**	**Mer 10/11/27**
159	**EP & EU**	**115 jours**	**Ven 02/04/27**	**Mer 06/10/27**
160	Déviation DEP & chutes EU	3 jours	Ven 02/04/27	Mar 06/04/27
161	Distribution EU-EV	6 jours	Mar 08/06/27	Mar 15/06/27
162	Appareillages sanitaires	4 jours	Ven 01/10/27	Mer 06/10/27
163	**EF & ECS**	**8 jours**	**Mer 16/06/27**	**Ven 25/06/27**
164	Distribution (EF), (ECS) & (RECS)	8 jours	Mer 16/06/27	Ven 25/06/27
165	**Eau osmosée**	**81 jours**	**Lun 28/06/27**	**Mer 10/11/27**
166	Distribution eau osmosée et équipement attenant	8 jours	Lun 28/06/27	Mer 07/07/27
167	Tableau électrique et régulation	4 jours	Mer 03/11/27	Lun 08/11/27
168	Mise en services - Essais	2 jours	Mar 09/11/27	Mer 10/11/27
169	**Fluides médicaux & Air comprimé**	**73 jours**	**Jeu 08/07/27**	**Mer 10/11/27**
170	Distribution	5 jours	Jeu 08/07/27	Jeu 15/07/27
171	Points de raccordements / Terminaux	4 jours	Mer 13/10/27	Lun 18/10/27
172	Mise en services - Essais	2 jours	Mar 09/11/27	Mer 10/11/27
173	**Chauffage**	**2 jours**	**Mer 07/04/27**	**Jeu 08/04/27**
174	Adaptations réseaux	2 jours	Mer 07/04/27	Jeu 08/04/27
175	**ELECTRICITE**	**180 jours**	**Mer 17/02/27**	**Mar 24/11/27**
176	**Travaux préparatoires**	**20 jours**	**Mer 17/02/27**	**Mar 16/03/27**
177	Consignations	1 jour	Mer 17/02/27	Mer 17/02/27
178	Identifications / Déposes / Evacuations	10 jours	Lun 01/03/27	Ven 12/03/27
179	Délocalisation armoire TGBT	2 jours	Lun 15/03/27	Mar 16/03/27
180	**CFO**	**93 jours**	**Mar 08/06/27**	**Lun 08/11/27**
181	Distribution plénum	20 jours	Mar 08/06/27	Lun 05/07/27
182	Distribution en cloisons neuves	25 jours	Mar 15/06/27	Mar 20/07/27
183	Pose luminaires	7 jours	Mer 27/10/27	Ven 05/11/27
184	Pose terminaux neufs / Repose éléments conservés	15 jours	Lun 18/10/27	Lun 08/11/27
185	**SSI - CFA**	**172 jours**	**Lun 01/03/27**	**Mar 24/11/27**
186	Identifications / déposes	3 jours	Lun 01/03/27	Mer 03/03/27
187	Repose éléments conservés	4 jours	Mer 13/10/27	Lun 18/10/27
188	Ajout de détecteurs supplémentaires	3 jours	Mar 19/10/27	Jeu 21/10/27
189	Distribution précâblage Tél/Info	3 jours	Ven 22/10/27	Mar 26/10/27
190	installations de contrôle d'accès par lecteur de badge	2 jours	Mar 09/11/27	Mer 10/11/27
191	Mise en services - Essais	5 jours	Jeu 18/11/27	Mer 24/11/27
192	**SERRURERIE**	**74 jours**	**Mer 28/04/27**	**Ven 03/09/27**
193	Travaux préparatoires : reprises d'étanchéité pour potelets	3 jours	Mer 28/04/27	Ven 30/04/27
194	Travaux préparatoires : reprises d'étanchéité pour gaines	5 jours	Lun 03/05/27	Mar 11/05/27
195	Pose profilés & plancher caillebotis	4 jours	Mer 12/05/27	Mar 18/05/27
196	Pose garde-corps et escaliers	2 jours	Mer 21/07/27	Jeu 22/07/27
197	Dépose sécurité provisoire	1 jour	Ven 03/09/27	Ven 03/09/27
198	Pose porte grillagée : Local compresseur	1 jour	Ven 23/07/27	Ven 23/07/27
199	**MONTE-CHARGE**	**136 jours**	**Lun 15/03/27**	**Lun 18/10/27**
200	**MC 58**	**136 jours**	**Lun 15/03/27**	**Lun 18/10/27**
201	Dépose MC58 existant	5 jours	Lun 15/03/27	Ven 19/03/27
202	Délais fabrication, approvisionnement	60 jours	Lun 22/03/27	Jeu 17/06/27
203	Montage MC 58	8 jours	Ven 18/06/27	Mar 29/06/27
204	Mise en services - Essais	2 jours	Ven 15/10/27	Lun 18/10/27
205	**AOR**	**7 jours**	**Mar 16/11/27**	**Mer 24/11/27**
206	OPR	1 jour	Mar 16/11/27	Mar 16/11/27
207	Levée de réserves	5 jours	Mer 17/11/27	Mar 23/11/27
208	Réception	1 jour	Mer 24/11/27	Mer 24/11/27
209	**Qualifications**	**5 jours**	**Ven 26/11/27**	**Jeu 02/12/27**
210	Opérations de Qualifications de fin de chantier	5 jours	Ven 26/11/27	Jeu 02/12/27

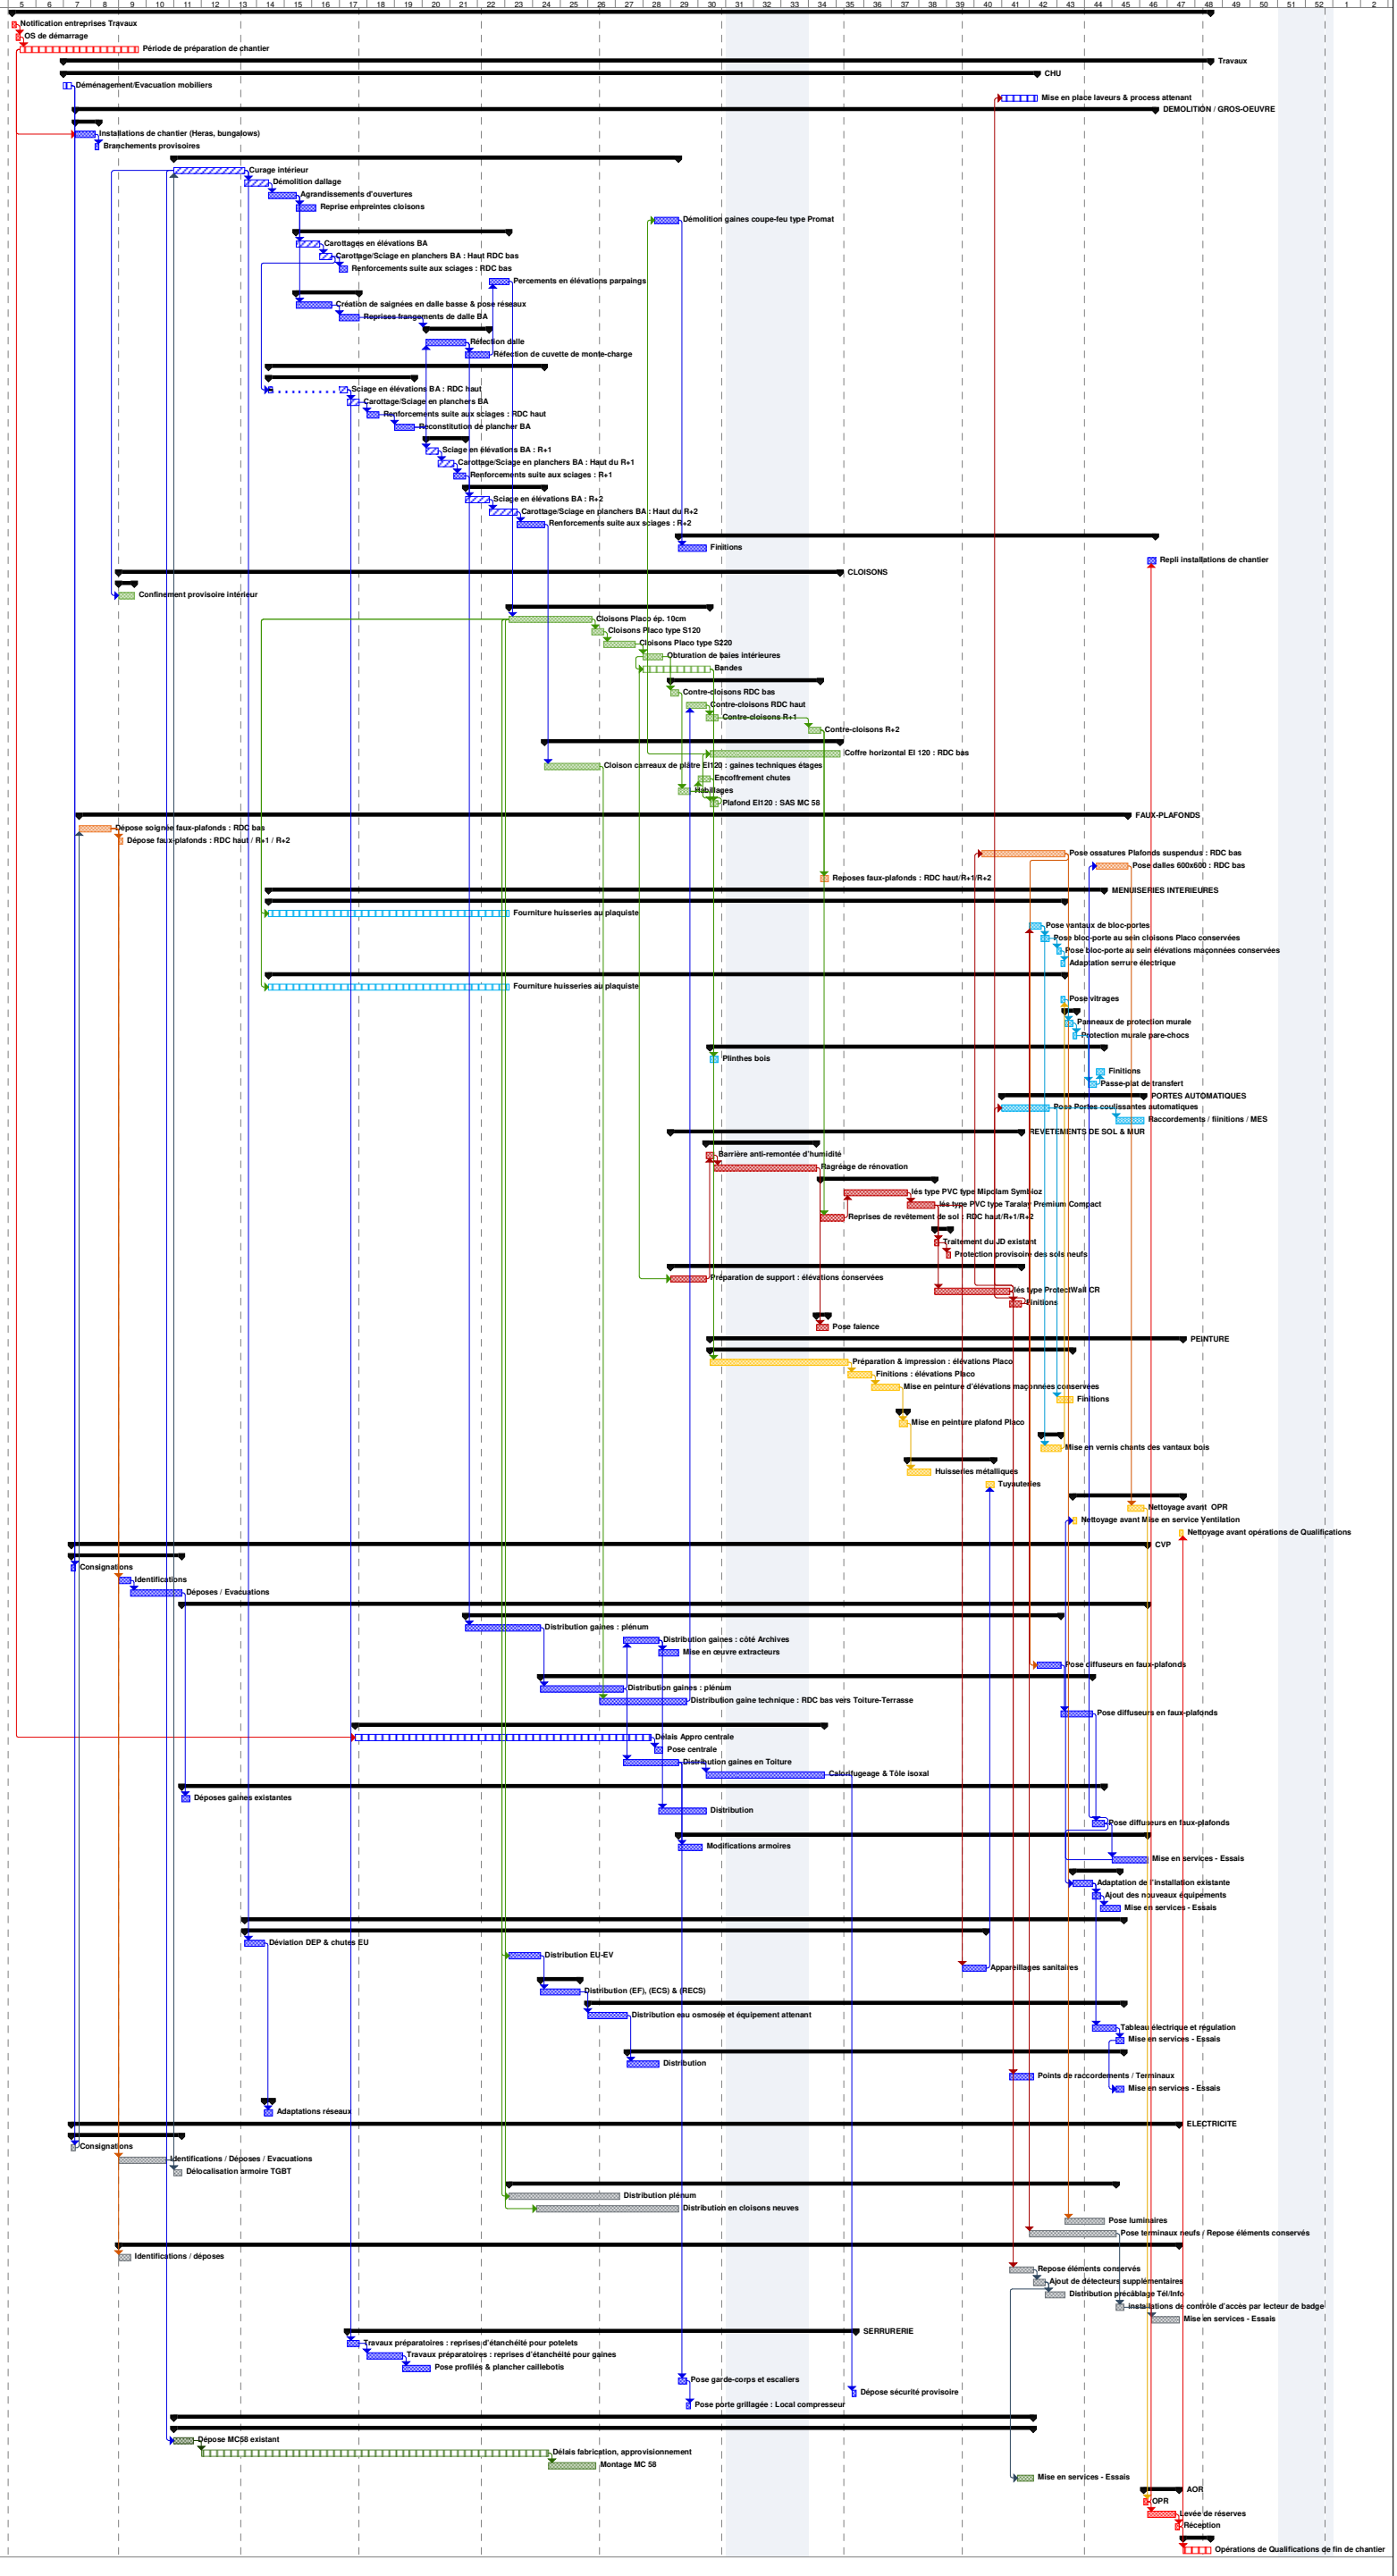

Hors intempéries & aléas de chantier

Réalisé par Pierre KERNINON
