
ARCHIVES ET MÉMOIRE DE WALLIS
Planning prévisionnel DCE - Ind 0

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
CONSULTATION	04/11/2026	09/02/2027	55
Publication AO	04/11/2026	04/11/2026	0
Délais de consultation	04/11/2026	15/12/2026	30
Réception des offres	16/12/2026	16/12/2026	0
Analyses des offres / Négociation	16/12/2026	09/02/2027	25
Notifications de marchés	10/02/2027	10/02/2027	0
PERIODE DE PREPARATION	24/02/2027	04/05/2027	43
Période de préparation	24/02/2027	04/05/2027	43
TRAVAUX	05/05/2027	28/02/2029	415
Installation de chantier	05/05/2027	27/05/2027	15
Hors d'eau / Hors d'air	14/04/2028	14/04/2028	0
LOT 02 // Terrassement – VRD	28/05/2027	14/02/2029	390
Terrassements	28/05/2027	24/06/2027	20
Réseaux Secs et Humides	25/06/2027	10/08/2027	30
Chaussée	25/01/2029	14/02/2029	15
LOT 01 // Fondation – Gros œuvre - Maçonnerie	25/06/2027	24/01/2029	355
Infrastructure	25/06/2027	21/09/2027	60
Superstructure	22/09/2027	13/01/2028	60
Divers ouvrages	11/01/2029	24/01/2029	10
Revetements de sols Archives	30/11/2028	10/01/2029	15
LOT 04 // Charpente – Couverture - Peinture	14/01/2028	16/03/2028	45
Charpente	14/01/2028	17/02/2028	25
Couvertures	18/02/2028	16/03/2028	20
LOT 06 // Electricité CFO-CFa	25/06/2027	10/10/2028	300
Réseaux sous dalle	25/06/2027	09/07/2027	10
Distributions	14/04/2028	08/06/2028	30
TGBT / VDI	09/06/2028	07/07/2028	20
Mise en service TGBT pour essais TCE	10/07/2028	10/07/2028	0
Appareillages	10/07/2028	31/07/2028	15
Luminaires	20/09/2028	10/10/2028	15
LOT 07 // Plomberie - sanitaires	25/06/2027	29/11/2028	330
Réseaux sous dalle	25/06/2027	09/07/2027	10
Distribution / Evacuations	11/10/2028	08/11/2028	15
Appareils sanitaires	09/11/2028	29/11/2028	15
LOT 08 // Menuiseries aluminium	17/03/2028	07/02/2029	200
Volets roulants	25/01/2029	07/02/2029	10
Blocs fenêtres	17/03/2028	30/03/2028	10
Blocs portes	31/03/2028	13/04/2028	10
Stores	07/12/2028	10/01/2029	10
LOT 13 // Installation photovoltaïque	14/04/2028	22/06/2028	40
Installation PV	14/04/2028	22/06/2028	40
LOT 12 // Climatisation – Ventilation – Traitement Air	14/04/2028	29/11/2028	145
Distributions	14/04/2028	22/06/2028	40
Climatisations	20/09/2028	31/10/2028	25
Ventilations	02/11/2028	29/11/2028	20
LOT 11 // Plâtrerie – cloison – faux plafond	23/06/2028	19/09/2028	60
Faux plafonds plaques de platre	23/06/2028	24/07/2028	20
Gaines techniques	25/07/2028	07/08/2028	10
Faux plafonds démontables	08/08/2028	19/09/2028	30
LOT 10 // Revêtements des sols et murs carrelages	25/07/2028	10/10/2028	55
Chapes	25/07/2028	22/08/2028	20
Revetements carrelages	23/08/2028	26/09/2028	25
Faiences	27/09/2028	10/10/2028	10
LOT 09 // Menuiseries bois – agencement	27/09/2028	10/01/2029	55
Blocs portes bois	27/09/2028	24/10/2028	15
Agencements / Signalétique	07/12/2028	10/01/2029	10
LOT 14 // Mobilier	11/01/2029	31/01/2029	15
Mobilier	11/01/2029	31/01/2029	15
LOT 05 // Peinture - Nettoyage	25/10/2028	28/02/2029	75
Peintures Intérieures	25/10/2028	06/12/2028	30
Peintures Extérieures	07/12/2028	24/01/2029	20
Nettoyage	15/02/2029	28/02/2029	10
MISE A BLANC ET ESSAIS	01/03/2029	30/05/2029	60
Mise à blanc et essais TCE	01/03/2029	30/05/2029	60
RECEPTION	31/05/2029	29/06/2029	22
OPR	31/05/2029	29/06/2029	22
Réception	02/07/2029	02/07/2029	0

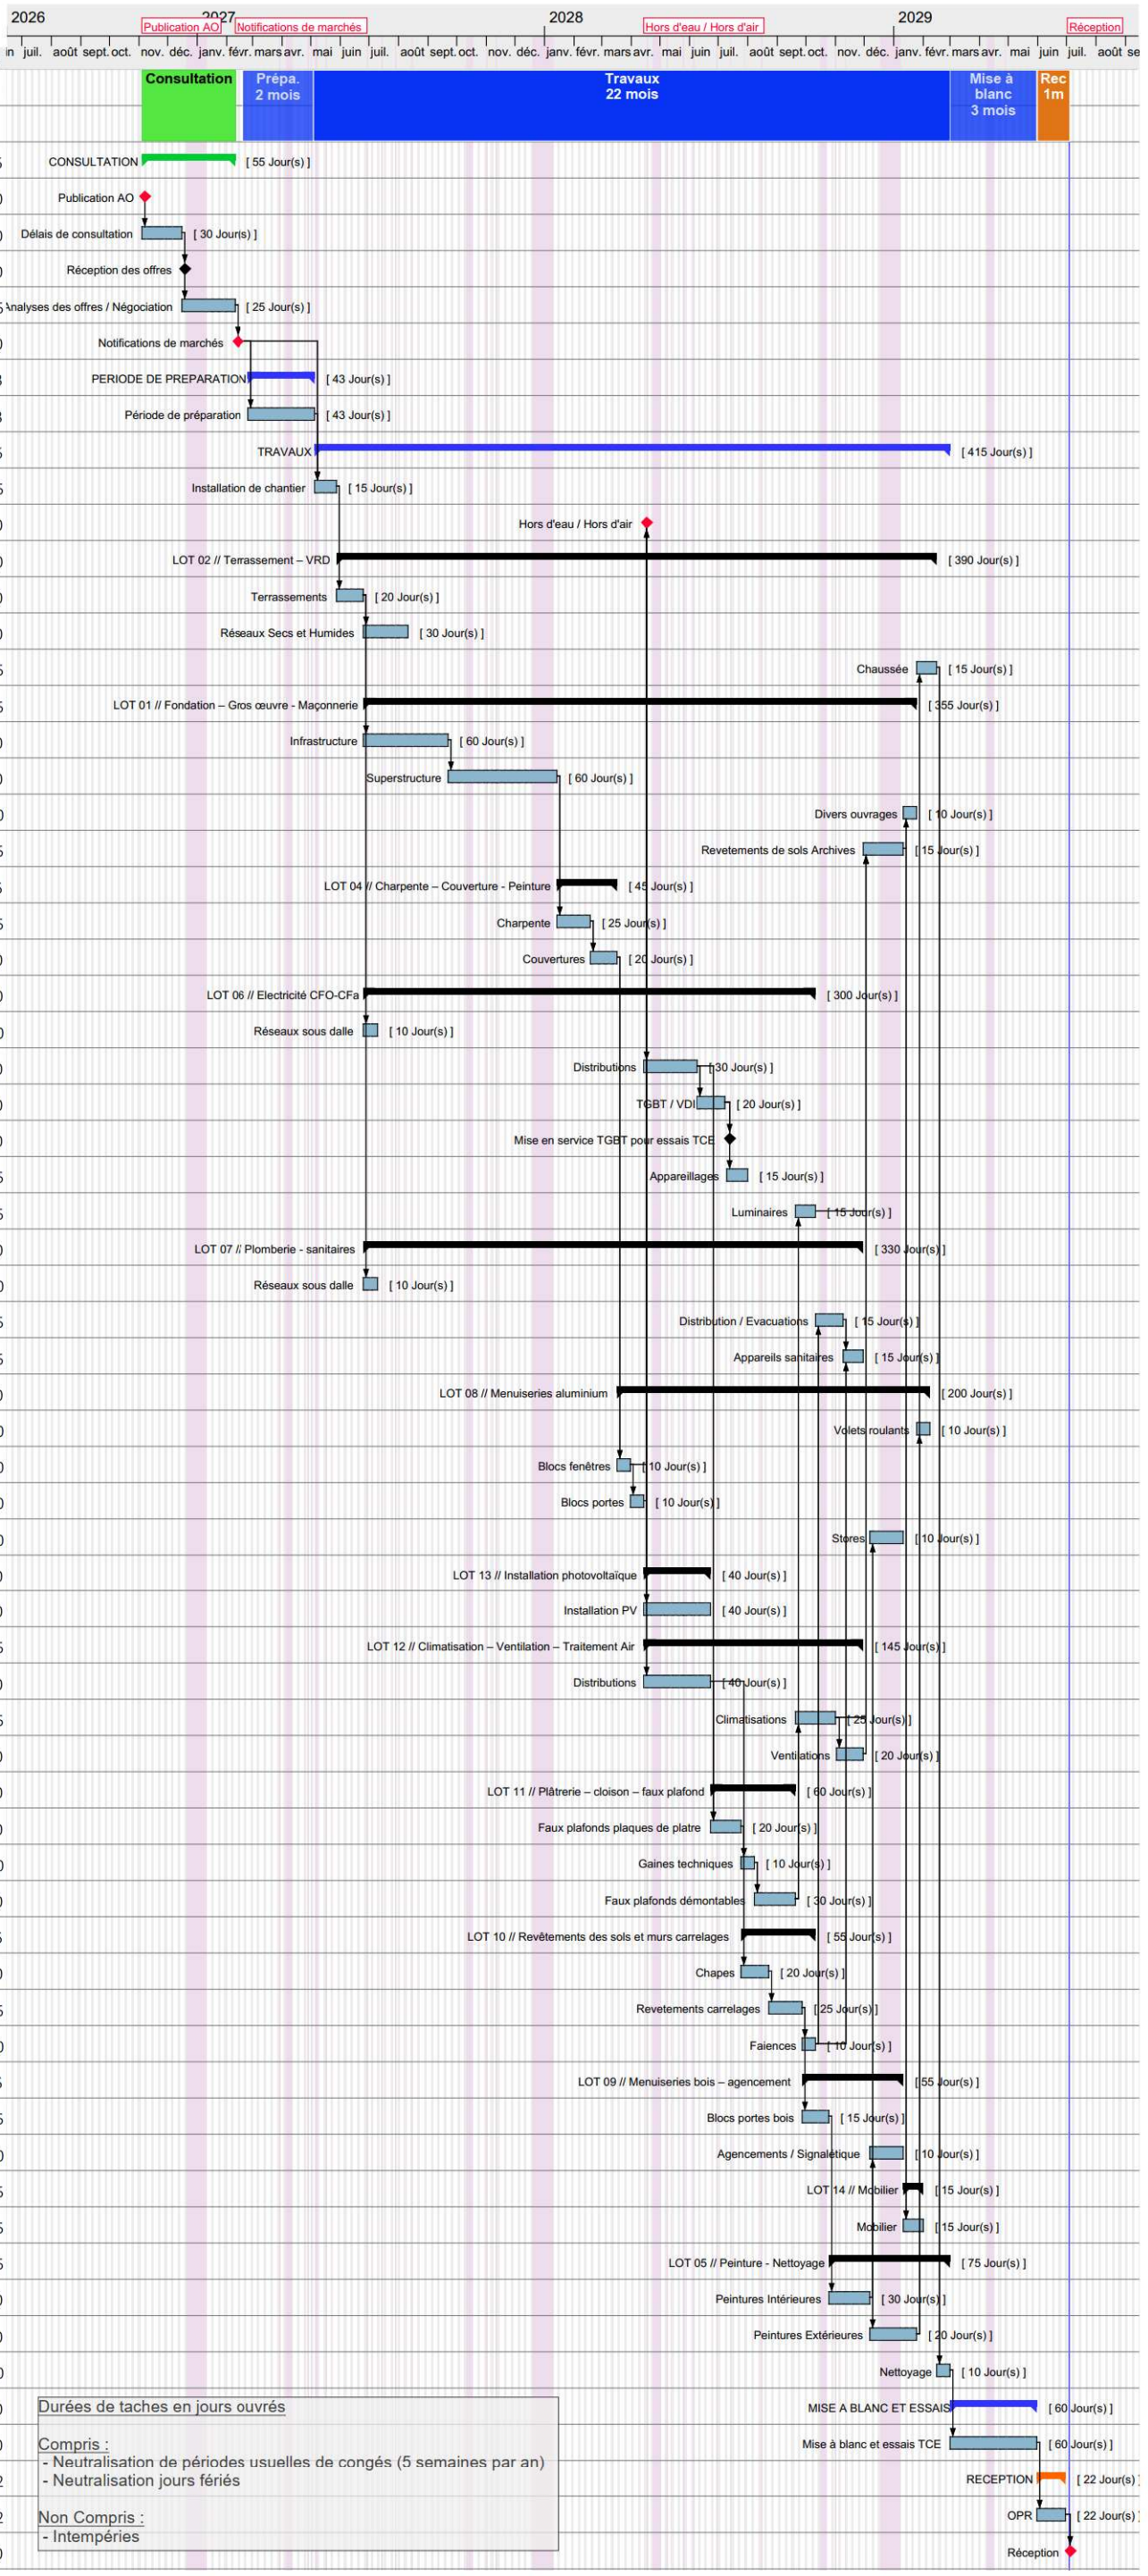

Durées de taches en jours ouvrés

Compris :
- Neutralisation de périodes usuelles de congés (5 semaines par an)
- Neutralisation jours fériés

Non Compris :
- Intempéries
