
CREATION D'UN GARAGE ERIS - DISP DIJON
PLANNING PREVISIONNEL DE TRAVAUX

Mar 20/10/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	OS de période de préparation	0 jr	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27
2	PHASE : PREPARATION DE CHANTIER	75 jrs	Lun 11/01/27	Lun 26/04/27
3	Réunion de lancement	1 jr	Lun 11/01/27	Lun 11/01/27
4	Etudes EXE	5 sem.	Lun 11/01/27	Ven 12/02/27
5	VISA et bon pour exécution du maître d'oeuvre + Avis du CTC	3 sem.	Lun 25/01/27	Ven 12/02/27
6	Délai de commandes et approvisionnements matériel après validation	12 sem.	Lun 01/02/27	Lun 26/04/27
7	OS de démarrage des travaux - Point d'arrêt	0 jr	Ven 12/02/27	Ven 12/02/27
8	PHASE : TRAVAUX EXE	118 jrs	Mar 12/01/27	Mer 30/06/27
9	LOT 01 : Terrassement - Gros oeuvre - VRD	118 jrs	Mar 12/01/27	Mer 30/06/27
10	DT - DICT	1 jr	Mar 12/01/27	Mar 12/01/27
11	Constat d'huissier et remise rapport	2 jrs	Mar 02/02/27	Lun 15/02/27
12	Localisation des réseaux enterrés et piquetage	1 jr	Lun 22/02/27	Lun 22/02/27
13	Installation de chantier	2 jrs	Mar 23/02/27	Mer 24/02/27
14	Dévoiement définitif des réseaux	2 jrs	Jeu 25/02/27	Ven 26/02/27
15	Eaux pluviales	2 jrs	Jeu 25/02/27	Ven 26/02/27
16	Réseaux télécom (si besoin)	2 jrs	Jeu 25/02/27	Ven 26/02/27
17	Fondations	10 jrs	Lun 01/03/27	Ven 12/03/27
18	Fouilles	3 jrs	Lun 01/03/27	Mer 03/03/27
19	Gros béton	2 jrs	Jeu 04/03/27	Ven 05/03/27
20	Semelles	5 jrs	Lun 08/03/27	Ven 12/03/27
21	Elévations	18 jrs	Lun 15/03/27	Jeu 08/04/27
22	Dépose partielle du bardage de la nouvelle extension	1 jr	Lun 15/03/27	Lun 15/03/27
23	Murs à coffrage intégrés	8 jrs	Lun 15/03/27	Mer 24/03/27
24	Imperméabilisation des voiles enterrés et protection par nappe géocomposite	2 jrs	Lun 05/04/27	Mar 06/04/27
25	Drainage périphérique	2 jrs	Mer 07/04/27	Jeu 08/04/27
26	Réseaux extérieurs	4 jrs	Jeu 08/04/27	Mar 13/04/27
27	Démolition enrobés et fouilles	1 jr	Jeu 08/04/27	Jeu 08/04/27
28	Réseaux EP et EU yc séparateur à hydrocarbures et regards	1 jr	Ven 09/04/27	Ven 09/04/27
29	Raccordement sur existant	1 jr	Lun 12/04/27	Lun 12/04/27
30	Remblaiement	1 jr	Mar 13/04/27	Mar 13/04/27
31	Plancher bas	66 jrs	Jeu 25/03/27	Mer 30/06/27
32	Circuit de terre	1 jr	Jeu 25/03/27	Jeu 25/03/27
33	Réseaux humides (EP, EU, AEP) yc regards et caniveaux et siphon de sol	2 jrs	Jeu 25/03/27	Ven 26/03/27
34	Plateforme sous dallage	4 jrs	Mar 30/03/27	Ven 02/04/27
35	Bordures T2	1 jr	Mar 11/05/27	Mar 11/05/27
36	Réglage sous dallage	1 jr	Mer 12/05/27	Mer 12/05/27
37	Isolation sous dallage	1 jr	Jeu 13/05/27	Jeu 13/05/27
38	Dallage sur terre-plein (voirie) yc seuils portes sectionnelles	1 jr	Ven 14/05/27	Ven 14/05/27
39	Dallage sur terre-plein (trottoir, sas et circulation) yc seuils portes piétons, palier et receveur robinet de puisage	2 jrs	Mar 18/05/27	Mer 19/05/27

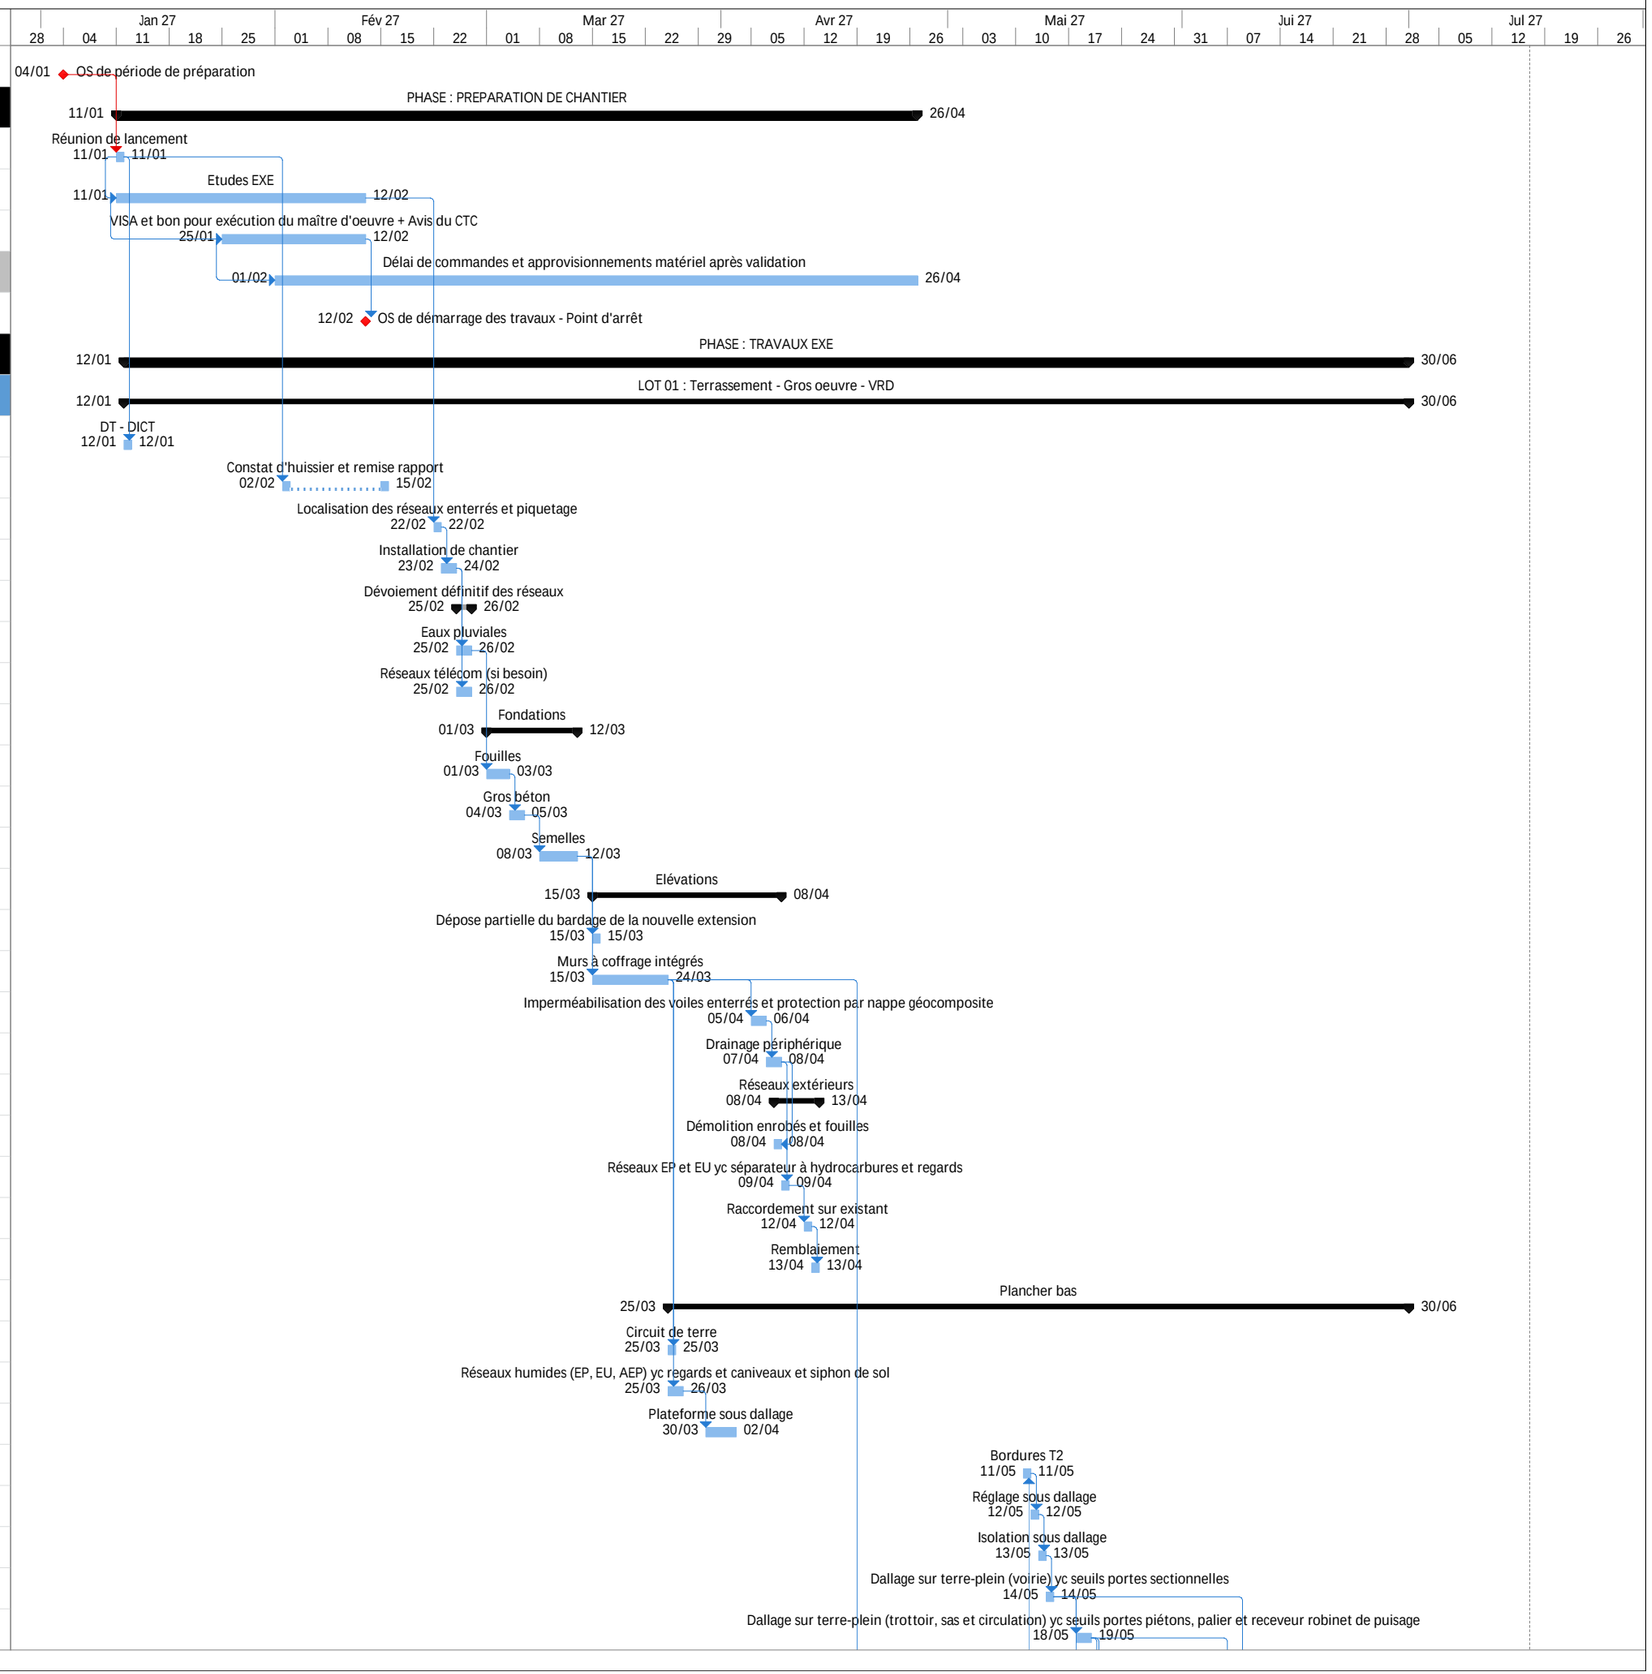

PMM SYNERGIES & SOLUTIONS

CREATION D'UN GARAGE ERIS - DISP DIJON
PLANNING PREVISIONNEL DE TRAVAUX

Mar 20/10/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
40	Robinet de puisage	1 jr	Ven 28/05/27	Ven 28/05/27
41	Résine de sol	1 jr	Ven 25/06/27	Ven 25/06/27
42	Peinture au sol	2 jrs	Lun 28/06/27	Mar 29/06/27
43	Bute-roues	1 jr	Mer 30/06/27	Mer 30/06/27
44	Aménagements extérieurs	30 jrs	Jeu 20/05/27	Mer 30/06/27
45	Lasure	2 jrs	Jeu 20/05/27	Ven 21/05/27
46	Protection contre graffitis	1 jr	Lun 24/05/27	Lun 24/05/27
47	Bordures T2	1 jr	Mar 25/05/27	Mar 25/05/27
48	Réfection de voiries enrobés	1 jr	Mer 26/05/27	Mer 26/05/27
49	Revêtement graviers	1 jr	Jeu 27/05/27	Jeu 27/05/27
50	Panneau de signalisation	1 jr	Jeu 27/05/27	Jeu 27/05/27
51	Marquage au sol	1 jr	Mer 30/06/27	Mer 30/06/27
52	LOT 02 : Charpente bois - couverture métallique	16 jrs	Lun 19/04/27	Mer 12/05/27
53	Pose charpente bois : poutres, contreventements, pannes et chevêtres	10 jrs	Lun 19/04/27	Ven 30/04/27
54	Couvertures en panneaux sandwichs yc caniveaux	3 jrs	Lun 03/05/27	Mer 05/05/27
55	Lanterneaux	1 jr	Lun 10/05/27	Lun 10/05/27
56	Descentes d'eaux pluviales...	2 jrs	Lun 10/05/27	Mar 11/05/27
57	Couvertines	1 jr	Lun 10/05/27	Lun 10/05/27
58	Garde-corps, échelle et portillon	2 jrs	Mar 11/05/27	Mer 12/05/27
59	LOT 03 : Portes sectionnelles - Serrurerie	17 jrs	Mar 18/05/27	Mer 09/06/27
60	Blocs-portes issue de secours et sas	1 jr	Ven 21/05/27	Ven 21/05/27
61	Portes sectionnelles	1 jr	Mer 09/06/27	Mer 09/06/27
62	Racks de stockage avec grilles de fermeture et boite à clés	1 jr	Mar 18/05/27	Mar 18/05/27
63	LOT 3 : Electricité - Ventilation - Désenfumage	14 jrs	Lun 07/06/27	Jeu 24/06/27
64	Liaisons équipotentielles et mise à la terre	1 jr	Lun 07/06/27	Lun 07/06/27
65	Distribution électrique et branchement sur TGBT existant	10 jrs	Lun 07/06/27	Ven 18/06/27
66	Appareillages : prise courant, interrupteur, détecteur	1 jr	Lun 21/06/27	Lun 21/06/27
67	Eclairage standard et de sécurité	1 jr	Lun 21/06/27	Lun 21/06/27
68	Dispositif lumineux entrée et sortie des véhicules	1 jr	Mar 22/06/27	Mar 22/06/27
69	Borne de recharge	1 jr	Mar 22/06/27	Mar 22/06/27
70	Ventilation et désenfumage	1 jr	Mer 23/06/27	Mer 23/06/27
71	Aérothermes	1 jr	Mer 23/06/27	Mer 23/06/27
72	Vidéosurveillance	1 jr	Jeu 24/06/27	Jeu 24/06/27
73	Système de sécurité incendie : modification centrale existante, DAF, DM...	2 jrs	Lun 21/06/27	Mar 22/06/27
74	RECEPTION DES TRAVAUX	11 jrs	Jeu 01/07/27	Ven 16/07/27
75	OPR	1 jr	Jeu 01/07/27	Jeu 01/07/27
76	Levée des réserves	10 jrs	Ven 02/07/27	Ven 16/07/27
77	Réception des travaux	0 jr	Ven 16/07/27	Ven 16/07/27
78	Livraison	0 jr	Ven 16/07/27	Ven 16/07/27

