1 PHASE 3 : Travaux d'enveloppe du bâtiment D1 et réaménagement du R+1 et R+2

Planning prévisionnel des travaux

PHASE PRO/DCE Indice E' du 21/10/2026

N°	[LOT]	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
169		**ETUDES**	**165 jrs**	**19/06/26**	**16/03/27**
183		**A3 - LOT CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE - ETANCHEITE**	**131 jrs**	**19/06/26**	**27/01/27**
189	A03	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
190	**A3**	**Etudes EXE**	**30 jrs**	**28/10/26**	**09/12/26**
201	A03	Validation des échantillons	0 jr	10/11/26	10/11/26
202	A03	Commande charpente	0 jr	02/12/26	02/12/26
203	A03	Approvisionnement charpente	8 semain	02/12/26	27/01/27
204		**A4 - LOT GROS ŒUVRE - DECONSTRUCTION**	**87 jrs**	**03/07/26**	**26/11/26**
209	A04	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
210	A04	Etudes EXE	1 m	29/10/26	26/11/26
211	A04	Validation échantillons	0 jr	19/11/26	19/11/26
212		**A5 - LOT FACADES - DEPOSE ENDUIT - ITE**	**86 jrs**	**03/07/26**	**25/11/26**
217	A05	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
218	A05	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
219	A05	Validation échantillons	0 jr	18/11/26	18/11/26
220	A05	Validation prototype (enduit)	0 jr	18/11/26	18/11/26
221		**A6 - LOT MENUISERIES EXTERIEURES - BSO MOTORISE**	**158 jrs**	**26/06/26**	**12/03/27**
226	A06	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
227	A06	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
228	A06	Validation échantillons	0 jr	18/11/26	18/11/26
229	A05	Validation prototype	0 jr	18/11/26	18/11/26
230	A06	Premières prises de cotes	0 jr	15/01/27	15/01/27
231	A06	Approvisionnement / fabrication	8 sem.	18/01/27	12/03/27
232	A06	Démarrage pose	0 jr	12/03/27	12/03/27
233		**A7 - LOT SERURERIE**	**116 jrs**	**19/06/26**	**06/01/27**
238	A07	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
239	A07	Etudes EXE / appro	8 sem.	28/10/26	06/01/27
240	A07	Validation échantillons	0 jr	16/12/26	16/12/26
241	A07	Validation prototype (brise soleil fixe)	0 jr	16/12/26	16/12/26
242		**A8 - LOT CLOISONS / DOUBLAGES**	**96 jrs**	**19/06/26**	**25/11/26**
247	A08	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
248	A08	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
249	A08	Validation échantillons	0 jr	18/11/26	18/11/26
250		**A9 - LOT CLOISONS MODULAIRES - FAUX PLAFONDS**	**91 jrs**	**26/06/26**	**25/11/26**
255	A09	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
256	A09	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
257	A09	Validation échantillons	0 jr	18/11/26	18/11/26
258		**A10 - LOT MENUISERIES INTERIEURES BOIS**	**91 jrs**	**26/06/26**	**25/11/26**
263	A10	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
264	A10	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
265	A10	Validation échantillons	0 jr	18/11/26	18/11/26
266		**A11 - LOT CARRELAGES**	**91 jrs**	**26/06/26**	**25/11/26**
271	A11	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
272	A11	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
273	A11	Validations échantillons	0 jr	25/11/26	25/11/26
274		**A12 - LOT SOLS SOUPLES**	**91 jrs**	**26/06/26**	**25/11/26**
279	A12	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
280	A12	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
281	A12	Validation échantillons	0 jr	18/11/26	18/11/26
282		**A13 - LOT PEINTURES**	**91 jrs**	**26/06/26**	**25/11/26**
287	A13	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
288	A13	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
289	A13	Validation échantillons	0 jr	18/11/26	18/11/26
290		**A14 - LOT CVC**	**91 jrs**	**26/06/26**	**25/11/26**
295	A14	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
296	A14	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
297	A14	Validation échantillons	0 jr	18/11/26	18/11/26
298		**A15 - LOT PLOMBERIE SANITAIRES**	**91 jrs**	**26/06/26**	**25/11/26**
303	A15	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26




2 PHASE 3 : Travaux d'enveloppe du bâtiment D1 et réaménagement du R+1 et R+2

Planning prévisionnel des travaux

PHASE PRO/DCE Indice E' du 21/10/2026

N°	[LOT]	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
304	A15	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
305	A15	Validation échantillons	0 jr	18/11/26	18/11/26
306		**A16 - LOT CFO / CFA**	**91 jrs**	**26/06/26**	**25/11/26**
311	A16	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
312	A16	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
313	A16	Validation échantillons	0 jr	18/11/26	18/11/26
314		**A17 - LOT VRD**	**91 jrs**	**26/06/26**	**25/11/26**
319	A17	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
320	A17	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
321		**A18 - LOT PORTES INDUSTRIELLES**	**91 jrs**	**26/06/26**	**25/11/26**
326	A18	Réunion de lancement	0 jr	28/10/26	28/10/26
327	A18	Etudes EXE	1 m	28/10/26	25/11/26
328	A18	Validation échantillons	0 jr	18/11/26	18/11/26
329		**B7 - LOT SERURERIE (R+1)**	**95 jrs**	**14/09/26**	**08/02/27**
331	B07	Envoi DCE	0 jr	02/11/26	02/11/26
332	B07	Réception des offres	0 jr	07/12/26	07/12/26
333	B07	Passation marché	0 jr	15/12/26	15/12/26
334	B07	Réunion de lancement	0 jr	11/01/27	11/01/27
335	B07	Etudes EXE	1 m	12/01/27	08/02/27
336	B07	Validation échantillons	0 jr	02/02/27	02/02/27
337	B07	Validation prototype	0 jr	02/02/27	02/02/27
338		**B8 - LOT CLOISONS / DOUBLAGES (R+1)**	**95 jrs**	**14/09/26**	**08/02/27**
340	A08	Envoi DCE	0 jr	02/11/26	02/11/26
341	A08	Réception des offres	0 jr	07/12/26	07/12/26
342	A08	Passation marché	0 jr	15/12/26	15/12/26
343	A08	Réunion de lancement	0 jr	11/01/27	11/01/27
344	A08	Etudes EXE	1 m	12/01/27	08/02/27
345	A08	Validation échantillons	0 jr	02/02/27	02/02/27
346		**B9 - LOT CLOISONS MODULAIRES - FAUX PLAFONDS (R+1)**	**95 jrs**	**14/09/26**	**08/02/27**
348	B09	Envoi DCE	0 jr	02/11/26	02/11/26
349	B09	Réception des offres	0 jr	07/12/26	07/12/26
350	B09	Passation marché	0 jr	15/12/26	15/12/26
351	B09	Réunion de lancement	0 jr	11/01/27	11/01/27
352	B09	Etudes EXE	1 m	12/01/27	08/02/27
353	B09	Validation échantillons	0 jr	02/02/27	02/02/27
354		**B10 - LOT MENUISERIES INTERIEURES BOIS (R+1)**	**95 jrs**	**14/09/26**	**08/02/27**
356	B10	Envoi DCE	0 jr	02/11/26	02/11/26
357	B10	Réception des offres	0 jr	07/12/26	07/12/26
358	B10	Passation marché	0 jr	15/12/26	15/12/26
359	B10	Réunion de lancement	0 jr	11/01/27	11/01/27
360	B10	Etudes EXE	1 m	12/01/27	08/02/27
361	B10	Validation échantillons	0 jr	02/02/27	02/02/27
362		**B11- LOT CARRELAGES (R+1)**	**95 jrs**	**14/09/26**	**08/02/27**
364	B11	Envoi DCE	0 jr	02/11/26	02/11/26
365	B11	Réception des offres	0 jr	30/11/26	30/11/26
366	B11	Passation marché	0 jr	15/12/26	15/12/26
367	B11	Réunion de lancement	0 jr	11/01/27	11/01/27
368	B11	Etudes EXE	1 m	12/01/27	08/02/27
369		**B12 - LOT SOLS SOUPLES (R+1)**	**95 jrs**	**14/09/26**	**08/02/27**
371	B12	Envoi DCE	0 jr	02/11/26	02/11/26
372	B12	Réception des offres	0 jr	30/11/26	30/11/26
373	B12	Passation marché	0 jr	15/12/26	15/12/26
374	B12	Réunion de lancement	0 jr	11/01/27	11/01/27
375	B12	Etudes EXE	1 m	12/01/27	08/02/27
376	B12	Validation échantillons	0 jr	02/02/27	02/02/27
377		**B13 - LOT PEINTURES (R+1)**	**95 jrs**	**14/09/26**	**08/02/27**
379	B13	Envoi DCE	0 jr	02/11/26	02/11/26
380	B13	Réception des offres	0 jr	07/12/26	07/12/26
381	B13	Passation marché	0 jr	15/12/26	15/12/26

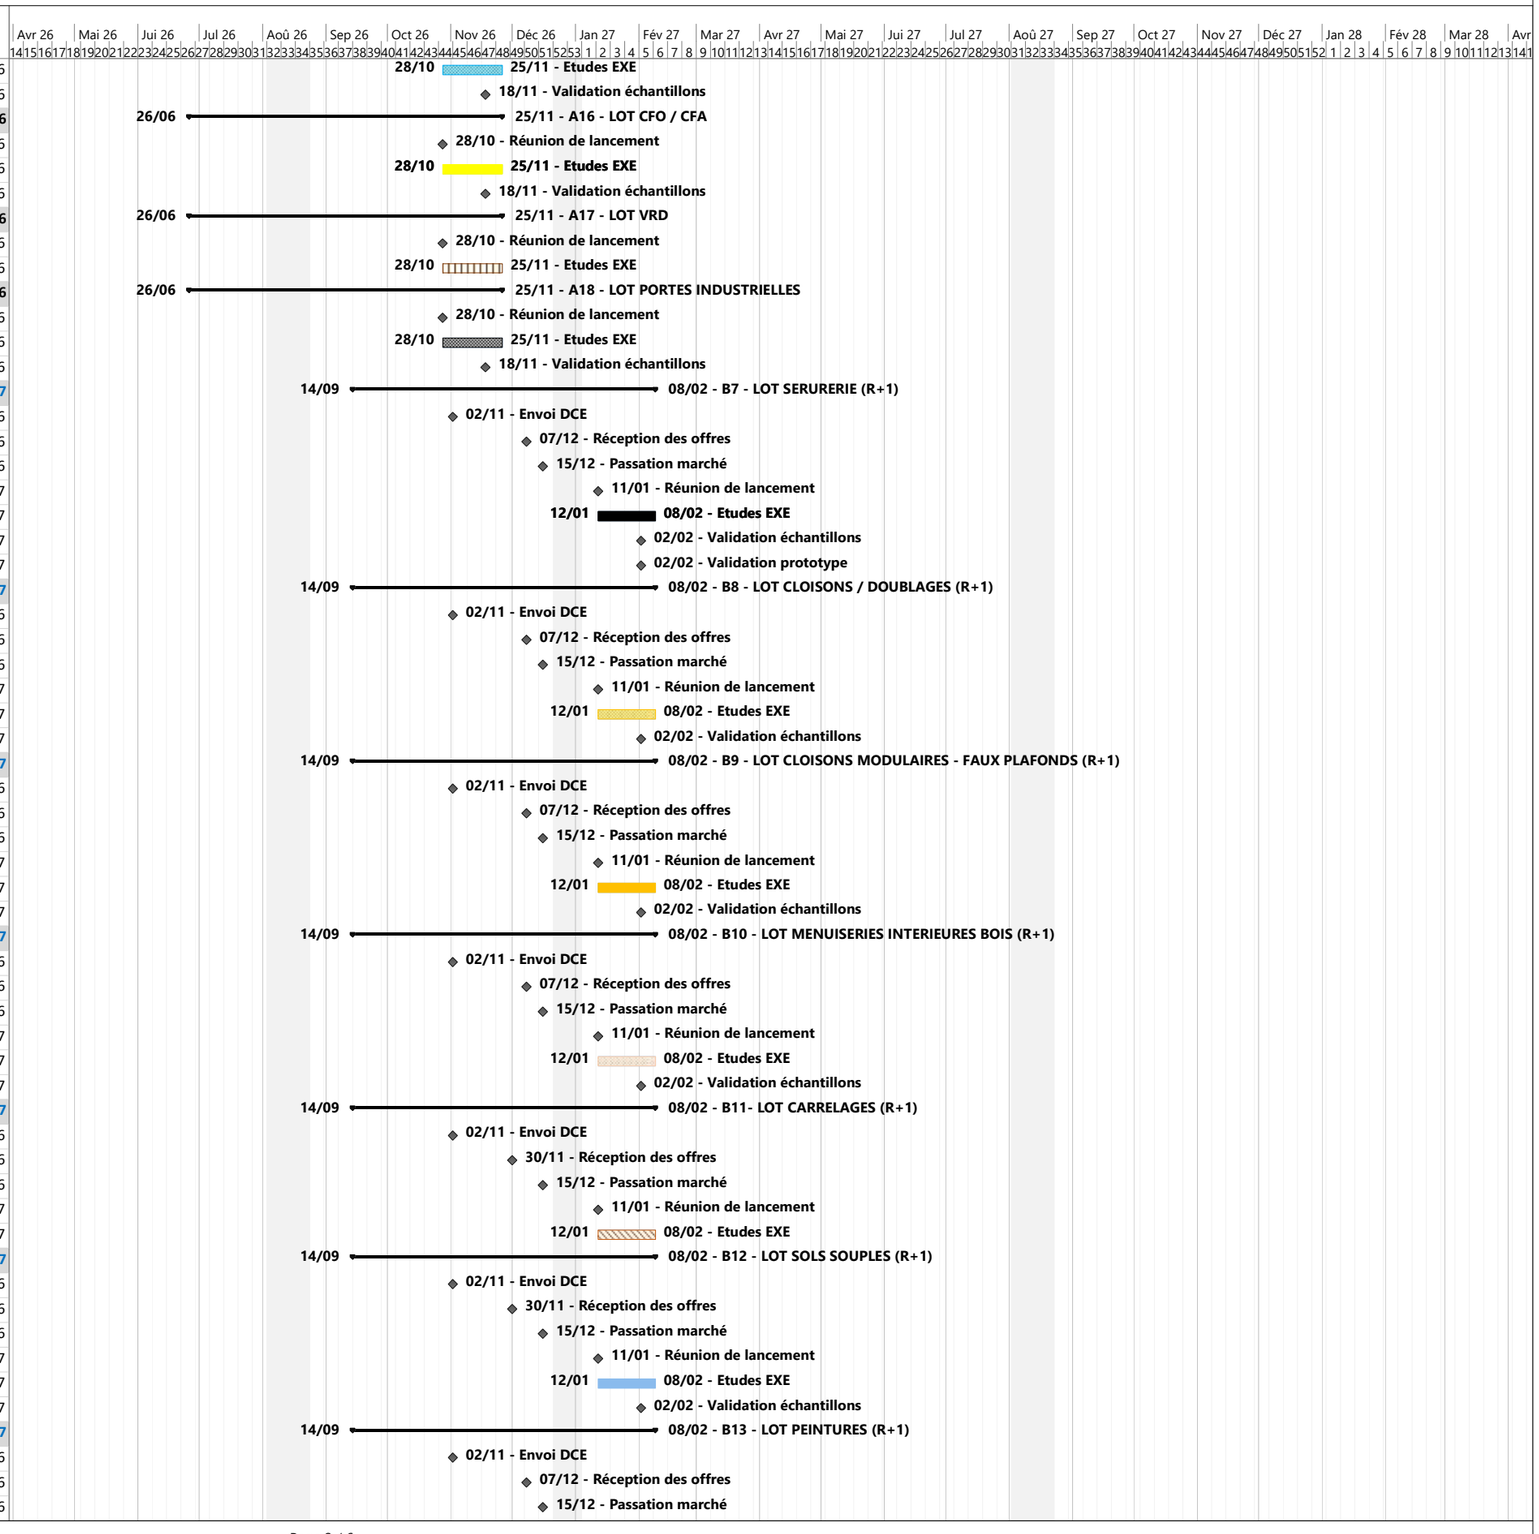


3 PHASE 3 : Travaux d'enveloppe du bâtiment D1 et réaménagement du R+1 et R+2

Planning prévisionnel des travaux

PHASE PRO/DCE Indice E' du 21/10/2026

N°	[LOT]	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
382	B13	Réunion de lancement	0 jr	11/01/27	11/01/27
383	B13	Etudes EXE	1 m	12/01/27	08/02/27
384	B13	Validation échantillons	0 jr	02/02/27	02/02/27
385		**B14 - LOT CVC (R+1)**	**121 jrs**	**14/09/26**	**16/03/27**
387	B14	Envoi DCE	0 jr	02/11/26	02/11/26
388	B14	Réception des offres	0 jr	07/12/26	07/12/26
389	B14	Passation marché	0 jr	10/02/27	10/02/27
390	B14	Réunion de lancement	0 jr	16/02/27	16/02/27
391	B14	Etudes EXE	1 m	17/02/27	16/03/27
392	B14	Validation échantillons	0 jr	10/03/27	10/03/27
393		**B15 - LOT PLOMBERIE SANITAIRES (R+1)**	**95 jrs**	**14/09/26**	**08/02/27**
395	B15	Envoi DCE	0 jr	02/11/26	02/11/26
396	B15	Réception des offres	0 jr	07/12/26	07/12/26
397	B15	Passation marché	0 jr	15/12/26	15/12/26
398	B15	Réunion de lancement	0 jr	11/01/27	11/01/27
399	B15	Etudes EXE	1 m	12/01/27	08/02/27
400	B15	Validation échantillons	0 jr	02/02/27	02/02/27
401		**B16 - LOT CFO / CFA (R+1)**	**121 jrs**	**14/09/26**	**16/03/27**
403	B16	Envoi DCE	0 jr	02/11/26	02/11/26
404	B16	Réception des offres	0 jr	07/12/26	07/12/26
405	B16	Passation marché	0 jr	10/02/27	10/02/27
406	B16	Réunion de lancement	0 jr	16/02/27	16/02/27
407	B16	Etudes EXE	1 m	17/02/27	16/03/27
408	B16	Validation échantillons	0 jr	10/03/27	10/03/27
409		**TRAVAUX**	**727 jrs?**	**02/10/24**	**21/10/27**
410		**TOITURE et DESAMIANTAGE R+2**	**232 jrs**	**03/08/26**	**24/08/27**
411		**Echafaudage en façade principale**	**227 jrs**	**31/08/26**	**24/08/27**
412	A01	Démarrage pose échafaudage	0 jr	31/08/26	31/08/26
413	A01	Pose échafaudage	3 sem.	31/08/26	18/09/26
414	A01	Dépose échafaudage	2 sem.	21/07/27	24/08/27
415		**Echafaudage parapluie**	**137 jrs**	**14/09/26**	**08/04/27**
416	A01	Pose parapluie	5 sem.	14/09/26	16/10/26
417	A01	Dépose parapluie	2 sem.	25/03/27	08/04/27
418		Mesures initiales amiante	1 sem.	03/08/26	07/08/26
419	A00	Confortement de façade	1 sem.	24/08/26	28/08/26
421	A02	Installation et mise en place du confinement	1 sem.	21/09/26	25/09/26
422	A02	Réalisation du test fumée	0 jr	25/09/26	25/09/26
423	A02	Enlèvement des polyanes au plafond et coupe des têtes de murs	1 sem.	28/09/26	02/10/26
424	A02	curage vert des cloisons.	2 sem.	12/10/26	23/10/26
425	A00	Réalisation des renforcements supplémentaires	1 sem.	28/09/26	02/10/26
426	A02	Déconstruction de la toiture, des poutres en bois, de la noue et des poutres en béton.	34 jrs	26/10/26	11/12/26
427	A02	Essais et repli	1 sem.	07/12/26	11/12/26
429	A03	Pose nouvelle charpente et bac acier	8 sem.	28/01/27	24/03/27
430		**FACADES**	**707 jrs**	**02/10/24**	**23/09/27**
431	A06	Prise de côte RDC	0 jr	02/10/24	02/10/24
432	A04	Dépose menuiseries (DIAG plomb)	3 sem.	30/11/26	18/12/26
433		**Façade principale - première moitié de bâtiment**	**70 jrs**	**07/12/26**	**26/03/27**
434	A04	Démolition / maçonnerie R+2	2 sem.	04/01/27	15/01/27
435	A06	Prise de cotes / lancement fabrication menuiseries R+2	0 sem.	15/01/27	15/01/27
436	A06	Pose des menuiseries R+2	2 sem.	15/03/27	26/03/27
437	A04	Démolition / maçonnerie R+1	2 sem.	07/12/26	18/12/26
438	A06	Prise de cotes / lancement fabrication menuiseries R+1	0 sem.	18/12/26	18/12/26
439	A06	Pose des menuiseries R+1	2 sem.	01/03/27	12/03/27
440	A04	Démolition / maçonnerie RDC (site occupé)	2 sem.	15/02/27	26/02/27
441	A06	Pose des menuiseries RDC (site occupé)	2 sem.	01/03/27	12/03/27
442		**Façade principale - deuxième moitié de bâtiment**	**128 jrs**	**18/01/27**	**20/07/27**
443	A04	Démolition / maçonnerie R+2	2 sem.	18/01/27	29/01/27
444	A06	Pose des menuiseries R+2	2 sem.	30/03/27	12/04/27

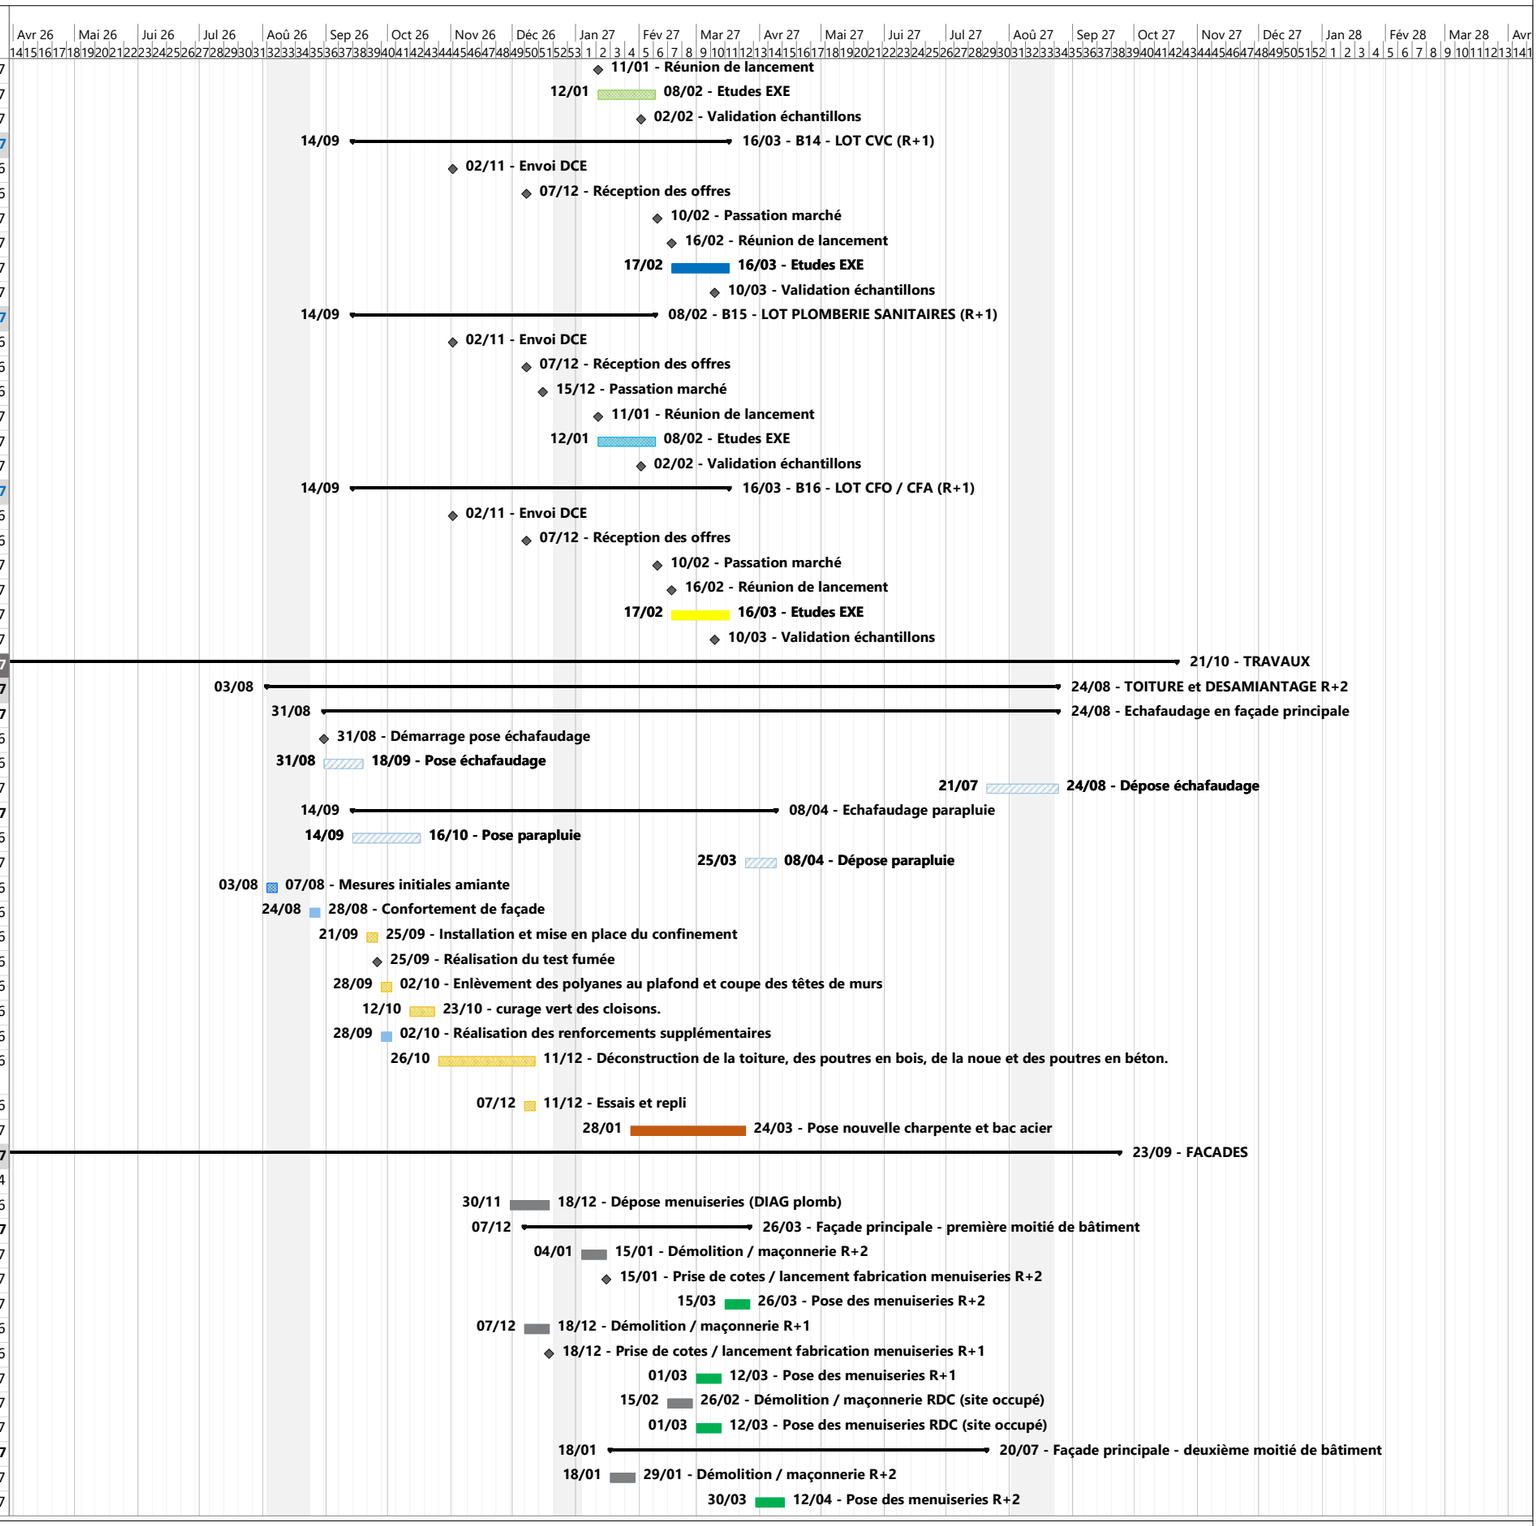


4 PHASE 3 : Travaux d'enveloppe du bâtiment D1 et réaménagement du R+1 et R+2

Planning prévisionnel des travaux

PHASE PRO/DCE Indice E' du 21/10/2026

N°	[LOT]	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
445		Hors d'air R+2	0 jr	12/04/27	12/04/27
446	A04	Démolition / maçonnerie R+1	2 sem.	01/02/27	12/02/27
447	A06	Pose des menuiseries R+1	2 sem.	12/04/27	23/04/27
448		Hors d'air R+1	0 jr	23/04/27	23/04/27
449	A04	Démolition / maçonnerie RDC (site occupé)	2 sem.	01/03/27	12/03/27
450	A06	Pose des menuiseries RDC (site occupé)	2 sem.	15/03/27	26/03/27
451		Fin charpente	0 jr	24/03/27	24/03/27
452	A05	Isolation par l'extérieur et finitions	4 m	25/03/27	20/07/27
453	A01	Fin besoin échafaudage en façade	0 jr	20/07/27	20/07/27
454		**Zone recette a matériaux**	**249 jrs**	**31/08/26**	**23/09/27**
456	A01	Démontage recette a matériaux	2 jrs	21/07/27	22/07/27
457	A04	Reprise gros oeuvre	1 sem.	23/07/27	29/07/27
458	A06	Pose des menuiseries R+1 et R+2	1 sem.	30/07/27	26/08/27
459	A05	Isolation par l'extérieur et finitions	2 sem.	27/08/27	09/09/27
460	A17	Travaux VRD et raccordement EP	2 sem.	10/09/27	23/09/27
461	A05	Finitions ITE pied de façade	2 sem.	10/09/27	23/09/27
462		**Façade nord ouest**	**18,5 jrs**	**11/01/27**	**04/02/27**
463	A02	Dépose complète	1,5 jrs	11/01/27	12/01/27
464	A02	Perçage précadre	0,5 jr	12/01/27	12/01/27
465	A18	Portes empilables	2,5 jrs	12/01/27	14/01/27
466	A03	Remplacement auvent	1 sem.	14/01/27	21/01/27
467	A05	Isolation par l'extérieur	2 sem.	21/01/27	04/02/27
468		**Façade côté Chartreuse**	**18,5 jrs**	**12/01/27**	**05/02/27**
469	A02	Dépose complète	1,5 jrs	12/01/27	13/01/27
470	A02	Perçage précadre	0,5 jr	13/01/27	13/01/27
471	A18	Portes empilables	2,5 jrs	13/01/27	15/01/27
472	A03	Remplacement auvent	1 sem.	18/01/27	22/01/27
473	A05	Isolation par l'extérieur	2 sem.	25/01/27	05/02/27
474		**Façade côté Vercors**	**18,5 jrs**	**14/01/27**	**09/02/27**
475	A02	Dépose complète	1,5 jrs	14/01/27	15/01/27
476	A02	Perçage précadre	0,5 jr	15/01/27	15/01/27
477	A18	Portes empilables	2,5 jrs	15/01/27	19/01/27
478	A03	Remplacement auvent	1 sem.	19/01/27	26/01/27
479	A05	Isolation par l'extérieur	2 sem.	26/01/27	09/02/27
480		**TRAVAUX INTERIEURS - R+2**	**117 jrs**	**11/03/27**	**16/09/27**
481		Fin charpente	0 jr	24/03/27	24/03/27
482	A14	Réseaux CVC	1 m	11/03/27	08/04/27
483	A16	Chemins de câbles et distributions électriques	1 m	11/03/27	08/04/27
484	A15	Réseaux plomberie	1 m	11/03/27	08/04/27
485		**Bureaux (yc circulations)**	**68 jrs**	**12/04/27**	**20/07/27**
486		Hors d'air R+2	0 jr	12/04/27	12/04/27
487	A08	Flocage sous cheneau métallique	3 jrs	13/04/27	15/04/27
488	A08	Cloisons/doublages et joues en tête de cloisons mobiles	2 sem.	16/04/27	29/04/27
489	A08	Cloisons sur halle	1 sem.	30/04/27	07/05/27
490	A14	Incorporations / passage de réseaux en cloisons	2 sem.	16/04/27	29/04/27
491	A16	Incorporations / passage de réseaux en cloisons	2 sem.	16/04/27	29/04/27
492	A15	Incorporations / passage de réseaux en cloisons	2 sem.	16/04/27	29/04/27
493	A10	Pose des plinthes	1 sem.	23/04/27	29/04/27
494	A13	Prépa peinture	2 sem.	30/04/27	14/05/27
495	A08	Pose des ossatures de faux plafonds	2 sem.	10/05/27	24/05/27
496	A10	Pose des plafonds en lames stratifiées	2 sem.	10/05/27	24/05/27
497	A14	Appareillages	2 sem.	18/05/27	31/05/27
498	A16	Appareillages	2 sem.	18/05/27	31/05/27
499	A12	Ragréages et pose des sols souples	2 sem.	01/06/27	14/06/27
500	A09	Pose des cloisons modulaires	3 sem.	15/06/27	05/07/27
501	A10	Pose des portes	1 sem.	06/07/27	12/07/27
502	A13	Finitions peintures	1 sem.	06/07/27	12/07/27
503	A08	Pose des dalles en faux plafonds	1 sem.	13/07/27	20/07/27
504		**Locaux techniques**	**25 jrs**	**16/04/27**	**24/05/27**

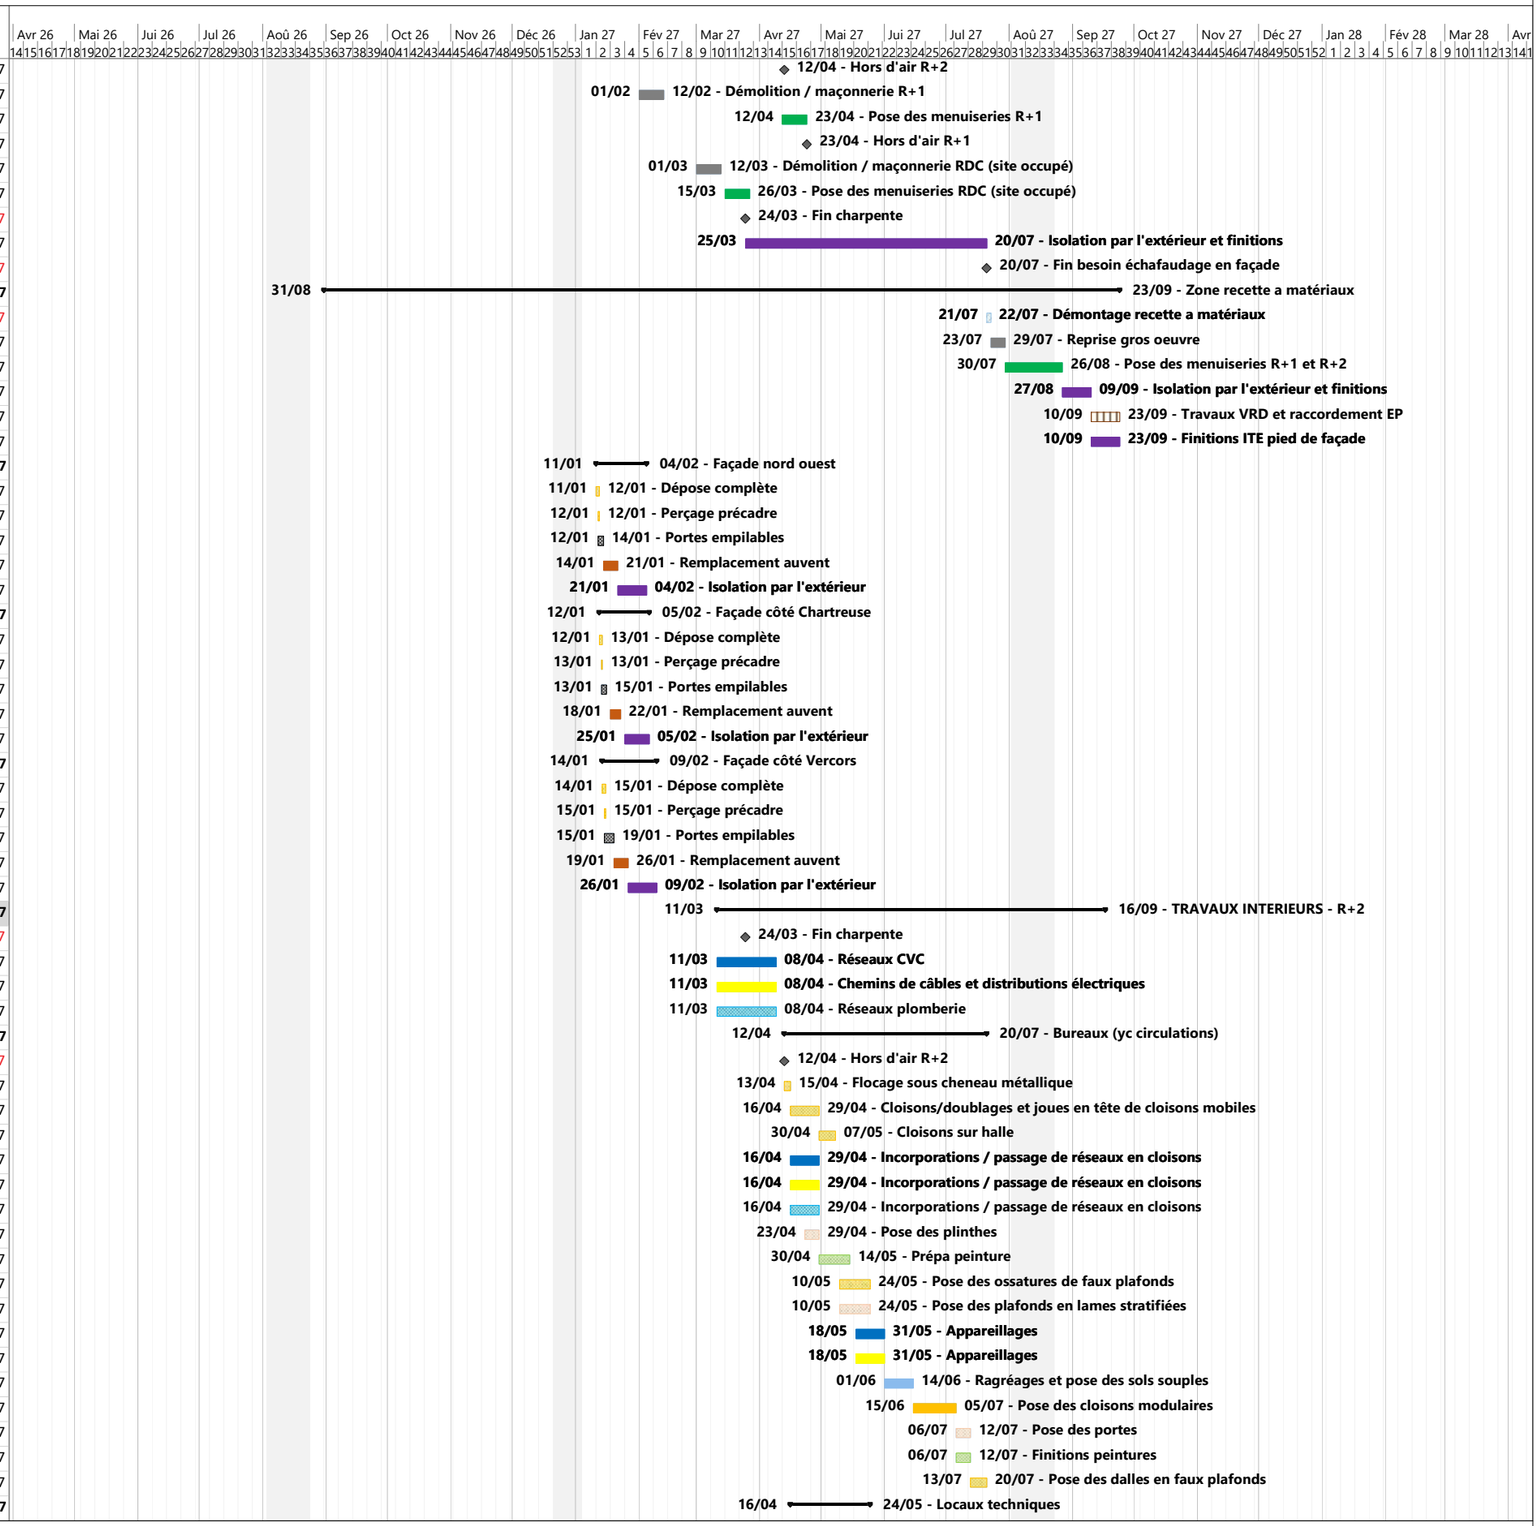


5 PHASE 3 : Travaux d'enveloppe du bâtiment D1 et réaménagement du R+1 et R+2

Planning prévisionnel des travaux

PHASE PRO/DCE Indice E' du 21/10/2026

N°	[LOT]	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
505	A08	Cloisons/doublages	1 sem.	16/04/27	22/04/27
506	A13	Peintures	1 sem.	23/04/27	29/04/27
507	A14	Equipements CVC / CTA et raccordements	3 sem.	30/04/27	24/05/27
508	A16	Equipements électriques / armoires électriques et raccordements	3 sem.	30/04/27	24/05/27
509	A15	Equipements plomberie	3 sem.	30/04/27	24/05/27
510		**Sanitaires**	**29 jrs**	**10/05/27**	**18/06/27**
511	A08	Cloisons/doublages	1 sem.	10/05/27	14/05/27
512	A15	Incorporations	1 sem.	10/05/27	14/05/27
513	A16	Incorporations	1 sem.	10/05/27	14/05/27
514	A13	Prépa peintures	1 sem.	18/05/27	24/05/27
515	A08	Pose des ossatures de faux plafonds	3 jrs	25/05/27	27/05/27
516	A11	Carrelages	5 jrs	28/05/27	03/06/27
517	A10	Pose des portes	3 jrs	04/06/27	08/06/27
518	A15	Appareillages sanitaires	1 sem.	04/06/27	10/06/27
519	A16	Appareillages électriques	1 sem.	04/06/27	10/06/27
520	A08	Pose dalles de faux plafond	3 jrs	11/06/27	15/06/27
521	A13	Finitions peintures	3 jrs	16/06/27	18/06/27
522		**Zone devant recette à matériaux**	**15 jrs**	**26/08/27**	**16/09/27**
523		Fin fermeture zone recette a matériaux	0 jr	26/08/27	26/08/27
524	A08	Cloisons / doublages	3 jrs	27/08/27	31/08/27
525	A13	Prépa peintures	3 jrs	27/08/27	31/08/27
526	A08	Pose des ossatures de faux plafonds	2 jrs	01/09/27	02/09/27
527	A14	Pose des appareillages	2 jrs	03/09/27	06/09/27
528	A16	Pose des appareillages	2 jrs	03/09/27	06/09/27
529	A12	Ragréage et pose des sols souples	2 jrs	07/09/27	08/09/27
530	A09	Pose des cloisons modulaires	3 jrs	09/09/27	13/09/27
531	A13	Finitions peintures	3 jrs	14/09/27	16/09/27
532		Fin travaux R+2	0 jr	16/09/27	16/09/27
533		**TRAVAUX INTERIEURS - R+1**	**118 jrs**	**12/03/27**	**21/09/27**
534		**Zone bureaux non refaits à neuf**	**42 jrs**	**12/03/27**	**13/05/27**
535	B14	Incorporations / passage de réseaux en cloisons	2 sem.	08/04/27	22/04/27
536	B16	Incorporations / passage de réseaux en cloisons	2 sem.	08/04/27	22/04/27
537		Hors d'air - fin pose des menuiseries extérieures R+1	0 jr	12/03/27	12/03/27
538	B13	Peintures	3 sem.	22/04/27	13/05/27
539		**Zone bureaux refaits à neuf**	**96 jrs**	**15/04/27**	**21/09/27**
540	Hors ma	Dépose réseaux EC / ECS	3 sem.	15/04/27	05/05/27
541	B14	Réseaux CVC	1 m	22/04/27	21/05/27
542	B16	Chemins de câbles et distributions électriques	1 m	22/04/27	21/05/27
543	B15	Réseaux plomberie	1 m	22/04/27	21/05/27
544		**Bureaux (yc circulations)**	**83 jrs**	**23/04/27**	**13/09/27**
545		Hors d'air R+1	0 jr	23/04/27	23/04/27
546	B08	Cloisons/doublages et joues en tête de cloisons mobiles	2 sem.	24/05/27	04/06/27
547	B08	Cloisons sur halle	1 sem.	07/06/27	11/06/27
548	B14	Incorporations / passage de réseaux en cloisons	2 sem.	24/05/27	04/06/27
549	B16	Incorporations / passage de réseaux en cloisons	2 sem.	24/05/27	04/06/27
550	B15	Incorporations / passage de réseaux en cloisons	2 sem.	24/05/27	04/06/27
551	B10	Pose des plinthes	1 sem.	31/05/27	04/06/27
552	B13	Prépa peinture	2 sem.	07/06/27	18/06/27
553	B08	Pose des ossatures de faux plafonds	2 sem.	14/06/27	25/06/27
554	B10	Pose des plafonds en lames stratifiées	2 sem.	14/06/27	25/06/27
555	B14	Appareillages	2 sem.	21/06/27	02/07/27
556	B16	Appareillages	2 sem.	21/06/27	02/07/27
557	B12	Ragréages et pose des sols souples	2 sem.	05/07/27	19/07/27
558		Fin approvisionnements via recette à matériaux	0 jr	22/07/27	22/07/27
559	B09	Pose des cloisons modulaires	3 sem.	20/07/27	30/08/27
560	B10	Pose des portes	1 sem.	31/08/27	06/09/27
561	B13	Finitions peintures	1 sem.	31/08/27	06/09/27
562	B08	Pose des dalles en faux plafonds	1 sem.	07/09/27	13/09/27
563		**Locaux techniques**	**25 jrs**	**24/05/27**	**25/06/27**

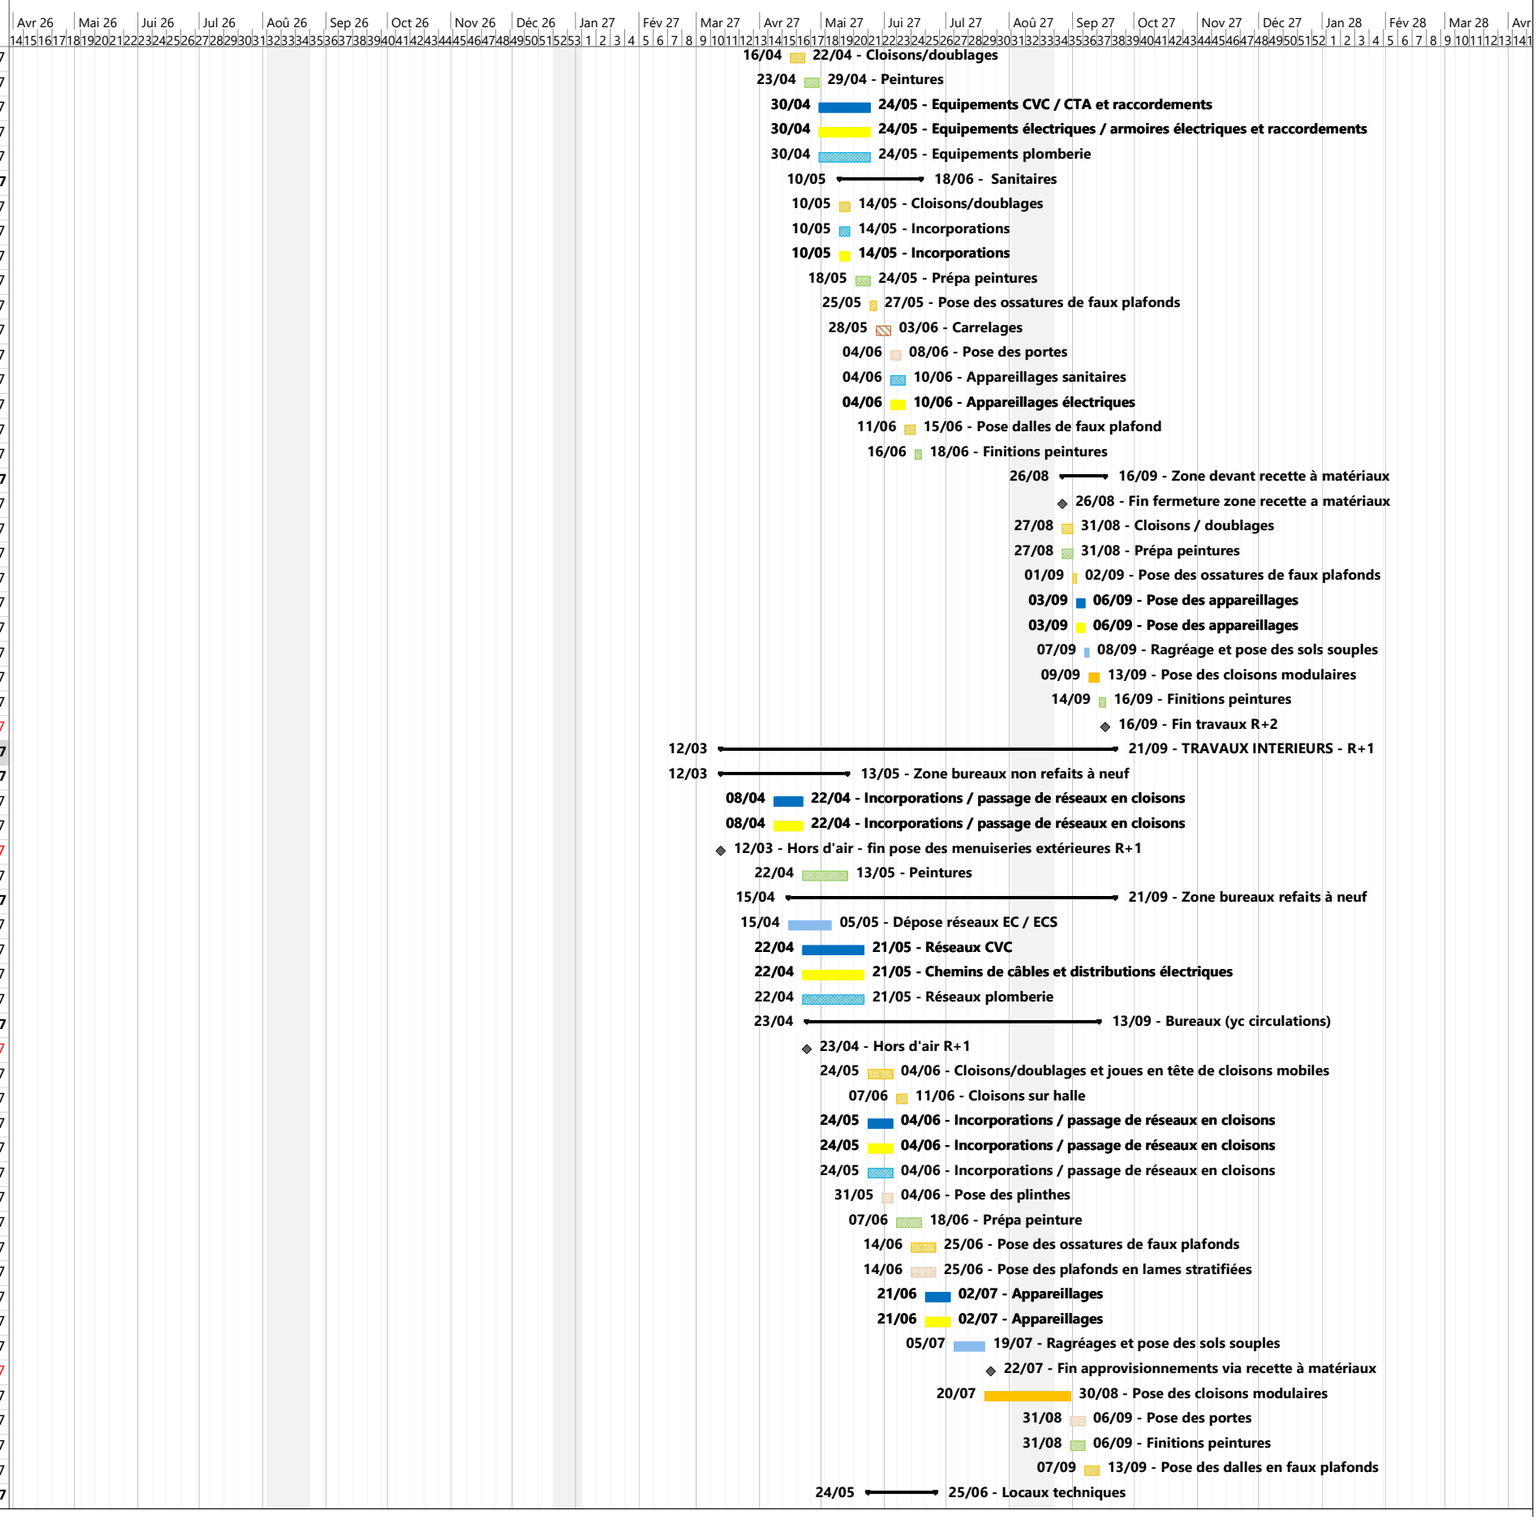

6 PHASE 3 : Travaux d'enveloppe du bâtiment D1 et réaménagement du R+1 et R+2

Planning prévisionnel des travaux

PHASE PRO/DCE Indice E' du 21/10/2026

N°	[LOT]	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
564	B08	Cloisons/doublages	1 sem.	24/05/27	28/05/27
565	B13	Peintures	1 sem.	31/05/27	04/06/27
566	B14	Equipements CVC / CTA et raccordements	3 sem.	07/06/27	25/06/27
567	B16	Equipements électriques / armoires électriques et raccordements	3 sem.	07/06/27	25/06/27
568	B15	Equipements plomberie	3 sem.	07/06/27	25/06/27
569		**Sanitaires**	**29 jrs**	**14/06/27**	**23/07/27**
570	B08	Cloisons/doublages	1 sem.	14/06/27	18/06/27
571	B15	Incorporations	1 sem.	14/06/27	18/06/27
572	B16	Incorporations	1 sem.	14/06/27	18/06/27
573	B13	Prépa peintures	1 sem.	21/06/27	25/06/27
574	B08	Pose des ossatures de faux plafonds	3 jrs	28/06/27	30/06/27
575	B18	Carrelages	5 jrs	01/07/27	07/07/27
576	B10	Pose des portes	3 jrs	08/07/27	12/07/27
577	B15	Appareillages sanitaires	1 sem.	08/07/27	15/07/27
578	B16	Appareillages électriques	1 sem.	08/07/27	15/07/27
579	B08	Pose dalles de faux plafond	3 jrs	16/07/27	20/07/27
580	B13	Finitions peintures	3 jrs	21/07/27	23/07/27
581		**Zone devant recette à matériaux**	**18 jrs**	**26/08/27**	**21/09/27**
582		Fin fermeture zone recette a matériaux	0 jr	26/08/27	26/08/27
583	B08	Cloisons / doublages	3 jrs	01/09/27	03/09/27
584	B13	Prépa peintures	3 jrs	01/09/27	03/09/27
585	B08	Pose des ossatures de faux plafonds	2 jrs	06/09/27	07/09/27
586	B14	Pose des appareillages	2 jrs	08/09/27	09/09/27
587	B16	Pose des appareillages	2 jrs	08/09/27	09/09/27
588	B12	Ragréage et pose des sols souples	2 jrs	10/09/27	13/09/27
589	B09	Pose des cloisons modulaires	3 jrs	14/09/27	16/09/27
590	B13	Finitions peintures	3 jrs	17/09/27	21/09/27
591		Fin travaux R+1	0 jr	21/09/27	21/09/27
592		**CAGE d'ESCALIER**	**137 jrs**	**15/03/27**	**18/10/27**
593	A04	Démolition / maçonnerie cage d'escalier avec l'échafaudage	3 jrs	15/03/27	17/03/27
594	A02	Pose sapine d'accès suite démontage recette à matériaux	2 jrs	23/07/27	26/07/27
595	A02	Dépose sapine d'accès	2 jrs	22/09/27	23/09/27
596	A06	Pose des menuiseries extérieures	2 jrs	24/09/27	27/09/27
597	B13	Montage échafaudage	2 jrs	24/09/27	28/09/27
598	B13	Peintures	1 sem.	28/09/27	04/10/27
599	B13	Démontage échafaudage	1 sem.	05/10/27	11/10/27
600	A07	Pose des gardes corps	1 sem.	12/10/27	18/10/27
601		**OPR RECEPTIONS**	**52 jrs?**	**20/07/27**	**21/10/27**
602		**R+2**	**27 jrs**	**20/07/27**	**16/09/27**
603		Fin travaux intérieurs R+2 (hors zone recette a matériaux)	0 jr	20/07/27	20/07/27
604		Fin travaux intérieurs R+2 (yc zone recette à matériaux)	0 jr	16/09/27	16/09/27
605		**R+1**	**6 jrs**	**13/09/27**	**21/09/27**
606		Fin travaux intérieurs R+1 (hors zone recette a matériaux)	0 jr	13/09/27	13/09/27
607		Fin travaux intérieurs R+1 (yc zone recette à matériaux)	0 jr	21/09/27	21/09/27
608		**Cage d'escalier et extérieurs**	**17 jrs**	**23/09/27**	**18/10/27**
609		Fin travaux extérieurs VRD et finitions ITE	0 jr	23/09/27	23/09/27
610		Fin travaux cage d'escalier	0 jr	18/10/27	18/10/27
611		**OPR**	**22 jrs?**	**22/09/27**	**21/10/27**
613	B13	Nettoyage	2 jrs	22/09/27	23/09/27
614		OPR	1 m	24/09/27	21/10/27
615		Réception	0 jr	21/10/27	21/10/27

