ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX153073
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 04/02/2026
Reférence mandataire : 2, AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ SAINT

DÉSIGNATION DU BIEN

Cabinet médical
2 AVENUE DU MAOUBESI
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR

PROPRIÉTAIRE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX153073
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 04/02/2026
Reférence mandataire : 2, AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ SAINT

DÉSIGNATION DU BIEN

Cabinet médical
2 AVENUE DU MAOUBESI
65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR

PROPRIÉTAIRE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR

Référence client : 2, AVENUE DU MAOUBESI 65120 LU Z SAINT SAUVEUR

Désignation : Cabinet médical

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

Donneur d'ordre :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SERGENT NATHAN
Accompagnateur : Docteur Patricia MOINARD (Tél. 06.83.28.57.9
Date de repérage 04/02/2026
Numéro attestation : CPDI6701
Délivré le : 31/01/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)
Date du rapport : 17/02/2026
Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 17/02/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (Extérieur)	RDC - Vol 2 (Soins)
RDC - Vol 3 (Radio)	RDC - Vol 4 (Dev.)
RDC - Vol 5 (Cab. 1)	RDC - Vol 6 (Cab. 2)
RDC - Vol 7 (Cab. 3)	RDC - Vol 8 (Cab. 4)
RDC - Vol 9 (SAS)	RDC - Vol 10 (Attente 1)
RDC - Vol 11 (Accueil)	RDC - Vol 12 (Attente 2)
RDC - Vol 13 (Box 1)	RDC - Vol 14 (Box 2)
RDC - Vol 15 (Box 3)	RDC - Vol 16 (Cab inf)
RDC - Vol 17 (Espalier)	RDC - Vol 18 (Attente 3)
RDC - Vol 19 (Kiné)	RDC - Vol 20 (Repos med.)
RDC - Vol 21 (W.c 1)	RDC - Vol 22 (W.c 2)
Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)	Toiture - Vol 24 (Toiture)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Repérage des sols, murs, plafonds, faïences... Dans le cadre de travaux

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ensemble du bien

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	RDC	Vol 1 (Extérieur) - Vol 17 (Espalier)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (Extérieur) - Vol 2 (Soins) - Vol 3 (Radio) - Vol 4 (Dev.) - Vol 5 (Cab. 1) - Vol 6 (Cab. 2) - Vol 7 (Cab. 3) - Vol 8 (Cab. 4) - Vol 9 (SAS) - Vol 10 (Attente 1) - Vol 11 (Accueil) - Vol 12 (Attente 2) - Vol 13 (Box 1) - Vol 14 (Box 2) - Vol 15 (Box 3) - Vol 16 (Cab inf) - Vol 17 (Espalier) - Vol 18 (Attente 3) - Vol 19 (Kiné) - Vol 20 (Repos med.) - Vol 21 (W.c 1) - Vol 22 (W.c 2)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Extérieur) - Vol 2 (Soins) - Vol 3 (Radio) - Vol 4 (Dev.) - Vol 5 (Cab. 1) - Vol 6 (Cab. 2) - Vol 7 (Cab. 3) - Vol 8 (Cab. 4) - Vol 9 (SAS) - Vol 10 (Attente 1) - Vol 11 (Accueil) - Vol 12 (Attente 2) - Vol 13 (Box 1) - Vol 14 (Box 2) - Vol 15 (Box 3) - Vol 16 (Cab inf) - Vol 17 (Espalier) - Vol 18 (Attente 3) - Vol 19 (Kiné) - Vol 20 (Repos med.) - Vol 21 (W.c 1) - Vol 22 (W.c 2)	
Voies et réseaux divers	RDC	Vol 1 (Extérieur)	

Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 2 (Soins) - Vol 3 (Radio) - Vol 4 (Dev.) - Vol 5 (Cab. 1) - Vol 6 (Cab. 2) - Vol 7 (Cab. 3) - Vol 8 (Cab. 4) - Vol 9 (SAS) - Vol 10 (Attente 1) - Vol 11 (Accueil) - Vol 12 (Attente 2) - Vol 13 (Box 1) - Vol 14 (Box 2) - Vol 15 (Box 3) - Vol 16 (Cab inf) - Vol 17 (Espalier) - Vol 18 (Attente 3) - Vol 19 (Kiné) - Vol 20 (Repos med.) - Vol 21 (W.c 1) - Vol 22 (W.c 2)
Revêtement de mur	RDC	Vol 2 (Soins) - Vol 4 (Dev.) - Vol 5 (Cab. 1) - Vol 6 (Cab. 2) - Vol 7 (Cab. 3) - Vol 8 (Cab. 4) - Vol 10 (Attente 1) - Vol 13 (Box 1) - Vol 16 (Cab inf) - Vol 21 (W.c 1)
Conduits, canalisations et équipements	Chaufferie	Vol 23 (Chaufferie)
Equipements divers et accessoires	Chaufferie	Vol 23 (Chaufferie)
Parois verticales intérieures et enduits	Chaufferie	Vol 23 (Chaufferie)
Plafond et faux-plafonds	Chaufferie	Vol 23 (Chaufferie)
Revêtement de sol	Chaufferie	Vol 23 (Chaufferie)
Façades	Toiture	Vol 24 (Toiture)
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 24 (Toiture)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 23 (Chaufferie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P20

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

MPSCA noyés dans les maçonnerie : Certains matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être noyés dans les maçonneries (cales de ferraillage, conduits noyés, écarteurs de banche, etc.) sans qu'il soit possible d'en identifier la présence antérieurement à la démolition. Notre responsabilité ne saurait être recherchée en cas de présence de tels matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante découverts en cours de démolition. Nous nous tenons toutefois à la disposition du donneur d'ordre pour compléter notre repérage ultérieurement, selon nos tarifs en vigueur.

Réseaux enterrés : L'intégralité des réseaux enterrés n'ont pu être investigués dans le cadre du présent repérage. En effet, ces réseaux enterrés ne sont pas repérables sans moyens spécifiques (terrassement, caméra, etc.) non prévus au présent contrat. Des investigations complémentaires devront être réalisées ultérieurement une fois les moyens d'accès aux réseaux enterrés mis à disposition ou lors de la phase de travaux correspondant à leur mise à jour.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Equipements divers et accessoires

9 - Voies et réseaux divers

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 24 (Toiture)	Ardoises	Naturelle	S84	Réalisation d'un sondage		S84 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 17 (Espalier)	Menuiseries	Joint vitrier caoutchouc	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 17 (Espalier)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 17 (Espalier)	Menuiseries	Reprise d'étanchéïté	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Colle de carrelage	P21	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX153073 n°21 - 1	P21 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Colle de carrelage	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Gris	002EX 15307 3 n°21 - 1	P21 Phase 1	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Colle de carrelage	P21	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 15307 3 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Colle de carrelage	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Gris	002EX 15307 3 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Enduit ciment	P22	Réalisation d'un prélevement	Muret	002EX 15307 3 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Enduit ciment	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Muret	002EX 15307 3 n°22 - 1	P22	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Enduit ciment	P23	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°23 - 1	P23	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Enduit ciment	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Beige	002EX 15307 3 n°23 - 1	P23	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 24 (Toiture)	Murs	Enduit ciment	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Beige	002EX 15307 3 n°23 - 1	P23	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 17 (Espalier)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélevement	Doublage mur	002EX 15307 3 n°2 - 1	P2	Peinture / Plâtre / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 12 (Attente 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Doublage mur	002EX 15307 3 n°2 - 1	P2	Peinture / Plâtre / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9 (SAS)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Doublage mur	002EX 15307 3 n°2 - 1	P2	Peinture / Plâtre / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Attente 1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Doublage mur	002EX 15307 3 n°2 - 1	P2	Peinture / Plâtre / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Radio)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Doublage mur	002EX 15307 3 n°2 - 1	P2	Peinture / Plâtre / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9 (SAS)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Doublage mur	002EX 15307 3 n°2 - 1	P2	Peinture / Plâtre / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 12 (Attente 2) - Vol 9 (SAS) - Vol 10 (Attente 1) - Vol 3 (Radio)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9 - S10 - S11 - S12 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Doublage mur	002EX 15307 3 n°2 - 1	P2	Peinture / Plâtre / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Espalier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 17 (Espalier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Attente 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Attente 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Accueil)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11 (Accueil)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Radio)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 12 (Attente 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Espalier) - Vol 18 (Attente 3) - Vol 10 (Attente 1) - Vol 11 (Accueil) - Vol 3 (Radio) - Vol 12 (Attente 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Box 1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélevement	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Box 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Box 3)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Cab inf)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Repos med.)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Kiné)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 21 (W.c 1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Dev.)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Soins)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (W.c 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Cab. 3)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Cab. 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 8 (Cab. 4)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cab. 1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (Box 2) - Vol 15 (Box 3) - Vol 16 (Cab inf) - Vol 20 (Repos med.) - Vol 19 (Kiné) - Vol 21 (W.c 1) - Vol 4 (Dev.) - Vol 2 (Soins) - Vol 22 (W.c 2) - Vol 7 (Cab. 3) - Vol 6 (Cab. 2) - Vol 8 (Cab. 4) - Vol 5 (Cab. 1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Doublage mur	002EX 15307 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Box 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Box 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (Box 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Box 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (Kiné)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Repos med.)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 21 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 16 (Cab inf)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 (Cab. 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Dev.)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Box 1) - Vol 14 (Box 2) - Vol 15 (Box 3) - Vol 19 (Kiné) - Vol 20 (Repos med.) - Vol 21 (W.c 1) - Vol 16 (Cab inf) - Vol 5 (Cab. 1) - Vol 4 (Dev.)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Soins)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P16	Réalisation d'un prélevement	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Cab. 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Cab. 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Cab. 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Cloisons séparative	002EX 15307 3 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Cab. 3) - Vol 22 (W.c 2) - Vol 6 (Cab. 2) - Vol 8 (Cab. 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S65 - S66 - S67 - S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Cloisons séparative	002EX15307 3 n°16 - 1	P16	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 23 (Chaufferie)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P17	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX15307 3 n°17 - 1	P17	Joint - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 23 (Chaufferie)	Gaines et coffre verticaux	Jonction entre panneaux	P19	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX15307 3 n°19 - 1	P19	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 23 (Chaufferie)	Gaines et coffre verticaux	Jonction entre panneaux	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Beige	002EX15307 3 n°19 - 1	P19	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu pvc	S49	Réalisation d'un sondage		S49 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Coffrage perdu pvc	S49	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S49		S49 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 17 (Espalier)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P4	Réalisation d'un prélevement	Jaune	002EX 15307 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Attente 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Jaune	002EX 15307 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Attente 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Jaune	002EX 15307 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9 (SAS)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Jaune	002EX 15307 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Accueil)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Jaune	002EX 15307 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Radio)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Jaune	002EX 15307 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Attente 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Jaune	002EX 15307 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 (Attente 3) - Vol 12 (Attente 2) - Vol 9 (SAS) - Vol 11 (Accueil) - Vol 3 (Radio) - Vol 10 (Attente 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S41 - S42 - S43 - S44 - S45 - S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Jaune	002EX 15307 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Box 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P8	Réalisation d'un prélèvement	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Cab inf)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (W.c 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Repos med.)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Kiné)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cab. 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Cab. 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Cab. 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Cab. 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Dev.)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Soins)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (W.c 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Box 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Box 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Cab inf) - Vol 21 (W.c 1) - Vol 20 (Repos med.) - Vol 19 (Kiné) - Vol 5 (Cab. 1) - Vol 8 (Cab. 4) - Vol 6 (Cab. 2) - Vol 7 (Cab. 3) - Vol 4 (Dev.) - Vol 2 (Soins) - Vol 22 (W.c 2) - Vol 14 (Box 2) - Vol 15 (Box 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S70 - S71 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Jaune	002EX 15307 3 n°8 - 1	P8	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 23 (Chaufferie)	Plafonds	Enduit de rebouchage	P18	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 15307 3 n°18 - 1	P18	Enduit - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Attente 1)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P24	Réalisation d'un prélevement		002EX 15307 3 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 17 (Espalier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 15307 3 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Attente 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Gris	002EX 15307 3 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Attente 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Gris	002EX 15307 3 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Attente 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Gris	002EX 15307 3 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9 (SAS)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Gris	002EX 15307 3 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Accueil)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Gris	002EX 15307 3 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Radio)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Gris	002EX 15307 3 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 (Attente 3) - Vol 12 (Attente 2) - Vol 10 (Attente 1) - Vol 9 (SAS) - Vol 11 (Accueil) - Vol 3 (Radio)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Gris	002EX 15307 3 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Box 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P5	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Cab inf)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (Box 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Box 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Kiné)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Repos med.)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cab. 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Cab. 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Cab. 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Cab. 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Soins)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Dev.)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 16 (Cab inf) - Vol 14 (Box 2) - Vol 15 (Box 3) - Vol 19 (Kiné) - Vol 20 (Repos med.) - Vol 21 (W.c 1) - Vol 5 (Cab. 1) - Vol 8 (Cab. 4) - Vol 6 (Cab. 2) - Vol 7 (Cab. 3) - Vol 2 (Soins) - Vol 4 (Dev.) - Vol 22 (W.c 2) - Vol 1 (Extérieur)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S52 - S53 - S54 - S55 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Gris	002EX 15307 3 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie	Vol 23 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Dalle béton	S47	Réalisation d'un sondage		S47 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Revêtement de sol	Dalle béton	S47	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S47		S47 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Box 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°9 - 1	P9	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Cab inf)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°10 - 1	P10	Colle / Carton / Plâtre - Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°11 - 1	P11 Phase 1	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°11 - 1	P11 Phase 2	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Cab. 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°12 - 1	P12	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Dev.)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°13 - 1	P13	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Soins)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°14 - 1	P14	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Soins)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°15 - 1	P15	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Gris / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Attente 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 15307 3 n°25 - 1	P25	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cab. 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°26 - 1	P26 Phase 1	Joint - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cab. 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°26 - 1	P26 Phase 2	Colle / Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Dur / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Cab. 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P27	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°27 - 1	P27	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Cab. 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P28	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°28 - 1	P28 Phase 1	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Cab. 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P28	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EX 15307 3 n°28 - 1	P28 Phase 2	Joint - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 23 (Chaufferie)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P20	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EX 15307 3 n°20 - 1	P20	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie	Vol 23 (Chaufferie)	Chaudières	Ensemble	S48	Réalisation d'un sondage		S48 - 1				Négatif sur marquageDate de fabrication : 2010

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Conduits	Pvc	S50	Réalisation d'un sondage		S50 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Conduits	Pvc	S50	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S50		S50 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Conduits	Pvc	S51	Réalisation d'un sondage		S51 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Conduits	Pvc	S51	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S51		S51 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Chaufferie				
P20	Conduit air	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris	Vol 23 (Chaufferie)	,21 m			

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	Chaufferie	Chaufferie - Plan de repérage - Actions menées
	Chaufferie	Chaufferie - MPCA Toutes catégories confondues
	Chaufferie	Chaufferie - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX153073

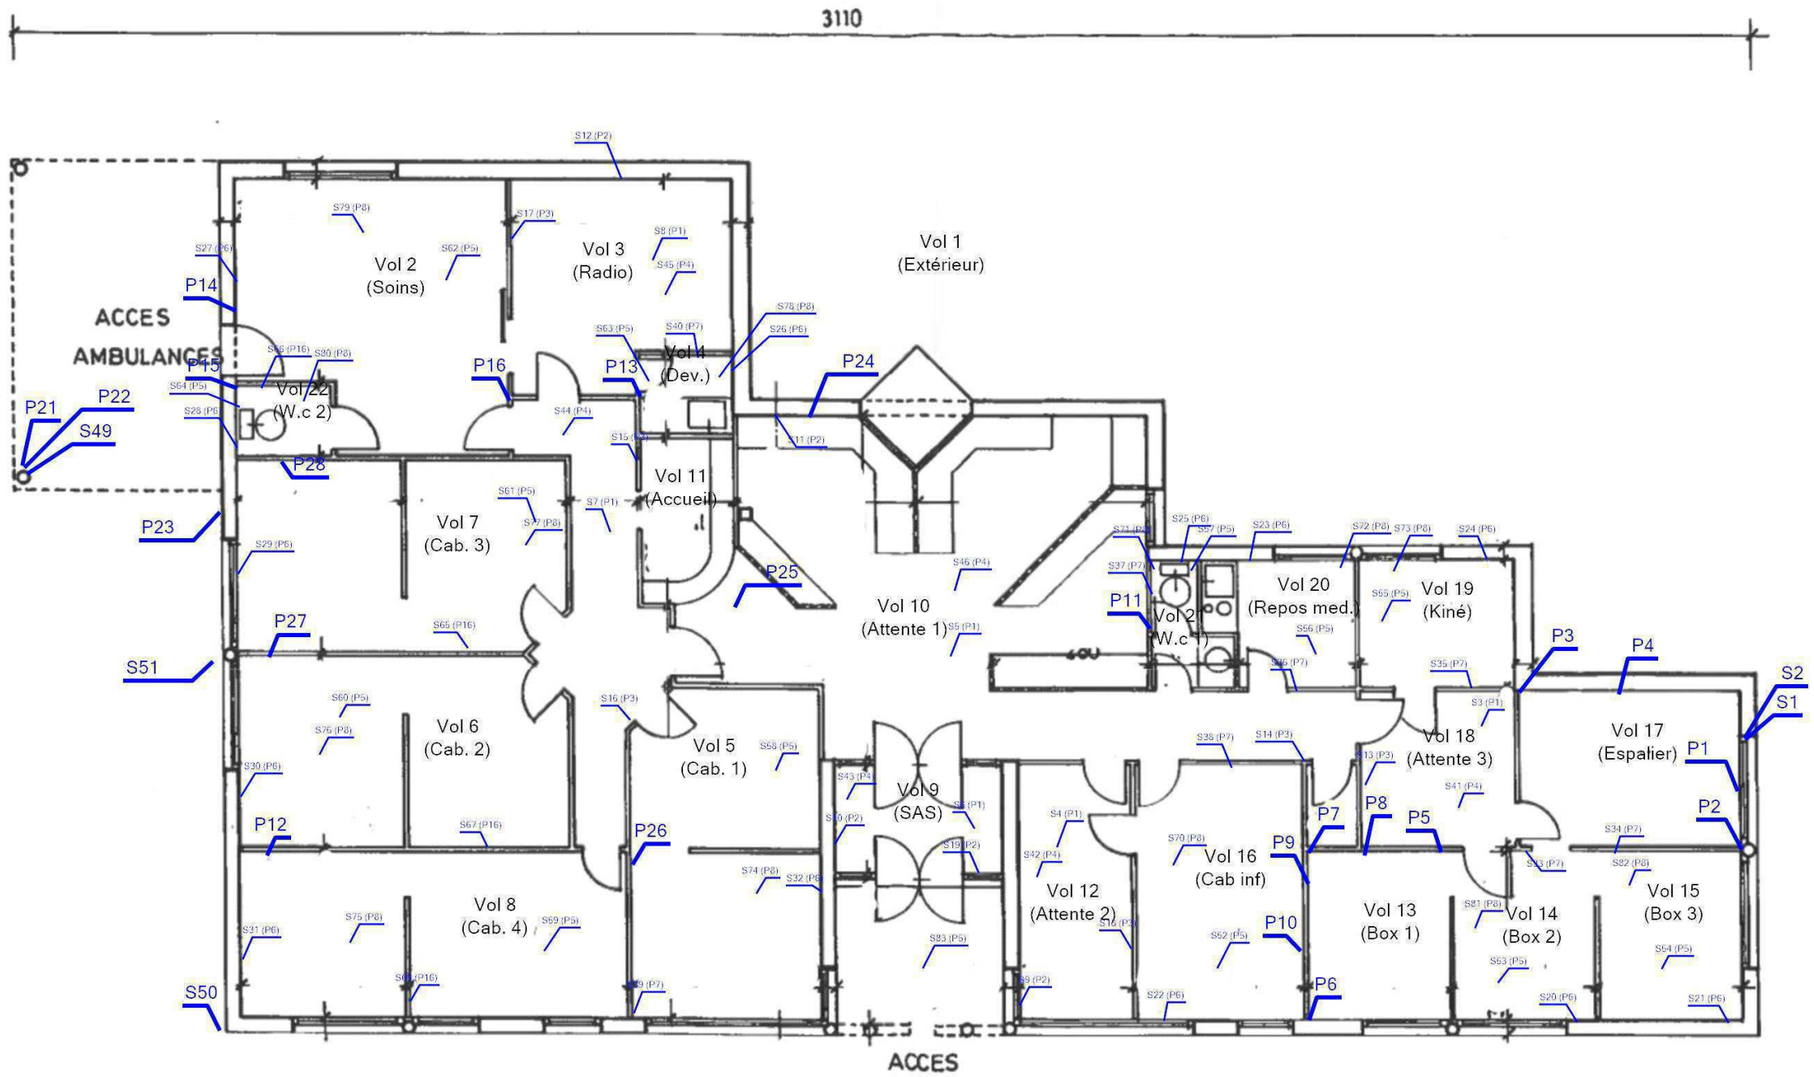


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR	Cabinet médical	04/02/2026	SERGENT NATHAN

CHAUFFERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX153073

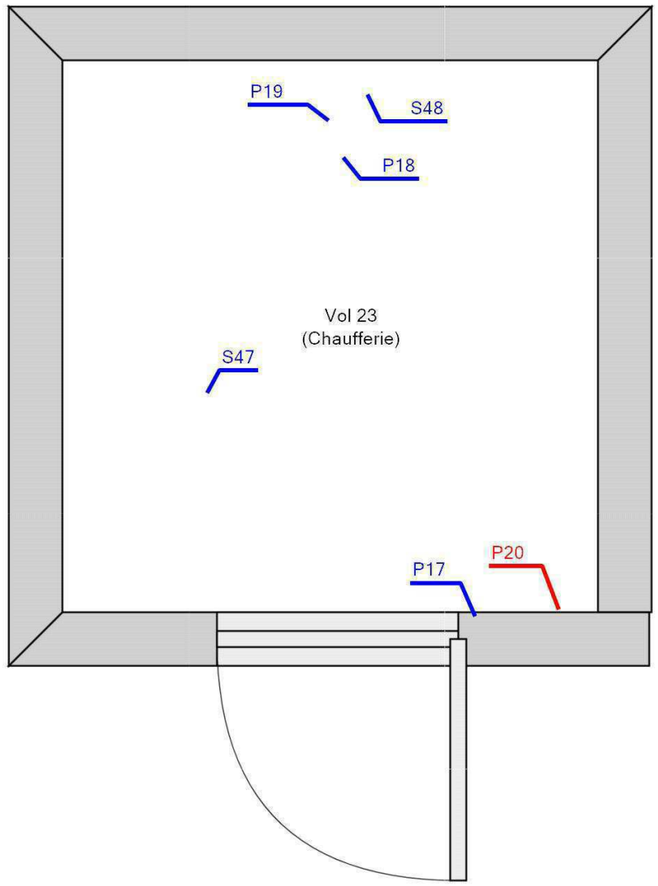


Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR	Cabinet médical	04/02/2026	SERGENT NATHAN

CHAUFFERIE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX153073

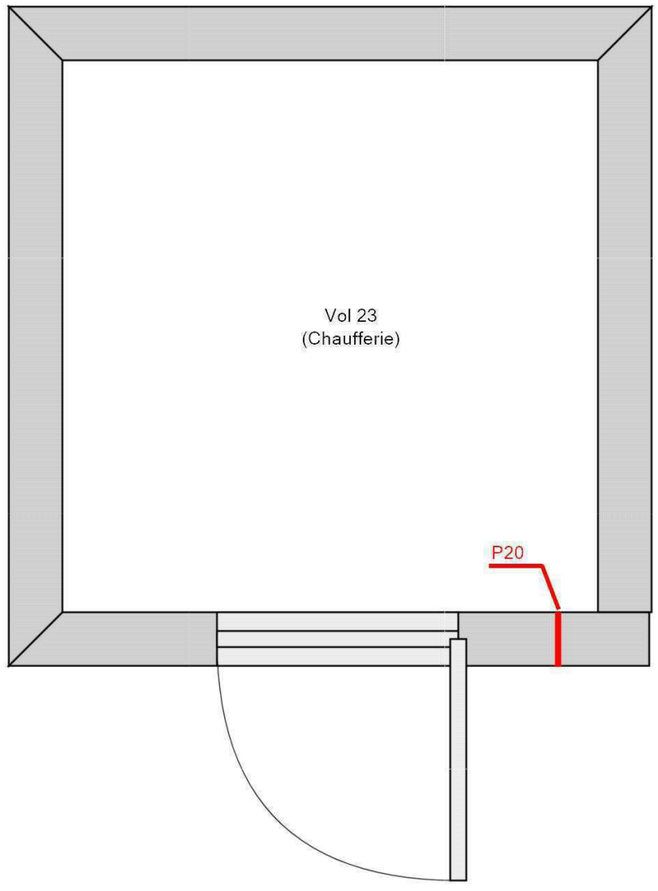


0.5 m

Légende	
	P20 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR	Cabinet médical	04/02/2026	SERGENT NATHAN

CHAUFFERIE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EX153073

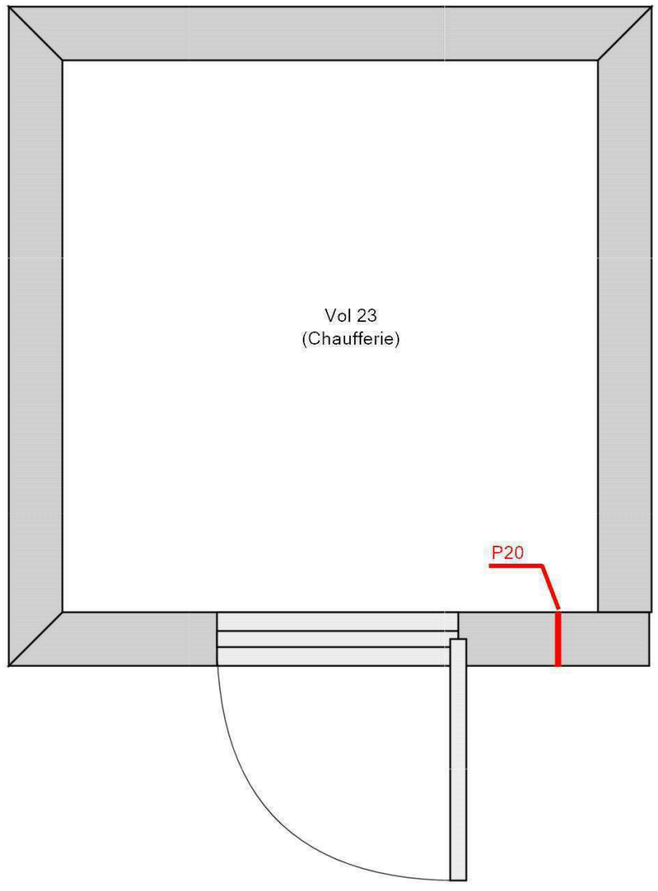

Légende	
	P20 : Conduit en fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR	Cabinet médical	04/02/2026	SERGENT NATHAN

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX153073



Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR	Cabinet médical	04/02/2026	SERGENT NATHAN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX153073 n°17 - 1 (P17)	Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EX153073 n°18 - 1 (P18)	Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EX153073 n°19 - 1 (P19)	Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EX153073 n°20 - 1 (P20)	Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)	Prélevement positif
S47 - 1 (S47)	Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)	Absence : pas d'amiante par nature
S48 - 1 (S48)	Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)	Absence sur marquage du materiau
002EX153073 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 17 (Espalier)	Prélevement négatif
002EX153073 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 17 (Espalier)	Prélevement négatif
002EX153073 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 17 (Espalier)	Prélevement négatif
002EX153073 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 17 (Espalier)	Prélevement négatif
002EX153073 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 13 (Box 1)	Prélevement négatif
002EX153073 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 13 (Box 1)	Prélevement négatif
002EX153073 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 13 (Box 1)	Prélevement négatif
002EX153073 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 13 (Box 1)	Prélevement négatif
002EX153073 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 13 (Box 1)	Prélevement négatif
002EX153073 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 16 (Cab inf)	Prélevement négatif
002EX153073 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 21 (W.c 1)	Prélevement négatif
002EX153073 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 8 (Cab. 4)	Prélevement négatif
002EX153073 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 4 (Dev.)	Prélevement négatif
002EX153073 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 2 (Soins)	Prélevement négatif
002EX153073 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 2 (Soins)	Prélevement négatif
002EX153073 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 2 (Soins)	Prélevement négatif
002EX153073 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 1 (Extérieur)	Prélevement négatif
002EX153073 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 1 (Extérieur)	Prélevement négatif
002EX153073 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 1 (Extérieur)	Prélevement négatif
002EX153073 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 10 (Attente 1)	Prélevement négatif
002EX153073 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 10 (Attente 1)	Prélevement négatif

002EX153073 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 5 (Cab. 1)	Prélevement négatif
002EX153073 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 6 (Cab. 2)	Prélevement négatif
002EX153073 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 7 (Cab. 3)	Prélevement négatif
S1 - 1 (S1)	RDC - Vol 17 (Espalier)	Absence : pas d'amiante par nature
S2 - 1 (S2)	RDC - Vol 17 (Espalier)	Absence : pas d'amiante par nature
S49 - 1 (S49)	RDC - Vol 1 (Extérieur)	Absence : pas d'amiante par nature
S50 - 1 (S50)	RDC - Vol 1 (Extérieur)	Absence : pas d'amiante par nature
S51 - 1 (S51)	RDC - Vol 1 (Extérieur)	Absence : pas d'amiante par nature
S84 - 2 (S84)	Toiture - Vol 24 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature




002EX153073 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 17 (Espalier)



002EX153073 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 17 (Espalier)



002EX153073 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 17 (Espalier)

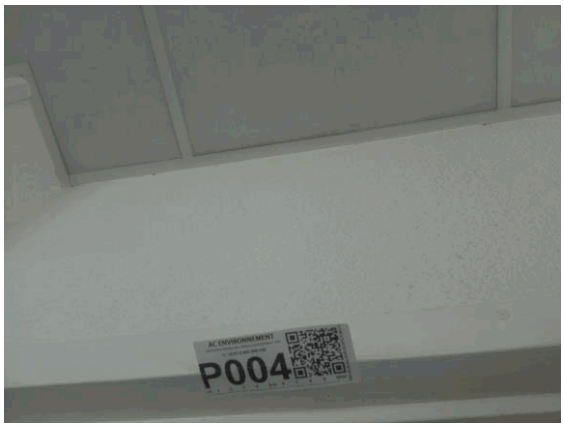

002EX153073 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 17 (Espalier)



002EX153073 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 13 (Box 1)



002EX153073 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 13 (Box 1)



002EX153073 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 13 (Box 1)



002EX153073 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 13 (Box 1)



002EX153073 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 13 (Box 1)



002EX153073 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 16 (Cab inf)



002EX153073 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 21 (W.c 1)



002EX153073 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 8 (Cab. 4)



002EX153073 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 4 (Dev.)



002EX153073 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 2 (Soins)




002EX153073 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 2 (Soins)



002EX153073 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 2 (Soins)



002EX153073 n°17 - 1 (P17) - Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)

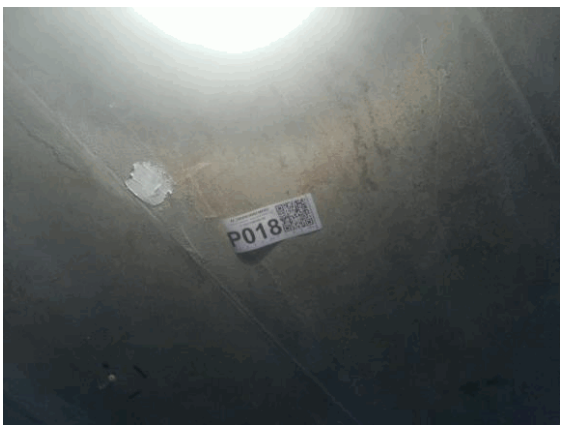

002EX153073 n°18 - 1 (P18) - Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)



002EX153073 n°19 - 1 (P19) - Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)



002EX153073 n°20 - 1 (P20) - Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)




002EX153073 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 1 (Extérieur)



002EX153073 n°22 - 1 (P22) - RDC - Vol 1 (Extérieur)




002EX153073 n°23 - 1 (P23) - RDC - Vol 1 (Extérieur)

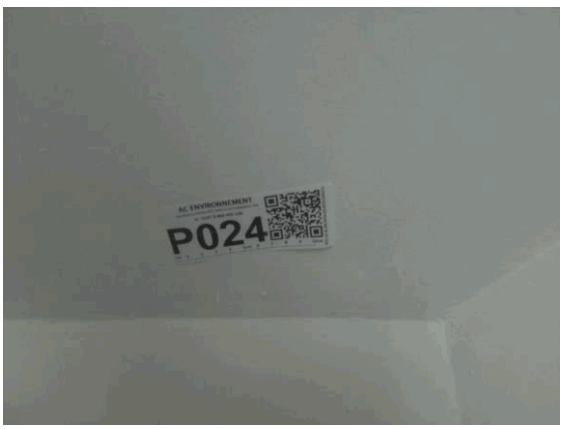

002EX153073 n°24 - 1 (P24) - RDC - Vol 10 (Attente 1)




002EX153073 n°25 - 1 (P25) - RDC - Vol 10 (Attente 1)

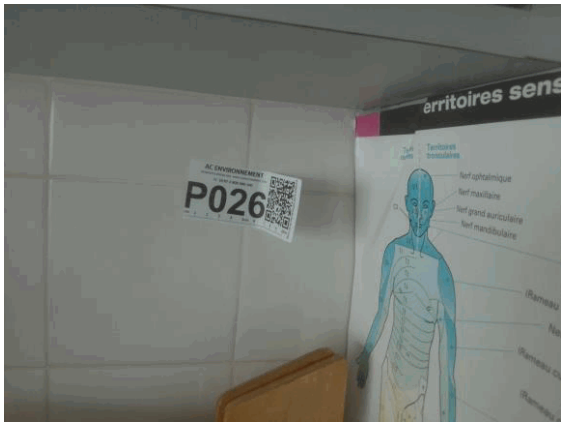

002EX153073 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 5 (Cab. 1)



002EX153073 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 6 (Cab. 2)

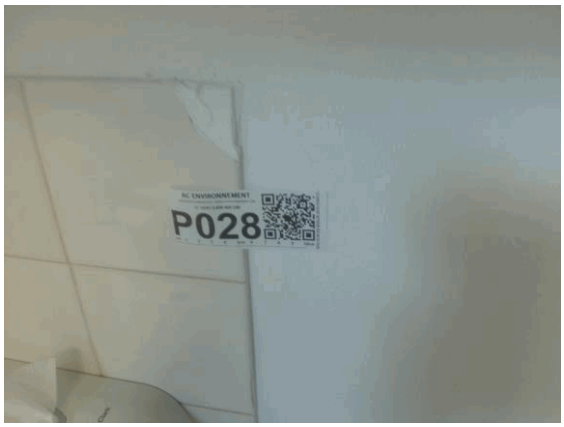

002EX153073 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 7 (Cab. 3)




S1 - 1 (S1) - RDC - Vol 17 (Espalier)



S2 - 1 (S2) - RDC - Vol 17 (Espalier)



S47 - 1 (S47) - Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)

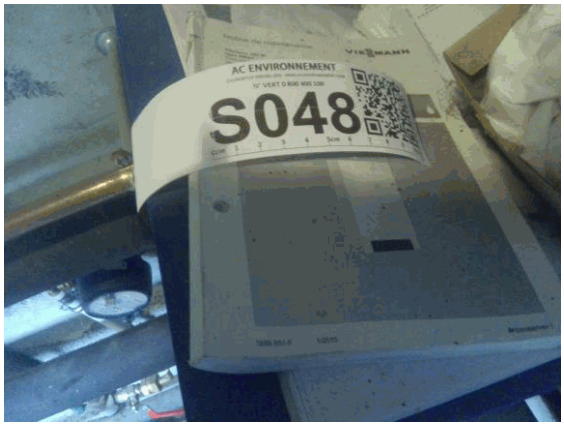

S48 - 1 (S48) - Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)



S49 - 1 (S49) - RDC - Vol 1 (Extérieur)



S50 - 1 (S50) - RDC - Vol 1 (Extérieur)



S51 - 1 (S51) - RDC - Vol 1 (Extérieur)



S84 - 2 (S84) - Toiture - Vol 24 (Toiture)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Gris	RDC - Vol 17 (Espalier)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc - Doublage mur	RDC - Vol 17 (Espalier)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative	RDC - Vol 17 (Espalier)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune - Jaune	RDC - Vol 17 (Espalier)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Gris	RDC - Vol 13 (Box 1)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Peinture - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc - Doublage mur	RDC - Vol 13 (Box 1)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc - Cloisons séparative	RDC - Vol 13 (Box 1)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Laine - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Jaune - Jaune	RDC - Vol 13 (Box 1)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Jaune - Beige	RDC - Vol 13 (Box 1)	

P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton / Plâtre - Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Marron / Gris - Beige	RDC - Vol 16 (Cab inf)
P11 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Blanc - Beige	RDC - Vol 21 (W.c 1)
P11 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Gris / Beige - Beige	RDC - Vol 21 (W.c 1)
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Gris / Beige - Beige	RDC - Vol 8 (Cab. 4)
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Papier - Dur / Souple Fibreux - Gris / Beige - Beige	RDC - Vol 4 (Dev.)
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Gris / Marron - Beige	RDC - Vol 2 (Soins)
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Gris / Marron - Beige	RDC - Vol 2 (Soins)
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Cloisons séparative	RDC - Vol 2 (Soins)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint - Effritable - Gris - Gris	Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit - Effritable - Gris - Gris	Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Colle - Dur - Gris - Beige	Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)
P20	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture / Fibres-ciment - Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Gris - Gris	Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)
P21 Phase 1	Façades	Murs	Joint - Dur - Gris - Gris	RDC - Vol 1 (Extérieur)
P21 Phase 2	Façades	Murs	Colle - Dur - Gris - Gris	RDC - Vol 1 (Extérieur)
P22	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris - Muret	RDC - Vol 1 (Extérieur)
P23	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris - Beige	RDC - Vol 1 (Extérieur)
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 10 (Attente 1)
P25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Gris	RDC - Vol 10 (Attente 1)
P26 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris Beige - Beige	RDC - Vol 5 (Cab. 1)

P26 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Dur / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Beige	RDC - Vol 5 (Cab. 1)
P27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Beige	RDC - Vol 6 (Cab. 2)
P28 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Beige	RDC - Vol 7 (Cab. 3)
P28 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Effritable - Blanc - Beige	RDC - Vol 7 (Cab. 3)

ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C012026828721**
Adresse	Commande : 002EX153073 Affaire : 2, AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ SAINT SAUVEUR 2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 17/02/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026828721
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX153073_001

Référence labo	PM07612173
Date du prélèvement	04/02/2026
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 17 (Espalier)
Remarque concernant le prélèvement	Gris Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	16/02/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	IDS	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Multicolore

Référence échantillon : 002EX153073_002

Référence labo	PM07612174	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 17 (Espalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage mur Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SKE	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX153073_003

Référence labo	PM07612175	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 17 (Espalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SKE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX153073_004

Référence labo	PM07612176	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 17 (Espalier)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SKE	Non détecté
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX153073_005

Référence labo	PM07612177	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 13 (Box 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	IDS	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Multicolore
Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la morphologie.

Référence échantillon : 002EX153073_006

Référence labo	PM07612178	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 13 (Box 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Doublage mur Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SKE	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX153073_007

Référence labo	PM07612179	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 13 (Box 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SKE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX153073_008

Référence labo	PM07612180	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 13 (Box 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SKE	Non détecté	●
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX153073_009

Référence labo	PM07612181	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 13 (Box 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
	4	Matériau Effritable Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX153073_010

Référence labo	PM07612182	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 16 (Cab inf)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	2	2	IDS	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX153073_011

Référence labo	PM07612183	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 21 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX153073_012

Référence labo	PM07612184	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 8 (Cab. 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX153073_013

Référence labo	PM07612185	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 4 (Dev.)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SKE	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX153073_014

Référence labo	PM07612186	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 2 (Soins)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SKE	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Carton / Souple Fibreux / Marron n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX153073_015

Référence labo	PM07612187	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 2 (Soins)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX153073_016

Référence labo	PM07612188	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 2 (Soins)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparative Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX153073_017

Référence labo	PM07612189	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 23 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EX153073_018

Référence labo	PM07612190	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 23 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX153073_019

Référence labo	PM07612191	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gaines et coffre verticaux - Jonction entre panneaux		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 23 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX153073_020

Référence labo	PM07612192	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	11/02/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 23 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	WSN	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX153073_021

Référence labo	PM07612193	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Façades - Murs - Colle de carrelage		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 1 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Gris

Référence échantillon : 002EX153073_022

Référence labo	PM07612194	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 1 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	Muret		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX153073_023

Référence labo	PM07612195	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 1 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX153073_024

Référence labo	PM07612196	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 10 (Attente 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX153073_025

Référence labo	PM07612197	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 10 (Attente 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Faïence Dur Gris, Carton Souple Fibreux Marron

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026828721
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX153073_026

Référence labo	PM07612198	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 5 (Cab. 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Dur Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
2	2	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	IDS	Non détecté	●
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	6	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 2. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse. Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX153073_027

Référence labo	PM07612199	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 6 (Cab. 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SKE	Non détecté	●
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse. Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026828721
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX153073_028

Référence labo	PM07612200	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	04/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	16/02/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Cabinet médical - Vol 7 (Cab. 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	3	Joint Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	1	IDS	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse

La couche Joint / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Faïence Dur Blanc

Référence dossier: RSC012026828721

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 31 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 32/32

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Suppléant Responsable Equipe
Jonathan MARCHAL

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	!0 LUZ SAINT SAUVEUR
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	Cabinet médical
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1997
Fonction du bâtiment :	Etablissement sanitaire (Clinique)

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

Donneur d'ordre :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

Accompagnateur : Médecins

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis FenX (2-1043)
Date de chargement de la source :	01/04/2022
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	01/04/2027
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	04/02/2026
Date du rapport :	04/02/2026
Référence mission :	002EX153073
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	SERGENT NATHAN
Certification n° :	CPDI6701
Délivré le	13/03/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble du bien

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l 'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC : Vol 1 (Extérieur)	RDC : Vol 2 (Soins)
RDC : Vol 3 (Radio)	RDC : Vol 4 (Dev.)
RDC : Vol 5 (Cab. 1)	RDC : Vol 6 (Cab. 2)
RDC : Vol 7 (Cab. 3)	RDC : Vol 8 (Cab. 4)
RDC : Vol 9 (SAS)	RDC : Vol 10 (Attente 1)
RDC : Vol 11 (Accueil)	RDC : Vol 12 (Attente 2)
RDC : Vol 13 (Box 1)	RDC : Vol 14 (Box 2)
RDC : Vol 15 (Box 3)	RDC : Vol 16 (Cab inf)
RDC : Vol 17 (Espalier)	RDC : Vol 18 (Attente 3)
RDC : Vol 19 (Kiné)	RDC : Vol 20 (Repos med.)
RDC : Vol 21 (W.c 1)	RDC : Vol 22 (W.c 2)
Chaufferie : Vol 23 (Chaufferie)	Toiture : Vol 24 (Toiture)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)					
789	C	Mur parpaing (Parpaing)-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
790	B	Mur parpaing (Parpaing)-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
791	A	Mur parpaing (Parpaing)-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
792	D	Mur parpaing (Parpaing)-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
793	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
803	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
805	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Chaufferie - Vol 23 (Chaufferie)					
811	A	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 1 (Extérieur)					
567	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
570	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
571	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
572	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
585	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
586	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
587	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
588	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
765	D	Mur enduit projeté peint-Mur1	Haut Centre	Autre	Crépis	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
766	D	Mur enduit projeté peint-Mur1	Haut Droite	Autre	Crépis	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
767	C	Mur enduit projeté peint-Mur1	Haut Droite	Autre	Crépis	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
768	C	Mur enduit projeté peint-Mur1	Bas Centre	Autre	Crépis	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
769	B	Mur enduit projeté peint-Mur1	Bas Droite	Autre	Crépis	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
770	B	Mur enduit projeté peint-Mur1	Centre Droite	Autre	Crépis	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
771	A	Mur enduit projeté peint-Mur1	Centre Centre	Autre	Crépis	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
772	A	Mur enduit projeté peint-Mur1	Centre Droite	Autre	Crépis	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 1 (Extérieur)					
773	A	Mur enduit projeté peint-Mur2	Centre Centre	Autre	Crépis	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
774	A	Mur enduit projeté peint-Mur2	Centre Gauche	Autre	Crépis	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
775	J	Mur enduit projeté peint-Mur1	Centre Gauche	Autre	Crépis	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
776	J	Mur enduit projeté peint-Mur1	Centre Gauche	Autre	Crépis	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
777	I	Mur enduit projeté peint-Mur1	Centre Centre	Autre	Crépis	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
778	I	Mur enduit projeté peint-Mur1	Centre Gauche	Autre	Crépis	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
779	H	Mur enduit projeté peint-Mur1	Bas Droite	Autre	Crépis	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
780	H	Mur enduit projeté peint-Mur1	Centre Centre	Autre	Crépis	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
781	G	Mur enduit projeté peint-Mur1	Bas Gauche	Autre	Crépis	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
782	G	Mur enduit projeté peint-Mur1	Bas Centre	Autre	Crépis	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
783	F	Mur enduit projeté peint-Mur1	Centre Centre	Autre	Crépis	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
784	F	Mur enduit projeté peint-Mur1	Centre Droite	Autre	Crépis	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
785	E	Mur enduit projeté peint-Mur1	Bas Centre	Autre	Crépis	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
786	E	Mur enduit projeté peint-Mur1	Bas Gauche	Autre	Crépis	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 10 (Attente 1)					
78	G	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	G	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	G	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	H	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	H	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 10 (Attente 1)					
83	H	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
127	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
132	F	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	F	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	F	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
135	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
137	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 10 (Attente 1)					
140	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison2	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
207	I	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	I	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
209	I	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	H	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
286	H	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	H	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	G	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	G	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	G	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 10 (Attente 1)					
359	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
372	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 10 (Attente 1)					
382	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
574	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
575	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
576	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
644	G	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
645	G	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 10 (Attente 1)					
646	G	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
647	G	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
648	G	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
649	G	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
650	G	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
651	G	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
652	G	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
653	G	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
654	H	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
655	H	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
656	H	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
657	H	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
658	H	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
695	I	Faux plafond -Plafond1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
733	H	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
734	H	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
751	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
752	B	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 25

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 11 (Accueil)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 11 (Accueil)					
87	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
90	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
91	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	Q	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	Q	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	Q	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
96	N	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	N	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
98	N	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	O	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	O	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 11 (Accueil)					
101	O	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	L	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	L	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
104	L	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	K	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	K	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
107	K	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	G	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	G	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	G	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
111	F	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	F	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
113	F	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	R	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 11 (Accueil)					
115	R	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
116	R	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	J	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
289	J	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	J	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	H	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	H	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	H	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
294	I	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	I	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	I	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
312	Q	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	Q	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	Q	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 11 (Accueil)					
472	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	L	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	L	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 11 (Accueil)					
513	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	O	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	O	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	A	Faux plafond -Plafond1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 21

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 12 (Attente 2)					
30	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 12 (Attente 2)					
198	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
200	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
321	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
600	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
601	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 12 (Attente 2)					
602	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
603	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
604	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
605	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
606	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
607	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
608	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
699	C	Faux plafond -Plafond1	Centre Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
741	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
742	C	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 13 (Box 1)					
48	E	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	E	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	E	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
213	F	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 13 (Box 1)					
214	F	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	F	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
218	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	F	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	F	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison2	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	F	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison2	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
222	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
225	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
226	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 13 (Box 1)					
327	F	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	F	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	F	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
670	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
671	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
672	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
673	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
693	E	Faux plafond -Plafond1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
731	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
743	E	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
744	E	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 14 (Box 2)					
51	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
230	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
234	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
342	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 14 (Box 2)					
418	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
675	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
676	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
677	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
678	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
690	D	Faux plafond -Plafond1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
745	D	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
746	D	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 15 (Box 3)					
54	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 15 (Box 3)					
237	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
239	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
241	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
680	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
681	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
682	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
683	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
689	D	Faux plafond -Plafond1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
747	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
748	C	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 16 (Cab inf)					
45	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
399	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
590	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
591	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 16 (Cab inf)					
592	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
593	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
594	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
595	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
596	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
597	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
598	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
694	C	Faux plafond -Plafond1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
730	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
739	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
740	C	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 17 (Espalier)					
60	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 17 (Espalier)					
244	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
245	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
348	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
685	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
686	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
687	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 17 (Espalier)					
688	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
691	A	Faux plafond -Plafond1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
749	D	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
750	D	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 18 (Attente 3)					
249	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
250	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
254	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 18 (Attente 3)					
258	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
330	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 18 (Attente 3)					
437	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
692	D	Faux plafond -Plafond1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 19 (Kiné)					
66	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
272	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
274	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 19 (Kiné)					
275	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
665	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
666	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
667	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
668	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
698	A	Faux plafond -Plafond1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
737	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
738	C	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2 (Soins)					
9	E	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	E	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	E	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	F	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	F	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	F	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
175	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
179	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
181	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2 (Soins)					
185	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
303	B	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	B	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	B	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2 (Soins)					
566	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	F	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
640	F	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
641	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
642	F	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
643	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
705	B	Faux plafond -Plafond1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
720	F	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
721	F	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
722	F	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	E	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
761	F	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
762	F	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 20 (Repos med.)					
72	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 20 (Repos med.)					
262	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
264	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
266	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
268	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
450	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 20 (Repos med.)					
659	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
660	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
661	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
662	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
663	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
697	A	Faux plafond -Plafond1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
735	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
736	C	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 21 (W.c 1)					
75	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
278	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 21 (W.c 1)					
281	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
282	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
284	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
453	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	B	Faux plafond -Plafond1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
732	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22 (W.c 2)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22 (W.c 2)					
186	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
188	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
191	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
194	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
196	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22 (W.c 2)					
559	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
723	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 3 (Radio)					
3	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	C	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	C	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	C	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 3 (Radio)					
530	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	A	Faux plafond -Plafond1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
763	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
764	C	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
787	B	Cloison placoplâtre (Feuille de plomb)-Cloison1	Haut Gauche	Autre	Papier peint	2,11 mg/cm²	Non visible	Inconnu
788	A	Cloison placoplâtre (Feuille de plomb)-Cloison1	Bas Gauche	Autre	Papier peint	1,19 mg/cm²	Non visible	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Dev.)					
84	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Dev.)					
541	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	D	Faux plafond -Plafond1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
708	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
710	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
713	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
717	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
718	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
719	D	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
729	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 5 (Cab. 1)					
27	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
120	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
122	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
141	E	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	E	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
143	E	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 5 (Cab. 1)					
315	C	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	C	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	C	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
610	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
611	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
612	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
613	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
614	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
615	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
616	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
617	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 5 (Cab. 1)					
618	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
700	D	Faux plafond -Plafond1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
728	E	Faience brut (Faience)-Faience1	Bas Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
753	D	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
754	D	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 6 (Cab. 2)					
18	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
152	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
156	E	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 6 (Cab. 2)					
157	E	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	E	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
159	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
300	C	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	C	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	C	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
630	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
631	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
632	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 6 (Cab. 2)					
633	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
702	C	Faux plafond -Plafond1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
726	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
757	D	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
758	D	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 7 (Cab. 3)					
15	B	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	B	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	B	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
165	E	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	E	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
167	E	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 7 (Cab. 3)					
169	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	D	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
171	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
173	C	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
635	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
636	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
637	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 7 (Cab. 3)					
638	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
704	A	Faux plafond -Plafond1	Haut Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
725	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Centre	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
759	B	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
760	B	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 8 (Cab. 4)					
21	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	C	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu
145	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	B	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 8 (Cab. 4)					
149	A	Cloison placoplâtres papier peint (Cloison)-Cloison1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
468	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
619	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
620	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
621	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
622	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
623	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
624	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
625	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
626	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
627	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
628	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
701	C	Faux plafond -Plafond1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
727	D	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Gauche	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
755	C	Radiateur (Radiateur)-Radiateur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
756	C	Radiateur (Tuyauterie)-Radiateur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 9 (SAS)					
33	A	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	A	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	A	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	D	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	B	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	B	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	B	Mur doublage placoplâtres (Mur)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	A	Plinthes - tous murs (Plinthes-tous murs)-Plinthes-tous murs1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
577	C	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
578	C	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
579	C	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
580	C	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
581	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
582	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
583	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
584	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.


Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX153073

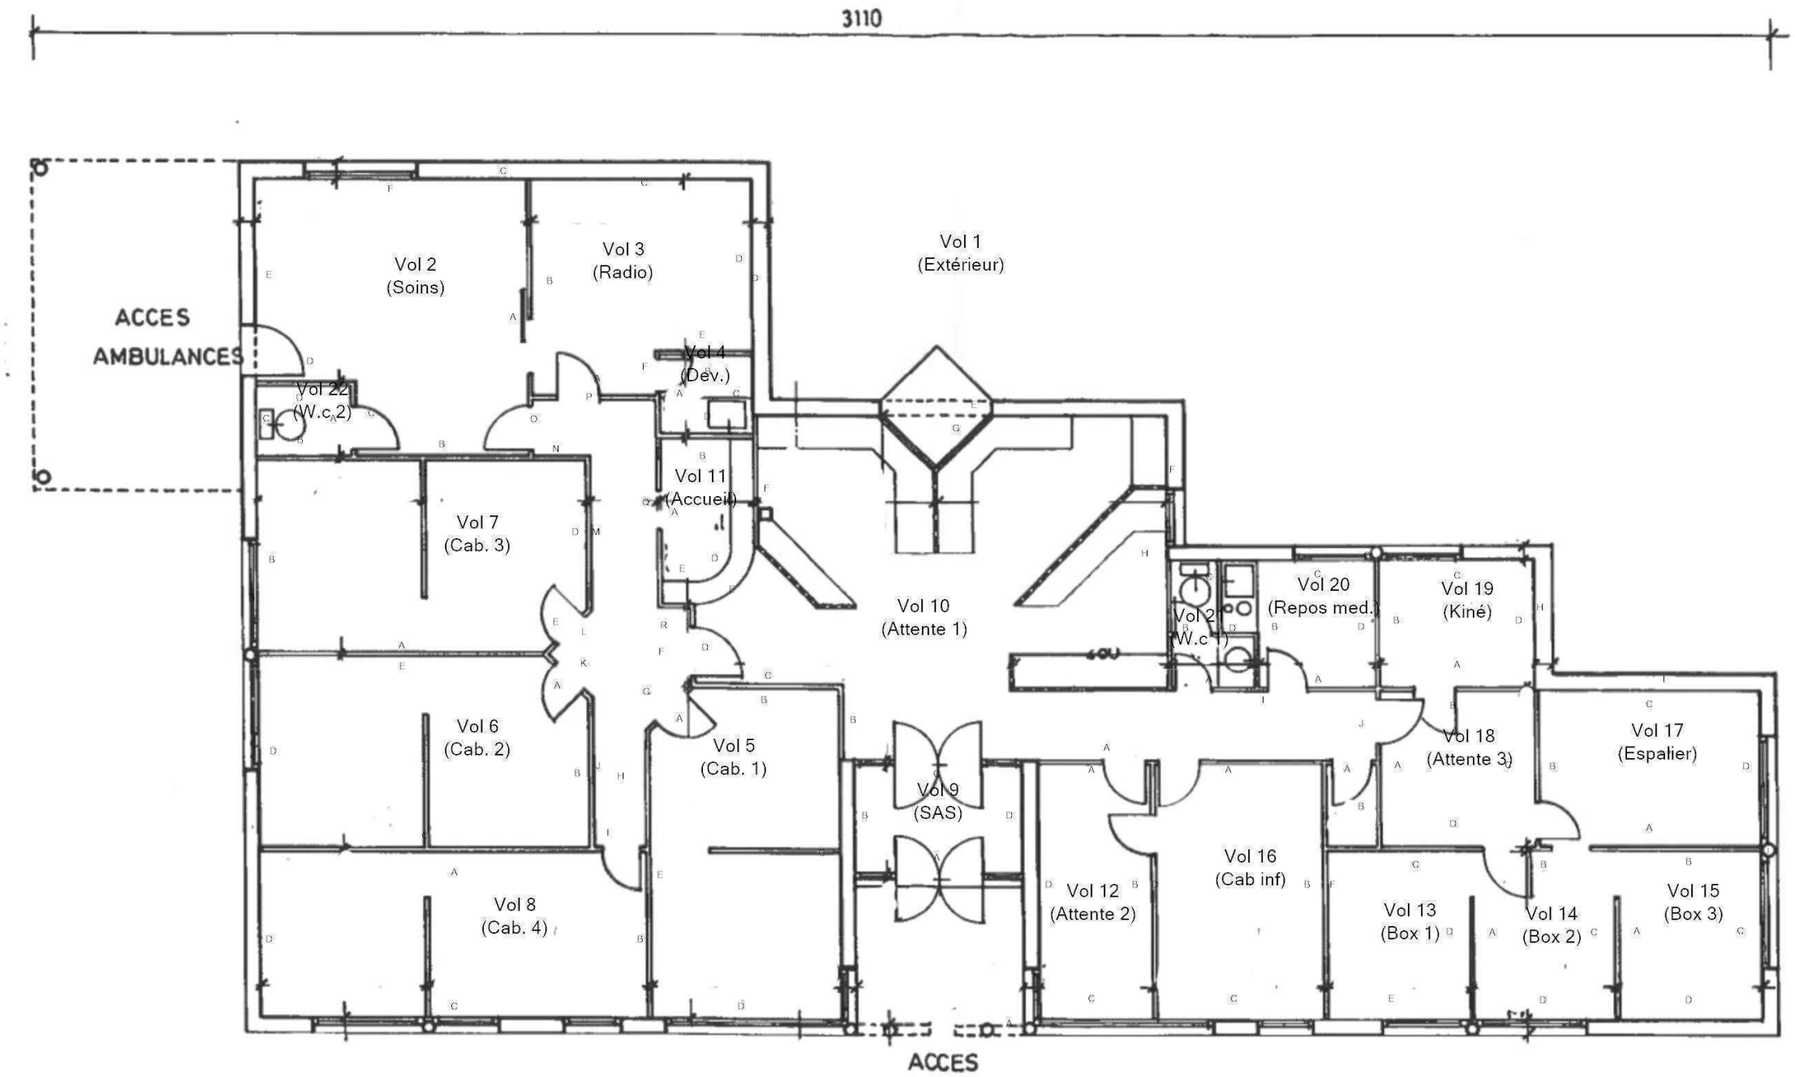


Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR	Cabinet médical	04/02/2026	SERGENT NATHAN

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002EX153073

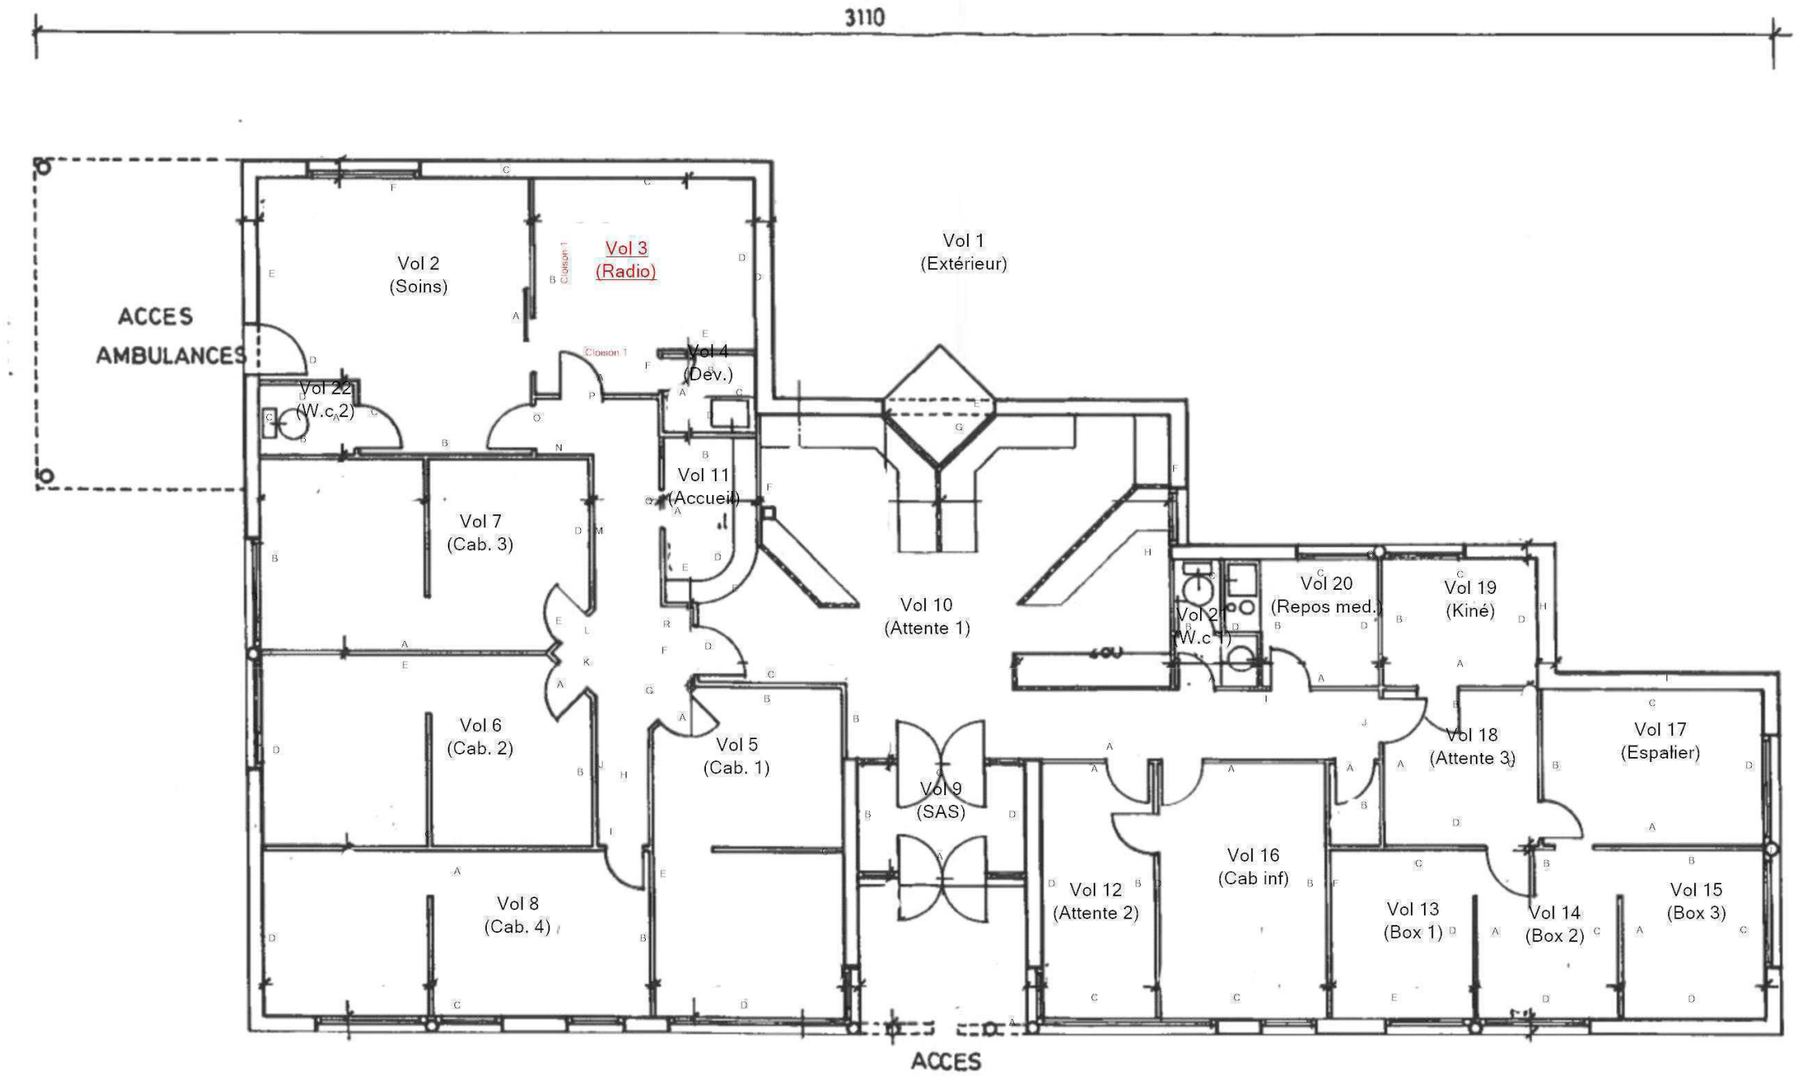


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR	Cabinet médical	04/02/2026	SERGENT NATHAN

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX153073

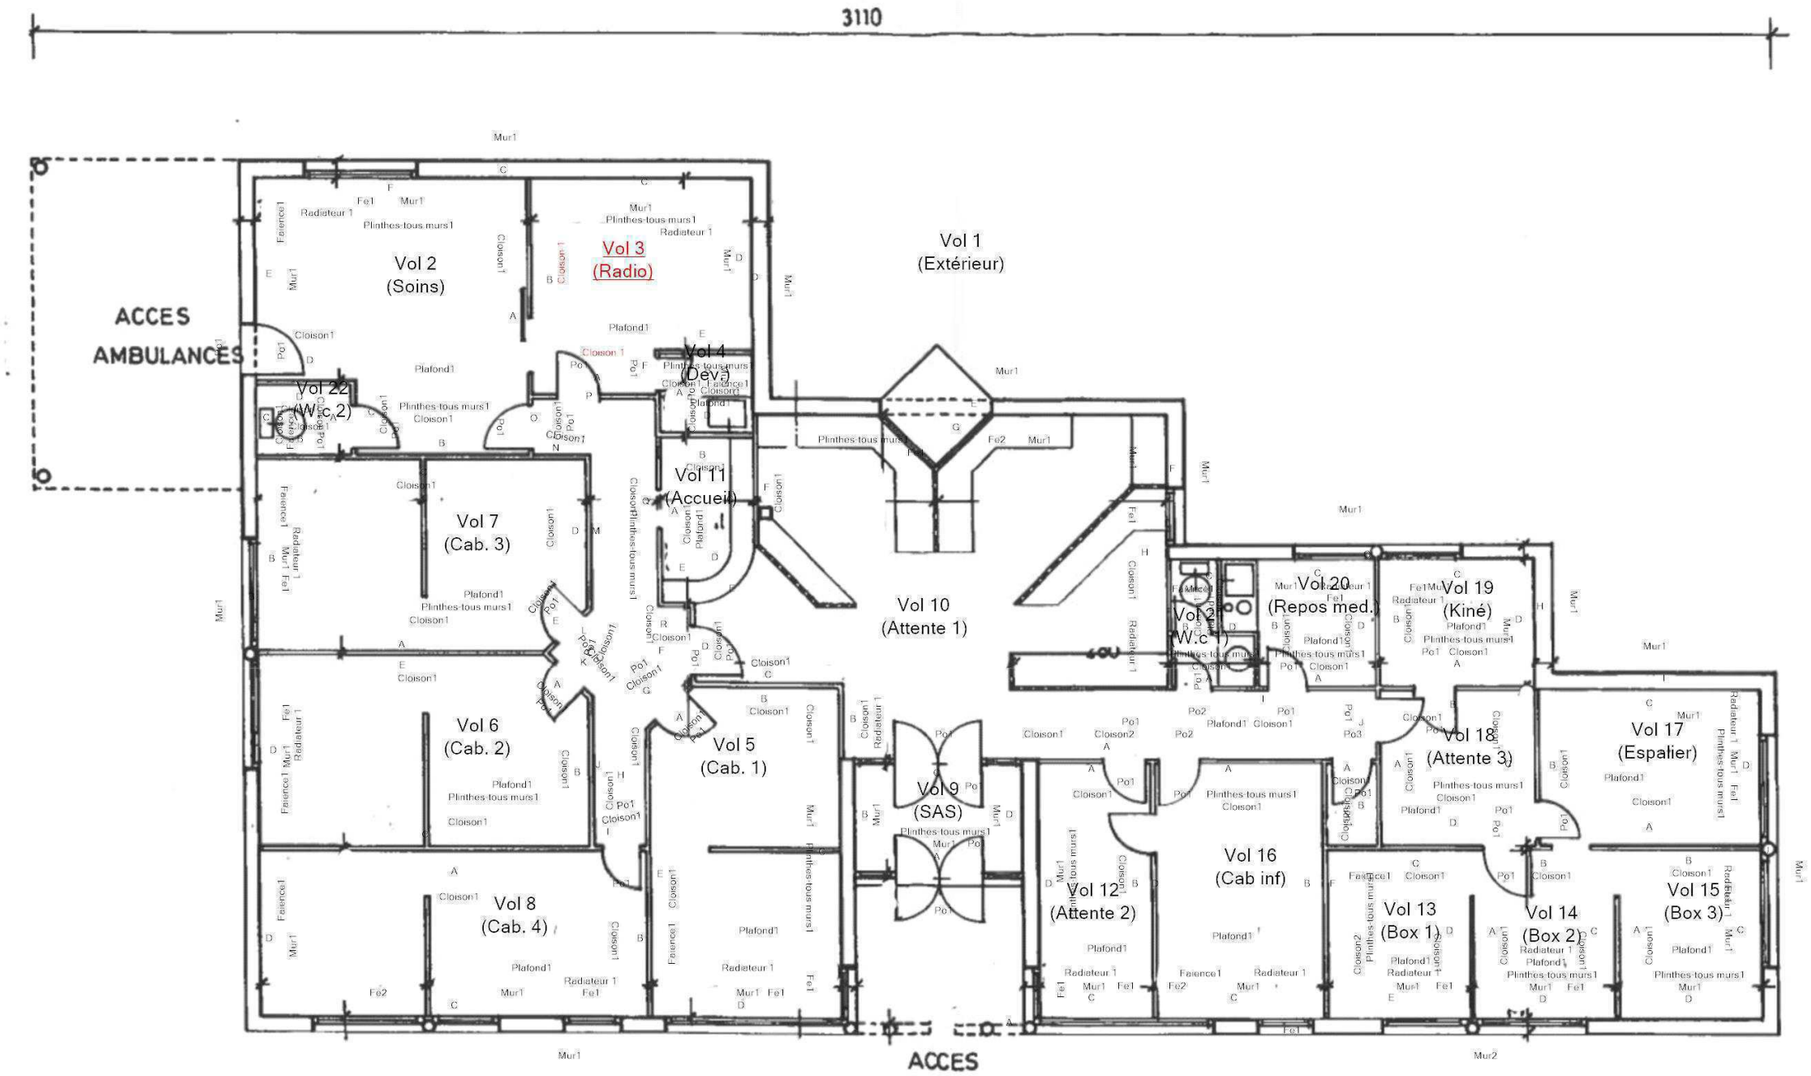

Légende


	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR	Cabinet médical	04/02/2026	SERGENT NATHAN

CHAUFFERIE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX153073

Légende

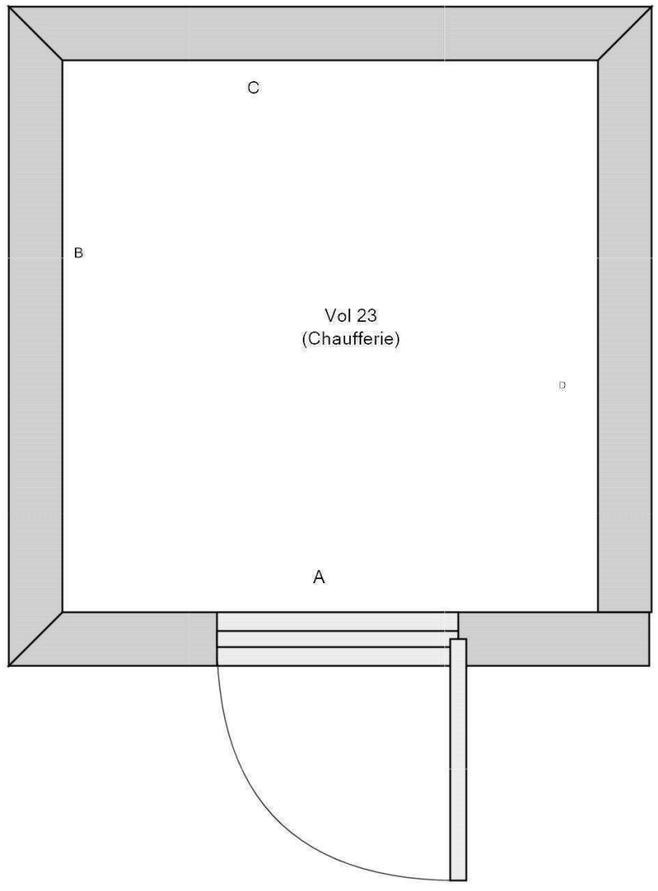





Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR	Cabinet médical	04/02/2026	SERGENT NATHAN

CHAUFFERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX153073

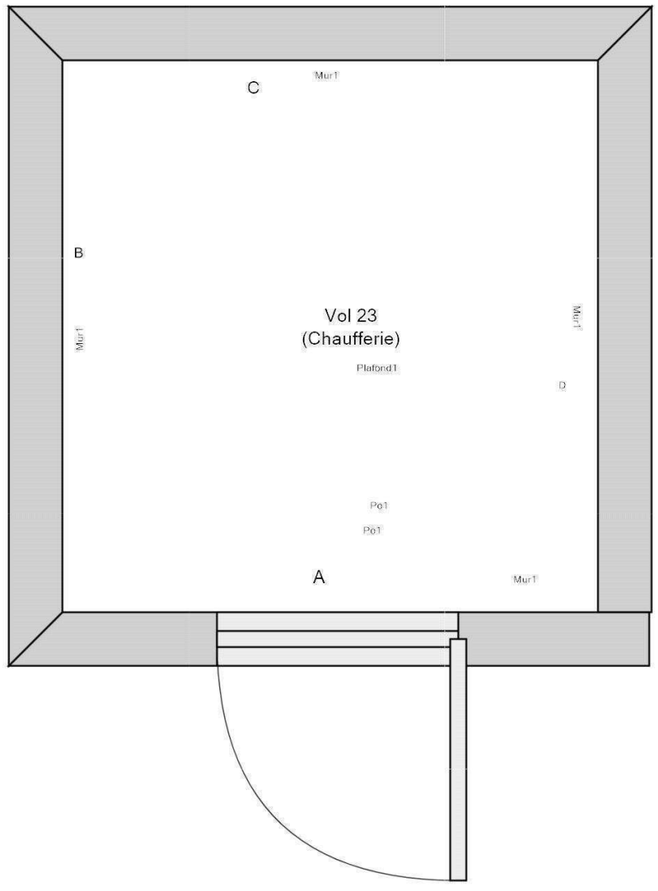



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR	Cabinet médical	04/02/2026	SERGENT NATHAN

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX153073




Légende	

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 AVENUE DU MAOUBESI 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR	Cabinet médical	04/02/2026	SERGENT NATHAN

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

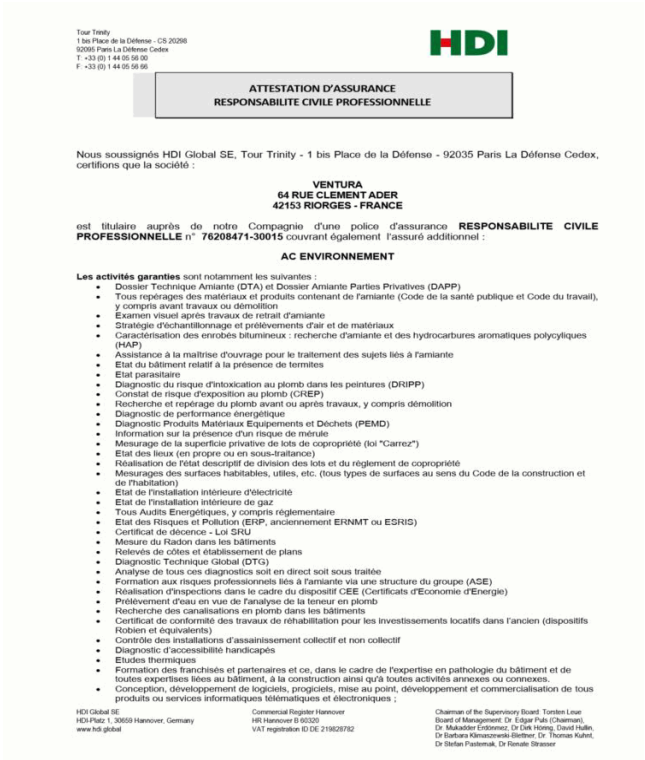

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 58 00
F : +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Dr. Mukaddder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2

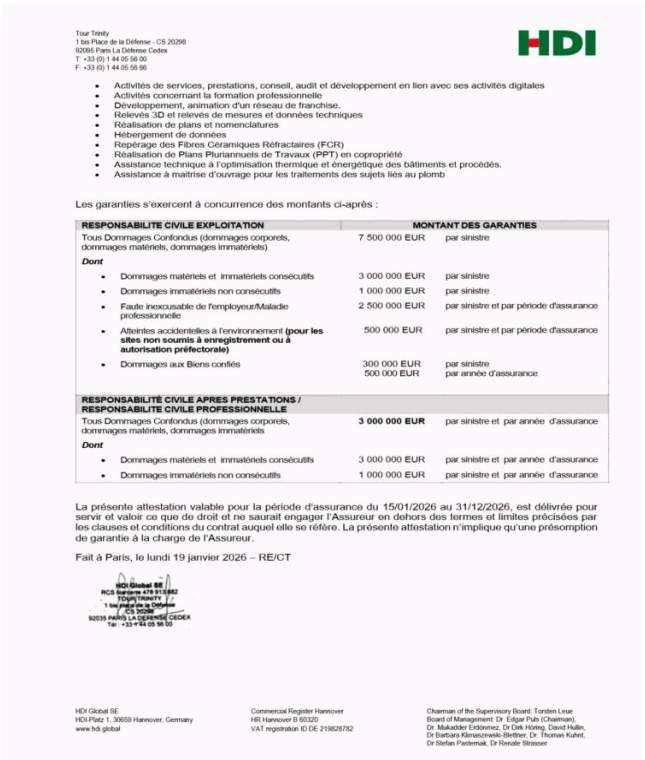

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 58 00
F : +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engagor l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
RCS Nanterre 478 913 882
TOUR TRINITY
1 bis, Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Dr. Mukaddder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6701



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6701 Version 006

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SERGENT Nathan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 31/01/2023 - Date d'expiration : 30/01/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 31/01/2023 - Date d'expiration : 30/01/2030
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 19/03/2024 - Date d'expiration : 18/03/2031
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 19/03/2024 - Date d'expiration : 18/03/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 13/03/2023 - Date d'expiration : 12/03/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 23/10/2023 - Date d'expiration : 22/10/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6701



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6701 Version 006

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SERGENT Nathan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 31/01/2023 - Date d'expiration : 30/01/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 31/01/2023 - Date d'expiration : 30/01/2030
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 19/03/2024 - Date d'expiration : 18/03/2031
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 19/03/2024 - Date d'expiration : 18/03/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 13/03/2023 - Date d'expiration : 12/03/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 23/10/2023 - Date d'expiration : 22/10/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic amiante, électricité, gaz, état et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 23 juillet 2020 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 16 décembre 2020 définissant les critères d'accréditation des opérateurs du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19
