APAVE
AGENCE DE CHERBOURG
19-21 rue Louis Aragon
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE
N° SIRET : 90386907100097

DONNEUR D'ORDRE
UNICAEN
Esplanade de la Paix
14032 CAEN CEDEX
CONTACT : Mme SEPCHAT Marlène

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre **: 3700790.1**
Numéro de contrat : **C26362151**
Numéro de de tâche : **T260630175**
Date d'émission du rapport : **16/10/2026**

Rapport N° :
T260630175 _148928 _UNICAEN _amiante avant travaux


Lieu d'intervention :
Bâtiment UFR
CS 20082
60 rue Max Pol Fouchet
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Destinataire rapport :
UNICAEN

Date d'intervention :
Le **25/09/2026**
Le **01/10/2026**
Le **06/10/2026**

Intervenant : **M. DESCHAMPS Loïc**

Signature :



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 110 pages

APAVE Infrastructures et Construction France
6 rue du Général Audran
92412 COURBEVOIE CEDEX

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	**CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN**	Numéro de Lot :	**/**
		Référence Cadastrale :	**383AD - 0845**
		Date du Permis de Construire :	**Antérieur au 1er juillet 1997**
Étage :	**Sous-sol, Rez de Jardin et Rez de Chaussée**	Date de construction :	**1994-1995**
Bâtiment :	**UFR MEI**		
Nature du bâtiment :	**Bâtiment Universitaire**		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	**UNICAEN**	Nom :	**UNICAEN**
Adresse :	**Esplanade de la Paix 14032 CAEN CEDEX**	Adresse :	**Esplanade de la Paix 14032 CAEN CEDEX**

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	**DESCHAMPS Loïc**	Laboratoire d'Analyses :	**Eurofins Eichrom Amiante**
		Adresse laboratoire :	**Campus de Ker Lann – Parc de Lormandière Rue Maryse Bastié Bât. C 35170 BRUZ**
N° certification :	**21-1537**		
Date d'obtention :	**11/01/2022**	Numéro d'accréditation :	**1-6491**
Organisme :	**ABCIDIA CERTIFICATION**		
Adresse :	**Domaine de St Paul - Bât : A6 – BAL N° 6011 102 route de Limours 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE**	Organisme d'assurance professionnelle :	**Allianz Global Corporate & Specialty SE**
		Adresse assurance :	**1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex**
Date de la commande :	**25/09/2026**	N° de contrat d'assurance :	**FRL003861**
Accompagnateur :	**Le représentant du donneur d'ordre**	Date de validité :	**31/12/2026**

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence : Voir page 106
Nature des travaux envisagés : Modification des locaux du bâtiment UFR dans les niveaux Rez de Jardin et Rez de Chaussée. Installation de CTA et autres. Voir page 102

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Par ailleurs, des références d'analyses (prélèvements et sondages) du rapport **2026-UNICAEN-03-UFR _140986 _UNICAEN _amiante avant travaux** sont intégrés dans ce repérage avant travaux **T260630175 _148928 _UNICAEN _amiante avant travaux**, dans les zones jumelées par les demandes de travaux.

Demande travaux page 106 de ce rapport : *T260630175 _148928 _UNICAEN _amiante avant travaux*
Demande travaux page 24 du rapport : *2026-UNICAEN-03-UFR_140986 _UNICAEN _amiante avant travaux*

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES 2
DESIGNATION DU BATIMENT 2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 2
EXÉCUTION DE LA MISSION 2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT 2

RESULTATS DU REPERAGE 4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 4

INVESTIGATIONS NON REALISEES 9
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE 9
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE 9

COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION 9
OBJECTIF 9
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 9
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 10

PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION 10
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 10
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE 11

RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 14

OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI 14

PRECONISATIONS 15

ANNEXE : CROQUIS 15

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 21

ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSES 70

ANNEXE : TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES 90

ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE 91

ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS 101

ANNEXE : CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE 107

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 108

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS 109

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Absence

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDJ	UF S06	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S004	Z001
		Plinthe doublage	Carrelage vert + colle grise + enduit blanc	Résultat d'analyse (P033)	S053	Z016
		Plinthe doublage	Carrelage vert + colle grise + enduit blanc	Résultat d'analyse (P033 - idem)	S054	Z016
		Mur doublage	Toile fibrée tissée peinte + enduit blanc + béton gris	Résultat d'analyse (P034)	S056	Z017
		Mur porteur	Enduit blanc + béton gris	Résultat d'analyse (P035)	S055	Z020
		Mur porteur	Enduit blanc + béton gris	Résultat d'analyse (P035 - idem)	S062	Z020
		Mur doublage	Toile fibrée tissée peinte + enduit blanc + béton gris	Résultat d'analyse (P034 - idem)	S063	Z017
		Jointement entre plafond et doublage	Plâtre blanc	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S064	Z021
		Jointement entre plafond et doublage	Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S073	Z023
		Sol	Carrelage vert + colle grise	Document consulté	S080	Z025
		Cloison	Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P036 - idem)	S079	Z019
		Sol	Carrelage vert + colle grise	Document consulté	S081	Z025
		Allège doublage	Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P037 - idem)	S089	Z018
		Plénum	Latte métallique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	/	/
		Sol	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S092	Z029

RDJ	UF S13	Sol	Carrelage gris + colle grise	Résultat d'analyse (P003)	S012	Z003
		Sol	Colle grise/ noire + ragréage gris + enduit blanc	Résultat d'analyse (P004)	S014	Z004
		Sol	Colle grise/ noire + ragréage gris + enduit blanc	Résultat d'analyse (P005)	S015	Z004
		Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S005	Z001
		Mur doublage	Peinture blanche + papier marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P016)	S030	Z022
		Plinthe doublage	Colle grise + carrelage gris + papier marron	Résultat d'analyse (P017)	S031	Z024
		Jointement entre plafond et doublage	Plâtre blanc	Résultat d'analyse (P018)	S032	Z021
		Plinthe doublage	Peinture blanche + colle grise + carrelage gris	Résultat d'analyse (P019)	S033	Z024
		Mur doublage	Toile fibrée tissée peinte + papier marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P020)	S034	Z022
		Jointement entre plafond et doublage	Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P021)	S035	Z023
		Mur doublage	Peinture blanche + papier marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S070	Z022
		Jointement entre plafond et doublage	Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S071	Z023
		Jointement entre plafond et doublage	Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S072	Z023
		Sol	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S093	Z029
RDJ	UF S05	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S006	Z001
		Sol	Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S010	Z002
		Jointement entre plafond et doublage	Plâtre blanc	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S065	Z021
		Jointement entre plafond et doublage	Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S074	Z023
		Cloison	Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P036 - idem)	S088	Z019
RDJ	UF S05	Sol	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S094	Z029

RDJ	UF S03	Sol	Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc	Résultat d'analyse (P006)	S003	Z002
		Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S007	Z001
		Jointement entre plafond et doublage	Plâtre blanc	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S066	Z021
		Jointement entre plafond et doublage	Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S075	Z023
		Cloison	Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P036 - idem)	S087	Z019
		Allège doublage	Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P037 - idem)	S090	Z018
		Sol	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S095	Z029
Extérieur	Hall RDC	Sol	Pax alu + revêtement bitumineux noire fibrée	Résultat d'analyse (P007)	S018	Z006
		Etanchéité toit terrasse	Revêtement bitumineux noir	Résultat d'analyse (P012)	S021	Z007
		Etanchéité toit terrasse	Toile fibrée marron	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S023	Z008
		Etanchéité toit terrasse	Colle noire + mousse jaune dure	Résultat d'analyse (P013)	S025	Z009
		Etanchéité toit terrasse	Colle noire épaisse	Résultat d'analyse (P014)	S027	Z010
		Etanchéité solin alu	Joint souple blanc	Résultat d'analyse (P015)	S028	Z011
		Angle mur	Peinture blanche + béton gris ragrée	Document consulté	S083	Z026
		Angle mur	Peinture bleue + enduit gris + béton gris ragrée	Document consulté	S082	/
		Isolation casquette préau	Flocage fibre blanche	Document consulté	S084	Z027
Extérieur	Pignon Ouest	Murs	Peinture blanche souple	Résultat d'analyse (P032)	S052	Z028
Sous-sol	Sous-sol	Plafond	Béton gris ragrée	Document consulté	S016	Z005
		Plafond	Béton gris ragrée	Document consulté	S017	Z005
RDJ	UF S04	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z001
		Sol	Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc	Résultat d'analyse (P002)	S002	Z002
		Cloison	Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P039)	S060	Z019

RDJ	UF S04	Cloison	Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P040)	S061	Z019
		Jointement entre plafond et doublage	Plâtre blanc	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S067	Z021
		Jointement entre plafond et doublage	Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S076	Z023
		Allège doublage	Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P037 - idem)	S091	Z018
		Sol	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S096	Z029
RDJ	UF S07	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S008	Z001
		Sol	Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S011	Z002
		Cloison	Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P036)	S057	Z019
		Allège doublage	Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P037)	S058	Z018
		Cloison	Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P038)	S059	Z019
		Jointement entre plafond et doublage	Plâtre blanc	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S068	Z021
		Jointement entre plafond et doublage	Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S077	Z023
		Sol	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S097	Z029
RDJ	UF S10	Sol	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S042	Z013
		Mur	Peinture + béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P029 - idem)	S046	Z014
		Plafond jointement dalle	Peinture + béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S050	Z015
		Porte d'entrée	Peinture grise	Document consulté	S099	Z030
RDJ	UF S11	Sol	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S043	Z013
		Mur	Peinture + béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P029 - idem)	S047	Z014
		Plafond jointement dalle	Peinture + béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P031 - idem)	S051	Z015

RDJ	UF S11	Porte d'entrée	Peinture grise	Document consulté	S100	Z030
RDJ	UF S12	Sol	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P028)	S041	Z013
		Mur	Peinture + béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P029)	S045	Z014
		Mur doublage	Peinture + papier marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P030)	S048	/
		Plafond jointement dalle	Peinture + béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P031)	S049	Z015
		Porte d'entrée	Peinture grise	Document consulté	S101	Z030
RDJ	UF S14	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S009	Z001
		Sol	Carrelage gris + colle grise	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S013	Z003
		Sol	Carrelage beige + colle grise	Résultat d'analyse (P022)	S036	/
		Sol	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P024)	S038	Z029
		Plinthe cloison	Carrelage beige + colle grise + papier marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P023)	S039	/
		Cloison	Bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P025)	S040	Z012
		Cloison	Bande calicot marron + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P026)	S037	Z012
		Mur cloison	Toile tissée fibrée peinte + enduit blanc	Résultat d'analyse (P027)	S044	/
		Jointement entre plafond et doublage	Plâtre blanc	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S069	Z021
		Jointement entre plafond et doublage	Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S078	Z023
RDJ	UF S43	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S110	Z001
RDJ	UF S44	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S105	Z001
RDJ	UF S45	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S108	Z001
RDJ	UF S46	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S104	Z001
RDJ	UF S47	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S111	Z001
RDJ	UF S48	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S103	Z001
RDJ	UF S49	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S102	Z001
RDJ	UF S50	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S106	Z001

RDJ	UF S51	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S107	Z001
RDJ	UF S52	Plafond	Béton gris ragrée	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S108	Z001
Extérieur	Conféren-ce RDC	Sol	Pax alu + revêtement bitumineux noire fibrée	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S019	Z006
		Etanchéité toit terrasse	Revêtement bitumineux noir + toile fibrée marron	Résultat d'analyse (P008)	S020	Z007
		Etanchéité toit terrasse	Toile fibrée marron	Résultat d'analyse (P009)	S022	Z008
		Etanchéité toit terrasse	Colle noire + toile marron fibrée + mousse jaune dure	Résultat d'analyse (P010)	S024	Z009
		Etanchéité toit terrasse	Colle noire épaisse	Résultat d'analyse (P011)	S026	Z010
		Etanchéité solin alu	Joint souple blanc	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S029	Z011
		Mur	Peinture blanche + béton gris ragrée	Document consulté	S085	Z026
Extérieur	Conféren-ce RDC	Isolation casquette préau	Flocage fibre blanche	Document consulté	S086	Z027
		Porte d'entrée	Peinture grise	Document consulté	S098	Z030

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
25/09/2026	Visite + intervention
01/10/2026	Visite + intervention
06/10/2026	Visite + intervention

Documents remis :

Titre	Date	Auteur / Société
Demande de repérage travaux	21/09/2026	UNICAEN / Mme SEPCHAT

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc.), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : *Le rapport contient des repérages et analyses venant du rapport 2026-UNICAEN-03-UFR_140986_UNICAEN_Amiante avant travaux.*
Ces repérages sont dans les même zones définie par le programme travaux de Repérage Amiante. « Demande travaux du projet d'aménagement intérieur du bâtiment UFR ».

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION


5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre


Référence du programme de travaux : Voir page 102 et 106
Nature des travaux envisagés : Modification des locaux du bâtiment UFR dans les niveaux Rez de Jardin et Rez de Chaussée. Installation de CTA et autres.



Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDJ	 UF S06	**OUI**	
RDJ	 UF S13	**OUI**	
RDJ	 UF S05	**OUI**	

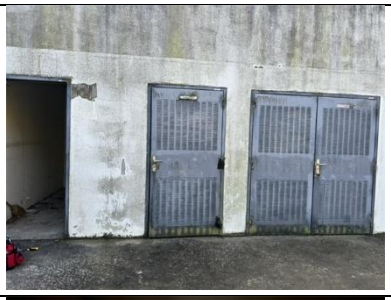RDJ	 UF S03	**OUI**	
Extérieur	 Hall RDC	**OUI**	
Extérieur	 Pignon Ouest	**OUI**	
Sous-sol	 Sous-sol	**OUI**	
RDJ	 UF S04	**OUI**	
RDJ	 UF S07	**OUI**	
RDJ	UF S43	**OUI**	
RDJ	UF S45	**OUI**	
RDJ	UF S49	**OUI**	
RDJ	UF S48	**OUI**	

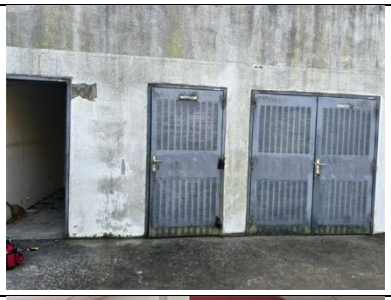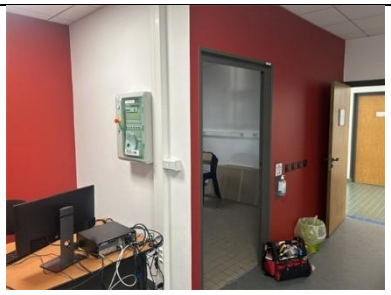RDJ	UF S46	**OUI**	
RDJ	UF S44	**OUI**	
RDJ	 UF S10	**OUI**	
RDJ	 UF S11	**OUI**	
RDJ	 UF S12	**OUI**	
RDJ	 UF S14	**OUI**	
Extérieur	 Conférence RDC	**OUI**	
RDJ	UF S50	**OUI**	
RDJ	UF S51	**OUI**	
RDJ	UF S52	**OUI**	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi-indépendante, pare-vapeur	P	
	Colles, produits d'accrochage	M	
2 – Parois verticales intérieures			
Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	M	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Bandes calicot	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Colles non bitumineuses	M	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE : CROQUIS

Page suivante

Client :	UNICAEN	Titre :	Plan prélèvements
N° rapport :	T260630175 _148928 _UNICAEN _amiante avant travaux		CS 20082
N° planche :	1/5 Version : 0	Lieu d'intervention :	60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Type :	Planche de repérage usuel en plan		
Date :	16/10/2026	Bâtiment :	UFR MEI
Intervenant :	DESCHAMPS Loïc	Etage :	Rez De Jardin
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	/

Planche de repérage

Légende :

Prélèvement négatif


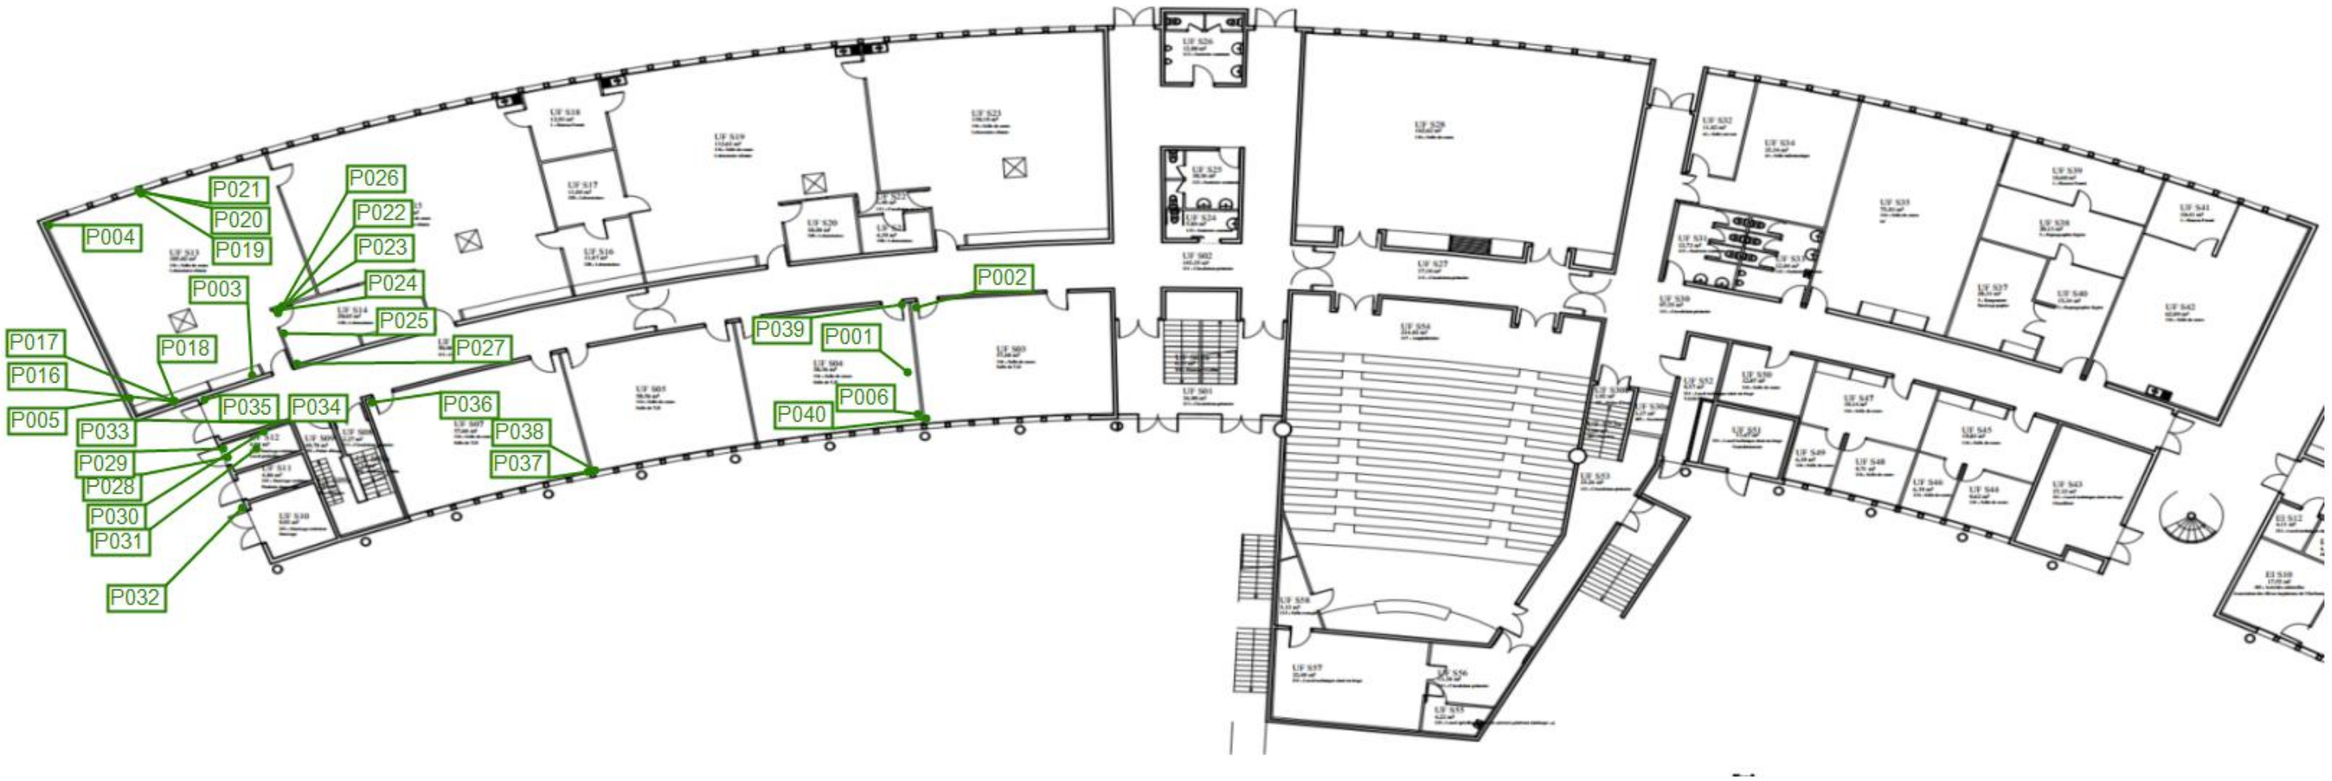


Planche de repérage

Légende :

Prélèvement négatif

Client :	UNICAEN	Titre :	Plan prélèvements
N° rapport :	T260630175 _148928 _UNICAEN _amiante avant travaux		CS 20082
N° planche :	2/5 Version : 0	Lieu d'intervention :	60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Type :	Planche de repérage usuel en plan		
Date :	16/10/2026	Bâtiment :	UFR MEI
Intervenant :	DESCHAMPS Loïc	Etage :	Rez De Chaussée
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	Ajout de résultat issu du rapport 2026-UNICAEN-03-UFR_UNICAEN amiante avant travaux

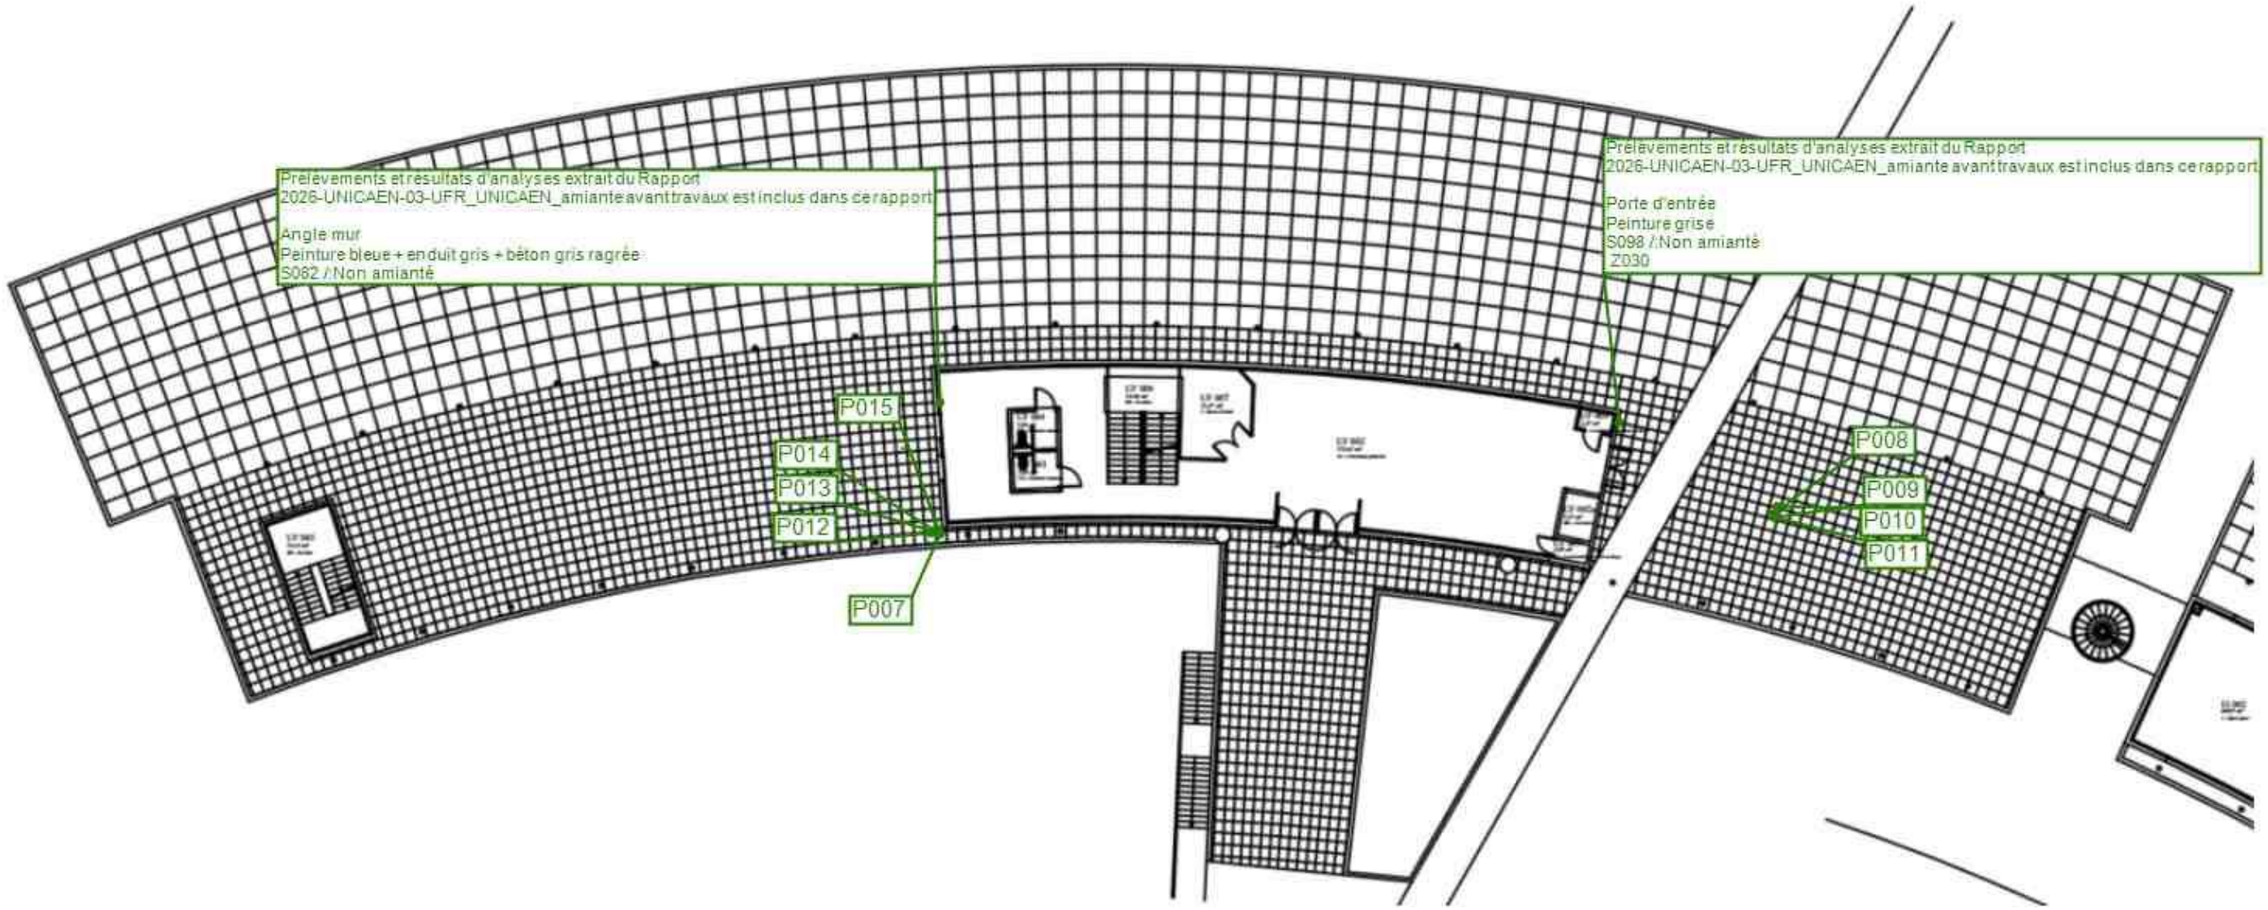

Client :	UNICAEN	Titre :	Plan sous-sol
N° rapport :	T260630175 _148928 _UNICAEN _amiante avant travaux		CS 20082
N° planche :	3/5 Version : 0	Lieu d'intervention :	60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Type :	Planche de repérage usuel en plan et photo		
Date :	16/10/2026	Bâtiment :	UFR MEI
Intervenant :	DESCHAMPS Loïc	Etage :	Sous-Sol
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	Ajout des prélèvements et sondages issu du rapport 2026-UNICAEN-03-UFR_UNICAEN amiante avant travaux

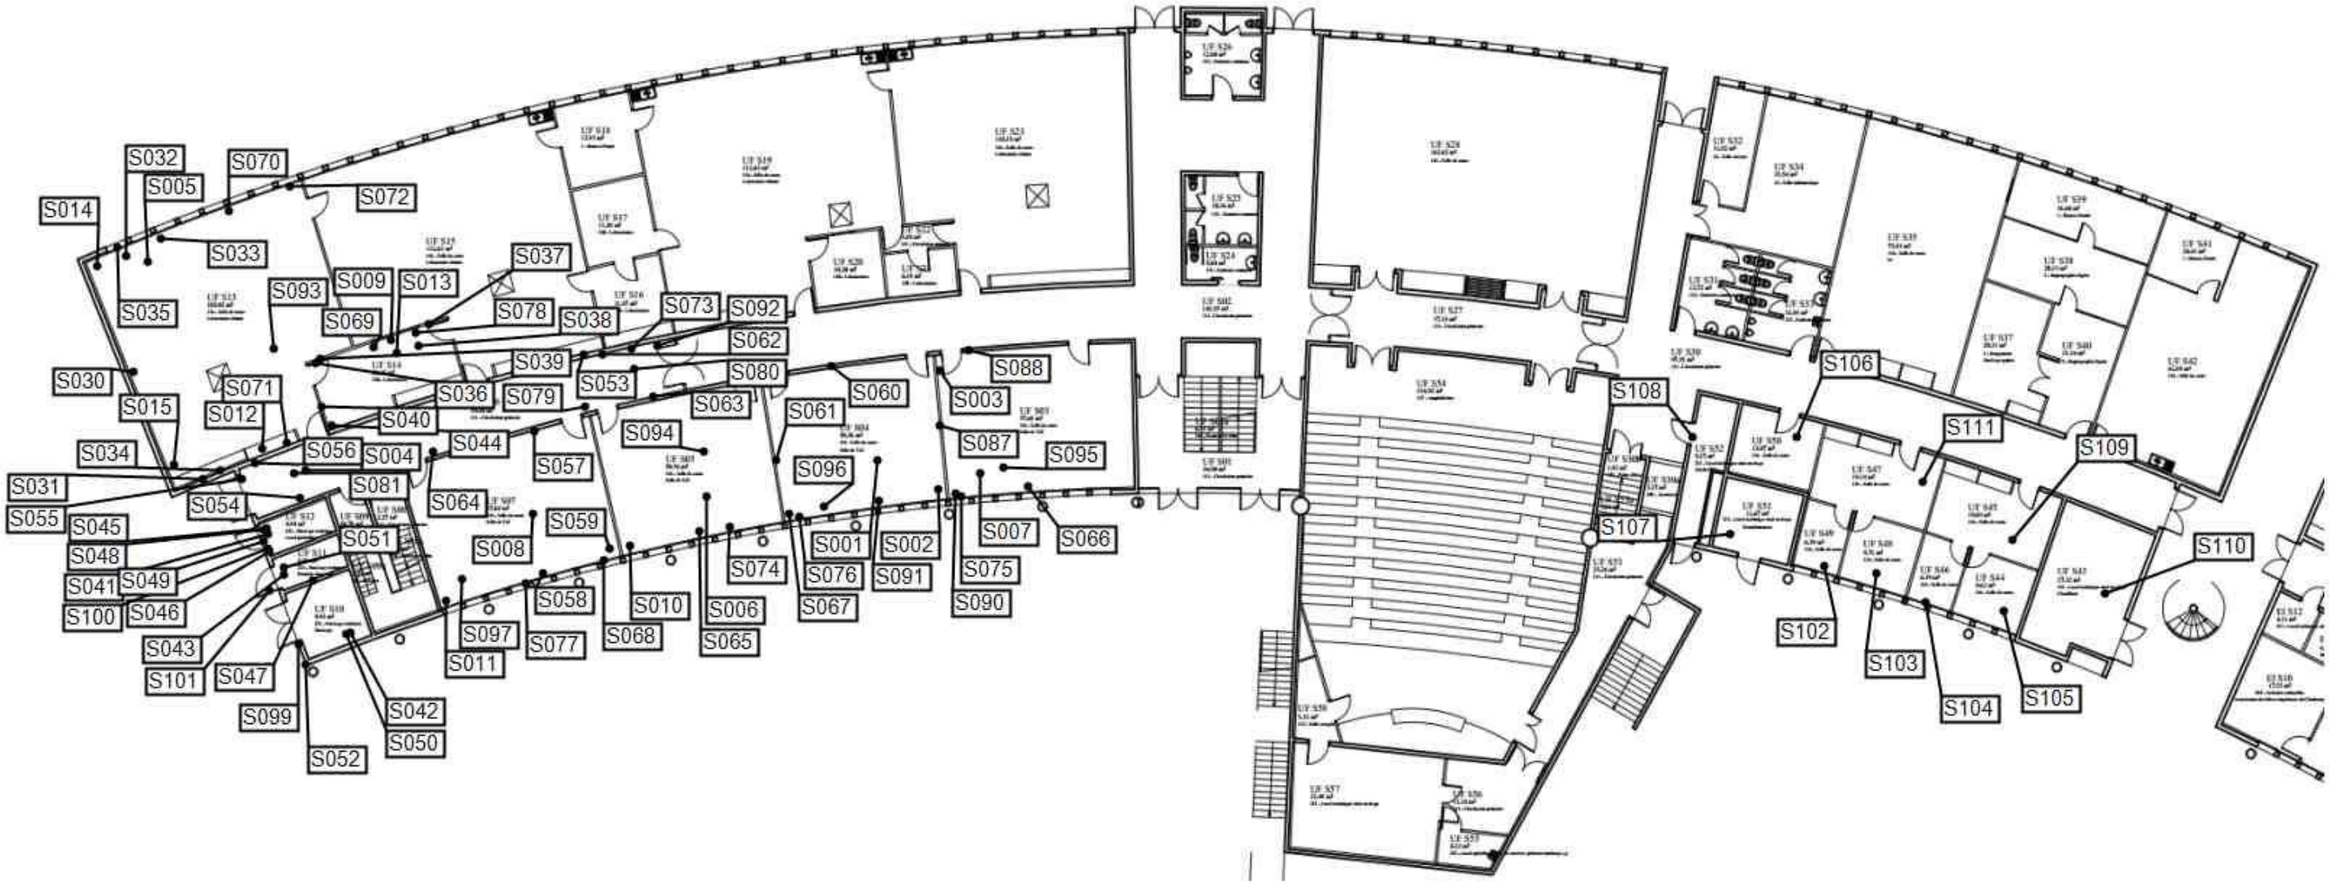


Planche de repérage

Client :	UNICAEN	Titre :	Plan sondages
N° rapport :	T260630175 _148928 _UNICAEN _amiante avant travaux		CS 20082
N° planche :	4/5 Version : 0	Lieu d'intervention :	60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Type :	Planche de repérage usuel en plan		
Date :	16/10/2026	Bâtiment :	UFR MEI
Intervenant :	DESCHAMPS Loïc	Etage :	Rez De Jardin
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	/

Légende :

Sondage




Client :	UNICAEN	Titre :	Plan sondages
N° rapport :	T260630175 _148928 _UNICAEN _amiante avant travaux		CS 20082
N° planche :	5/5 Version : 0	Lieu d'intervention :	60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Type :	Planche de repérage usuel en plan et photo		
Date :	16/10/2026	Bâtiment :	UFR MEI
Intervenant :	DESCHAMPS Loïc	Etage :	Rez De Chaussée
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	Ajout des sondages issu du rapport 2026-UNICAEN-03-UFR_UNICAEN amiante avant travaux

Planche de repérage

Légende :

Sondage

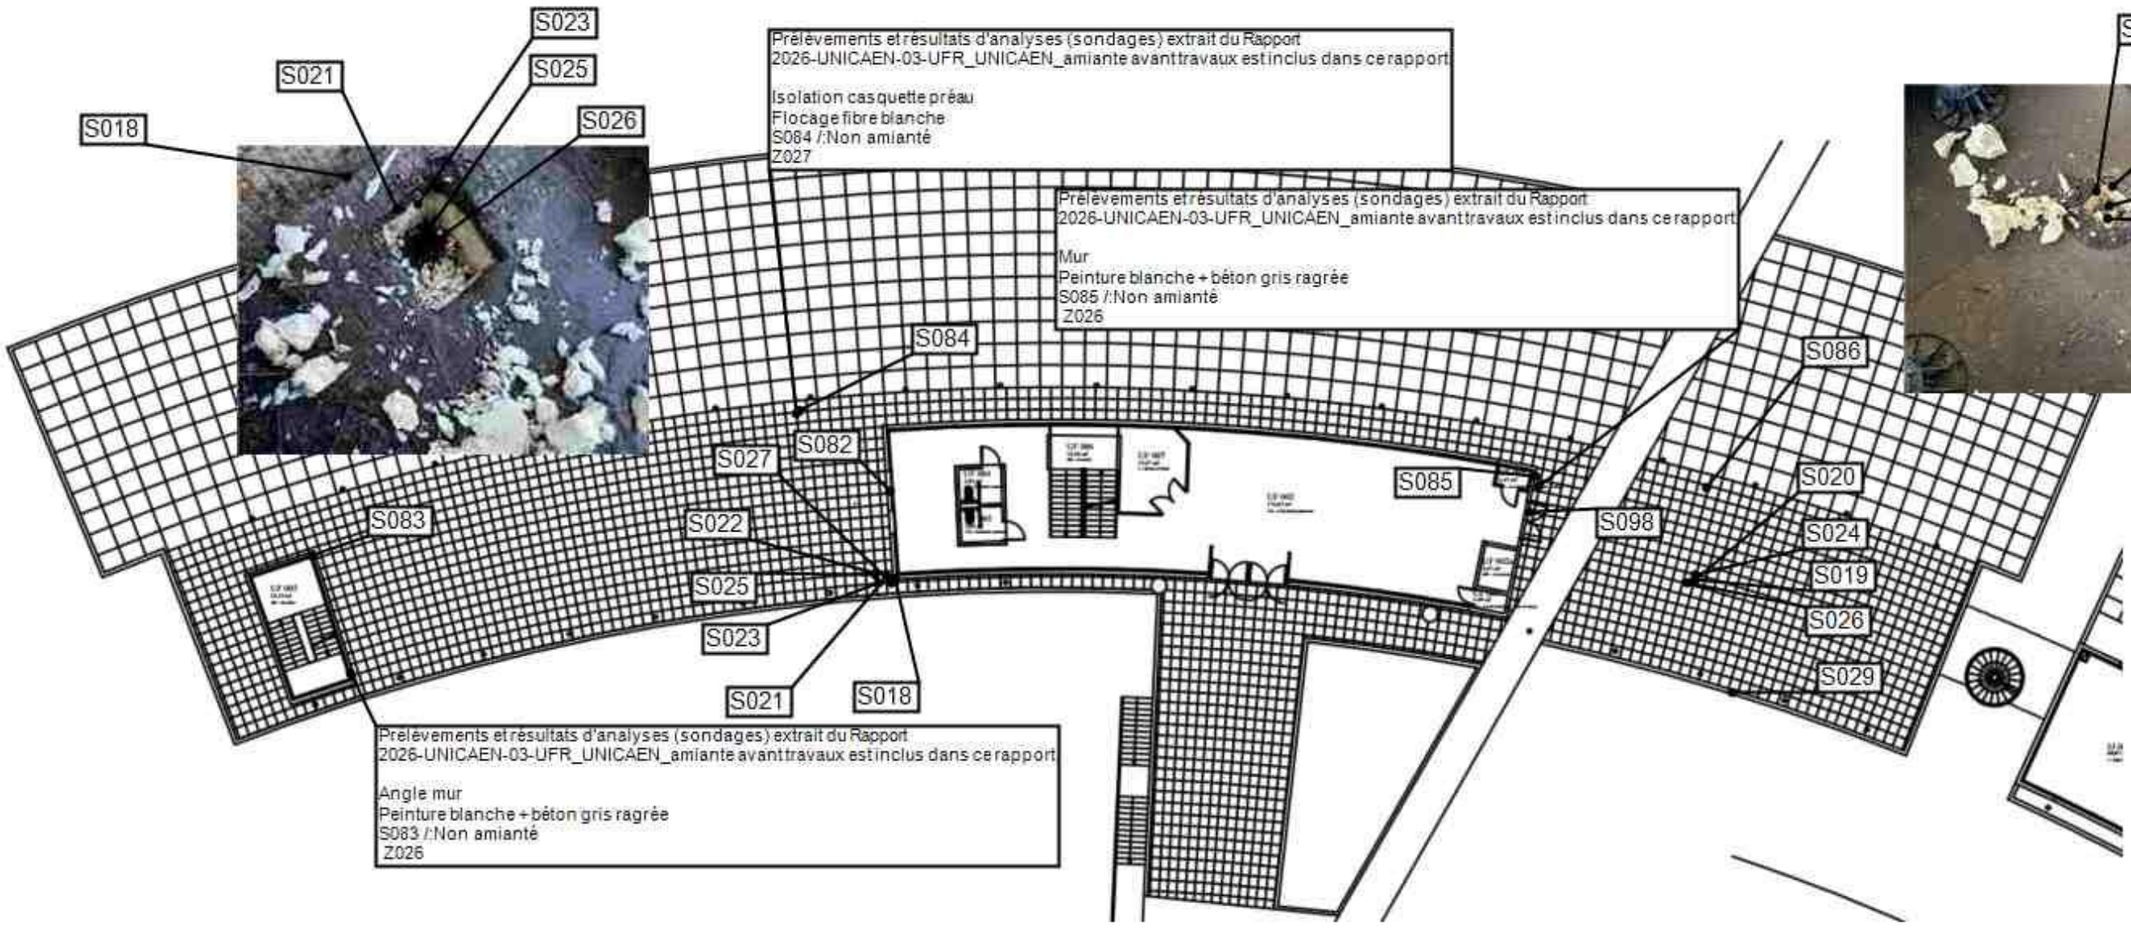

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Sol

Matériau / Produit	**Carrelage vert + colle grise**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	RDJ - UF S06	**Référence du sondage**	S080
Localisation	Sol - Sol		

ELEMENT : Porte d'entrée


Matériau / Produit	**Peinture grise**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	RDJ - UF S11	**Référence du sondage**	S100
Localisation	Porte d'entrée - Murs		

ELEMENT : Mur

Matériau / Produit	**Peinture + béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	RDJ - UF S11	**Référence du sondage**	S047
Localisation	Mur - Murs		

ELEMENT : Sol

Matériau / Produit	**Béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	RDJ - UF S11	**Référence du sondage**	S043
Localisation	Sol - Sol		

ELEMENT : Porte d'entrée

Matériau / Produit	**Peinture grise**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	RDJ - UF S10	**Référence du sondage**	S099
Localisation	Porte d'entrée - Murs		

ELEMENT : Plafond jointement dalle

Matériau / Produit	**Peinture + béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	RDJ - UF S10	**Référence du sondage**	S050
Localisation	Plafond jointement dalle - Plafond		

ELEMENT : Mur

Matériau / Produit	**Peinture + béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	RDJ - UF S10	**Référence du sondage**	S046
Localisation	Mur - Murs		

ELEMENT : Sol


Matériau / Produit	**Béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	RDJ - UF S10	**Référence du sondage**	S042
Localisation	Sol - Sol		

ELEMENT : Plénum

Matériau / Produit	Latte métallique
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE

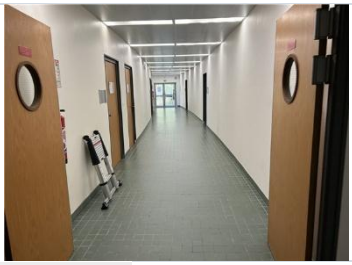Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	Nom de l'opérateur	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDJ - UF S06	Référence du sondage	
Localisation	Plénum - Plafond		

ELEMENT : Sol

Matériau / Produit	Carrelage vert + colle grise
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	Nom de l'opérateur	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDJ - UF S06	Référence du sondage	S081
Localisation	Sol - Sol		

ELEMENT : Isolation casquette préau

Matériau / Produit	**Flocage fibre blanche**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	Extérieur - Conférence RDC	**Référence du sondage**	S086
Localisation	Isolation casquette préau - Toiture		

ELEMENT : Plafond

Matériau / Produit	**Béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	Sous-sol - Sous-sol	**Référence du sondage**	S017
Localisation	Plafond - Plafond		

ELEMENT : Plafond

Matériau / Produit	**Béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	Sous-sol - Sous-sol	**Référence du sondage**	S016
Localisation	Plafond - Plafond		

ELEMENT : Isolation casquette préau

Matériau / Produit	**Flocage fibre blanche**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	Extérieur - Hall RDC	**Référence du sondage**	S084
Localisation	Isolation casquette préau - Toiture		

ELEMENT : Angle mur

Matériau / Produit	Peinture bleue + enduit gris + béton gris ragrée
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	Nom de l'opérateur	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	Date de prélèvement	
Pièce ou local	Extérieur - Hall RDC	Référence du sondage	S082
Localisation	Angle mur - Murs		

ELEMENT : Angle mur

Matériau / Produit	Peinture blanche + béton gris ragrée
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	Nom de l'opérateur	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	Date de prélèvement	
Pièce ou local	Extérieur - Hall RDC	Référence du sondage	S083
Localisation	Angle mur - Murs		

ELEMENT : Porte d'entrée


Matériau / Produit	**Peinture grise**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	Extérieur - Conférence RDC	**Référence du sondage**	S098
Localisation	Porte d'entrée - Murs		

ELEMENT : Plafond

Matériau / Produit	**Béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

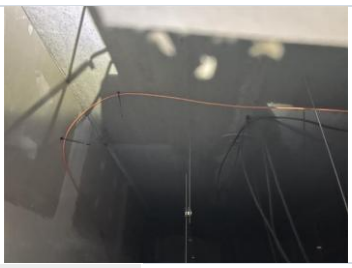Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	
Pièce ou local	RDJ - UF S03	**Référence du sondage**	S007
Localisation	Plafond - Plafond		

PRELEVEMENT : P001

Matériau / Produit	**Béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S04	**Référence du sondage**	S001
Localisation	Plafond - Plafond		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Béton gris ragrée



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT


Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039204-01	Matériau dur de type béton (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039204-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P002

Matériau / Produit	**Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

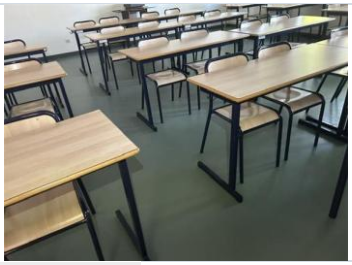Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S04	**Référence du sondage**	S002
Localisation	Sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT


Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039204-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) (fibreux)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039204-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P003

Matériau / Produit	**Carrelage gris + colle grise**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S13	**Référence du sondage**	S012
Localisation	Sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Carrelage gris + colle grise



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039204-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type colle (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039204-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P004

Matériau / Produit	**Colle grise/ noire + ragréage gris + enduit blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S13	**Référence du sondage**	S014
Localisation	Sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle grise/ noire + ragréage gris + enduit blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT


Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039204-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (gris) + (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039204-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P005

Matériau / Produit	**Colle grise/ noire + ragréage gris + enduit blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

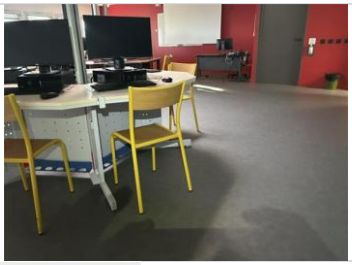Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S13	**Référence du sondage**	S015
Localisation	Sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle grise/ noire + ragréage gris + enduit blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT


Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039204-01	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (gris) + (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039204-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P006

Matériau / Produit	**Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S03	**Référence du sondage**	S003
Localisation	Sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039204-01	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (jaune) (fibreux)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039204-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P007

Matériau / Produit	**Pax alu + revêtement bitumineux noire fibrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	Extérieur - Hall RDC	**Référence du sondage**	S018
Localisation	Sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Pax alu + revêtement bitumineux noire fibrée



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039171-01	Matériau semi-dur (bitumineux) (beige) (fibreux)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039171-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P008

Matériau / Produit	**Revêtement bitumineux noir + toile fibrée marron**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	Extérieur - Conférence RDC	**Référence du sondage**	S020
Localisation	Etanchéité toit terrasse - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Revêtement bitumineux noir + toile fibrée marron



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (marron)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P009

Matériau / Produit	**Toile fibrée marron**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	Extérieur - Conférence RDC	**Référence du sondage**	S022
Localisation	Etanchéité toit terrasse - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Toile fibrée marron



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	Matériau de type maillage de fibres (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P010

Matériau / Produit	**Colle noire + toile marron fibrée + mousse jaune dure**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	Extérieur - Conférence RDC	**Référence du sondage**	S024
Localisation	Etanchéité toit terrasse - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle noire + toile marron fibrée + mousse jaune dure



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	Matériau de type mousse (jaune)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P011

Matériau / Produit	**Colle noire épaisse**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	Extérieur - Conférence RDC	**Référence du sondage**	S026
Localisation	Etanchéité toit terrasse - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle noire épaisse



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P012

Matériau / Produit	**Revêtement bitumineux noir**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	Extérieur - Hall RDC	**Référence du sondage**	S021
Localisation	Etanchéité toit terrasse - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Revêtement bitumineux noir



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	Matériau souple bitumineux (noir)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P013

Matériau / Produit	**Colle noire + mousse jaune dure**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	Extérieur - Hall RDC	**Référence du sondage**	S025
Localisation	Etanchéité toit terrasse - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle noire + mousse jaune dure



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P014

Matériau / Produit	**Colle noire épaisse**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	Extérieur - Hall RDC	**Référence du sondage**	S027
Localisation	Etanchéité toit terrasse - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle noire épaisse



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-039891-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P015

Matériau / Produit	**Joint souple blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	Extérieur - Hall RDC	**Référence du sondage**	S028
Localisation	Etanchéité solin alu - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Joint souple blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple de type joint (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P016

Matériau / Produit	**Peinture blanche + papier marron + plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement




Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S13	**Référence du sondage**	S030
Localisation	Mur doublage - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture blanche + papier marron + plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P017

Matériau / Produit	**Colle grise + carrelage gris + papier marron**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S13	**Référence du sondage**	S031
Localisation	Plinthe doublage - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle grise + carrelage gris + papier marron



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) + (gris) (foncé)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P018

Matériau / Produit	**Plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S13	**Référence du sondage**	S032
Localisation	Jointement entre plafond et doublage - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P019

Matériau / Produit	**Peinture blanche + colle grise + carrelage gris**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S13	**Référence du sondage**	S033
Localisation	Plinthe doublage - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture blanche + colle grise + carrelage gris



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) + (gris) (foncé)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P020

Matériau / Produit	**Toile fibrée tissée peinte + papier marron + plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S13	**Référence du sondage**	S034
Localisation	Mur doublage - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Toile fibrée tissée peinte + papier marron + plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc) (transparent)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
002-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P021

Matériau / Produit	**Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S13	**Référence du sondage**	S035
Localisation	Jointement entre plafond et doublage - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées


DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P022

Matériau / Produit	**Carrelage beige + colle grise**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement

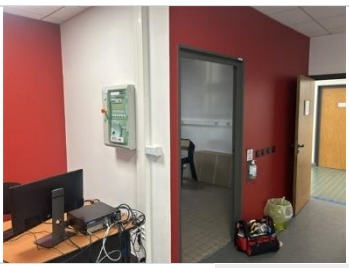

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S14	**Référence du sondage**	S036
Localisation	Sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Carrelage beige + colle grise



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) en traces ; matériau (beige)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées


DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P023

Matériau / Produit	**Carrelage beige + colle grise + papier marron + plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement

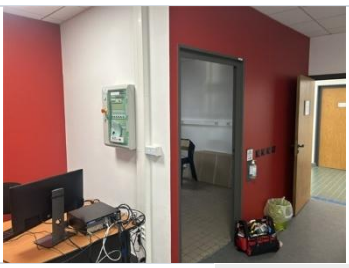

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S14	**Référence du sondage**	S039
Localisation	Plinthe cloison - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Carrelage beige + colle grise + papier marron + plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées


DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P024

Matériau / Produit	**Béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement

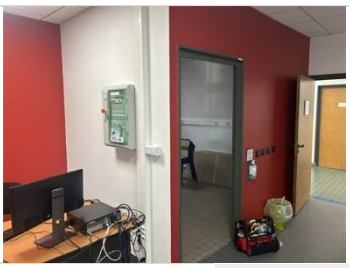

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S14	**Référence du sondage**	S038
Localisation	Sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet
Béton gris ragrée



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau dur de type béton (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées


DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P025

Matériau / Produit	**Bande calicot marron + plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement

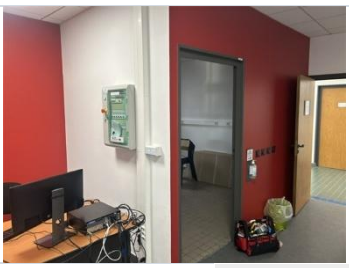

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S14	**Référence du sondage**	S040
Localisation	Cloison - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Bande calicot marron + plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées


DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P026

Matériau / Produit	**Bande calicot marron + plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement

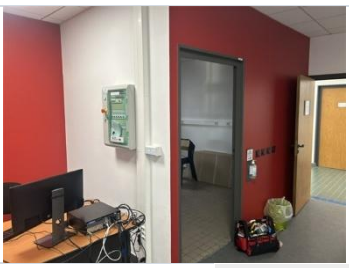

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S14	**Référence du sondage**	S037
Localisation	Cloison - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Bande calicot marron + plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées


DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P027

Matériau / Produit	**Toile tissée fibrée peinte + enduit blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement

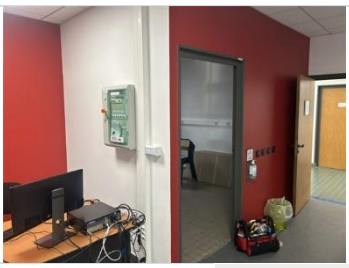

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S14	**Référence du sondage**	S044
Localisation	Mur cloison - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Toile tissée fibrée peinte + enduit blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige) (clair) ; matériau de type peinture (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type tresse de fibres (blanc) (transparent)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P028

Matériau / Produit	**Béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S12	**Référence du sondage**	S041
Localisation	Sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Béton gris ragrée



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau dur de type béton (gris) (clair) + (noir)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P029

Matériau / Produit	**Peinture + béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S12	**Référence du sondage**	S045
Localisation	Mur - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture + béton gris ragrée



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type béton (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P030

Matériau / Produit	**Peinture + papier marron + plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S12	**Référence du sondage**	S048
Localisation	Mur doublage - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture + papier marron + plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P031

Matériau / Produit	**Peinture + béton gris ragrée**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S12	**Référence du sondage**	S049
Localisation	Plafond jointement dalle - Plafond		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture + béton gris ragrée



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type béton (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P032

Matériau / Produit	**Peinture blanche souple**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	Extérieur - Pignon Ouest	**Référence du sondage**	S052
Localisation	Murs - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture blanche souple



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) en traces	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées


DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P033

Matériau / Produit	**Carrelage vert + colle grise + enduit blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement

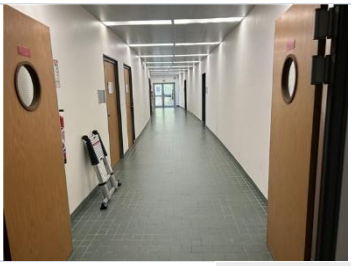

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S06	**Référence du sondage**	S053
Localisation	Plinthe doublage - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Carrelage vert + colle grise + enduit blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées


DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P034

Matériau / Produit	**Toile fibrée tiissée peinte + enduit blanc + béton gris**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement

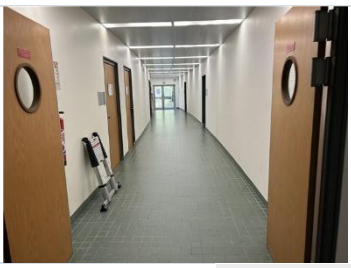

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S06	**Référence du sondage**	S056
Localisation	Mur doublage - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Toile fibrée tissée peinte + enduit blanc + béton gris



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type béton (gris) en traces	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc) (transparent)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées


DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P035

Matériau / Produit	**Enduit blanc + béton gris**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement

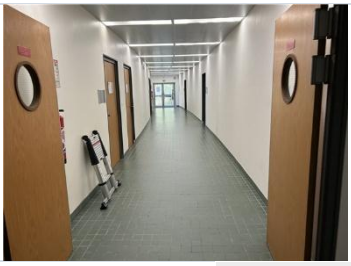

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S06	**Référence du sondage**	S055
Localisation	Mur porteur - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Enduit blanc + béton gris



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type béton (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P036

Matériau / Produit	**Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S07	**Référence du sondage**	S057
Localisation	Cloison - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P037

Matériau / Produit	**Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S07	**Référence du sondage**	S058
Localisation	Allège doublage - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P038

Matériau / Produit	**Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S07	**Référence du sondage**	S059
Localisation	Cloison - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P039

Matériau / Produit	**Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S04	**Référence du sondage**	S060
Localisation	Cloison - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

PRELEVEMENT : P040

Matériau / Produit	**Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc**
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client	UNICAEN	**Nom de l'opérateur**	DESCHAMPS Loïc
Numéro de dossier	T260630175	**Date de prélèvement**	25/09/2026
Pièce ou local	RDJ - UF S04	**Référence du sondage**	S061
Localisation	Cloison - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**
001-COUCHE	AR-26-SE-040497-01	**Fibres d'amiante non détectées**

ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Bordereau d'analyse AR-26-RI-047154-01

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

Eurofins Eichrom Amiante Laboratoire
Analyses Eichrom
Campus de Ker Lann, Rue Maryse Bastié,
Rue Maryse Bastié - Bât. C France
35170 Bruz

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-047154-01
Référence laboratoire N° : 26RI046134
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Date d'émission de rapport : 10/07/2026 21:40
Référence de suivi du dossier N° : 26SE018547
Date de réception :06/07/2026
Page1/33
Référence dossier Client:26SE018547 - 2026-UNICAEN-03-UFR A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26SE018547-001 - P001-Sous sol - Sous-sol - Plafond - Sous face - Béton gris ragrée	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26SE018547-002 - P002-Sous sol - Sous-sol - Plafond - Sous face - Béton gris ragrée	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26SE018547-003 - P003-RDJ - UF S06 - Sol - Sol - Carrelage vert + colle grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	26SE018547-004 - P004-RDJ - UF S06 - Sol - Sol - Béton gris ragrée	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (vert) en traces	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

PV_00720260901938560

eichrom LABORATOIRES amiante
membre du réseau eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Loïc DESCHAMPS
19 Rue Louis Aragon
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-039204-01 — Date d'émission de rapport : 02/10/2026 13:44 — Page1/3
Dossier N° : 26SE026841 — Date de réception : 28/09/2026 — Date d'analyse : 29/09/2026
Référence dossier Client:
148928 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDJ - UF S04 - Plafond - Plafond - Bétotn gris ragrée	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	P002-RDJ - UF S04 - Sol - Sol - Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) (fibreux)	MET * / ZIZ7	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDJ - UF S13 - Sol - Sol - Carrelage gris + colle grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type colle (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-RDJ - UF S13 - Sol - Sol - Colle grise/ noire + ragréage gris + enduit blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (gris) + (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / ZIZ7	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eichrom LABORATOIRES omicrons membre du réseau eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-039204-01 — Date d'émission de rapport : 02/10/2026 13:44 — Page2/3
Dossier N° : 26SE026841 — Date de réception : 28/09/2026 — Date d'analyse : 29/09/2026
Référence dossier Client:
148928 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	P005-RDJ - UF S13 - Sol - Sol - Colle grise/ noire + ragréage gris + enduit blanc	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (gris) + (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / ZIZ7	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDJ - UF S03 - Sol - Sol - Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (jaune) (fibreux)	MET * / ZIZ7	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

PV_00720260901938475

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-039204-01 | Date d'émission de rapport : 02/10/2026 13:44 | Page3/3
Dossier N° : 26SE026841 | Date de réception : 28/09/2026 | Date d'analyse : 29/09/2026
Référence dossier Client:
148928 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Nolwen VASLIN
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

eichrom LABORATOIRES ominorte
membre du réseau
eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Loïc DESCHAMPS
19 Rue Louis Aragon
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-039171-01 | Date d'émission de rapport : 02/10/2026 8:44 | Page1/2
Dossier N° : 26SE026838 | Date de réception : 28/09/2026 | Date d'analyse : 29/09/2026
Référence dossier Client:
148928 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P007-Extérieur - Préau RDC - Sol - Sol - Pax alu + révêtement bitumineux noire fibrée	Matériau semi-dur (bitumineux) (beige) (fibreux)	MET * / ZIZ7	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eichrom LABORATOIRES omicrons
membre du réseau
eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-039171-01 | Date d'émission de rapport : 02/10/2026 8:44 | Page2/2
Dossier N° : 26SE026838 | Date de réception : 28/09/2026 | Date d'analyse : 29/09/2026
Référence dossier Client:
148928 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN



Nolwen VASLIN
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

PV_00720261001943135

eichrom LABORATOIRES amionte
membre du réseau
eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Loïc DESCHAMPS
19 Rue Louis Aragon
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-039891-01 — Date d'émission de rapport : 08/10/2026 12:59 — Page1/3
Dossier N° : 26SE027537 — Date de réception : 02/10/2026 — Date d'analyse : 06/10/2026
Référence dossier Client:
148928 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P008-Extérieur - Conférence RDC - Sol - Etanchéité toit terrasse - Revêtement bitumineux noir + toile fibrée marron	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (marron)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	P009-Extérieur - Conférence RDC - Sol - Etanchéité toit terrasse - Toile fibrée marron	Matériau de type maillage de fibres (marron)	**MOLP** * / HWXN	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P010-Extérieur - Conférence RDC - Sol - Etanchéité toit terrasse - Colle noire + toile marrron fibrée + mousse jaune dure	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (jaune)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eichrom LABORATOIRES omicronte membre du réseau eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-039891-01 — Date d'émission de rapport : 08/10/2026 12:59 — Page2/3
Dossier N° : 26SE027537 — Date de réception : 02/10/2026 — Date d'analyse : 06/10/2026
Référence dossier Client:
148928 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P011-Extérieur - Conférence RDC - Sol - Etanchéité toit terrasse - Colle noire épaisse	Matériau de type colle bitumineux (noir)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	P012-Extérieur - Hall RDC - Sol - Etanchéité toit terrasse - Revêtement bitumineux noir	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P013-Extérieur - Hall RDC - Sol - Etanchéité toit terrasse - Colle noire + mousse jaune dure	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P014-Extérieur - Hall RDC - Sol - Etanchéité toit terrasse - Colle noire épaisse	Matériau de type colle bitumineux (noir)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) Des fibres minérales asbestiformes susceptibles d'être inhalées (l < 3 µm) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres, de nature asbestiforme, sont de type fibre de verre et ont pu être différenciées de fibres d'amiante via leurs propriétés optiques.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-039891-01 | Date d'émission de rapport : 08/10/2026 12:59 | Page3/3
Dossier N° : 26SE027537 | Date de réception : 02/10/2026 | Date d'analyse : 06/10/2026
Référence dossier Client:
148928 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, arrêté du 1er octobre 201 Analyse réalisée d
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tifenn GOUIN
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

PV_00720261001946875

eichrom LABORATOIRES amionte
membre du réseau
eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Loïc DESCHAMPS
19 Rue Louis Aragon
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-040497-01 — Date d'émission de rapport : 13/10/2026 21:29 — Page1/9
Dossier N° : 26SE027934 — Date de réception : 07/10/2026 — Date d'analyse : 12/10/2026
Référence dossier Client:
T260630175 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P015-Extérieur - Hall RDC - Murs - Etanchéité solin alu - Joint souple blanc	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	P016-RDJ - UF S13 - Murs - Mur doublage - Peinture blanche + papier marron + plâtre blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P017-RDJ - UF S13 - Murs - Plinthe doublage - Colle grise + carrelage gris + papier marron	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) + (gris) (foncé)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	**MOLP** * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eichrom LABORATOIRES omionte
membre du réseau
eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-040497-01 | Date d'émission de rapport : 13/10/2026 21:29 | Page2/9
Dossier N° : 26SE027934 | Date de réception : 07/10/2026 | Date d'analyse : 12/10/2026
Référence dossier Client:
T260630175 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P018-RDJ - UF S13 - Murs - Jointement entre plafond et doublage - Plâtre blanc	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	P019-RDJ - UF S13 - Murs - Plinthe doublage - Peinture blanche + colle grise + carrelage gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) + (gris) (foncé)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	P020-RDJ - UF S13 - Murs - Mur doublage - Toile fibrée tissée peinte + papier marron + plâtre blanc	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc) (transparent)(ii)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eichrom LABORATOIRES omicrons membre du réseau eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-040497-01 | Date d'émission de rapport : 13/10/2026 21:29 | Page3/9
Dossier N° : 26SE027934 | Date de réception : 07/10/2026 | Date d'analyse : 12/10/2026
Référence dossier Client:
T260630175 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007 (1)	P021-RDJ - UF S13 - Murs - Jointement entre plafond et doublage - Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
008	P022-RDJ - UF S14 - Sol - Sol - Carrelage beige + colle grise	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) en traces ; matériau (beige)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P023-RDJ - UF S14 - Murs - Plinthe cloison - Carrelage beige + colle grise + papier marron + plâtre blanc	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (gris)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P024-RDJ - UF S14 - Sol - Sol - Béton gris ragrée	Matériau dur de type béton (gris)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eichrom LABORATOIRES ominorte
membre du réseau
eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-040497-01 — Date d'émission de rapport : 13/10/2026 21:29 — Page4/9
Dossier N° : 26SE027934 — Date de réception : 07/10/2026 — Date d'analyse : 12/10/2026
Référence dossier Client:
T260630175 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P025-RDJ - UF S14 - Murs - Cloison - Bande calicot marron + plâtre blanc	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
012	P026-RDJ - UF S14 - Murs - Cloison - Bande calicot marron + plâtre blanc	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P027-RDJ - UF S14 - Murs - Mur cloison - Toile tissée fibrée peinte + enduit blanc	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige) (clair) ; matériau de type peinture (blanc)(i)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type tresse de fibres (blanc) (transparent)(ii)	**MOLP** * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P028-RDJ - UF S12 - Sol - Sol - Béton gris ragrée					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eichrom LABORATOIRES omicrons membre du réseau eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-040497-01 | Date d'émission de rapport : 13/10/2026 21:29 | Page5/9
Dossier N° : 26SE027934 | Date de réception : 07/10/2026 | Date d'analyse : 12/10/2026
Référence dossier Client:
T260630175 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type béton (gris) (clair) + (noir)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	P029-RDJ - UF S12 - Murs - Mur - Peinture + béton gris ragrée	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type béton (gris)	MET * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P030-RDJ - UF S12 - Murs - Mur doublage - Peinture + papier marron + plâtre blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
017	P031-RDJ - UF S12 - Plafond - Plafond jointement dalle - Peinture + béton gris ragrée	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type béton (gris)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eichrom LABORATOIRES omicronte
membre du réseau eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-040497-01 | Date d'émission de rapport : 13/10/2026 21:29 | Page6/9
Dossier N° : 26SE027934 | Date de réception : 07/10/2026 | Date d'analyse : 12/10/2026
Référence dossier Client:
T260630175 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018 (1)	P032-Extérieur - Pignon Ouest - Murs - Murs - Peinture blanche souple	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) en traces	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	P033-RDJ - UF S06 - Murs - Plinthe doublage - Carrelage vert + colle grise + enduit blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	P034-RDJ - UF S06 - Murs - Mur doublage - Toile fibrée tiissée peinte + enduit blanc + béton gris	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type béton (gris) en traces	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc) (transparent)(ii)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
021 (1)	P035-RDJ - UF S06 - Murs - Mur doublage - Enduit blanc + béton gris	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type béton (gris)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eichrom LABORATOIRES omicrons membre du réseau eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-040497-01 | Date d'émission de rapport : 13/10/2026 21:29 | Page7/9
Dossier N° : 26SE027934 | Date de réception : 07/10/2026 | Date d'analyse : 12/10/2026
Référence dossier Client:
T260630175 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P036-RDJ - UF S07 - Murs - Cloison - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
023 (1)	P037-RDJ - UF S07 - Murs - Allège doublage - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
024	P038-RDJ - UF S07 - Murs - Cloison - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-040497-01 | Date d'émission de rapport : 13/10/2026 21:29 | Page8/9
Dossier N° : 26SE027934 | Date de réception : 07/10/2026 | Date d'analyse : 12/10/2026
Référence dossier Client:
T260630175 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P039-RDJ - UF S04 - Murs - Cloison - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
026	P040-RDJ - UF S04 - Murs - Cloison - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / PQ6A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
(i) Des fibres minérales asbestiformes susceptibles d'être inhalées (l < 3µm) ont été observées. Ces fibres, non amiantées, sont suspectées d'être de nature talc et/ou gypse. Elles ont pu être différenciées des amiantes par leur diffraction électronique.
(ii) Des fibres minérales asbestiformes susceptibles d'être inhalées (l < 3 µm) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres, de nature asbestiforme, sont de type fibre de verre et ont pu être différenciées de fibres d'amiante via leurs propriétés optiques.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

eichrom LABORATOIRES omicrons membre du réseau eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-040497-01 | Date d'émission de rapport : 13/10/2026 21:29 | Page9/9
Dossier N° : 26SE027934 | Date de réception : 07/10/2026 | Date d'analyse : 12/10/2026
Référence dossier Client:
T260630175 A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, arrêté du 1er octobre 2019 modifié.
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tifenn GOUIN
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

Bordereau d'analyse AR-26-RI-047154-01 du rapport 2026-UNICAEN-03-UFR_UNICAEN amiante avant travaux

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

Eurofins Eichrom Amiante Laboratoire
Analyses Eichrom
Campus de Ker Lann, Rue Maryse Bastié,
Rue Maryse Bastié - Bât. C France
35170 Bruz

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-047154-01
Référence laboratoire N° : 26RI046134
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Date d'émission de rapport : 10/07/2026 21:40
Référence de suivi du dossier N° : 26SE018547
Date de réception :08/07/2026
Page1/33
Référence dossier Client:26SE018547 - 2026-UNICAEN-03-UFR A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26SE018547-001 - P001-Sous sol - Sous-sol - Plafond - Sous face - Béton gris ragrée	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CBGK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26SE018547-002 - P002-Sous sol - Sous-sol - Plafond - Sous face - Béton gris ragrée	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CBGK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26SE018547-003 - P003-RDJ - UF S06 - Sol - Sol - Carrelage vert + colle grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / CBGK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	26SE018547-004 - P004-RDJ - UF S06 - Sol - Sol - Béton gris ragrée	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (vert) en traces	MET / CBGK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Bordereau d'analyse AR-26-RI-047154-01 du rapport 2026-UNICAEN-03-UFR_UNICAEN amiante avant travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-047154-01
Référence laboratoire N° : 26RI046134
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Référence dossier Client:26SE018547 - 2026-UNICAEN-03-UFR A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

Date d'émission de rapport : 10/07/2026 21:40
Référence de suivi du dossier N° : 26SE018547
Date de réception :08/07/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
096	26SE018547-096 - P096-Extérieur - Préau RDC - Murs - Angle de mur - Peinture grise + béton gris ragrée	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	26SE018547-097 - P097-Extérieur - Préau RDC - Murs - Etanchéité verrière - mur - Joint souple gris	Matériau souple de type joint (gris)	MET / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	26SE018547-098 - P098-Extérieur - Préau RDC - Murs - Angle de mur - Peinture bleue + enduit gris + béton gris ragrée	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	26SE018547-099 - P099-Extérieur - Préau RDC - Sol - Etanchéité sous dalle - Pax alu + revêtement bitumineux noir fibreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	26SE018547-100 - P100-Extérieur - Pignon Ouest - Murs - Etanchéité mur et carreau vitré - Joint blanc souple					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Bordereau d'analyse AR-26-RI-047154-01 du rapport 2026-UNICAEN-03-UFR_UNICAEN amiante avant travaux

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-047154-01
Référence laboratoire N° : 26RI046134
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026
Date d'analyse : 09/07/2026
Date d'émission de rapport : 10/07/2026 21:40
Référence de suivi du dossier N° : 26SE018547
Date de réception :08/07/2026
Page25/33
Référence dossier Client:26SE018547 - 2026-UNICAEN-03-UFR A - CS 20082 60 rue Max Pol Fouchet 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN - UNICAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	26SE018547-092 - P092-Extérieur - UF 101 - Murs - Etanchéité fenêtre - Joint mou gris	Matériau souple de type joint (marron)	MET / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	26SE018547-093 - P093-Extérieur - Entrée UF 002 - Murs - Etanchéité porte - Joint souple gris	Matériau souple de type joint (gris)	MET / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	26SE018547-094 - P094-Extérieur - Entrée UF 002 - Murs - Etanchéité - Pax alu + revêtement noir bitumineux fibré	Matériau de type aluminium ; matériau (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	26SE018547-095 - P095-Extérieur - Préau RDC - Murs - Angle de mur - Peinture grise + béton gris ragrée	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WOUQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE : TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES


SANS OBJET

ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE


Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les **Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages** suivantes :

Zones présentant des similitudes d'ouvrage sans présence d'amiante

Z001 - Plafond - Béton gris ragrée - (Zone continue : NON)


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	UF S06	RDJ	Plafond - Plafond - Béton gris ragrée		S004	P001 - idem	
2	UF S13	RDJ	Plafond - Plafond - Béton gris ragrée		S005	P001 - idem	
3	UF S05	RDJ	Plafond - Plafond - Béton gris ragrée		S006	P001 - idem	
4	UF S03	RDJ	Plafond - Plafond - Béton gris ragrée		S007	P001 - idem	
55	UF S04	RDJ	Plafond - Plafond - Béton gris ragrée	X	S001	P001	
56	UF S07	RDJ	Plafond - Plafond - Béton gris ragrée		S008	P001 - idem	
70	UF S14	RDJ	Plafond - Plafond - Béton gris ragrée		S009	P001 - idem	

Z002 - Sol - Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc - (Zone continue : NON)

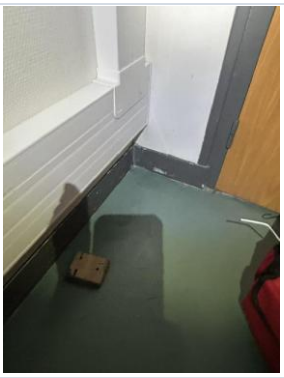N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
3	UF S05	RDJ	Sol- Sol - Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc		S010	P002 - idem	
4	UF S03	RDJ	Sol - Sol - Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc		S003	P006	

55	UF S04	RDJ	Sol - Sol - Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc	X	S002	P002	
56	UF S07	RDJ	Sol - Sol - Colle jaune fibrée + ragréage gris + enduit blanc		S011	P002 - idem	

Z003 - Sol - Carrelage gris + colle grise - (Zone continue : NON)

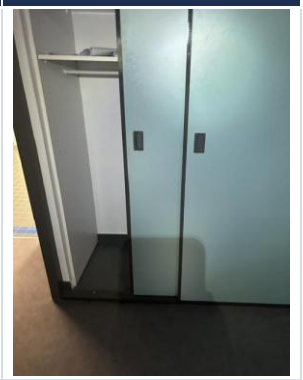N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	UF S13	RDJ	Sol - Sol - Carrelage gris + colle grise	X	S012	P003	
70	UF S14	RDJ	Sol - Sol - Carrelage gris + colle grise		S013	P003 - idem	

Z004 - Sol - Colle grise/ noire + ragréage gris + enduit blanc - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	UF S13	RDJ	Sol - Sol - Colle grise/ noire + ragréage gris + enduit blanc	X	S014	P004	
			Sol - Sol - Colle grise/ noire + ragréage gris + enduit blanc		S015	P005	

Z005 - Plafond - Béton gris ragrée - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
24	Sous-sol	Sous-sol	Plafond - Plafond - Béton gris ragrée	X	S016		
			Plafond - Plafond - Béton gris ragrée		S017		

Z006 - Sol - Pax alu + revêtement bitumineux noire fibrée - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Hall RDC	Extérieur	Sol - Sol - Pax alu + revêtement bitumineux noire fibrée	X	S018	P007	
71	Conférence RDC	Extérieur	Sol - Sol - Pax alu + revêtement bitumineux noire fibrée		S019	P007 - idem	

Z007 - Etanchéité toit terrasse - Revêtement bitumineux noir + toile fibrée marron - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Hall RDC	Extérieur	Etanchéité toit terrasse - Sol - Revêtement bitumineux noir		S021	P012	
71	Conférence RDC	Extérieur	Etanchéité toit terrasse - Sol - Revêtement bitumineux noir + toile fibrée marron	X	S020	P008	

Z008 - Etanchéité toit terrasse - Toile fibrée marron - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Hall RDC	Extérieur	Etanchéité toit terrasse - Sol - Toile fibrée marron		S023	P009 - idem	
71	Conférence RDC	Extérieur	Etanchéité toit terrasse - Sol - Toile fibrée marron	X	S022	P009	

Z009 - Etanchéité toit terrasse - Colle noire + toile marron fibrée + mousse jaune dure - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Hall RDC	Extérieur	Etanchéité toit terrasse - Sol - Colle noire + mousse jaune dure		S025	P013	
71	Conférence RDC	Extérieur	Etanchéité toit terrasse - Sol - Colle noire + toile marron fibrée + mousse jaune dure	X	S024	P010	

Z010 - Etanchéité toit terrasse - Colle noire épaisse - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Hall RDC	Extérieur	Etanchéité toit terrasse - Sol - Colle noire épaisse		S027	P014	
71	Conférence RDC	Extérieur	Etanchéité toit terrasse - Sol - Colle noire épaisse	X	S026	P011	

Z011 - Etanchéité solin alu - Joint souple blanc - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Hall RDC	Extérieur	Etanchéité solin alu - Murs - Joint souple blanc	X	S028	P015	
71	Conférence RDC	Extérieur	Etanchéité solin alu - Murs - Joint souple blanc		S029	P015 - idem	

Z012 - Cloison - Bande calicot marron + plâtre blanc - (Zone continue : NON)


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
70	UF S14	RDJ	Cloison - Murs - Bande calicot marron + plâtre blanc	X	S040	P025	
			Cloison - Murs - Bande calicot marron + plâtre blanc		S037	P026	

Z013 - Sol - Béton gris ragrée - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
67	UF S10	RDJ	Sol - Sol - Béton gris ragrée		S042	P028 - idem	
68	UF S11	RDJ	Sol - Sol - Béton gris ragrée		S043	P028 - idem	
69	UF S12	RDJ	Sol - Sol - Béton gris ragrée	X	S041	P028	

Z014 - Mur - Peinture + béton gris ragrée - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
67	UF S10	RDJ	Mur - Murs - Peinture + béton gris ragrée		S046	P029 - idem	

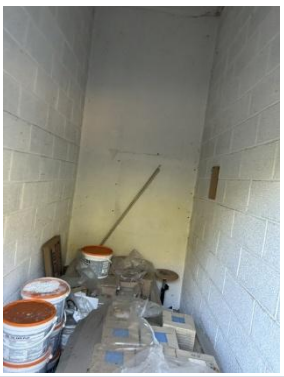68	UF S11	RDJ	Mur - Murs - Peinture + béton gris ragrée		S047	P029 - idem	
69	UF S12	RDJ	Mur - Murs - Peinture + béton gris ragrée	X	S045	P029	

Z015 - Plafond jointement dalle - Peinture + béton gris ragrée - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
67	UF S10	RDJ	Plafond jointement dalle - Plafond - Peinture + béton gris ragrée		S050	P031 - idem	
68	UF S11	RDJ	Plafond jointement dalle - Plafond - Peinture + béton gris ragrée		S051	P031 - idem	
69	UF S12	RDJ	Plafond jointement dalle - Plafond - Peinture + béton gris ragrée	X	S049	P031	

Z016 - Plinthe doublage - Carrelage vert + colle grise + enduit blanc - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	UF S06	RDJ	Plinthe doublage - Murs - Carrelage vert + colle grise + enduit blanc	X	S053	P033	
			Plinthe doublage - Murs - Carrelage vert + colle grise + enduit blanc		S054	P033 - idem	

Z017 - Mur doublage - Toile fibrée tissée peinte + enduit blanc + béton gris - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	UF S06	RDJ	Mur doublage - Murs - Toile fibrée tissée peinte + enduit blanc + béton gris	X	S056	P034	
			Mur doublage - Murs - Toile fibrée tissée peinte + enduit blanc + béton gris		S063	P034 - idem	

Z018 - Allège doublage - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	UF S06	RDJ	Allège doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc		S089	P037 - idem	
4	UF S03	RDJ	Allège doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc		S090	P037 - idem	
55	UF S04	RDJ	Allège doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc		S091	P037 - idem	
56	UF S07	RDJ	Allège doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	X	S058	P037	

Z019 - Cloison - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	UF S06	RDJ	Cloison - Murs - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc		S079	P036 - idem	
3	UF S05	RDJ	Cloison - Murs - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc		S088	P036 - idem	
4	UF S03	RDJ	Cloison - Murs - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc		S087	P036 - idem	
55	UF S04	RDJ	Cloison - Murs - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc		S060	P039	
			Cloison - Murs - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc		S061	P040	
56	UF S07	RDJ	Cloison - Murs - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc	X	S057	P036	
			Cloison - Murs - Peinture blanche + bande calicot marron + plâtre blanc		S059	P038	

Z020 - Mur porteur - Enduit blanc + béton gris - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	UF S06	RDJ	Mur porteur - Murs - Enduit blanc + béton gris	X	S055	P035	
			Mur porteur - Murs - Enduit blanc + béton gris		S062	P035 - idem	

Z021 - Jointement entre plafond et doublage - Plâtre blanc - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	UF S06	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Plâtre blanc		S064	P018 - idem	
2	UF S13	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Plâtre blanc	X	S032	P018	
3	UF S05	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Plâtre blanc		S065	P018 - idem	
4	UF S03	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Plâtre blanc		S066	P018 - idem	
55	UF S04	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Plâtre blanc		S067	P018 - idem	
56	UF S07	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Plâtre blanc		S068	P018 - idem	
70	UF S14	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Plâtre blanc		S069	P018 - idem	

Z022 - Mur doublage - Peinture blanche + papier marron + plâtre blanc - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	UF S13	RDJ	Mur doublage - Murs - Peinture blanche + papier marron + plâtre blanc	X	S030	P016	
			Mur doublage - Murs - Toile fibrée tissée peinte + papier marron + plâtre blanc		S034	P020	
			Mur doublage - Murs - Peinture blanche + papier marron + plâtre blanc		S070	P016 - idem	

Z023 - Jointement entre plafond et doublage - Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc - (Zone continue : NON)


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	UF S06	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc		S073	P021 - idem	

2	UF S13	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc	X	S035	P021	
			Jointement entre plafond et doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc		S071	P021 - idem	
			Jointement entre plafond et doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc		S072	P021 - idem	
3	UF S05	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc		S074	P021 - idem	
4	UF S03	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc		S075	P021 - idem	
55	UF S04	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc		S076	P021 - idem	
56	UF S07	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc		S077	P021 - idem	
70	UF S14	RDJ	Jointement entre plafond et doublage - Murs - Peinture blanche + bande calicot + plâtre blanc		S078	P021 - idem	

Z024 - Plinthe doublage - Colle grise + carrelage gris + papier marron - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	UF S13	RDJ	Plinthe doublage - Murs - Colle grise + carrelage gris + papier marron	X	S031	P017	
			Plinthe doublage - Murs - Peinture blanche + colle grise + carrelage gris		S033	P019	

Z025 - Sol - Carrelage vert + colle grise - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	UF S06	RDJ	Sol - Sol - Carrelage vert + colle grise	X	S080		
			Sol - Sol - Carrelage vert + colle grise		S081		

Z026 - Angle mur - Peinture blanche + béton gris ragrée - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Hall RDC	Extérieur	Angle mur - Murs - Peinture blanche + béton gris ragrée	X	S083		
71	Conférence RDC	Extérieur	Mur - Murs - Peinture blanche + béton gris ragrée		S085		

Z027 - Isolation casquette préau Flocage fibre blanche - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Hall RDC	Extérieur	Isolation casquette préau - Toiture - Flocage fibre blanche	X	S084		
71	Conférence RDC	Extérieur	Isolation casquette préau - Toiture - Flocage fibre blanche		S086		

Z028 - Murs - Peinture blanche souple - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
22	Pignon Ouest	Extérieur	Murs - Murs - Peinture blanche souple	X	S052	P032	

Z029 - Sol - Béton gris ragrée - (Zone continue : NON)


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	UF S06	RDJ	Sol - Sol - Béton gris ragrée		S092	P024 - idem	
2	UF S13	RDJ	Sol - Sol - Béton gris ragrée		S093	P024 - idem	
3	UF S05	RDJ	Sol - Sol - Béton gris ragrée		S094	P024 - idem	
4	UF S03	RDJ	Sol - Sol - Béton gris ragrée		S095	P024 - idem	
55	UF S04	RDJ	Sol - Sol - Béton gris ragrée		S096	P024 - idem	
56	UF S07	RDJ	Sol - Sol - Béton gris ragrée		S097	P024 - idem	
70	UF S14	RDJ	Sol - Béton gris ragrée	X	S038	P024	


Z030 - Porte d'entrée - Peinture grise - (Zone continue : NON)


N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
67	UF S10	RDJ	Porte d'entrée - Murs - Peinture grise		S099		
68	UF S11	RDJ	Porte d'entrée - Murs - Peinture grise		S100		
69	UF S12	RDJ	Porte d'entrée - Murs - Peinture grise		S101		
71	Conférence RDC	Extérieur	Porte d'entrée - Murs - Peinture grise	X	S098		


ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS
Page suivante

Document :	Demande de repérage travaux

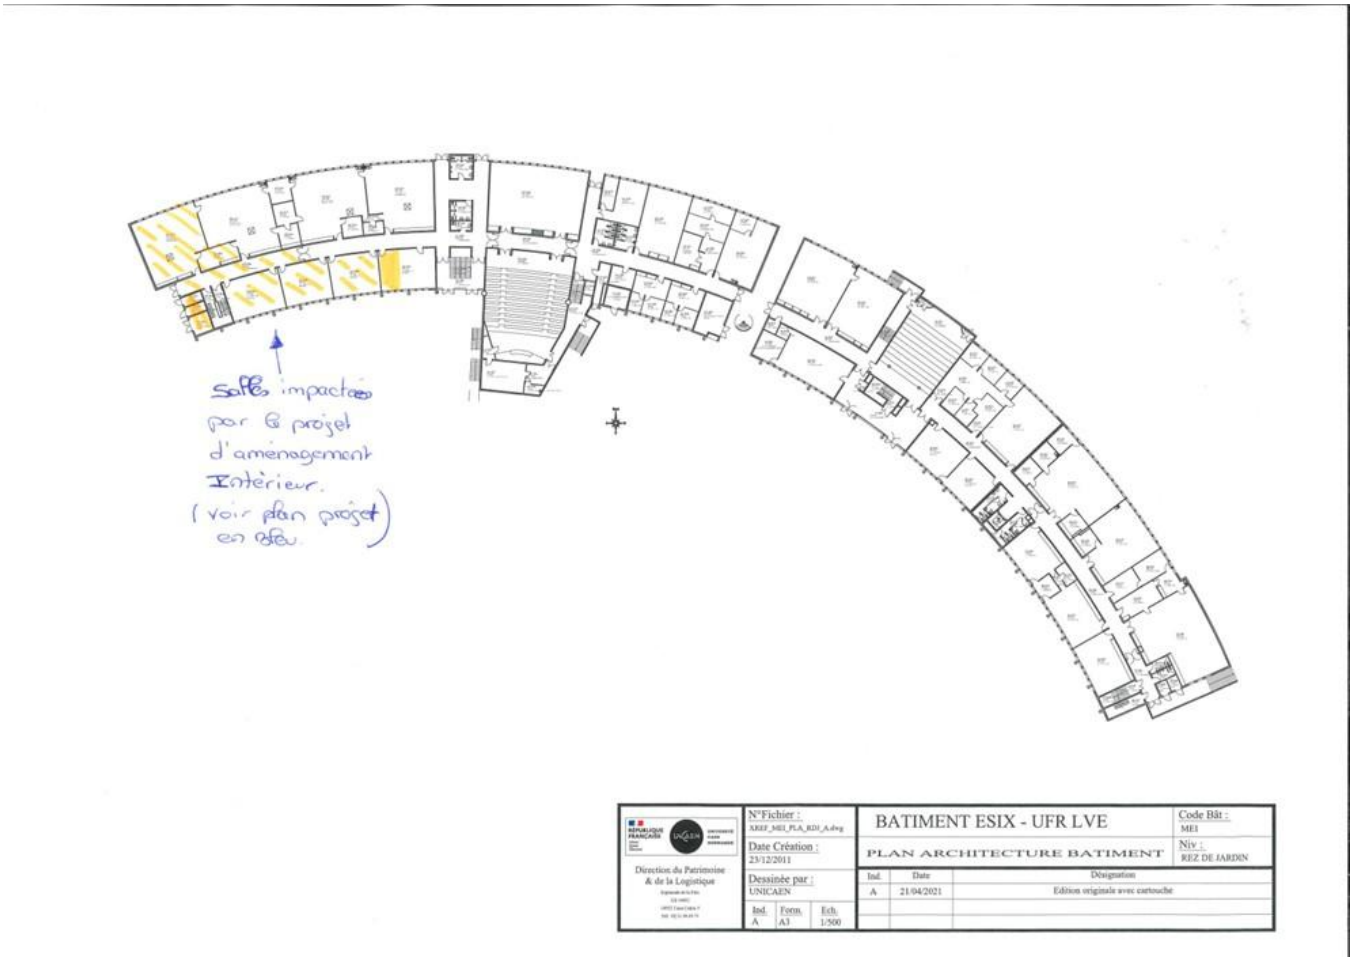

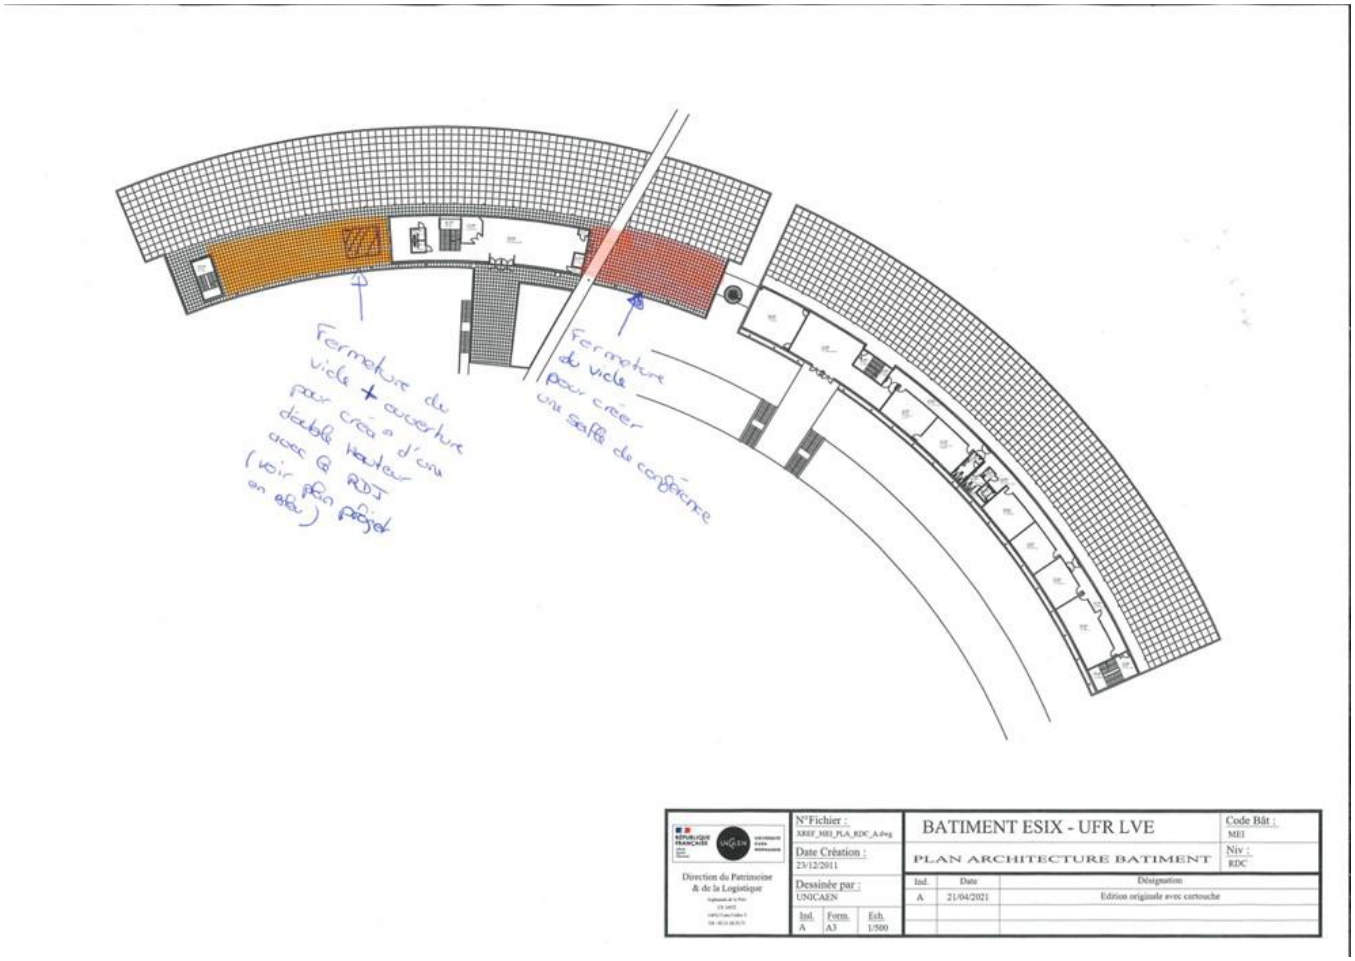
Fermeture du vide + ouverture pour créa d'un double hauteur avec @ RDJ (voir plan en bleu) projet
Fermeture du vide pour créer une salle de conférence
Direction du Patrimoine & de la Logistique
N°Fichier :
Date Création :
23/12/2011
Dessinée par :
UNICAEN
Ind. A
Form. A3
Ech. 1/500
BATIMENT ESIX - UFR LVE
PLAN ARCHITECTURE BATIMENT
Code Bât : MEI
Niv : RDC
Ind. A
Date 21/04/2021
Désignation Edition originale avec cartouche

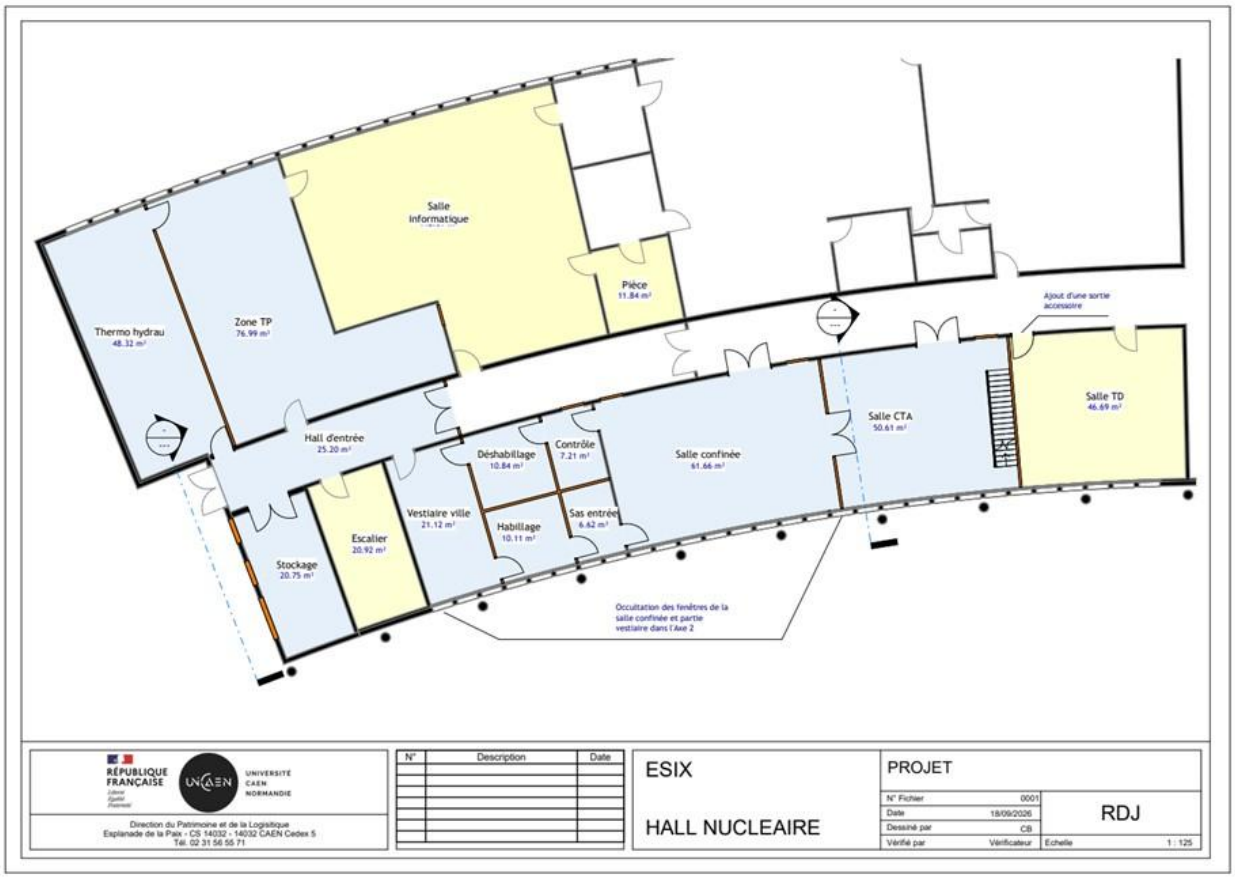
Salle informatique
Pièce 11.84 m²
Thermo hydrau 48.32 m²
Zone TP 76.99 m²
Ajout d'une sortie accessoire
Salle TD 46.69 m²
Salle CTA 50.61 m²
Hall d'entrée 25.20 m²
Déshabillage 10.84 m²
Contrôle 7.21 m²
Salle confinée 61.66 m²
Vestiaire ville 21.12 m²
Habillage 10.11 m²
Sas entrée 6.62 m²
Escalier 20.92 m²
Stockage 20.75 m²
Occultation des fenêtres de la salle confinée et partie vestiaire dans l'Axe 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE
Direction du Patrimoine et de la Logistique
Esplanade de la Paix - CS 14032 - 14032 CAEN Cedex 5
Tél. 02 31 56 55 71
N° Description Date
ESIX
HALL NUCLEAIRE
PROJET
N° Fichier 0001
Date 18/09/2026
Dessiné par CB
Vérifié par Vérificateur
Echelle 1 : 125
RDJ

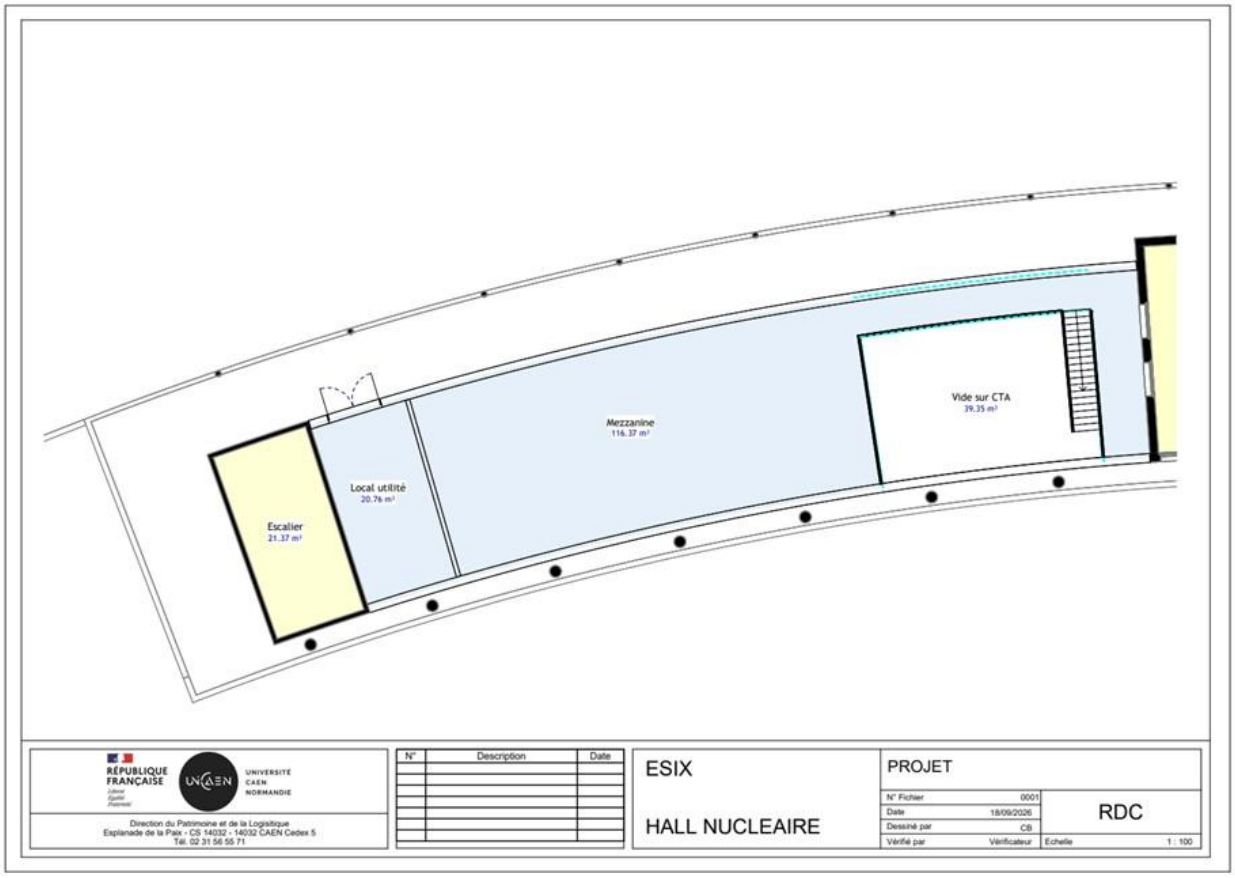

Commentaire :	

Document :	Demande de repérage travaux (Capture d'écran du mail de Mme Sepchat définissant le repérage travaux)

Vous trouverez ci joint une demande de devis pour un diagnostic amiante avant travaux.

Description du projet : un projet d'aménagement intérieur pour le bâtiments UFR du campus de Cherbourg.

Localisation : Campus de Cherbourg (bâtiment UFR) - 60 rue Max Pol Fouchet 50130 Cherbourg-en-Cotentin

Besoin : Suite à mon échange téléphonique avec Monsieur Loïc Deschamps, pour le nouveau diagnostic Amiante nous souhaiterions une analyse sur :

- Au RDJ les pièces UF S10, UF S11, UF S12, les salles UF S13, UF S14, UF S07, UF S05, UF S04 et UF S03 et une partie de la circulation UF S06
- Au RDC, fermeture du vide avec création d'une ouverture pour le Hall TP génie nucléaire (voir plan projet en bleu) + fermeture pour création d'u

Merci de ne pas prendre en compte les éléments déjà diagnostiquer lors de l'intervention de juin 2026.

En complément, vous trouverez le plan de repérage en pièce jointe ainsi que la demande de devis à compléter.

Si vous souhaitez plus de précision pour établir le devis, n'hésitez pas à me contacter.

Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,

Commentaire :	

ANNEXE : CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Saint Rémy les chevreuse, le 30/03/2026

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA à

Loïc DESCHAMPS

Sous le Numéro **21-1537**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☑	AMIANTE AVEC MENTION	Prise d'effet : 11/01/2022	Validité : 10/01/2029
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☑	AMIANTE SANS MENTION	Prise d'effet : 11/01/2022	Validité : 10/01/2029
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☑	PLOMB SANS MENTION	Prise d'effet : 11/01/2022	Validité : 10/01/2029
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance.
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Signature :

Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA Certification - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage
BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél : 01 30 85 25 71 - http://www.abcidia-certification.fr
ENR 20 - V11 CERTIFICAT DE DIAGNOSTIQUE 3/02/2025

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle			
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non - paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat.Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : *« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »*

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

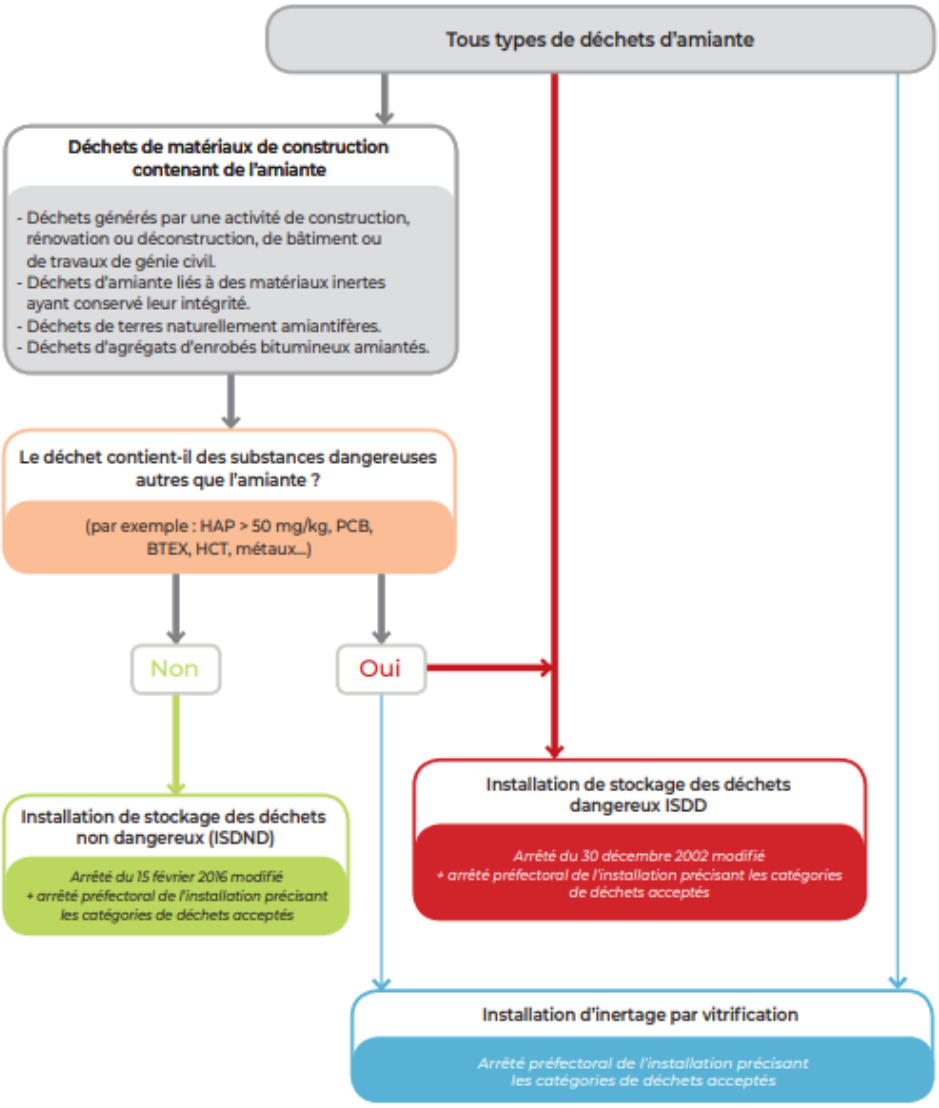

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
