
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

- CONSTRUCTION DES FARES ET BLOC SANITAIRE DU COLLEGE DE KANI-KELI -

RECTORAT DE MAYOTTE
Rue Sarahangue 97600 Mamoudzou, MAYOTTE

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**FARES DU COLLEGE KANI-KELI & BLOC SANITAIRE**	**140 jours**
2	**Notification de la période de préparation**	0 jour
3	**Mission DET**	**136 jours**
4	Visa des etudes EXE	15 jours
5	**INSTALLATION DE CHANTIER / DOSSIER EXE / DOE**	**127 jours**
6	**Etudes EXE - Lot 01 et Lot 03**	15 jours
7	**Installation de Chantier**	**20 jours**
8	**Aménagement et installation de la base-vie, parking, etc…**	10 jours
9	**Installation de clôture de chantier munie de portails et de portillons**	10 jours
10	**Aménée de matériels et matériaux**	15 jours
11	**Branchements electrique et eau**	5 jours
12	**Aménagement d'un atelier provisoire**	10 jours
13	**LOT 1 - TRAVAUX DE VRD**	**112 jours**
14	**Eaux Usées**	**5 jours**
15	Création des réseaux d'eaux usées	5 jours
16	**Réseau eau potable**	**5 jours**
17	Mise en place des réseaux d'eau potable	5 jours
18	**Réalisation réseaux eau puviale**	**33 jours**
19	Réalisation de la cuve de stockage	10 jours
20	Mise place des réseaux d'eau pluvale et raccordement à la cuve	3 jours
21	**Terrassements et démolition**	**6 jours**
22	Revêtements béton à démolir	3 jours
23	Depose de gravillons, décapage de terres végétales	3 jours
24	Démolition d'ouvrage en béton	4 jours
25	**Aménagements**	**15 jours**
26	Elargissement de la chaussée en béton	15 jours
27	Engazonnement	10 jours
28	**LOT 2 - TRAVAUX DE GROS-OEUVRE**	**36 jours**
29	**TRAVAUX DU FARE 1**	**18 jours**
30	Fouilles des fondations	3 jours
31	Réalisation des fondations	9 jours
32	Réalisation des massifs	6 jours
33	**TRAVAUX DU FARE 2**	**15 jours**
34	Fouilles des fondations	3 jours
35	Réalisation des fondations	9 jours
36	Réalisation des massifs	3 jours
37	**TRAVAUX DU BLOC SANITAIRE**	**21 jours**
38	Fouille des fondations	3 jours
39	Réalisation des fondations et dallage	10 jours
40	Elévation de l'ossature	8 jours
41	Elévation des murs	8 jours

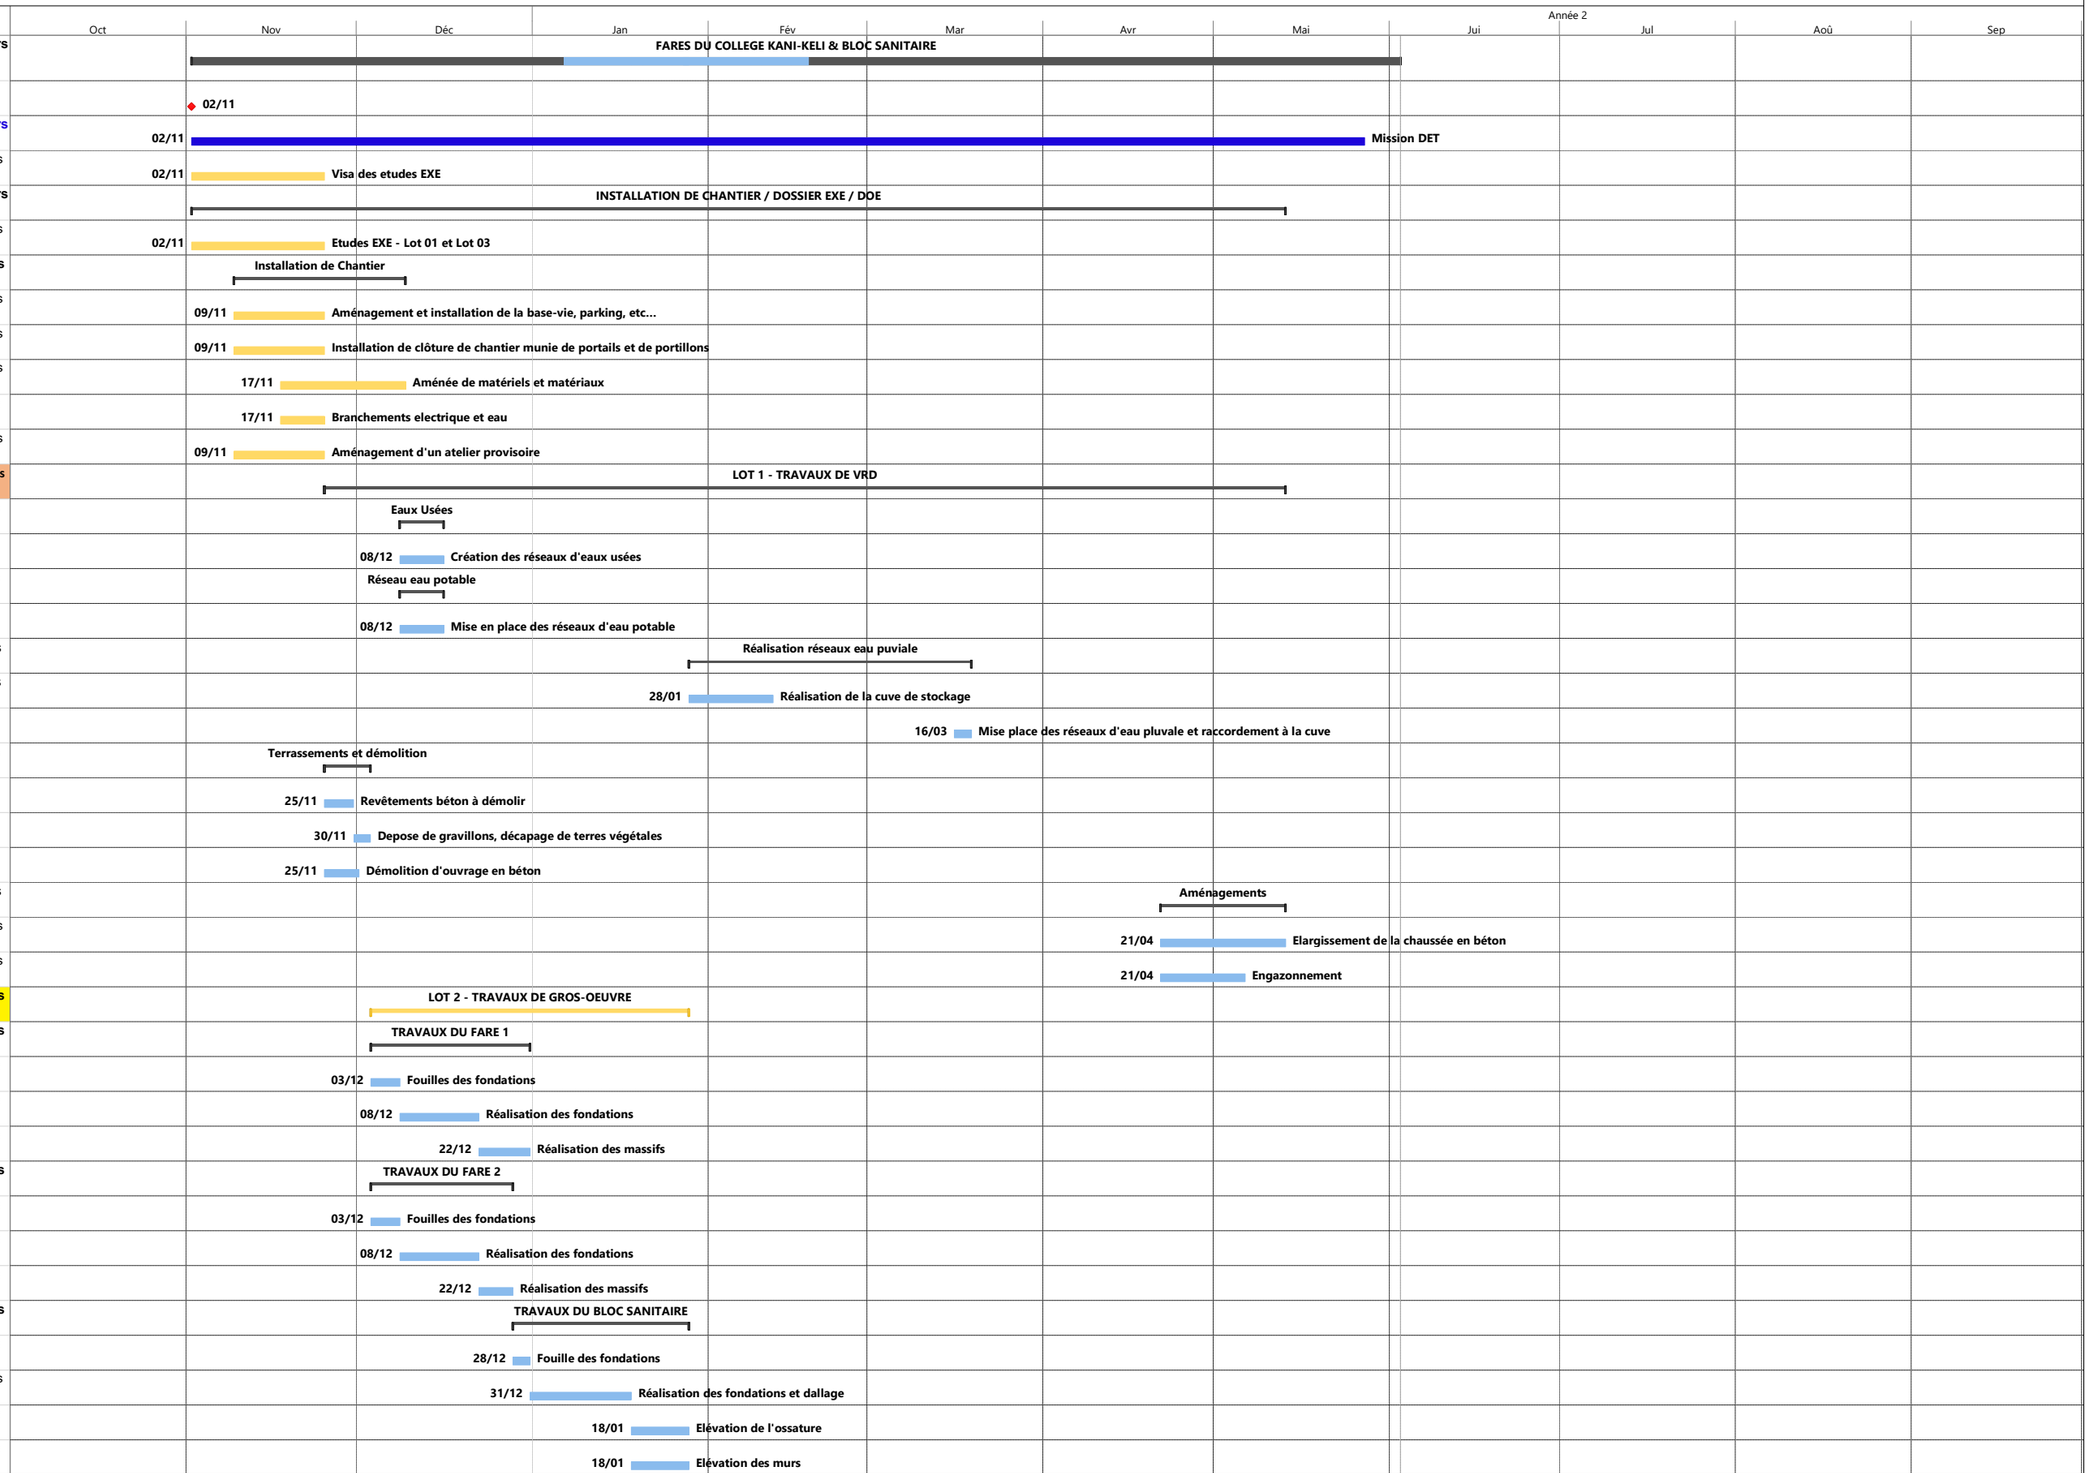

Projet : PLANNING BRISE DU L
Date : Mar 15/09/26


Tâche · Jalon · Récapitulatif du projet · Récapitulatif inactif · Échéance · Etudes EXE · Mission OPC
Fractionnement · Récapitulative · Jalon inactif · Récapitulatif manuel · Avancement · Mission DET · OS Demarrage et Reception

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

- CONSTRUCTION DES FARES ET BLOC SANITAIRE DU COLLEGE DE KANI-KELI -

RECTORAT DE MAYOTTE
Rue Sarahangue 97600 Mamoudzou, MAYOTTE

N°	Nom de la tâche	Durée
42		
43	**LOT 3 - CHARPENTE COUVERTURE**	**48 jours**
44	**Pose Charpente et couverture Faré 1**	**18 jours**
45	Fixation des poteaux	3 jours
46	Fourniture et pose des fermes	7 jours
47	Pose des pannes	2 jours
48	Pose de la couverture	3 jours
49	Pose de cheneaux et descente d'eau	3 jours
50	**Pose de charpente et couverture Faré 2**	**17 jours**
51	Fixation des poteaux	2 jours
52	Fourniture et pose des fermes	7 jours
53	Pose des pannes	2 jours
54	Pose de la couverture	3 jours
55	Pose de cheneaux et descente d'eau	3 jours
56	**Installation de la charpente couverture - Bloc sanitaire**	**16 jours**
57	Pose des poutres	2 jours
58	Pose de pannes	4 jours
59	Pose de la couverture	5 jours
60	Mise en place des cheneaux métalliques	3 jours
61	Mise en place des descentes EP	2 jours
62	**LOT 06 - MENUISERIE BOIS ET ALU**	**12 jours**
63	Installation des blocs portes extérieurs simple vantail	2 jours
64	Installation des blocs portes intérieurs	7 jours
65	Installation des ensembles jalousies	3 jours
66	**LOT 4 - CARRELAGE**	**10 jours**
67	Pose d'étanchéité	2 jours
68	Pose de carrelage et plinthes au sol et sur mur	8 jours
69	**LOT 5 - PEINTURES**	**64 jours**
70	**Peinture sur Farés**	**4 jours**
71	Pose de lacque microporeuse sur bois	4 jours
72	**Peinture sur bloc Sanitaire**	**23 jours**
73	Ragreage et peinture intérieure	10 jours
74	Ragréage et Peinture extérieure	10 jours
75	Laque microporeuse sur bois	3 jours
76	**LOT 7 - ELECTRICITE**	**66 jours**
77	**Travaux sur Farés**	**66 jours**
78	Pose, raccordement ensemble fourreautages	4 jours
79	Fourreaux et câblages des appareillages	3 jours
80	Pose des appareillages	2 jours
81	Essais, contrôles	1 jour
82	**Travaux sur Blocs sanitaires**	**54 jours**

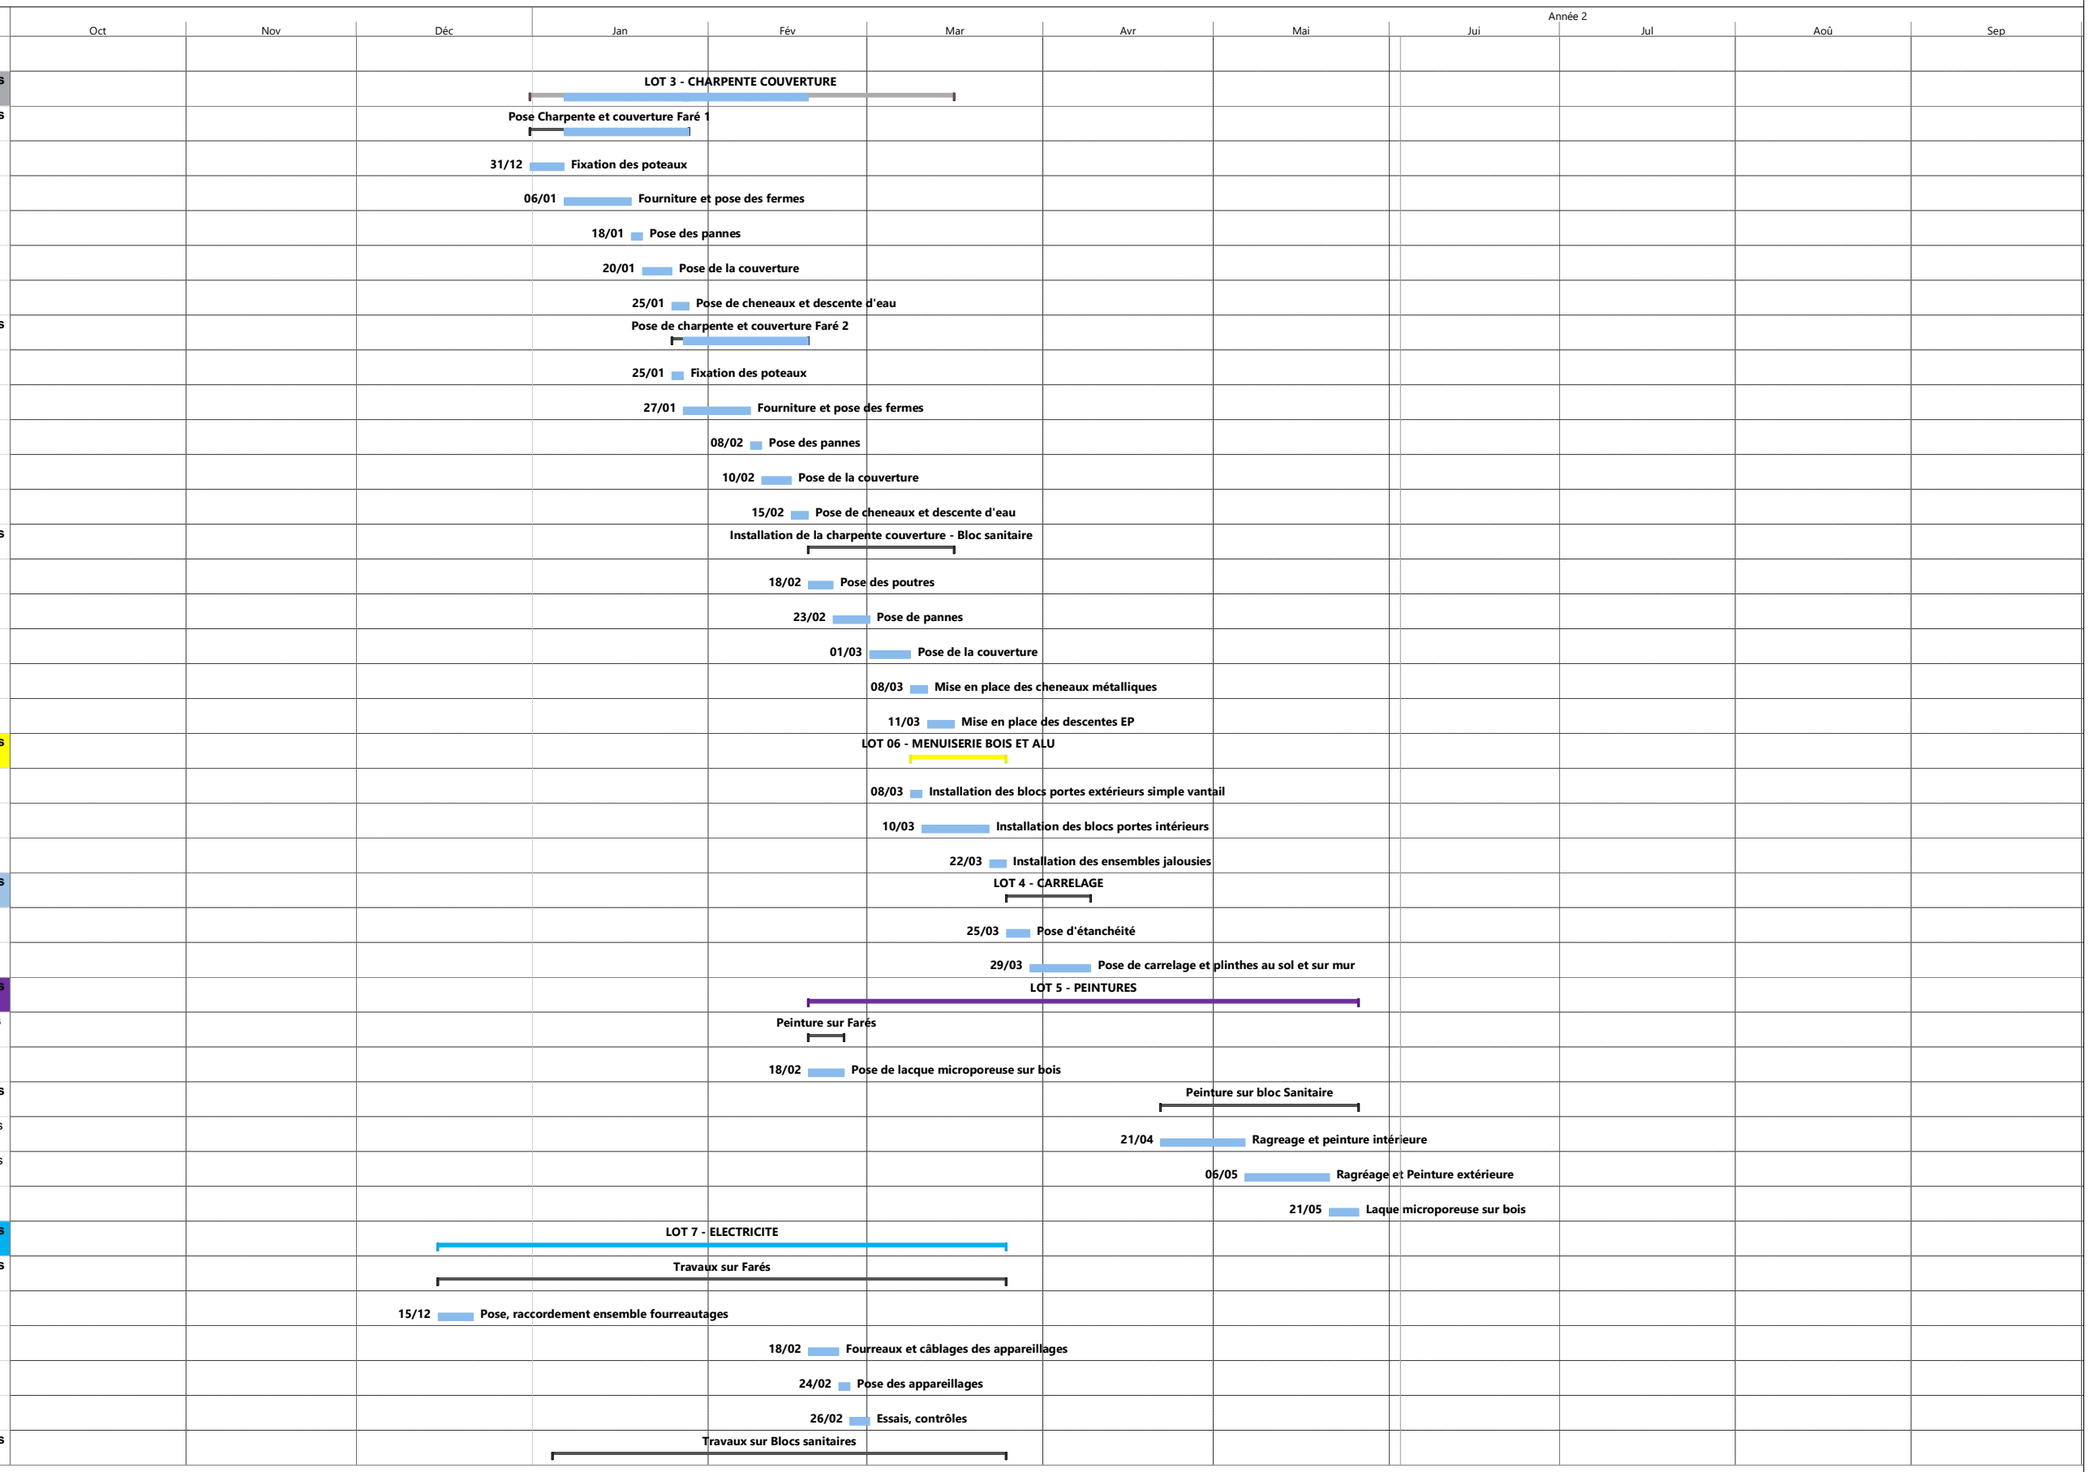

Projet : PLANNING BRISE DU L
Date : Mar 15/09/26


Tâche — Jalon — Récapitulatif du projet — Récapitulatif inactif — Échéance — Etudes EXE — Mission OPC
Fractionnement — Récapitulative — Jalon inactif — Récapitulatif manuel — Avancement — Mission DET — OS Demarrage et Reception

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

- CONSTRUCTION DES FARES ET BLOC SANITAIRE DU COLLEGE DE KANI-KELI -

RECTORAT DE MAYOTTE
Rue Sarahangue 97600 Mamoudzou, MAYOTTE

N°	Nom de la tâche	Durée
83	Pose, raccordement ensemble fourreautages	4 jours
84	Fourreaux et câblages des appareillages	3 jours
85	Pose des appareillages	3 jours
86	Essais, contrôles	1 jour
87	**LOT 8 - PLOMBERIE & INSTALLATIONS SANITAIRES**	**86 jours**
88	**Travaux Bloc Sanitaire**	**86 jours**
89	Mise en place de la tuyauterie - (distribution, évacuation, alimentation, etc) - Fondations	4 jours
90	Installation des appareils sanitaires - RDC	8 jours
91	Essais, reglages, contrôle des réseaux	1 jour
92	Réalisation des DOE	1 jour
93	**OPR**	5 jours
94	**RECEPTION FINALE**	0 jour

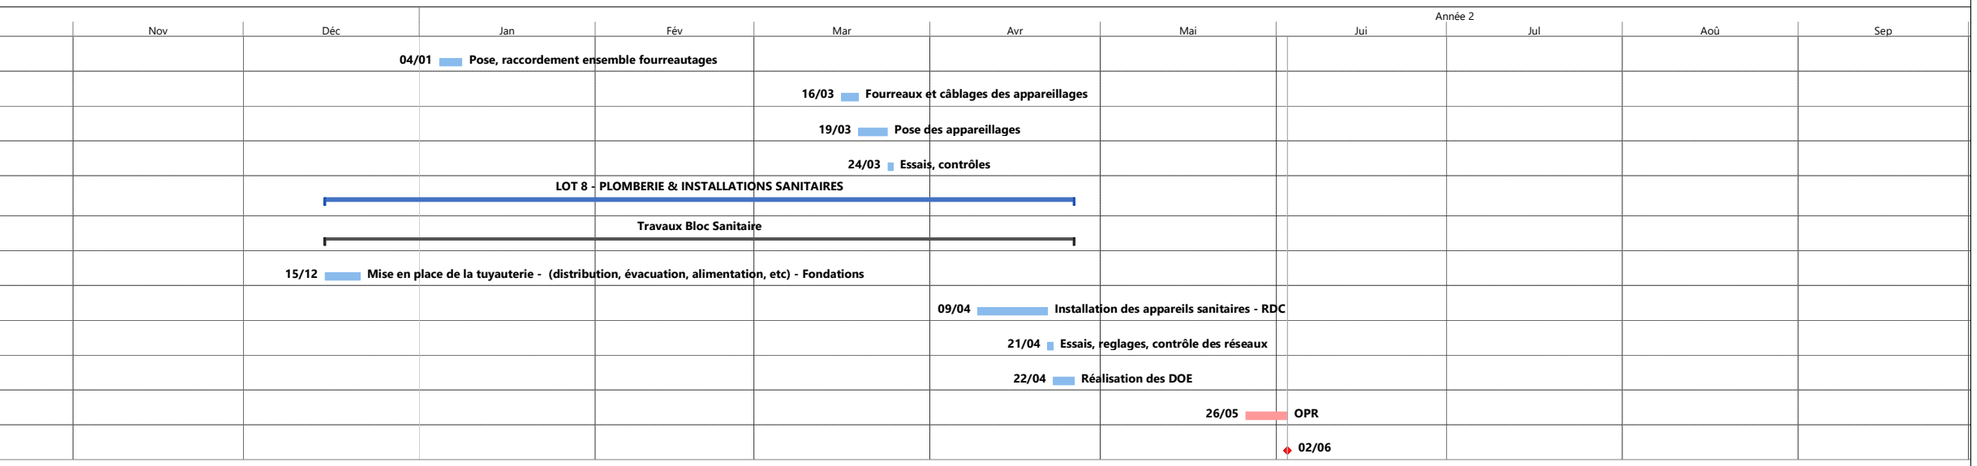

Projet : PLANNING BRISE DU L
Date : Mar 15/09/26

Tâche · Jalon · Récapitulatif du projet · Récapitulatif inactif · Échéance · Etudes EXE · Mission OPC
Fractionnement · Récapitulative · Jalon inactif · Récapitulatif manuel · Avancement · Mission DET · OS Demarrage et Reception
