
Réhabilitation et restructuration résidence étudiante BOURGONNIER MADELAINE

Planning DCE - OCTOBRE 2026

N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	**DUREE DES ETUDES**	**Lun 05/10/26**	**Ven 26/02/27**
2	Réponse au RICT	Mer 14/10/26	Mer 14/10/26
3	Réponse du BC au RICT	Mer 21/10/26	Mer 21/10/26
4	DOSSIER DE CONSULTATION	Lun 05/10/26	Ven 30/10/26
5	Validation MOA	Lun 02/11/26	Ven 06/11/26
6	APPEL D'OFFRES	Mer 11/11/26	Ven 11/12/26
7	RAO Final	Lun 04/01/27	Ven 22/01/27
8	Négociations	Lun 25/01/27	Ven 29/01/27
9	RAO suite négociations	Lun 01/02/27	Ven 05/02/27
10	Mise au point des contrats travaux	Lun 08/02/27	Ven 12/02/27
11	Notifications	Lun 15/02/27	Ven 26/02/27
12	**DUREE DU CHANTIER**	**Ven 26/02/27**	**Ven 18/02/28**
13	**TRAVAUX PREPARATOIRES**	**Ven 26/02/27**	**Ven 03/09/27**
14	Notification des entreprises	Ven 26/02/27	Ven 26/02/27
15	O.S Préparation	Ven 26/02/27	Ven 26/02/27
16	Période de préparation	Lun 01/03/27	Ven 23/04/27
17	Plan de retrait	Lun 26/04/27	Ven 21/05/27
18	Installation et cloisonnement de chantier	Lun 17/05/27	Ven 21/05/27
19	Consignations des réseaux	Lun 17/05/27	Ven 21/05/27
20	O.S. Travaux	Ven 23/04/27	Ven 23/04/27
21	Avis de laboratoire	Lun 01/03/27	Ven 21/05/27
22	Fabrication des MOBS (Assemblage murs/Mext/Bardage)	Lun 24/05/27	Ven 03/09/27
23	Date de libération maximale du batiment	Mer 30/06/27	Mer 30/06/27
24	**BATIMENT BOURGONNIER**	**Lun 05/07/27**	**Ven 18/02/28**
25	**Façade 1**	**Lun 05/07/27**	**Lun 03/01/28**
26	Désamiantage intérieur	Lun 05/07/27	Ven 16/07/27
27	Désamiantage façades	Lun 19/07/27	Ven 23/07/27
28	Dépose des menuiseries extérieures et modénatures	Lun 26/07/27	Ven 10/09/27
29	Démolitions GO	Lun 30/08/27	Ven 24/09/27
30	Démolitions diverses	Lun 13/09/27	Lun 11/10/27
31	Pose des FOBS	Mar 12/10/27	Lun 25/10/27
32	Reprise placo intérieur	Mar 19/10/27	Lun 15/11/27
33	Pose des Mint	Mar 16/11/27	Lun 29/11/27
34	Peinture	Mar 30/11/27	Lun 03/01/28
35	Bardage métallique	Mar 26/10/27	Lun 15/11/27
36	Finitions diverses	Mar 16/11/27	Lun 29/11/27
37	**Façade 2**	**Lun 26/07/27**	**Lun 31/01/28**
38	Désamiantage façade	Lun 26/07/27	Ven 30/07/27
39	Dépose des menuiseries extérieures et modénatures	Lun 13/09/27	Ven 08/10/27
40	Démolitions GO	Lun 27/09/27	Ven 22/10/27
41	Démolitions diverses	Lun 11/10/27	Ven 05/11/27
42	Pose des FOBS	Mar 26/10/27	Lun 22/11/27
43	Reprise placo intérieur	Mar 16/11/27	Lun 13/12/27
44	Pose des Mint	Mar 14/12/27	Lun 10/01/28
45	Peinture	Mar 11/01/28	Lun 31/01/28
46	Bardage métallique	Mar 23/11/27	Lun 13/12/27
47	Finitions diverses	Mar 14/12/27	Lun 03/01/28
48	**Pignon**	**Lun 20/09/27**	**Ven 26/11/27**
49	Montage échaffaudage	Lun 20/09/27	Ven 24/09/27
50	Dépose des menuiseries	Lun 27/09/27	Ven 01/10/27
51	Pose des MEXT	Lun 04/10/27	Ven 08/10/27
52	Mise en oeuvre ITE	Lun 11/10/27	Ven 22/10/27
53	Bardage métallique	Lun 25/10/27	Ven 19/11/27
54	Placo	Lun 11/10/27	Ven 22/10/27
55	Peinture	Lun 25/10/27	Ven 05/11/27
56	Finitions diverses	Lun 22/11/27	Ven 26/11/27
57	**Lots annexes**	**Lun 06/09/27**	**Lun 31/01/28**
58	Plomberie/CVC/ventilation	Lun 06/09/27	Ven 17/12/27
59	Electricité	Lun 06/09/27	Ven 17/12/27
60	Remise en état	Mar 04/01/28	Lun 31/01/28
61	**Phase de reception**	**Ven 21/01/28**	**Ven 18/02/28**
62	OPR	Ven 21/01/28	Ven 21/01/28
63	Levée des réserves	Lun 24/01/28	Ven 18/02/28
64	Nettoyage de reception	Ven 18/02/28	Ven 18/02/28
65	Réception	Ven 18/02/28	Ven 18/02/28
66	**BATIMENT MADELAINE**	**Lun 26/07/27**	**Lun 31/01/28**
67	**Façade Nord/Est + retour rue Bougonnier**	**Lun 26/07/27**	**Ven 03/12/27**
68	Désamiantage	Lun 26/07/27	Ven 30/07/27
69	Pose des échaffaudages	Lun 23/08/27	Ven 03/09/27
70	Pose des supports GALVA	Lun 06/09/27	Ven 17/09/27
71	Pose des MEXT	Lun 20/09/27	Ven 01/10/27
72	Dépose des menuiseries extérieures	Lun 04/10/27	Ven 15/10/27
73	ITE + ENDUIT	Lun 04/10/27	Ven 29/10/27
74	Pose bardage métallique	Lun 01/11/27	Ven 19/11/27
75	Reprise placo intérieur	Lun 04/10/27	Ven 08/10/27
76	Dépose échaffaudage	Lun 22/11/27	Ven 26/11/27
77	Finitions diverses	Lun 29/11/27	Ven 03/12/27
78	**Façade SUD/OUEST**	**Lun 06/09/27**	**Ven 17/12/27**
79	Pose des échaffaudages	Lun 06/09/27	Ven 17/09/27

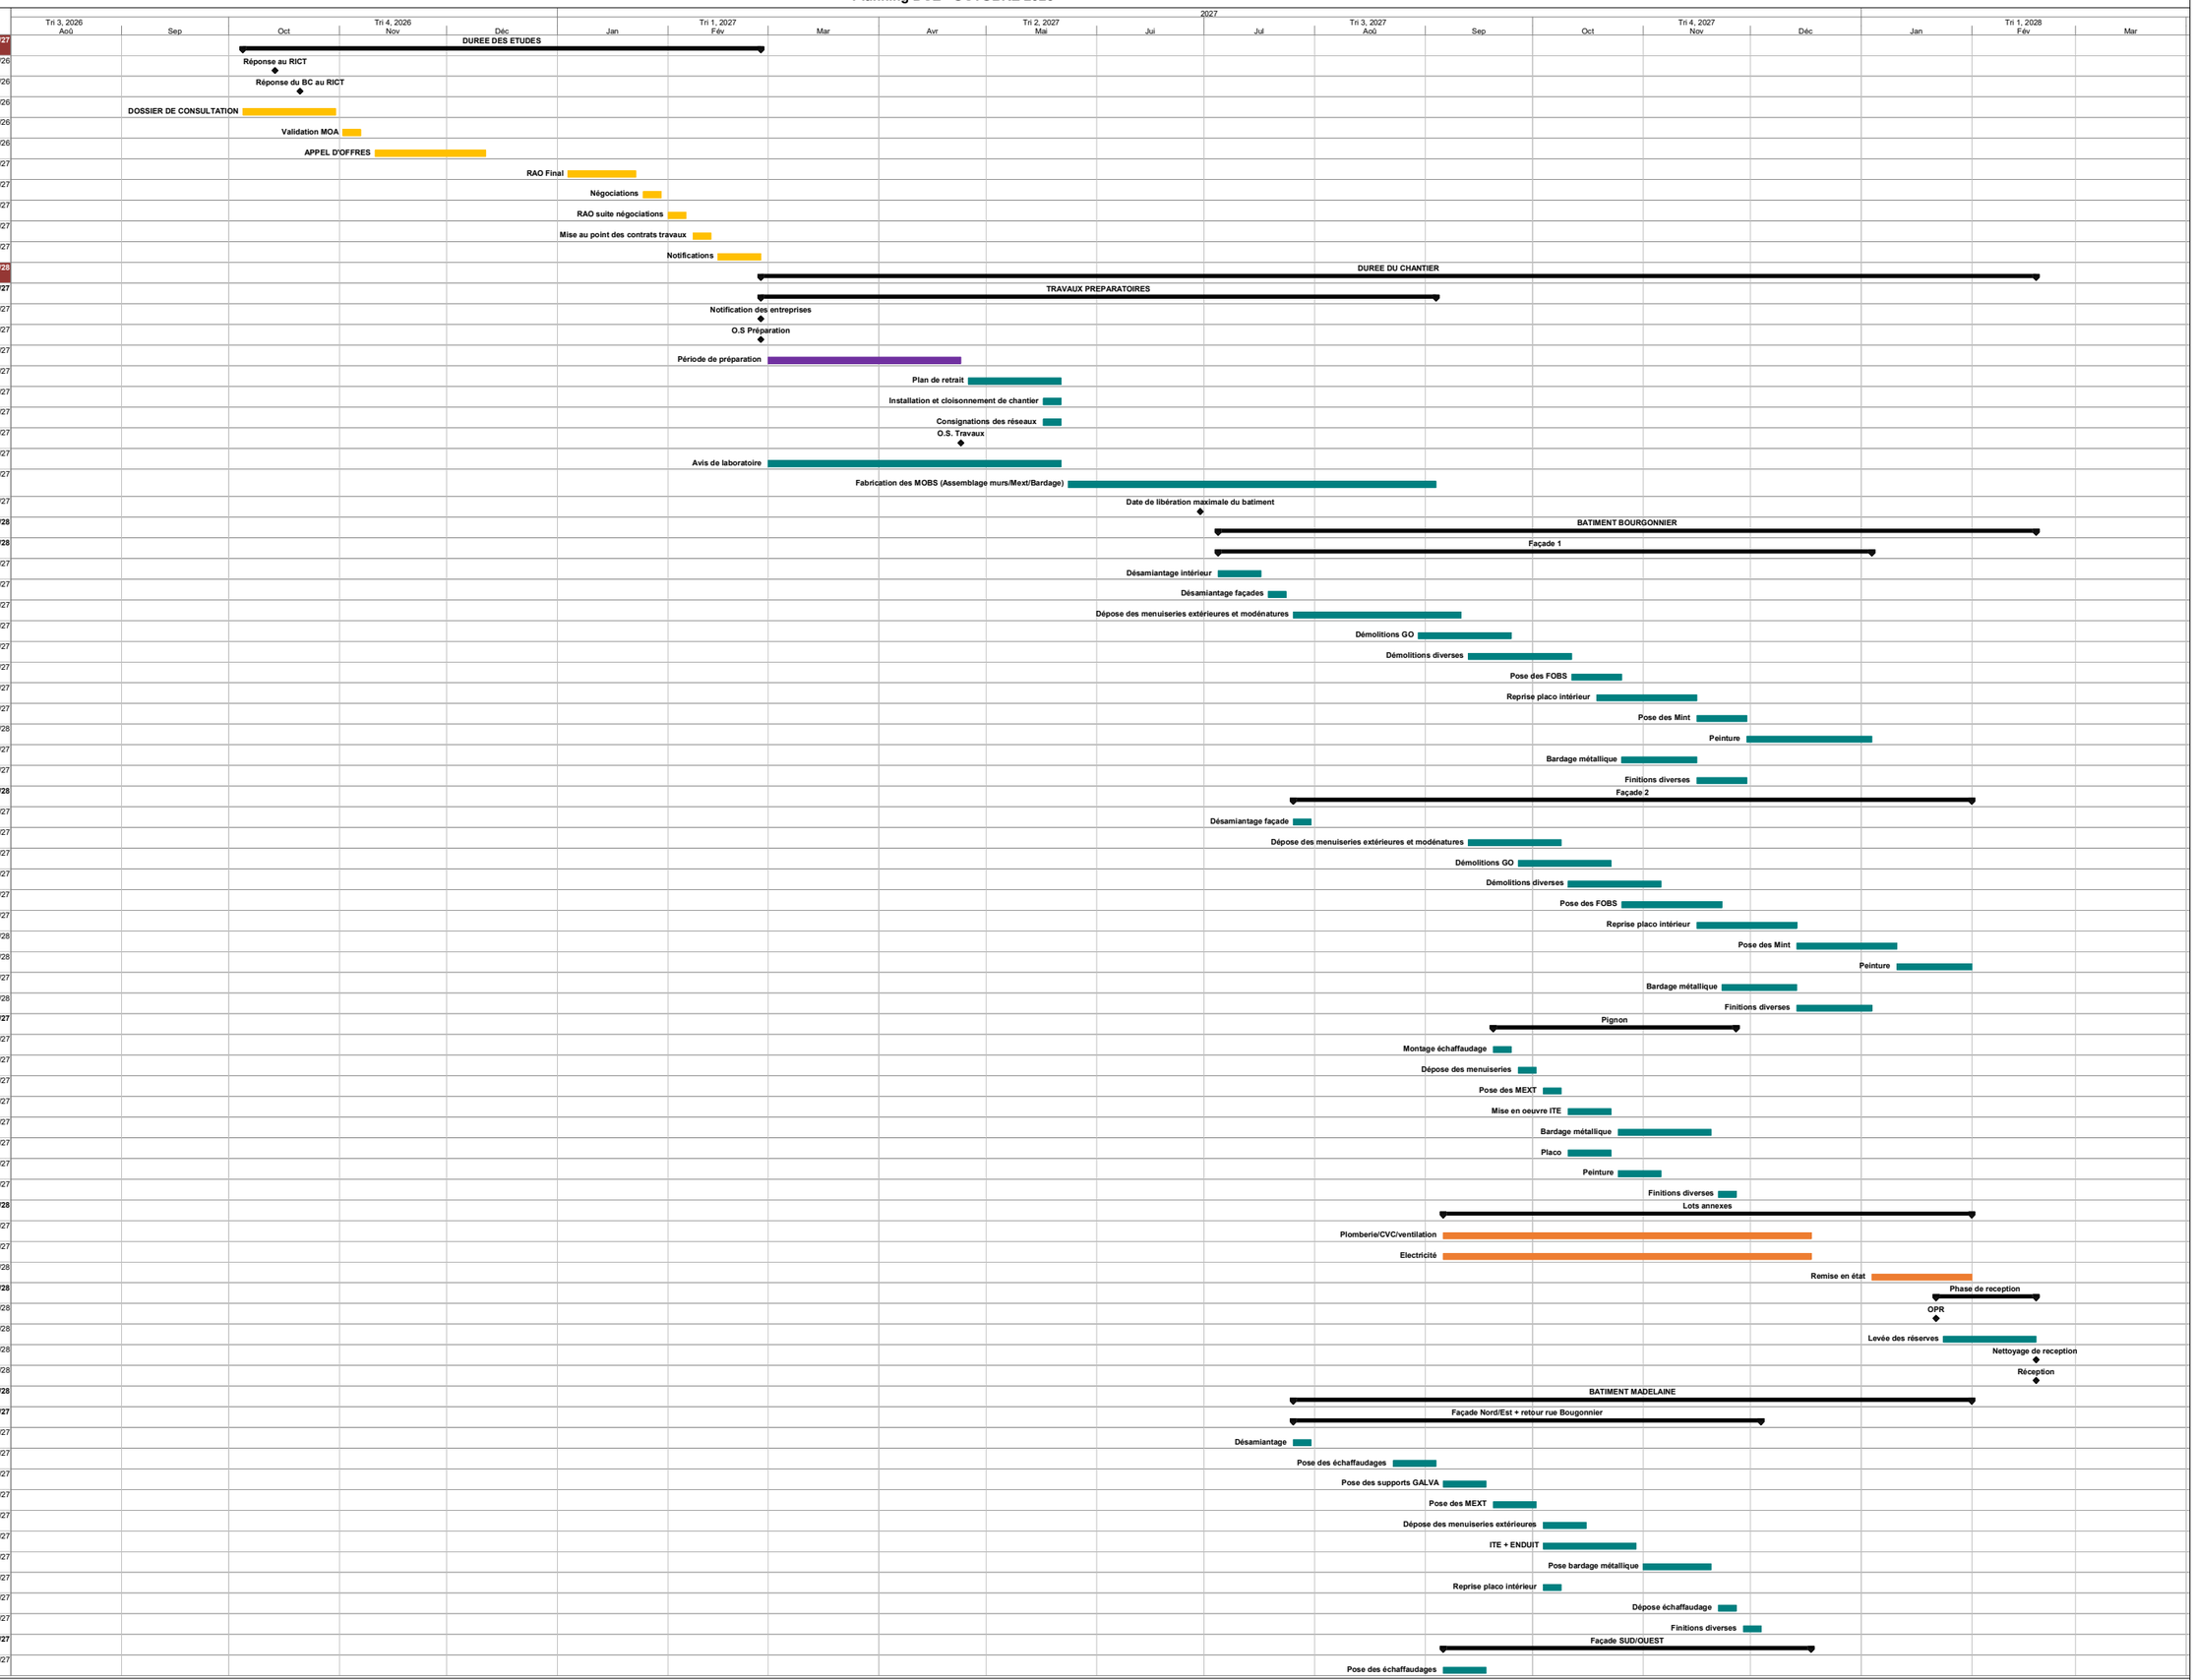

Dressé par E.DENIAUD

Réhabilitation et restructuration résidence étudiante BOURGONNIER MADELAINE

Planning DCE - OCTOBRE 2026

N°	Nom de la tâche	Début	Fin
80	Pose des supports GALVA	Lun 20/09/27	Ven 01/10/27
81	Pose des MEXT	Lun 04/10/27	Ven 15/10/27
82	Dépose des menuiseries extérieures	Lun 18/10/27	Ven 29/10/27
83	ITE + ENDUIT	Lun 18/10/27	Ven 12/11/27
84	Pose bardage métallique	Lun 15/11/27	Ven 03/12/27
85	Reprise placo intérieur	Lun 18/10/27	Ven 22/10/27
86	Dépose échaffaudage	Lun 06/12/27	Ven 10/12/27
87	Finitions diverses	Lun 13/12/27	Ven 17/12/27
88	**Lots annexes**	**Lun 04/10/27**	**Ven 14/01/28**
89	Plomberie/CVC/ventilation	Lun 04/10/27	Ven 07/01/28
90	Electricité	Lun 04/10/27	Ven 07/01/28
91	Remise en état	Lun 03/01/28	Ven 14/01/28
92	**Phase de reception**	**Ven 07/01/28**	**Lun 31/01/28**
93	Nettoyage OPR	Lun 10/01/28	Lun 10/01/28
94	OPR	Ven 07/01/28	Ven 07/01/28
95	Levée des réserves	Lun 10/01/28	Lun 31/01/28
96	Nettoyage de reception	Lun 31/01/28	Lun 31/01/28
97	Réception	Lun 31/01/28	Lun 31/01/28



Dressé par E.DENIAUD
