PRE RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Code du travail :	Décret :	Arrêtés :
Article R.4412-97	n°2011-629 du 3 juin 2011 n°2012-639 du 4 mai 2012 n°2013-594 du 5 juillet 2013 n°2015-789 du 29 juin 2015 n°2017-899 du 9 mai 2017 n°2019-251 du 27 mars 2019	du 26 juin 2013 du 25 juillet 2016 du 16 juillet 2019
Code de la Santé Publique :		

Norme : Norme NFX 46 -020 d'août 2017

1. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE BÂTI

Adresse : BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS

Complément d'adresse

Bât : | Entrée :

Esc. : | Etage :

Porte n : | Lot n° :

Référence cadastrale : Non Communiqué(s)

Fonction principale du bâtiment : Tertiaire

Type de bien : ERP

Catégorie du bâtiment : de 701 à 1500 personnes

Date du permis de construire : Antérieur au 1 juillet 1997



N° de dossier	Date de la commande
5349011	10/02/2026
Date du repérage	**Accompagnateur**
18/02/2026	Aucun

2. DESIGNATION DE L'ORGANISME ET AUTEUR DU REPERAGE

Organisme : QUALICONSULT IMMOBILIER

Adresse : 6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU

Auteur du repérage : ADELIS Gwenael

ICERT

Compétence Certifié par N° CPDI4649

Depuis le 17/04/2024

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police : 11450130004

Date de validité : 31/12/2026

3. DESIGNATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE

Laboratoire : EUROFINS OUEST

N° d'accréditation : 1-5597 rév 11

Adresse : 11, rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 NANTES

REVISION	DATE	OBJET
Version 01	07/04/2026	Création du document

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

SOMMAIRE

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE 3
1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS 4
1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE 4
1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE 4
2. PREAMBULE 4
3. BUT DE LA MISSION 4
3.1. REPERAGE ANTERIEUR REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE 4
3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 4
3.3. PERIMETRE DU REPERAGE 5
3.4. PROGRAMME DE REPERAGE 9
4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC 20
4.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE 20
4.2. PHASE DE REPERAGE 20
4.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON 21
5. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES 21
6. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE 25
6.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE 25
6.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 38
6.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 38
7. OBSERVATIONS & RESERVES 67
8. ANNEXES 67

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION **68**
PLANCHE(S) DE REPERAGE **71**
PLANCHE PHOTO(S) **77**
PROCES VERBAUX D'ANALYSES LABORATOIRE **119**
DOCUMENT(S) REMI(S) **155**
ATTESTATION D'ASSURANCE **169**
CERTIFICAT DE QUALIFICATION **171**

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE

DANS LE CADRE DE LA MISSION OBJET DU PRESENT RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Plaques, panneaux en composites — **Quantité estimée total dans la ZPSO :**

Etage	Local ou partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure	(Quantité estimée dans le local
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P119)	13 u

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Justification
Plomberies de l'ensemble des chambres	**Tous les étages**	Salle de bain/ cuisine	**Bourre de plomberies, éventuellement conduits encastrées gaines techniques**	Bâtiment en activité. Site occupé

Edité le : **07/04/2026**

Fait à : **CARQUEFOU**

Cachet de l'entreprise

QUALICONSULT IMMOBILIER
6 Bis Rue Alessandro Volta, Bâtiment F9
44481 CARQUEFOU CEDEX
Tél. 02 51 13 12 31 - Fax 02 51 13 99 44
nantes.facilities@qualiconsult.fr
SIRET 490 676 293 00569

Signature de l'opérateur

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Nom : CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

Qualité du donneur d'ordre :
Sur déclaration de l'intéressé

Adresse : 2 BOULEVARD GUY MOLLET
44322 NANTES CEDEX 3

1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Nom : CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

Qualité du donneur d'ordre :
Sur déclaration de l'intéressé

Adresse : 2 BOULEVARD GUY MOLLET
44322 NANTES CEDEX 3

2. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **de travaux de l'immeuble sis :**

BATIMENT Madeleine
19-21 Rue Lainé Laroche
49000 ANGERS

Date de délivrance du permis de construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**

Destination présente et passée de l'immeuble bâti : **Tertiaire**

Les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention sont définies à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique ainsi que par arrêté.

ANCIENS REPERAGE REMIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE :

Moyens mis à disposition par le maître d'ouvrage : Néant

3. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les ouvrages ou composant de la construction susceptibles d'être affectés par les travaux.

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 d'août 2017 :

Sans Objet

3.1. REPERAGE ANTERIEUR REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun repérages antérieure nous a été remis

3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Ref. Programme de Travaux	DESCRIPTION DES TRAVAUX
	Etude de travaux en annexes.

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

3.3. PERIMETRE DU REPERAGE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage	Etage	Travaux
Circulation	RDC	Concernée
Local poubelles	RDC	Concernée
Hall d'entée	RDC	Concernée
Escalier	RDC	Concernée
Circulation	1er	Concernée
Piece de vie	RDC - Chambre 209	Concernée
Salle de bains	RDC - Chambre 209	Concernée
Local ménage	RDC	Concernée
Locla ménage	1er	Concernée
Escalier	1er	Concernée
Pièce de vie	1er - Chambre 212	Concernée
Salle de bains	1er - Chambre 212	Concernée
Pièce de vie	1er - Chambre 216	Concernée
Salle de bains	1er - Chambre 216	Concernée
Circulation	2ème	Concernée
Locla ménage	2ème	Concernée
Escalier	2ème	Concernée
Pièce de vie	2ème - Chambre 225	Concernée
Salle de bains	2ème - Chambre 225	Concernée
Pièce de vie	2ème - Chambre 226	Concernée
Salle de bains	2ème - Chambre 226	Concernée
Circulation	3ème	Concernée
Locla ménage	3ème	Concernée
Escalier	3ème	Concernée
Pièce de vie	3ème - Chambre 234	Concernée
Salle de bains	3ème - Chambre 234	Concernée
Pièce de vie	3ème - Chambre 239	Concernée
Salle de bains	3ème - Chambre 239	Concernée
Chaufferie	3ème	Concernée
Combles	3ème	Concernée
Couverture	Ext	Concernée
Façades	Ext	Concernée
Piece de vie	RDC - Chambre 201	Concernée
Salle de bains	RDC - Chambre 210	Concernée
Piece de vie	RDC - Chambre 210	Concernée
Salle de bains	RDC - Chambre 201	Concernée
Piece de vie	RDC - Chambre 202	Concernée
Salle de bains	RDC - Chambre 202	Concernée

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage	Etage	Travaux
Piece de vie	RDC - Chambre 203	Concernée
Salle de bains	RDC - Chambre 203	Concernée
Piece de vie	RDC Chambre 204	Concernée
Salle de bains	RDC Chambre 204	Concernée
Piece de vie	RDC Chambre 205	Concernée
Salle de bains	RDC Chambre 205	Concernée
Piece de vie	RDC Chambre 206	Concernée
Salle de bains	RDC Chambre 206	Concernée
Piece de vie	RDC Chambre 207	Concernée
Salle de bains	RDC Chambre 207	Concernée
Piece de vie	RDC Chambre 208	Concernée
Salle de bains	RDC Chambre 208	Concernée
Pièce de vie	1er - Chambre 211	Concernée
Salle de bains	1er - Chambre 211	Concernée
Pièce de vie	1er - Chambre 213	Concernée
Salle de bains	1er - Chambre 213	Concernée
Pièce de vie	1er - Chambre 214	Concernée
Salle de bains	1er - Chambre 214	Concernée
Pièce de vie	1er - Chambre 215	Concernée
Salle de bains	1er - Chambre 215	Concernée
Pièce de vie	1er - Chambre 217	Concernée
Salle de bains	1er - Chambre 217	Concernée
Pièce de vie	1er - Chambre 218	Concernée
Salle de bains	1er - Chambre 218	Concernée
Pièce de vie	1er - Chambre 219	Concernée
Salle de bains	1er - Chambre 219	Concernée
Pièce de vie	1er - Chambre 220	Concernée
Salle de bains	1er - Chambre 220	Concernée
Pièce de vie	1er - Chambre 221	Concernée
Salle de bains	1er - Chambre 221	Concernée
Pièce de vie	2ème - Chambre 222	Concernée
Salle de bains	2ème - Chambre 222	Concernée
Pièce de vie	2ème - Chambre 223	Concernée
Salle de bains	2ème - Chambre 223	Concernée
Pièce de vie	2ème - Chambre 224	Concernée
Salle de bains	2ème - Chambre 224	Concernée

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage	Etage	Travaux
Pièce de vie	2ème - Chambre 227	Concernée
Salle de bains	2ème - Chambre 227	Concernée
Pièce de vie	2ème - Chambre 228	Concernée
Salle de bains	2ème - Chambre 228	Concernée
Pièce de vie	2ème - Chambre 229	Concernée
Salle de bains	2ème - Chambre 229	Concernée
Pièce de vie	2ème - Chambre 230	Concernée
Salle de bains	2ème - Chambre 230	Concernée
Pièce de vie	2ème - Chambre 231	Concernée
Salle de bains	2ème - Chambre 231	Concernée
Pièce de vie	2ème - Chambre 232	Concernée
Salle de bains	2ème - Chambre 232	Concernée
Pièce de vie	3ème - Chambre 233	Concernée
Salle de bains	3ème - Chambre 233	Concernée
Pièce de vie	3ème - Chambre 235	Concernée
Salle de bains	3ème - Chambre 235	Concernée
Pièce de vie	3ème - Chambre 236	Concernée
Salle de bains	3ème - Chambre 236	Concernée
Pièce de vie	3ème - Chambre 237	Concernée
Salle de bains	3ème - Chambre 237	Concernée
Pièce de vie	3ème - Chambre 238	Concernée
Salle de bains	3ème - Chambre 238	Concernée
Pièce de vie	3ème - Chambre 240	Concernée
Salle de bains	3ème - Chambre 240	Concernée
Pièce de vie	3ème - Chambre 241	Concernée
Salle de bains	3ème - Chambre 241	Concernée
Pièce de vie	3ème - Chambre 242	Concernée
Salle de bains	3ème - Chambre 242	Concernée
Pièce de vie	3ème - Chambre 243	Concernée
Salle de bains	3ème - Chambre 243	Concernée

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

3.4. PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire(s)
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
	Plaques planes en fibre-ciment	P	
	Plaques ondulées (Plaque sous tuiles PST) en fibres-ciment	P	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux ("shingles")	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
	Conduits de fumées	P	
	Conduits de cheminée	P	
	Conduits de ventilation	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Chéneaux	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Rives	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Closoirs	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Faitages	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Mïtres	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Costières	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Autre	P	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	
	Isolants fibreux en sous toiture	P	
	Flocages, enduits projetés	M	
	Isolans fibreux en sous-toiture	P	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Pare-vapeur	P	
	Pare pluie	P	
	Enduits projetés	M	
	Flocages	M	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
	Colles, produits d'accrochage	M	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés,...)	P	
	Parties planes ou relevés : compexes asphaltés	M	
	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés,...)	M	
	Parties planes : écrans de semi indépendance	M	
	Parties planes : pare-vapeur	M	
	Colles	M	
	Produits d'accrochage	M	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux…)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	M	
	Mastics vitriers	M	
	Mastics bitumineux	M	
	Mastics autre	M	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
	Plaques	P	
	Panneaux	P	
	Bacs en fibres-ciment	P	
	Eléments de remplissage	P	
	Joints d'assemblage	P	
	Joints d'étanchéité	P	
	Mastics	P	
	Tresses	P	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
	Carton-amiante	M	
	Flocages	M	
	Enduits projetés	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Colles et joints (faience, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940)	M	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
	Enduits extérieurs - projetés	M	
	Enduits extérieurs - lissés	M	
	Enduits extérieurs - talochés	M	
	Crépis extérieurs	M	
	Colles de faïence	M	
	Joints de faïence	M	
	Colles pâte de verre	M	
	Joints pâte de verre	M	
	Colles de carrelage	M	
	Joints de carrelage	M	
	Ragréages	M	
	Primaires d'accrochage	M	
	Imperméabilisants	M	
	briques blanches silico-calcaire	M	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Peintures décoratives	M	
	Plaques de fibres-ciment - Allèges	P	
	Plaques de fibres-ciment - Tableaux	P	
	Plaques de fibres-ciment - Embrasures	P	
	Plques de fibres-ciment - Impostes	P	
	Plaques de fibres-ciment - Autre	P	
	Plaques - fibres-ciment - Coffres	P	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P	
	Conduits de fumées	P	
	Conduits de cheminée	P	
	Conduits de vetilation	P	
	Conduits d'aération	P	
	Conduits d'eau pluvial (EP)	P	
	Conduits d'eaux usées (EU)	P	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Conduit d'eaux vannes (EV)	P	
	Eléments ponctuels - chéneaux	P	
	Eléments ponctuels - rives	P	
	Eléments ponctuels - corniches	P	
	Eléments ponctuels - cache moineaux	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)	P	
	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de plâtre	M	
	Enduits à base de ciment projetés	M	
	Enduits à base de ciment lissés	M	
	Enduits à base de ciment talochés	M	
	Enduits de ragréage	M	
	Enduits de débullage	M	
	Enduits de lissage	M	
	Joints de dilatation	M	
	Joints d'assemblage	M	
	Joints coupe-feu	M	
	Fourreaux - carton	P	
	Fourreaux fibres-ciment	P	
	Fourreaux PVC	P	
	Fourreaux métalliques	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibresciment, matériaux sandwich…), coffrages perdus	P	
	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de ciment lissés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Enduits à base de ciment talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation	M	
	Joints d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau carton-amiante	P	
	Entourages de poteau fibres-ciment	P	
	Entourages de poteau matériaux sandwich	P	
	Entourages de poteau autre	P	
	Entourages de poteau coffrages perdus	P	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous-couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Panneaux de cloisons lisses	P	
	Panneaux de cloisons moulurées	P	
	Panneaux de cloisons préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de ciment projetés	M	
	Enduits à base de ciment lissés	M	
	Enduits à base de ciment talochés	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse	P	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : carton	P	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : fibres-ciment	P	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse	P	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : carton	P	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : fibres-ciment	P	
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, …)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P	
	Flocages	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement des plaques de plaque cartonné	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de ciment lissés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Enduits à base de ciment talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Panneaux fibres-ciment	M	
	Panneaux bois agglomérés	M	
	Panneaux autre	M	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Jonctions entre panneaux tresses	P	
	Jonctions entre panneaux étanchéité entre panneaux	P	
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P	
	Isolants intérieurs des portes	P	
	Isolants intérieurs des portes	P	
	Joints des portes coupe-feu (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P	
	Joints des portes phoniques (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P	
	Joints des portes pare-flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P	
	Panneaux	P	
	Plaques en fibres-ciment des vantaux	P	
	Bakelite	P	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Sous-couches des tissus muraux	P	
	Sous-couches des moquettes murales	P	
	Sous-couches des les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibres-ciment (lambris)	P	
	Revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles de carrelage	M	
	Colles de faïence	M	
	Ragréage	M	
	Primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives : paillettes	M	
	Peintures décoratives : goutelettes	M	
	Peintures décoratives : autre	M	
	Joints de carrelage	M	
	Joints de faïence	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Flocages	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)	M	
	Résines	M	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M	
	Flocages	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous-couche des tissus muraux	P	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Résines	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de ciment projetés	M	
	Enduits à base de ciment lissés	M	
	Enduits à base de ciment talochés	M	
	Coffrages perdus carton-amiante	P	
	Coffrages perdus fibres-ciment	P	
	Coffrages perdus composite	P	
	Peintures décoratives pailletées	M	
	Peintures décoratives goutelettes	M	
	Peintures décoratives autre	M	
	Colles de carrelage	M	
	Ragréages	M	
	Primaires d'accrochage	M	
	Joints de carrelage	M	
Poutres et charpentes	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibresciment, matériaux sandwich)	P	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)	M	
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	
	Flocages	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de ciment projetés	M	
	Enduits à base de ciment lissés	M	
	Enduits à base de ciment talochés	M	
	Entourages de poutres carton-amiante	P	
	Entourages de poutres fibres-ciment	P	
	Entourages de poutres matériaux sandwich	P	
	Peintures décoratives pailletées	M	
	Peintures décoratives goutelettes	M	
	Peintures décoratives autre	M	
	Jonctions avec la façade	M	
	Calfeutrements	M	
	Joints coupe-feu	M	
	Joints de dilatation	M	
	Joints de structure	M	
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, …)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M	
	Flocages	M	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de ciment projetés	M	
	Enduits à base de ciment lissés	M	
	Enduits à base de ciment talochés	M	
	Panneaux fibres-ciment	P	
	Panneaux bois aggloméré	P	
	Panneaux bois	P	
	Panneaux bois autre	P	
	Panneaux PVC	P	
	Panneaux autres	P	
	Jonctions entre panneaux tresses	M	
	Jonctions entre panneaux étanchéité entre panneaux	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P	
	Pare vapeur	P	
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P	
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	
	Panneaux et plaques	P	
	Pare vapeur	P	
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P	
	Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	
	Jonctions entre faux plafond et structure	P	
	joints entre panneaux	P	
Suspentes et contrevents	Flocages	M	
	Protections en plâtre	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Flocages	M	
	Protections en plâtre	M	
	Peintures intumescentes	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P	
	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	M	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Moquette	M	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	
	Joints de dilatation et d'assemblage	P	
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	
	Enduit de cuvelage	M	
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M	
	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Moquette	M	
	Peintures de sol	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	
	Joints de dilatation et d'assemblage	P	
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	
	Enduit de cuvelage	M	
	Colles de carrelage	M	
	Joints de carrelage	M	
	Sous-couches des revêtements souples - Carton	M	
	Sous-couches des revêtements souples - Feutre	M	
	Sous-couches des revêtements souples - Autre	M	
	Sols coulés à base ciment - Terrazolith	M	
	Sols coulés à base ciment - Autre	M	
	Ragréages	M	
	Primaires d'accrochage	M	
	Rebouchages autour de conduits (principalement immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public), fourreaux en carton	M	
	Rebouchages autour de conduits (principalement immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public), fibres-ciment	M	
6 - Conduits et accessoires intérieurs			
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas…)	M	
	Matelas	P	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Rubans adhésifs	P	
	Mastics	M	
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P	
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P	
	Matelas	P	
	Rubans adhésifs	P	
	Mastics	M	
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P	
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P	
	Calorifuges tresses	M	
	Calorifuges coquilles	M	
	Calorifuges matelas	M	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Calorifuges autre	M	
	Enveloppes de calorifugeage - bandes tissées enduites	M	
	Enveloppes de calorifugeage - bandes tissées non enduites	M	
	Colles de calorifugeage	M	
	Joints entre éléments	M	
	Joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Conduits en fibres-ciment	P	
	Manchons en fibres-ciment	P	
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P	
	Volets coupe-feu y compris ossature	P	
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M	
	Volets coupe-feu y compris ossature	P	
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M	
	Clapets - tunnels	P	
	Clapets - Lames	P	
	Clapets - Joints	P	
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P	
	Joints d'étanchéité des trappes	M	
	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P	
	Joints d'étanchéité des trappes	M	
8 - Équipements divers et accessoires			
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages	M	
	Bourres	M	
	Tresses	M	
	Calorifugeages	M	
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M	
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P	
	Flocages	M	
	Bourres	M	
	Tresses	M	
	Calorifugeages	M	
	Joints d'étanchéité	M	
	Joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Dispositifs anti condensation- peintures	M	
	Dispositifs anti condensation - films	M	
	Dispositifs anti condensation - Autre	M	
	Tissus	P	
	Soufflets amortisseurs acoustiques	P	
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P	
	Tresses des diffuseurs	M	
	Isolants thermiques cartonnés	P	
	Tresses des diffuseurs	M	
Fusibles à broche	Carton, tresse	P	
	Tresse	P	
	Carton	P	
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P	
	Isolants	P	
Coffres-forts	Portes et parois	P	
	Portes	P	
	Parois	P	
	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P	
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P	
	Eléments en fibres-ciment	P	

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

4.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE

Dans le cadre d'une mission de repérage amiante avant travaux, **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER** les plans du bâtiment à jour ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche et le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante (ancien rapport de repérage, DTA, DIUO, DOE, etc…)

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit définir précisément la nature des travaux projeté ainsi que le périmètre de l'opération.
Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre n'est pas en mesure d'imposer :

- La méthodologie de repérage, celle-ci étant définie par l'arrêté du 16 juillet 2019 et la norme NF X 46-020 d'août 2017 satisfait également aux exigences de l'arrêté,
- Le nombre de prélèvement à analyser,

Le nombre d'investigations approfondies, le nombre de sondages, ainsi que le nombre de prélèvements et analyses à effectuer ne peut être déterminé avant l'achèvement du repérage.

Le maitre d'ouvrage / donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à **QUALICONSULT IMMOBILIER** tous les moyens d'accès pour le bon déroulement du repérage et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de toutes les autorisations et instrument d'accès nécessaires.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre informe les occupants et exploitant, de l'intervention qui doit être réalisé dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. **Le maitre d'ouvrage / donneur d'ordre** ou son représentant prend, à la demande l'opérateur de repérage, les dispositions ^pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre est tenu :

- De vérifier la cohérence entre le programme de travaux et le programme de repérage et son périmètre proposés.
- De fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisations,
- De procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage,
- D'informer l'opérateur de repérage de toute modification du programme de travaux

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

4.2. PHASE DE REPERAGE

La phase de repérage comporte deux étapes :
- **1er Etape** : l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble bâti, pour cela il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
- **2ème Etape** : l'opérateur de repérage :
  - Recherche et identifie les matériaux ou produit inscrit dans le programme de repérage
  - Repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante
  - Conclut sur la présence ou l'absence d'amiante

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leur caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

/!\ Avertissement :
Le repérage est réalisé conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019 et à la norme NF X46-020 d'août 2017, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (exemple des enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.
Les sondages et investigation approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020, il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages …) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore occupé et meublé, ces revêtements étant encore en place

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

4.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du matériau ou produit inscrit dans le programme de repérage, sera placé dans un contenant étanche doublé sir lequel seront reportées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel est soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront besoins l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le **COFRAC** au titre du LAB GTA 44 et de la norme NF X43-050.
Les méthodes d'analyse appliquée est conforme au conforme au programme d'accréditation des laboratoires LAB GTA 44 « Recherche d'amiante dans les échantillons massifs » du **COFRAC**.
En fonction de la nature du matériau ou produit à analyser, les techniques d'analyse appliquées sont les suivantes :
- La microscopie optique à lumière polarisée (**MOLP**)
- La microscopie électronique à transmission analytique (**META**)

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ».

5. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	⚠ Justification
RDC	Circulation	OUI	
RDC	Local poubelles	OUI	
RDC	Hall d'entée	OUI	
RDC	Escalier	OUI	
1er	Circulation	OUI	
RDC - Chambre 209	Piece de vie	OUI	
RDC - Chambre 209	Salle de bains	OUI	
RDC	Local ménage	OUI	
1er	Locla ménage	OUI	
1er	Escalier	OUI	
1er - Chambre 212	Pièce de vie	OUI	
1er - Chambre 212	Salle de bains	OUI	
1er - Chambre 216	Pièce de vie	OUI	
1er - Chambre 216	Salle de bains	OUI	
2ème	Circulation	OUI	
2ème	Locla ménage	OUI	
2ème	Escalier	OUI	
2ème - Chambre 225	Pièce de vie	OUI	
2ème - Chambre 225	Salle de bains	OUI	
2ème - Chambre 226	Pièce de vie	OUI	
2ème - Chambre 226	Salle de bains	OUI	
3ème	Circulation	OUI	
3ème	Locla ménage	OUI	
3ème	Escalier	OUI	
3ème - Chambre 234	Pièce de vie	OUI	
3ème - Chambre 234	Salle de bains	OUI	
3ème - Chambre 239	Pièce de vie	OUI	
3ème - Chambre 239	Salle de bains	OUI	
3ème	Chaufferie	OUI	
3ème	Combles	OUI	
Ext	Couverture	OUI	
Ext	Façades	OUI	
RDC - Chambre 201	Piece de vie	OUI	
RDC - Chambre 210	Salle de bains	OUI	
RDC - Chambre 210	Piece de vie	OUI	
RDC - Chambre 201	Salle de bains	OUI	
RDC - Chambre 202	Piece de vie	OUI	
RDC - Chambre 202	Salle de bains	OUI	
RDC - Chambre 203	Piece de vie	OUI	
RDC - Chambre 203	Salle de bains	OUI	
RDC Chambre 204	Piece de vie	OUI	
RDC Chambre 204	Salle de bains	OUI	
RDC Chambre 205	Piece de vie	OUI	
RDC Chambre 205	Salle de bains	OUI	
RDC Chambre 206	Piece de vie	OUI	
RDC Chambre 206	Salle de bains	OUI	
RDC Chambre 207	Piece de vie	OUI	
RDC Chambre 207	Salle de bains	OUI	
RDC Chambre 208	Piece de vie	OUI	
RDC Chambre 208	Salle de bains	OUI	
1er - Chambre 211	Pièce de vie	OUI	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	⚠ Justification
1er - Chambre 211	Salle de bains	OUI	
1er - Chambre 213	Pièce de vie	OUI	
1er - Chambre 213	Salle de bains	OUI	
1er - Chambre 214	Pièce de vie	OUI	
1er - Chambre 214	Salle de bains	OUI	
1er - Chambre 215	Pièce de vie	OUI	
1er - Chambre 215	Salle de bains	OUI	
1er - Chambre 217	Pièce de vie	OUI	
1er - Chambre 217	Salle de bains	OUI	
1er - Chambre 218	Pièce de vie	OUI	
1er - Chambre 218	Salle de bains	OUI	
1er - Chambre 219	Pièce de vie	OUI	
1er - Chambre 219	Salle de bains	OUI	
1er - Chambre 220	Pièce de vie	OUI	
1er - Chambre 220	Salle de bains	OUI	
1er - Chambre 221	Pièce de vie	OUI	
1er - Chambre 221	Salle de bains	OUI	
2ème - Chambre 222	Pièce de vie	OUI	
2ème - Chambre 222	Salle de bains	OUI	
2ème - Chambre 223	Pièce de vie	OUI	
2ème - Chambre 223	Salle de bains	OUI	
2ème - Chambre 224	Pièce de vie	OUI	
2ème - Chambre 224	Salle de bains	OUI	
2ème - Chambre 227	Pièce de vie	OUI	
2ème - Chambre 227	Salle de bains	OUI	
2ème - Chambre 228	Pièce de vie	OUI	
2ème - Chambre 228	Salle de bains	OUI	
2ème - Chambre 229	Pièce de vie	OUI	
2ème - Chambre 229	Salle de bains	OUI	
2ème - Chambre 230	Pièce de vie	OUI	
2ème - Chambre 230	Salle de bains	OUI	
2ème - Chambre 231	Pièce de vie	OUI	
2ème - Chambre 231	Salle de bains	OUI	
2ème - Chambre 232	Pièce de vie	OUI	
2ème - Chambre 232	Salle de bains	OUI	
3ème - Chambre 233	Pièce de vie	OUI	
3ème - Chambre 233	Salle de bains	OUI	
3ème - Chambre 235	Pièce de vie	OUI	
3ème - Chambre 235	Salle de bains	OUI	
3ème - Chambre 236	Pièce de vie	OUI	
3ème - Chambre 236	Salle de bains	OUI	
3ème - Chambre 237	Pièce de vie	OUI	
3ème - Chambre 237	Salle de bains	OUI	
3ème - Chambre 238	Pièce de vie	OUI	
3ème - Chambre 238	Salle de bains	OUI	
3ème - Chambre 240	Pièce de vie	OUI	
3ème - Chambre 240	Salle de bains	OUI	
3ème - Chambre 241	Pièce de vie	OUI	
3ème - Chambre 241	Salle de bains	OUI	
3ème - Chambre 242	Pièce de vie	OUI	
3ème - Chambre 242	Salle de bains	OUI	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	⚠ Justification
3ème - Chambre 243	Pièce de vie	OUI	
3ème - Chambre 243	Salle de bains	OUI	

6. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

6.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
RDC	Circulation	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Revêtements de sols n°1	Colle de carrelage 30x30 beige + ragréage
		Faux-plafond	Bois vernie
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de plinthes 10x20 beige
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux
		Plafonds	Enduit blanc
RDC	Hall d'entée	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de plinthes 10x20 beige
		Revêtements de sols n°1	Colle de carrelage 30x30 beige + ragréage
		Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
RDC	Escalier	Poteaux	Peinture + enduit
		Marches	Revêtement souple + colle
		Contre marches	Revêtement souple + colle
		Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Enduit de façade gris granuleux
1er	Circulation	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux
RDC - Chambre 209	Piece de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
RDC - Chambre 209	Salle de bains	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°1	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche
RDC	Local ménage	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit béton
		Plafonds	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Peinture bleu
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit béton
		Plafonds	Peinture + enduit béton
1er	Locla ménage	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Plafond	Peinture + enduit maigre
1er	Escalier	Contre marches	Revêtement souple + colle
		Marches	Revêtement souple + colle
		Poteaux	Peinture + enduit
		Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Enduit de façade gris granuleux
1er - Chambre 212	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
1er - Chambre 212	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
1er - Chambre 216	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
1er - Chambre 216	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
2ème	Circulation	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Ragréage
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux
2ème	Locla ménage	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
2ème	Escalier	Contre marches	Revêtement souple + colle
		Marches	Revêtement souple + colle
		Poteaux	Peinture + enduit
		Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Enduit de façade gris granuleux
2ème - Chambre 225	Pièce de vie	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
2ème - Chambre 225	Salle de bains	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
2ème - Chambre 226	Pièce de vie	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
2ème - Chambre 226	Salle de bains	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
3ème	Circulation	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Ragréage
3ème	Locla ménage	Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
3ème	Escalier	Contre marches	Revêtement souple + colle
		Marches	Revêtement souple + colle
		Poteaux	Peinture + enduit
		Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Enduit de façade gris granuleux
3ème - Chambre 234	Pièce de vie	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
3ème - Chambre 234	Salle de bains	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 239	Pièce de vie	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
3ème - Chambre 239	Salle de bains	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
3ème	Chaufferie	Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Parpaing	Béton
		Revêtements de sols	Dalle béton
		Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Calorifuge
3ème	Combles	Revêtements de sols	Laine minérale + pare vapeur
		Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppe de calorifugeages (plâtre)
		Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifugeage (noir)
Ext	Couverture	Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises naturelles
Ext	Façades	Menuiseries extérieures	Joint de vitrage
		Menuiseries extérieures	Joint de compression (rdc)
		Menuiseries extérieures	Joint de compression (1er étage)
		Menuiseries extérieures	Joint de vitrage
		Menuiseries extérieures - Tablier	Joint de vitrage
		Façades lourdes y compris poteaux	Peinture + enduit béton
		Façades lourdes y compris poteaux	Peinture + enduit béton
		Façades lourdes y compris poteaux - (entre bâti et menuiseries extérieur)	Peinture + joint étanchéité
		Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux en composites
		Façades lourdes y compris poteaux - Rejingot	Joint blanc
RDC - Chambre 201	Piece de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
RDC - Chambre 210	Salle de bains	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°1	Revêtement souple + colle + ragréage
		Revêtements de sols n°2	Ragréage
RDC - Chambre 210	Piece de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
RDC - Chambre 201	Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°1	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°1	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Colle de faïence 10x10 blanche
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + enduit maigre
RDC - Chambre 202	Piece de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
RDC - Chambre 202	Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Colle de faïence 10x10 blanche
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + enduit maigre
RDC - Chambre 203	Piece de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
RDC - Chambre 203	Salle de bains	Revêtements de sols n°1	Revêtement souple + colle + ragréage
		Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
RDC Chambre 204	Piece de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
RDC Chambre 204	Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Colle de faïence 10x10 blanche
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
RDC Chambre 205	Piece de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
RDC Chambre 205	Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°1	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Colle de faïence 10x10 blanche
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + enduit maigre
RDC Chambre 206	Piece de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
RDC Chambre 206	Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Colle de faïence 10x10 blanche
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + enduit maigre
RDC Chambre 207	Piece de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
RDC Chambre 207	Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Colle de faïence 10x10 blanche
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + enduit maigre
RDC Chambre 208	Piece de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
RDC Chambre 208	Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°1	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Colle de faïence 10x10 blanche
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + enduit maigre
1er - Chambre 211	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er - Chambre 211	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
1er - Chambre 213	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er - Chambre 213	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
1er - Chambre 214	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er - Chambre 214	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
1er - Chambre 215	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
1er - Chambre 215		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
1er - Chambre 217	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er - Chambre 217	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
1er - Chambre 218	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er - Chambre 218	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
1er - Chambre 219	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er - Chambre 219	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
1er - Chambre 220	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er - Chambre 220	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
1er - Chambre 221	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er - Chambre 221	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage
2ème - Chambre 222	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème - Chambre 222	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
2ème - Chambre 223	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème - Chambre 223	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
2ème - Chambre 224	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème - Chambre 224	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
2ème - Chambre 227	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème - Chambre 227	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
2ème - Chambre 228	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème - Chambre 228	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
2ème - Chambre 229	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème - Chambre 229	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
2ème - Chambre 230	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème - Chambre 230	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
2ème - Chambre 231	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème - Chambre 231	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
2ème - Chambre 232	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème - Chambre 232	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
3ème - Chambre 233	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 233	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 235	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 235	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 236	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 236	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 237	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 237	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
	Pièce de vie	Revêtements de sols n°1	Ragréage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
3ème - Chambre 238		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 238	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
3ème - Chambre 240	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 240	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
3ème - Chambre 241	Pièce de vie	Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 241	Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
3ème - Chambre 242	Pièce de vie	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 242	Salle de bains	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
3ème - Chambre 243	Pièce de vie	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème - Chambre 243	Salle de bains	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre

6.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Plaques, panneaux en composites

Etage	Local / partie d'immeuble	Critère ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P119)

6.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Revêtements de sols Colle de carrelage 30x30 beige + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Circulation	Résultat d'analyse (P001)
RDC	Hall d'entée	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de plinthes 10x20 beige

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Circulation	Résultat d'analyse (P002)
RDC	Hall d'entée	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Circulation	Résultat d'analyse (P003)
RDC	Hall d'entée	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Circulation	Résultat d'analyse (P004)
RDC	Hall d'entée	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Circulation	Résultat d'analyse (P005)
RDC	Hall d'entée	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Circulation	Résultat d'analyse (P006)
RDC	Hall d'entée	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)

Poteaux Peinture + enduit

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Escalier	Résultat d'analyse (P007)
1er	Escalier	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
2ème	Escalier	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
3ème	Escalier	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)

Marches Revêtement souple + colle

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Escalier	Résultat d'analyse (P008)
1er	Escalier	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
2ème	Escalier	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
3ème	Escalier	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)

Contre marches Revêtement souple + colle

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Escalier	Résultat d'analyse (P009)
1er	Escalier	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
2ème	Escalier	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
3ème	Escalier	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)

Volée d'escalier Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Escalier	Résultat d'analyse (P010)
1er	Escalier	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
2ème	Escalier	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
3ème	Escalier	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Enduit de façade gris granuleux

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Escalier	Résultat d'analyse (P011)
1er	Escalier	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
2ème	Escalier	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
3ème	Escalier	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Circulation	Résultat d'analyse (P012)

Plafonds Enduit blanc

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Circulation	Résultat d'analyse (P013)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Local ménage	Résultat d'analyse (P014)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

Revêtements de sols Ragréage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Circulation	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC	Hall d'entée	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC - Chambre 209	Piece de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC - Chambre 209	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC	Local ménage	Résultat d'analyse (P015)
1er - Chambre 212	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 212	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 216	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 216	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 225	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 225	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 226	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 226	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 234	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 234	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 239	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 239	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC - Chambre 201	Piece de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC - Chambre 210	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC - Chambre 210	Piece de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC - Chambre 202	Piece de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Piece de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC Chambre 204	Piece de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC Chambre 205	Piece de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC Chambre 206	Piece de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC Chambre 207	Piece de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
RDC Chambre 208	Piece de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 211	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 211	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 213	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 213	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 214	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 214	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 215	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 215	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 217	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 217	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 218	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 218	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 219	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 219	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 220	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 220	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er - Chambre 221	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 221	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 222	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 222	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 223	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 223	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 224	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 224	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 227	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 227	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 228	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 228	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 229	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 229	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 230	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 230	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 231	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 231	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 232	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
2ème - Chambre 232	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 233	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 233	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 237	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 237	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 238	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 238	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 240	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 240	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 241	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 241	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 242	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 242	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Salle de bains	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit béton

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Local ménage	Résultat d'analyse (P016)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Local ménage	Résultat d'analyse (P017)

Menuiseries extérieures Joint de vitrage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P018)

Menuiseries extérieures Joint de compression (rdc)

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P019)

Menuiseries extérieures Joint de compression (1er étage)

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P020)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Chambre 209	Piece de vie	Résultat d'analyse (P021)
RDC - Chambre 201	Piece de vie	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)
RDC - Chambre 210	Piece de vie	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)
RDC - Chambre 202	Piece de vie	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Piece de vie	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)
RDC Chambre 204	Piece de vie	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)
RDC Chambre 205	Piece de vie	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)
RDC Chambre 206	Piece de vie	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)
RDC Chambre 207	Piece de vie	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)
RDC Chambre 208	Piece de vie	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Chambre 209	Salle de bains	Résultat d'analyse (P022)
RDC - Chambre 210	Salle de bains	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Salle de bains	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Chambre 209	Piece de vie	Résultat d'analyse (P023)
RDC - Chambre 209	Salle de bains	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC - Chambre 201	Piece de vie	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC - Chambre 210	Salle de bains	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC - Chambre 210	Piece de vie	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC - Chambre 201	Salle de bains	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC - Chambre 202	Piece de vie	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC - Chambre 202	Salle de bains	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Piece de vie	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Salle de bains	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC Chambre 204	Piece de vie	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC Chambre 204	Salle de bains	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC Chambre 205	Piece de vie	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC Chambre 205	Salle de bains	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC Chambre 206	Piece de vie	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC Chambre 206	Salle de bains	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC Chambre 207	Piece de vie	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC Chambre 207	Salle de bains	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC Chambre 208	Piece de vie	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
RDC Chambre 208	Salle de bains	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P023-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Chambre 209	Piece de vie	Résultat d'analyse (P024)
RDC - Chambre 209	Salle de bains	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC - Chambre 201	Piece de vie	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC - Chambre 210	Salle de bains	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC - Chambre 210	Piece de vie	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC - Chambre 201	Salle de bains	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC - Chambre 202	Piece de vie	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC - Chambre 202	Salle de bains	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Piece de vie	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Salle de bains	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC Chambre 204	Piece de vie	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC Chambre 204	Salle de bains	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC Chambre 205	Piece de vie	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC Chambre 205	Salle de bains	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC Chambre 206	Piece de vie	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC Chambre 206	Salle de bains	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC Chambre 207	Piece de vie	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC Chambre 207	Salle de bains	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC Chambre 208	Piece de vie	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
RDC Chambre 208	Salle de bains	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P024-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Chambre 209	Piece de vie	Résultat d'analyse (P025)
RDC - Chambre 209	Salle de bains	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC - Chambre 201	Piece de vie	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC - Chambre 210	Salle de bains	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC - Chambre 210	Piece de vie	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC - Chambre 201	Salle de bains	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC - Chambre 202	Piece de vie	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC - Chambre 202	Salle de bains	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Piece de vie	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Salle de bains	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC Chambre 204	Piece de vie	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC Chambre 204	Salle de bains	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC Chambre 205	Piece de vie	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC Chambre 205	Salle de bains	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC Chambre 206	Piece de vie	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC Chambre 206	Salle de bains	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC Chambre 207	Piece de vie	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC Chambre 207	Salle de bains	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC Chambre 208	Piece de vie	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
RDC Chambre 208	Salle de bains	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Chambre 209	Piece de vie	Résultat d'analyse (P026)
RDC - Chambre 201	Piece de vie	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
RDC - Chambre 210	Piece de vie	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
RDC - Chambre 202	Piece de vie	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Piece de vie	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
RDC Chambre 204	Piece de vie	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
RDC Chambre 205	Piece de vie	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
RDC Chambre 206	Piece de vie	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
RDC Chambre 207	Piece de vie	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
RDC Chambre 208	Piece de vie	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Chambre 209	Salle de bains	Résultat d'analyse (P027)
RDC - Chambre 210	Salle de bains	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
RDC - Chambre 201	Salle de bains	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
RDC - Chambre 202	Salle de bains	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Salle de bains	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
RDC Chambre 204	Salle de bains	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
RDC Chambre 205	Salle de bains	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
RDC Chambre 206	Salle de bains	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
RDC Chambre 207	Salle de bains	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
RDC Chambre 208	Salle de bains	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P027-ZPSO)

Revêtements de sols Ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation	Résultat d'analyse (P029)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation	Résultat d'analyse (P028)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation	Résultat d'analyse (P030)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation	Résultat d'analyse (P031)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation	Résultat d'analyse (P032)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation	Résultat d'analyse (P033)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation	Résultat d'analyse (P034)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Locla ménage	Résultat d'analyse (P035)

Plafond Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Locla ménage	Résultat d'analyse (P036)

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation	Résultat d'analyse (P037)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 216	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P038)
1er - Chambre 217	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
1er - Chambre 218	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
1er - Chambre 219	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
1er - Chambre 220	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
1er - Chambre 221	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 216	Salle de bains	Résultat d'analyse (P039)
1er - Chambre 217	Salle de bains	Résultat d'analyse (P039-ZPSO)
1er - Chambre 218	Salle de bains	Résultat d'analyse (P039-ZPSO)
1er - Chambre 219	Salle de bains	Résultat d'analyse (P039-ZPSO)
1er - Chambre 220	Salle de bains	Résultat d'analyse (P039-ZPSO)
1er - Chambre 221	Salle de bains	Résultat d'analyse (P039-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 216	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P040)
1er - Chambre 217	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
1er - Chambre 218	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
1er - Chambre 219	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
1er - Chambre 220	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
1er - Chambre 221	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 216	Salle de bains	Résultat d'analyse (P041)
1er - Chambre 217	Salle de bains	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
1er - Chambre 218	Salle de bains	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
1er - Chambre 219	Salle de bains	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
1er - Chambre 220	Salle de bains	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
1er - Chambre 221	Salle de bains	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 216	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P042)
1er - Chambre 217	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
1er - Chambre 218	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
1er - Chambre 219	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
1er - Chambre 220	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
1er - Chambre 221	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 216	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P043)
1er - Chambre 217	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P043-ZPSO)
1er - Chambre 218	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P043-ZPSO)
1er - Chambre 219	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P043-ZPSO)
1er - Chambre 220	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P043-ZPSO)
1er - Chambre 221	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P043-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 216	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P044)
1er - Chambre 217	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P044-ZPSO)
1er - Chambre 218	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P044-ZPSO)
1er - Chambre 219	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P044-ZPSO)
1er - Chambre 220	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P044-ZPSO)
1er - Chambre 221	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P044-ZPSO)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 212	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P045)
1er - Chambre 211	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)
1er - Chambre 213	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)
1er - Chambre 214	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)
1er - Chambre 215	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 212	Salle de bains	Résultat d'analyse (P046)
1er - Chambre 211	Salle de bains	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)
1er - Chambre 213	Salle de bains	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)
1er - Chambre 214	Salle de bains	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)
1er - Chambre 215	Salle de bains	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 212	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P047)
1er - Chambre 211	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P047-ZPSO)
1er - Chambre 213	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P047-ZPSO)
1er - Chambre 214	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P047-ZPSO)
1er - Chambre 215	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P047-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 212	Salle de bains	Résultat d'analyse (P048)
1er - Chambre 211	Salle de bains	Résultat d'analyse (P048-ZPSO)
1er - Chambre 213	Salle de bains	Résultat d'analyse (P048-ZPSO)
1er - Chambre 214	Salle de bains	Résultat d'analyse (P048-ZPSO)
1er - Chambre 215	Salle de bains	Résultat d'analyse (P048-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 212	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P049)
1er - Chambre 211	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P049-ZPSO)
1er - Chambre 213	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P049-ZPSO)
1er - Chambre 214	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P049-ZPSO)
1er - Chambre 215	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P049-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 212	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P050)
1er - Chambre 211	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P050-ZPSO)
1er - Chambre 213	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P050-ZPSO)
1er - Chambre 214	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P050-ZPSO)
1er - Chambre 215	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P050-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 212	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P051)
1er - Chambre 211	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P051-ZPSO)
1er - Chambre 213	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P051-ZPSO)
1er - Chambre 214	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P051-ZPSO)
1er - Chambre 215	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P051-ZPSO)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P052)

Revêtements de sols Ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P053)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P054)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P055)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P056)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P057)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P058)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Locla ménage	Résultat d'analyse (P059)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Locla ménage	Résultat d'analyse (P060)

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P061)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 225	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P062)
2ème - Chambre 222	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
2ème - Chambre 223	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
2ème - Chambre 224	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
2ème - Chambre 232	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 225	Salle de bains	Résultat d'analyse (P063)
2ème - Chambre 222	Salle de bains	Résultat d'analyse (P063-ZPSO)
2ème - Chambre 223	Salle de bains	Résultat d'analyse (P063-ZPSO)
2ème - Chambre 224	Salle de bains	Résultat d'analyse (P063-ZPSO)
2ème - Chambre 232	Salle de bains	Résultat d'analyse (P063-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 225	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P064)
2ème - Chambre 222	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
2ème - Chambre 223	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
2ème - Chambre 224	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
2ème - Chambre 232	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 225	Salle de bains	Résultat d'analyse (P065)
2ème - Chambre 222	Salle de bains	Résultat d'analyse (P065-ZPSO)
2ème - Chambre 223	Salle de bains	Résultat d'analyse (P065-ZPSO)
2ème - Chambre 224	Salle de bains	Résultat d'analyse (P065-ZPSO)
2ème - Chambre 232	Salle de bains	Résultat d'analyse (P065-ZPSO)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 225	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P066)
2ème - Chambre 222	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P066-ZPSO)
2ème - Chambre 223	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P066-ZPSO)
2ème - Chambre 224	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P066-ZPSO)
2ème - Chambre 232	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P066-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 225	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P067)
2ème - Chambre 222	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P067-ZPSO)
2ème - Chambre 223	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P067-ZPSO)
2ème - Chambre 224	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P067-ZPSO)
2ème - Chambre 232	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P067-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 225	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P068)
2ème - Chambre 222	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P068-ZPSO)
2ème - Chambre 223	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P068-ZPSO)
2ème - Chambre 224	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P068-ZPSO)
2ème - Chambre 232	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P068-ZPSO)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 226	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P069)
2ème - Chambre 227	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
2ème - Chambre 228	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
2ème - Chambre 229	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
2ème - Chambre 230	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
2ème - Chambre 231	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 226	Salle de bains	Résultat d'analyse (P070)
2ème - Chambre 227	Salle de bains	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
2ème - Chambre 228	Salle de bains	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
2ème - Chambre 229	Salle de bains	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
2ème - Chambre 230	Salle de bains	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
2ème - Chambre 231	Salle de bains	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 226	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P071)
2ème - Chambre 227	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
2ème - Chambre 228	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
2ème - Chambre 229	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
2ème - Chambre 230	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
2ème - Chambre 231	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 226	Salle de bains	Résultat d'analyse (P072)
2ème - Chambre 227	Salle de bains	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
2ème - Chambre 228	Salle de bains	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
2ème - Chambre 229	Salle de bains	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
2ème - Chambre 230	Salle de bains	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
2ème - Chambre 231	Salle de bains	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 226	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P073)
2ème - Chambre 227	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P073-ZPSO)
2ème - Chambre 228	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P073-ZPSO)
2ème - Chambre 229	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P073-ZPSO)
2ème - Chambre 230	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P073-ZPSO)
2ème - Chambre 231	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P073-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 226	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P074)
2ème - Chambre 227	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)
2ème - Chambre 228	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)
2ème - Chambre 229	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)
2ème - Chambre 230	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)
2ème - Chambre 231	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 226	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P075)
2ème - Chambre 227	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P075-ZPSO)
2ème - Chambre 228	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P075-ZPSO)
2ème - Chambre 229	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P075-ZPSO)
2ème - Chambre 230	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P075-ZPSO)
2ème - Chambre 231	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P075-ZPSO)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Circulation	Résultat d'analyse (P076)

Revêtements de sols Ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Circulation	Résultat d'analyse (P077)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Circulation	Résultat d'analyse (P078)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Circulation	Résultat d'analyse (P079)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Circulation	Résultat d'analyse (P080)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Circulation	Résultat d'analyse (P081)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Circulation	Résultat d'analyse (P082)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Locla ménage	Résultat d'analyse (P083)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Locla ménage	Résultat d'analyse (P084)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 234	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P085)
3ème - Chambre 233	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 234	Salle de bains	Résultat d'analyse (P087)
3ème - Chambre 233	Salle de bains	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Salle de bains	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Salle de bains	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Salle de bains	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 234	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P088)
3ème - Chambre 233	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P088-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P088-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P088-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P088-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 234	Salle de bains	Résultat d'analyse (P089)
3ème - Chambre 233	Salle de bains	Résultat d'analyse (P089-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Salle de bains	Résultat d'analyse (P089-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Salle de bains	Résultat d'analyse (P089-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Salle de bains	Résultat d'analyse (P089-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 234	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P090)
3ème - Chambre 234	Salle de bains	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
3ème - Chambre 233	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
3ème - Chambre 233	Salle de bains	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Salle de bains	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Salle de bains	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Salle de bains	Résultat d'analyse (P090-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 234	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P091)
3ème - Chambre 234	Salle de bains	Résultat d'analyse (P091-ZPSO)
3ème - Chambre 233	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P091-ZPSO)
3ème - Chambre 233	Salle de bains	Résultat d'analyse (P091-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P091-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Salle de bains	Résultat d'analyse (P091-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P091-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Salle de bains	Résultat d'analyse (P091-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P091-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Salle de bains	Résultat d'analyse (P091-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 234	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P092)
3ème - Chambre 234	Salle de bains	Résultat d'analyse (P092-ZPSO)
3ème - Chambre 233	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P092-ZPSO)
3ème - Chambre 233	Salle de bains	Résultat d'analyse (P092-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P092-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Salle de bains	Résultat d'analyse (P092-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P092-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Salle de bains	Résultat d'analyse (P092-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P092-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Salle de bains	Résultat d'analyse (P092-ZPSO)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 239	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P093)
3ème - Chambre 237	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P093-ZPSO)
3ème - Chambre 238	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P093-ZPSO)
3ème - Chambre 240	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P093-ZPSO)
3ème - Chambre 241	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P093-ZPSO)
3ème - Chambre 242	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P093-ZPSO)

Revêtements de sols Revêtement souple + colle + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 239	Salle de bains	Résultat d'analyse (P094)
3ème - Chambre 237	Salle de bains	Résultat d'analyse (P094-ZPSO)
3ème - Chambre 238	Salle de bains	Résultat d'analyse (P094-ZPSO)
3ème - Chambre 240	Salle de bains	Résultat d'analyse (P094-ZPSO)
3ème - Chambre 241	Salle de bains	Résultat d'analyse (P094-ZPSO)
3ème - Chambre 242	Salle de bains	Résultat d'analyse (P094-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 239	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P095)
3ème - Chambre 237	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P095-ZPSO)
3ème - Chambre 238	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P095-ZPSO)
3ème - Chambre 240	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P095-ZPSO)
3ème - Chambre 241	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P095-ZPSO)
3ème - Chambre 242	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P095-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 239	Salle de bains	Résultat d'analyse (P096)
3ème - Chambre 237	Salle de bains	Résultat d'analyse (P096-ZPSO)
3ème - Chambre 238	Salle de bains	Résultat d'analyse (P096-ZPSO)
3ème - Chambre 240	Salle de bains	Résultat d'analyse (P096-ZPSO)
3ème - Chambre 241	Salle de bains	Résultat d'analyse (P096-ZPSO)
3ème - Chambre 242	Salle de bains	Résultat d'analyse (P096-ZPSO)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 239	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P097)
3ème - Chambre 237	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P097-ZPSO)
3ème - Chambre 238	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P097-ZPSO)
3ème - Chambre 240	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P097-ZPSO)
3ème - Chambre 241	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P097-ZPSO)
3ème - Chambre 242	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P097-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 239	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P098)
3ème - Chambre 237	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P098-ZPSO)
3ème - Chambre 238	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P098-ZPSO)
3ème - Chambre 240	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P098-ZPSO)
3ème - Chambre 241	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P098-ZPSO)
3ème - Chambre 242	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P098-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 239	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P099)
3ème - Chambre 237	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P099-ZPSO)
3ème - Chambre 238	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P099-ZPSO)
3ème - Chambre 240	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P099-ZPSO)
3ème - Chambre 241	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P099-ZPSO)
3ème - Chambre 242	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P099-ZPSO)

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Chambre 209	Piece de vie	Résultat d'analyse (P100)
RDC - Chambre 201	Piece de vie	Résultat d'analyse (P100-ZPSO)
RDC - Chambre 210	Piece de vie	Résultat d'analyse (P100-ZPSO)
RDC - Chambre 202	Piece de vie	Résultat d'analyse (P100-ZPSO)
RDC - Chambre 203	Piece de vie	Résultat d'analyse (P100-ZPSO)
RDC Chambre 204	Piece de vie	Résultat d'analyse (P100-ZPSO)
RDC Chambre 205	Piece de vie	Résultat d'analyse (P100-ZPSO)
RDC Chambre 206	Piece de vie	Résultat d'analyse (P100-ZPSO)
RDC Chambre 207	Piece de vie	Résultat d'analyse (P100-ZPSO)
RDC Chambre 208	Piece de vie	Résultat d'analyse (P100-ZPSO)

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 212	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P101)
1er - Chambre 211	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P101-ZPSO)
1er - Chambre 213	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P101-ZPSO)
1er - Chambre 214	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P101-ZPSO)
1er - Chambre 215	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P101-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er - Chambre 216	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P102)
1er - Chambre 217	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P102-ZPSO)
1er - Chambre 218	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P102-ZPSO)
1er - Chambre 219	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P102-ZPSO)
1er - Chambre 220	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P102-ZPSO)
1er - Chambre 221	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P102-ZPSO)

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 225	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P103)
2ème - Chambre 222	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P103-ZPSO)
2ème - Chambre 223	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P103-ZPSO)
2ème - Chambre 224	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P103-ZPSO)
2ème - Chambre 232	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P103-ZPSO)

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème - Chambre 226	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P104)
2ème - Chambre 227	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P104-ZPSO)
2ème - Chambre 228	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P104-ZPSO)
2ème - Chambre 229	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P104-ZPSO)
2ème - Chambre 230	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P104-ZPSO)
2ème - Chambre 231	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P104-ZPSO)

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 234	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P105)
3ème - Chambre 233	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
3ème - Chambre 235	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
3ème - Chambre 236	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
3ème - Chambre 243	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème - Chambre 239	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P106)
3ème - Chambre 237	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
3ème - Chambre 238	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
3ème - Chambre 240	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
3ème - Chambre 241	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
3ème - Chambre 242	Pièce de vie	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)

Plafonds Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Chaufferie	Résultat d'analyse (P107)

Revêtements de sols Laine minérale + pare vapeur

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Combles	Résultat d'analyse (P108)

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Enveloppe de calorifugeages (plâtre)

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Combles	Résultat d'analyse (P109)

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Calorifugeage (noir)

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Combles	Résultat d'analyse (P110)

Menuiseries extérieures Joint de vitrage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P111)

Menuiseries extérieures Tablier Joint de vitrage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P112)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Peinture bleu

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Local ménage	Résultat d'analyse (P113)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit béton

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Local ménage	Résultat d'analyse (P114)

Plafonds Peinture + enduit béton

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Local ménage	Résultat d'analyse (P115)

Façades lourdes y compris poteaux Peinture + enduit béton

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P116)

Façades lourdes y compris poteaux Peinture + enduit béton

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P117)

Façades lourdes y compris poteaux (entre bâti et menuiseries extérieur) Peinture + joint étanchéité

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P118)

Façades lourdes y compris poteaux Rejingot Joint blanc

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P120)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

7. OBSERVATIONS & RESERVES

Chaufferie : Calorifugeage post 97
Couverture en ardoise naturelles

8. ANNEXES

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P001	18/02/2026	Colle de carrelage 30x30 beige + ragréage	Négatif
P002	18/02/2026	Colle de plinthes 10x20 beige	Négatif
P003	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P004	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P005	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P006	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P007	18/02/2026	Peinture + enduit	Négatif
P008	18/02/2026	Revêtement souple + colle	Négatif
P009	18/02/2026	Revêtement souple + colle	Négatif
P010	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P011	18/02/2026	Enduit de façade gris granuleux	Négatif
P012	18/02/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux	Négatif
P013	18/02/2026	Enduit blanc	Négatif
P014	18/02/2026	Revêtement souple + colle	Négatif
P015	18/02/2026	Ragréage	Négatif
P016	18/02/2026	Peinture + enduit béton	Négatif
P017	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P018	18/02/2026	Joint de vitrage	Négatif
P019	18/02/2026	Joint de compression	Négatif
P020	18/02/2026	Joint de compression (1er étage)	Négatif
P021	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P022	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P023	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P024	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P025	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P026	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P027	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P028	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P029	18/02/2026	Ragréage	Négatif
P030	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P031	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P032	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P033	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P034	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P035	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P036	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P037	18/02/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux	Négatif
P038	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P039	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P040	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P041	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P042	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P043	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P044	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P045	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P046	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P047	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P048	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P049	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P050	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P051	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P052	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P053	18/02/2026	Ragréage	Négatif
P054	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P055	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P056	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P057	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P058	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P059	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P060	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P061	18/02/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux	Négatif
P062	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P063	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P064	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P065	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P066	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P067	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P068	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P069	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P070	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P071	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P072	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P073	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P074	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P075	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P076	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P077	18/02/2026	Ragréage	Négatif
P078	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P079	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P080	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P081	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P082	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P083	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P084	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P085	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P087	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P088	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P089	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P090	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P091	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P092	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P093	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P094	18/02/2026	Revêtement souple + colle + ragréage	Négatif
P095	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P096	18/02/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P097	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P098	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P099	18/02/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P100	18/02/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P101	18/02/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P102	18/02/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P103	18/02/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P104	18/02/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P105	18/02/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P106	18/02/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P107	18/02/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P108	18/02/2026	Laine minérale + pare vapeur	Négatif
P109	18/02/2026	Enveloppe de calorifugeages (plâtre)	Négatif
P110	18/02/2026	Calorifugeage (noir)	Négatif
P111	18/02/2026	Joint de vitrage	Négatif
P112	18/02/2026	Joint de vitrage	Négatif
P113	18/02/2026	Peinture bleu	Négatif
P114	18/02/2026	Peinture + enduit béton	Négatif
P115	18/02/2026	Peinture + enduit béton	Négatif
P116	18/02/2026	Peinture + enduit béton	Négatif
P117	18/02/2026	Peinture + enduit béton	Négatif
P118	18/02/2026	Peinture + joint	Négatif
P119	18/02/2026	Plaques, panneaux en composites	Positif
P120	18/02/2026	Joint blanc	Négatif

PLANCHE(S) DE REPERAGE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS
N° dossier :	5349011
N° planche :	1/5 — Version : 1
Type :	Plans rdc
Date :	07/04/2026
Intervenant	Gwenael Adelis
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE

Divers	REPRESENTATION GRAPHIQUE

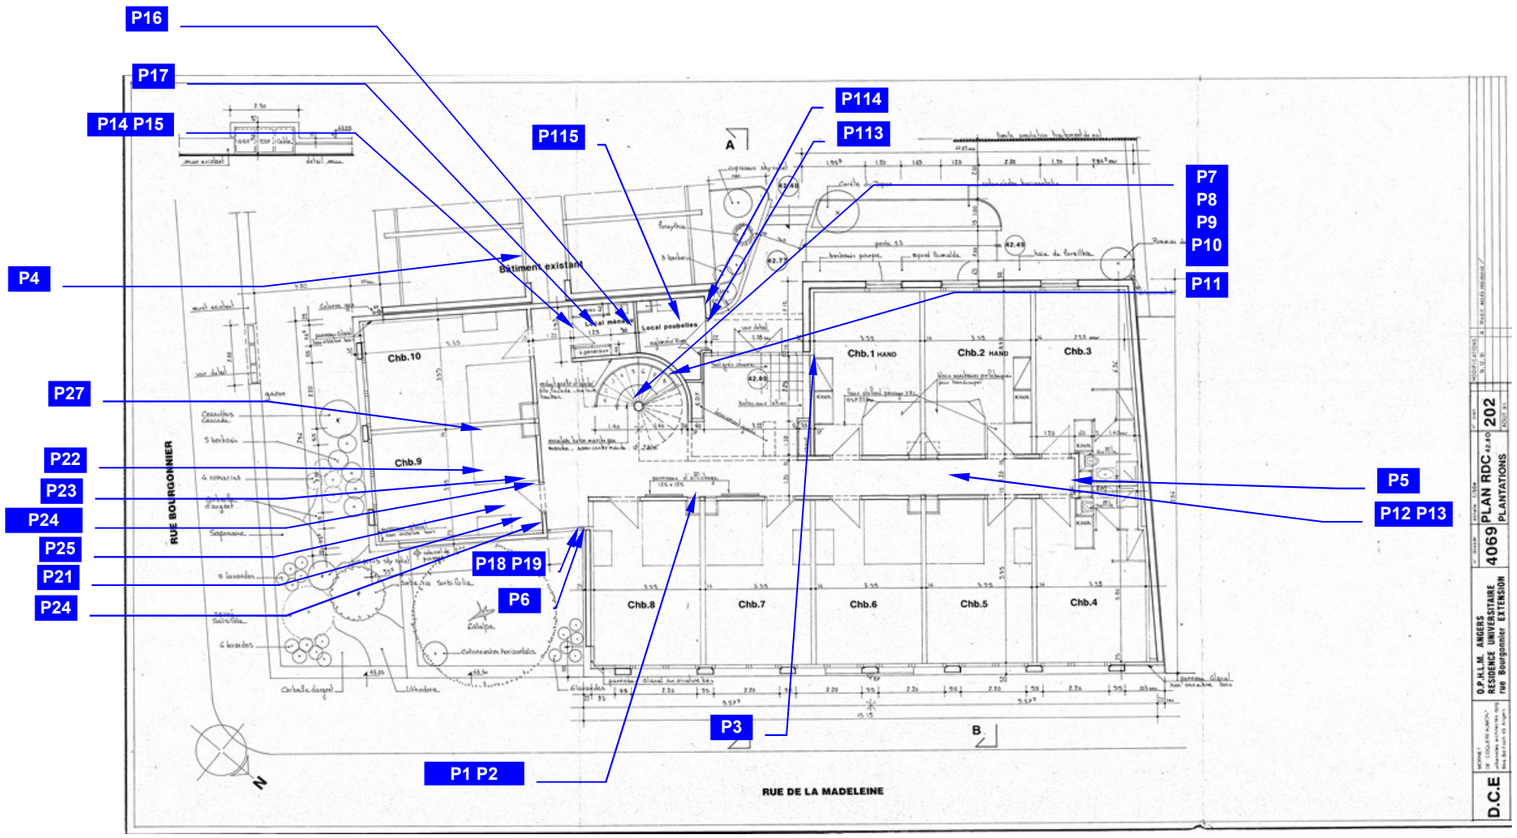

Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	**BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS**
N° dossier :	5349011
N° planche :	2/5 — Version : 1
Type :	Plans 1er étage
Date :	07/04/2026
Intervenant	Gwenael Adelis
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE

Divers	REPRESENTATION GRAPHIQUE

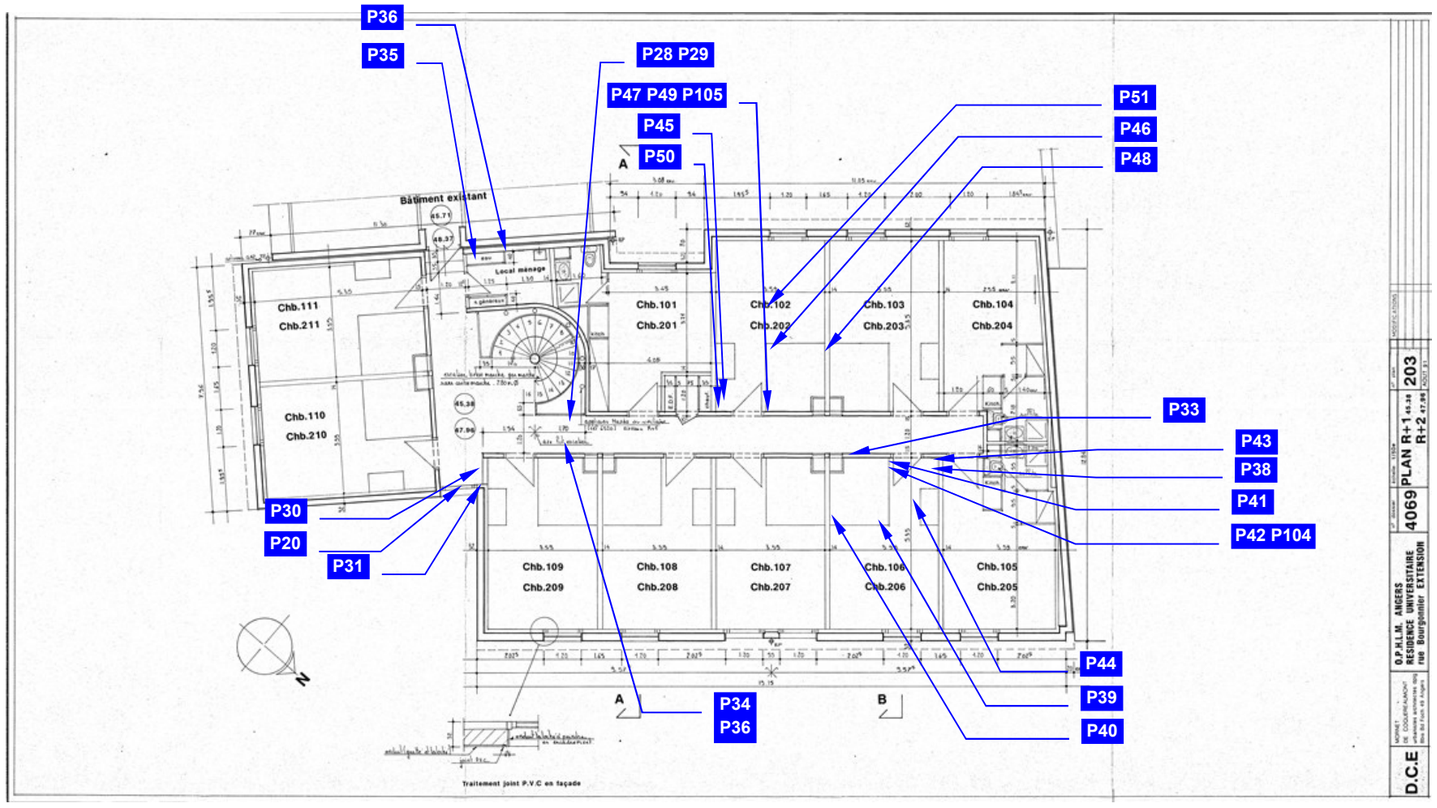

Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS
N° dossier :	5349011
N° planche :	3/5 — Version : 1
Type :	Plans 2ème r étage
Date :	07/04/2026
Intervenant	Gwenael Adelis
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE

Divers	REPRESENTATION GRAPHIQUE

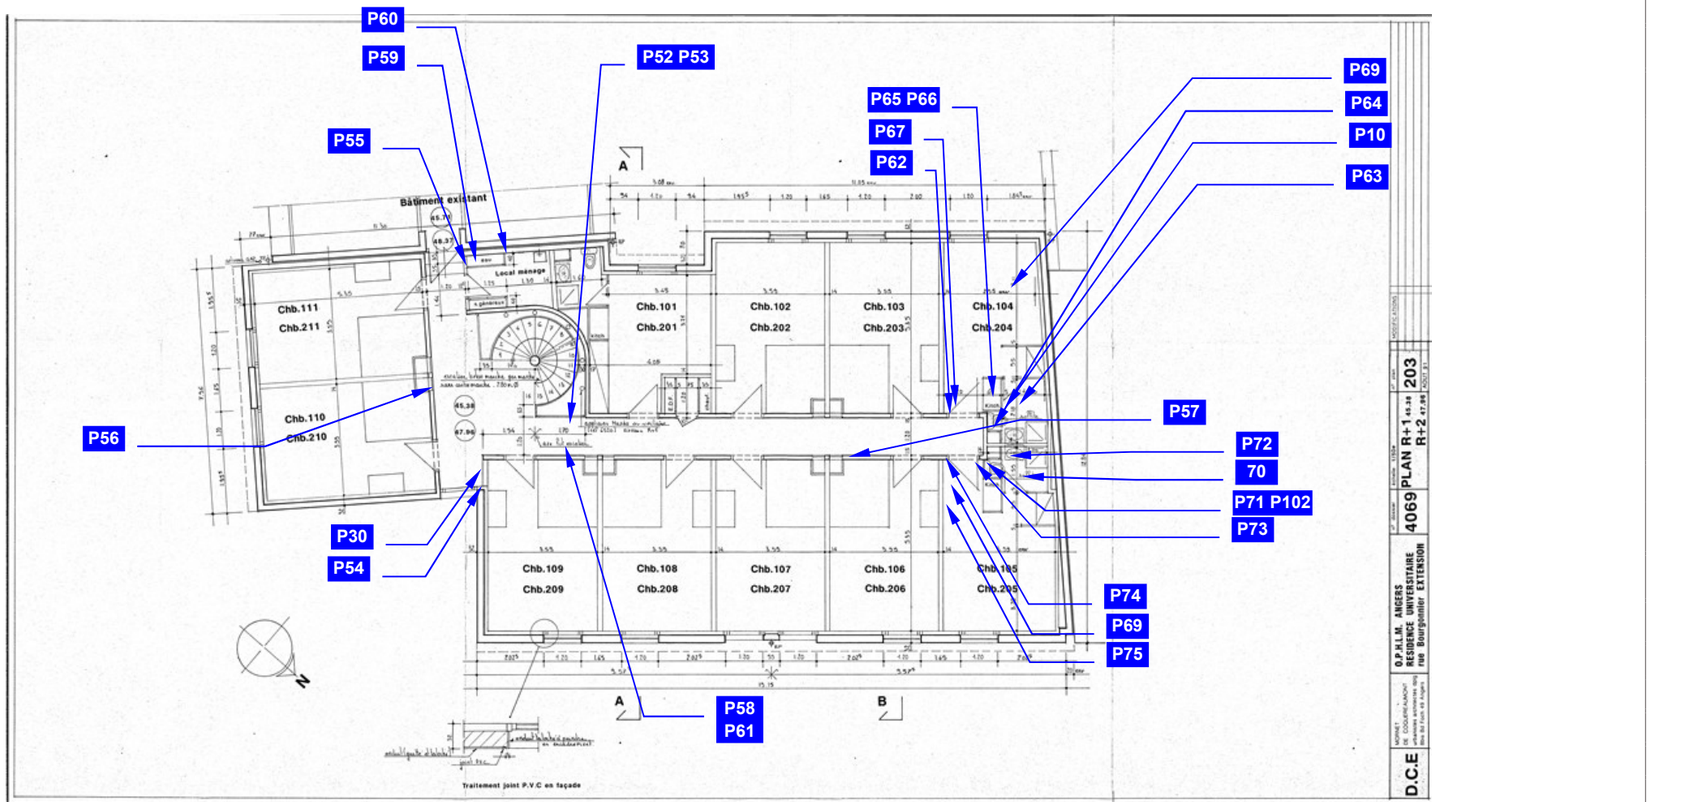

Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS
N° dossier :	5349011
N° planche :	4/5 — Version : 1
Type :	Plans 2ème r étage
Date :	07/04/2026
Intervenant	Gwenael Adelis
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE

Divers	REPRESENTATION GRAPHIQUE

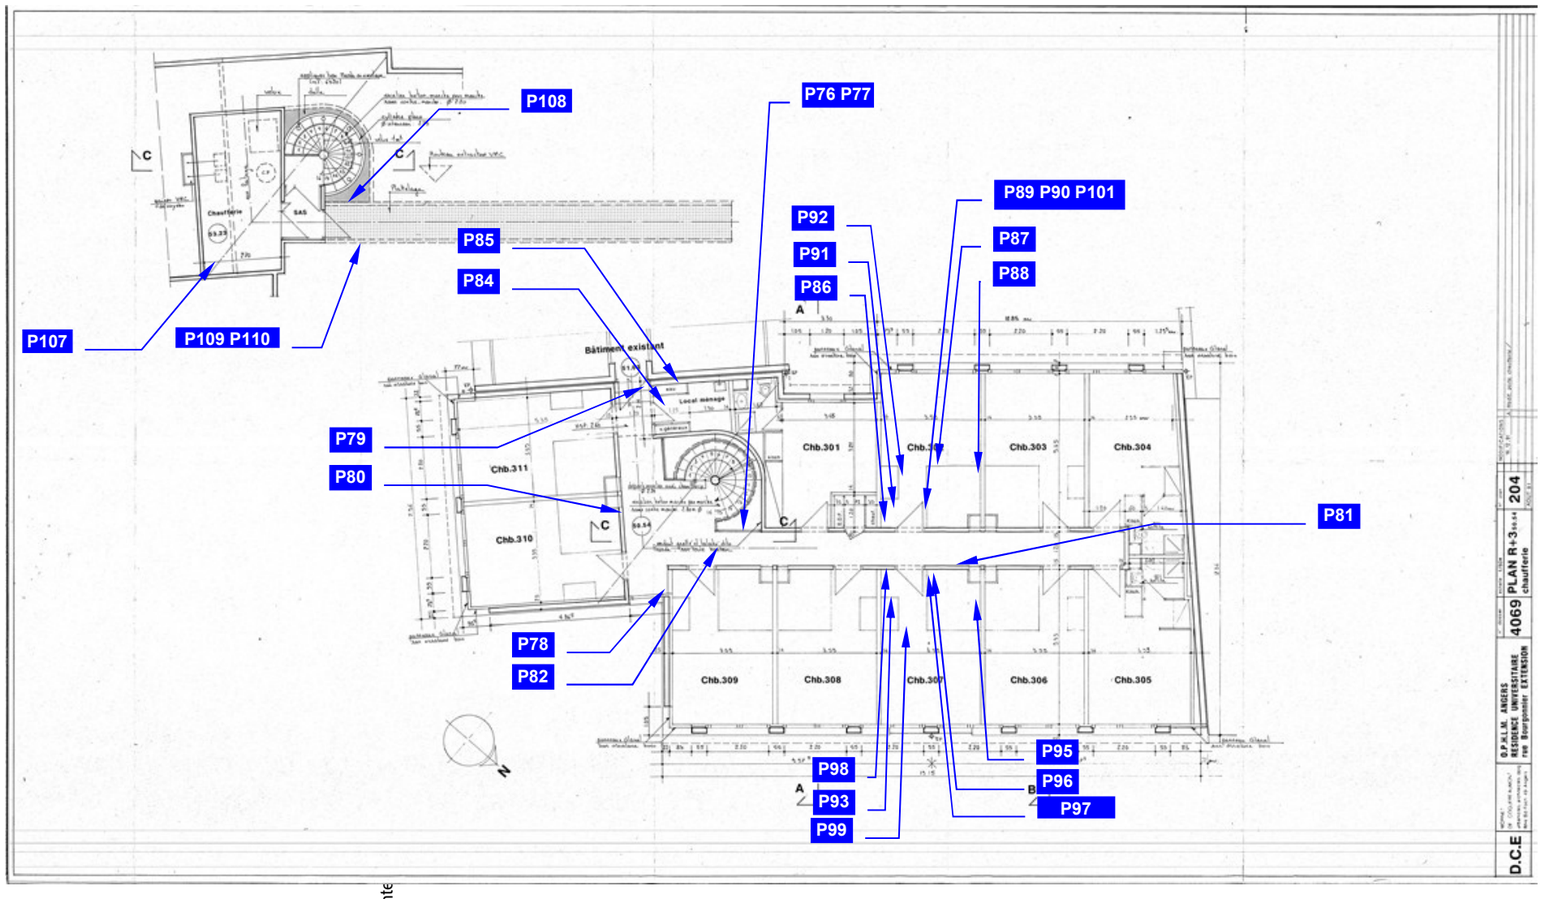

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS
N° dossier :	5349011
N° planche :	5/5 — Version : 1
Type :	Plans rdc
Date :	07/04/2026
Intervenant	Gwenael Adelis
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE
Plaques fibre ciment	

Divers	REPRESENTATION GRAPHIQUE

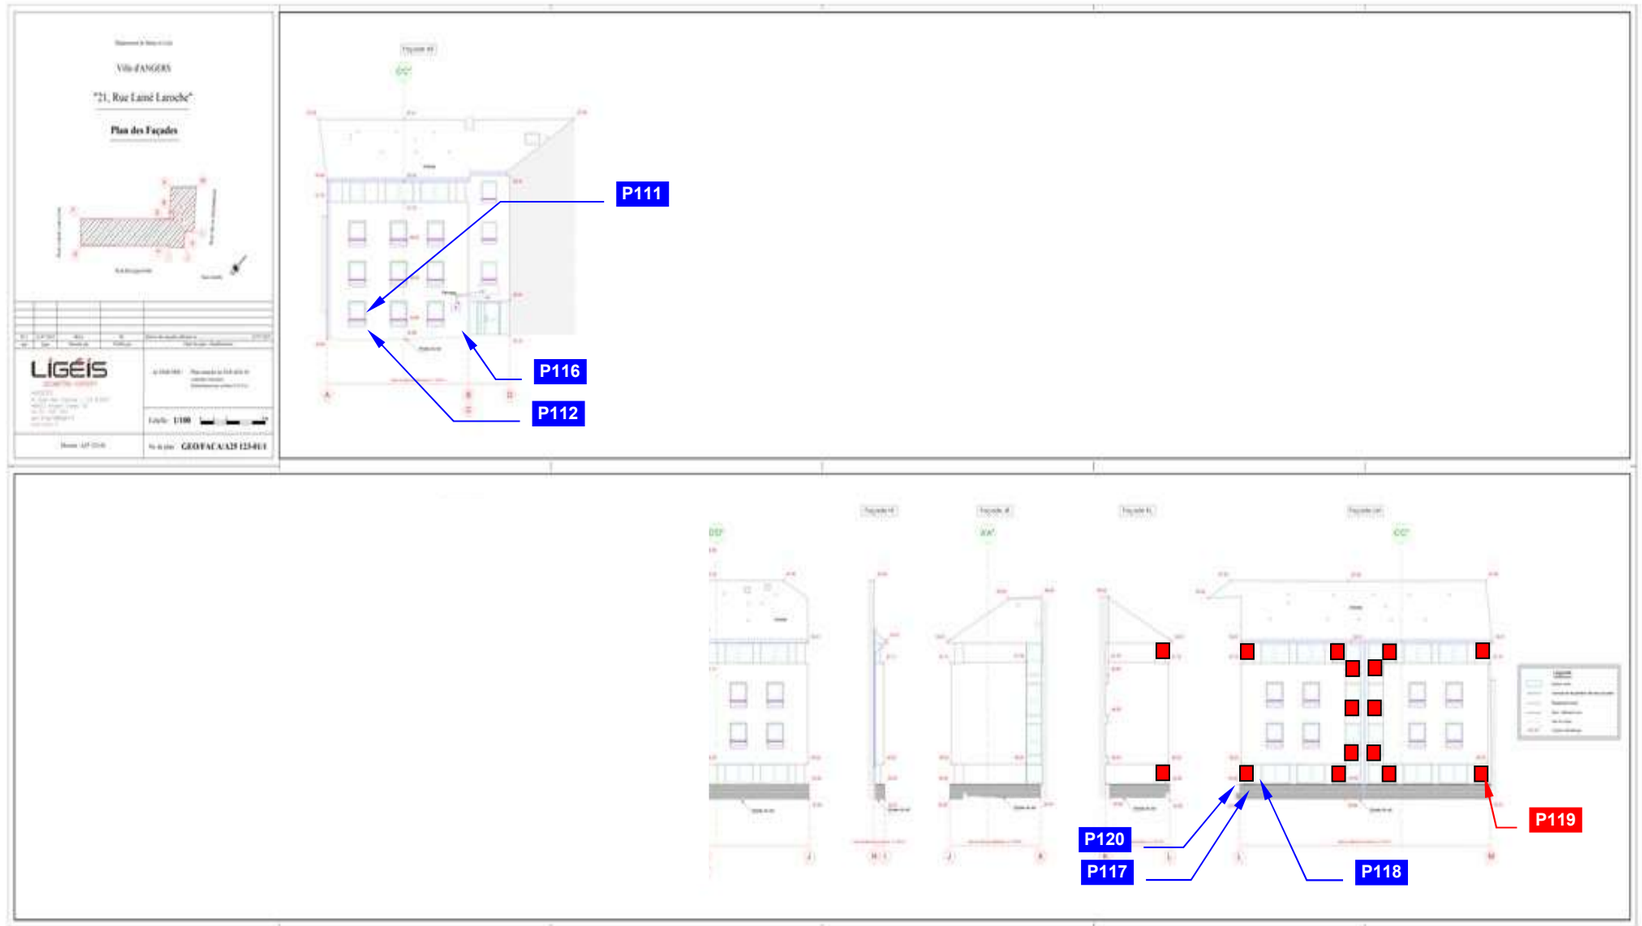


Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PLANCHE PHOTO(S)

ELEMENT : Ardoises, bardeaux bitumineux
OUVRAGE

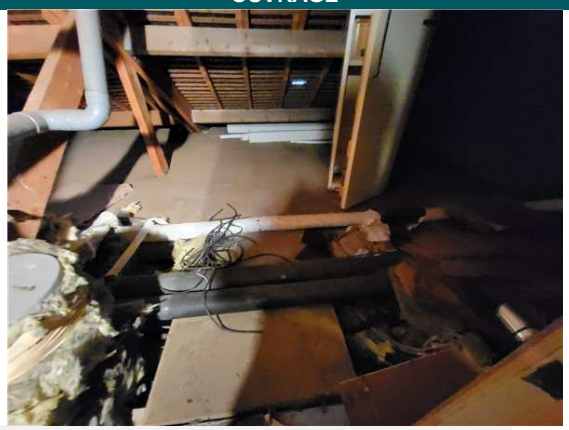

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Couverture	Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises naturelles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

ELEMENT : Parpaing
OUVRAGE

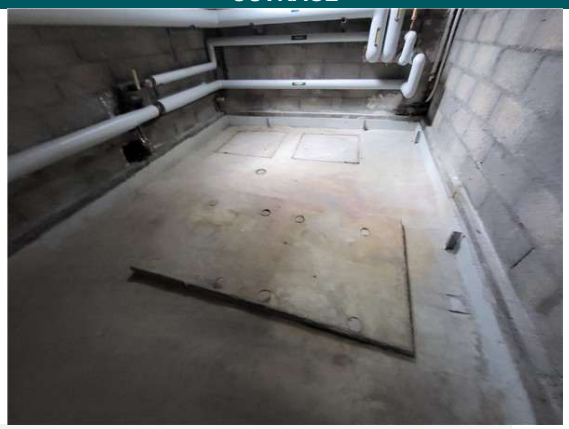

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chaufferie	Parpaing	Béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

ELEMENT : Revêtements de sols
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chaufferie	Revêtements de sols	Dalle béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

ELEMENT : Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains,


OUVRAGE

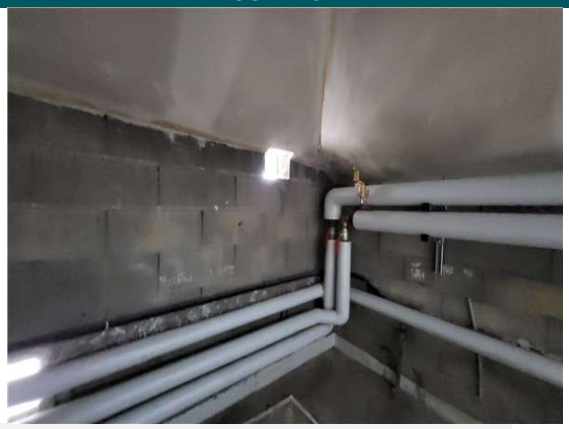

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chaufferie	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Calorifuge	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

ELEMENT : Faux-plafond


OUVRAGE

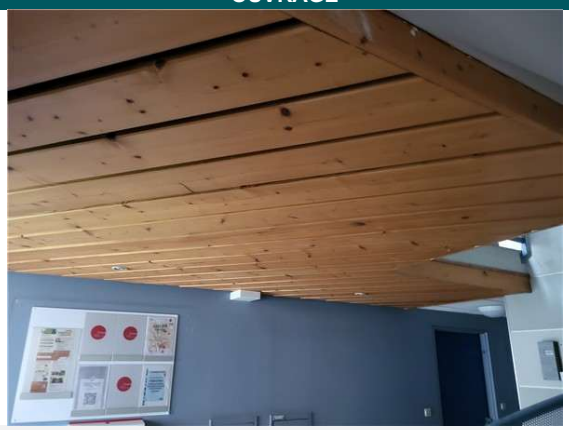

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Circulation	Faux-plafond - Plafond	Bois vernie	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P001

OUVRAGE

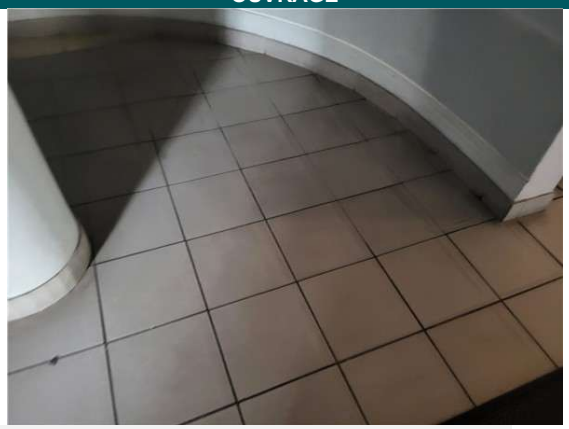

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Circulation	Revêtements de sols n°1	Colle de carrelage 30x30 beige + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P002

OUVRAGE

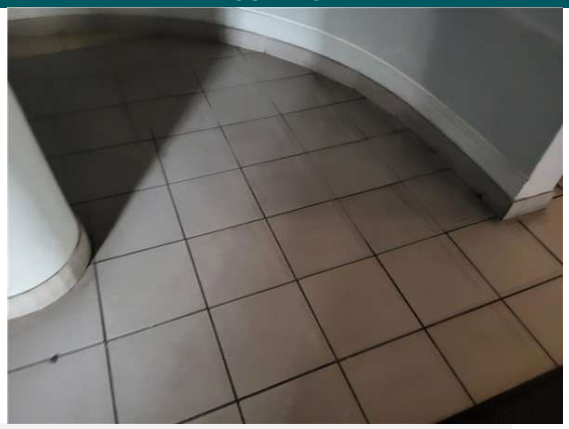


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Colle de plinthes 10x20 beige	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P003

OUVRAGE

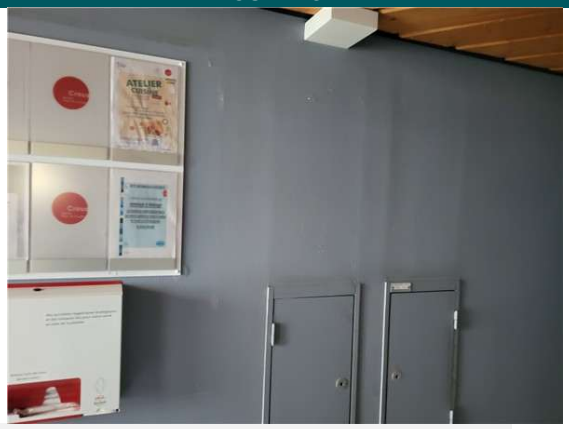

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P004

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P005

OUVRAGE

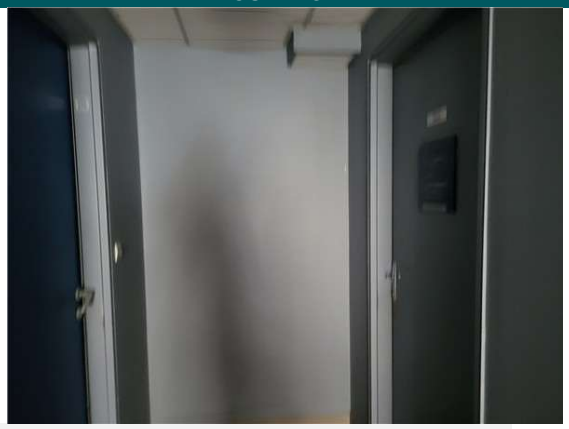


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Circulation	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P006

OUVRAGE

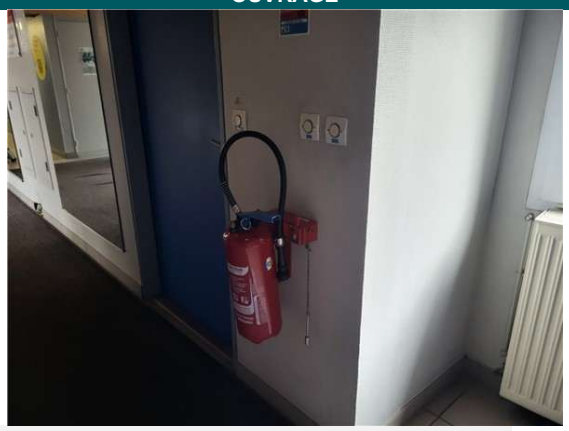

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Circulation	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P007

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Escalier	Poteaux	Peinture + enduit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P008


OUVRAGE

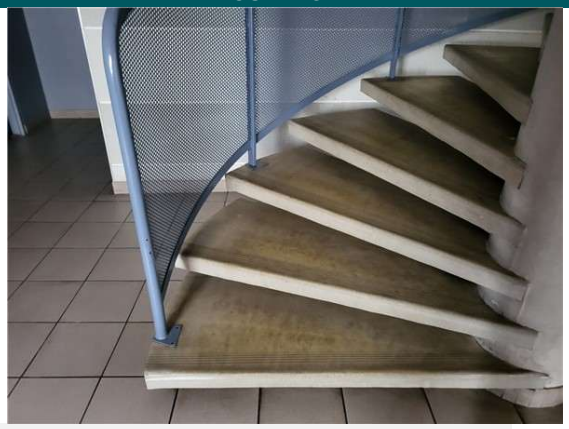

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Escalier	Marches	Revêtement souple + colle	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P009

OUVRAGE

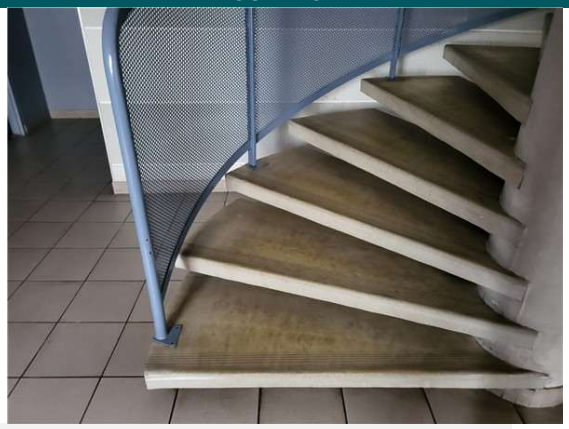

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Escalier	Contre marches	Revêtement souple + colle	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P010

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Escalier	Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P011
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Escalier	Murs et cloisons maçonnés	Enduit de façade gris granuleux	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P012
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Circulation	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P013
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Circulation	Plafonds	Enduit blanc	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P014


OUVRAGE

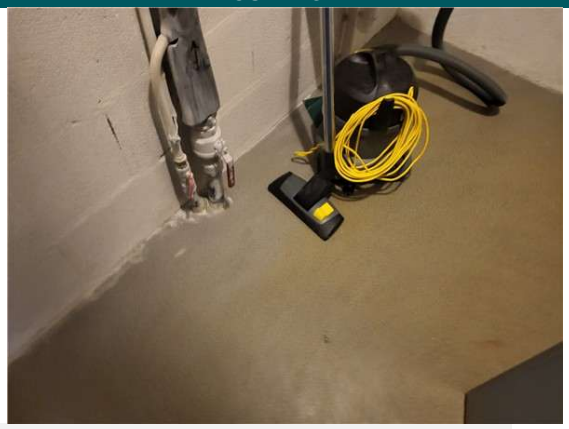

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Local ménage	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P015

OUVRAGE

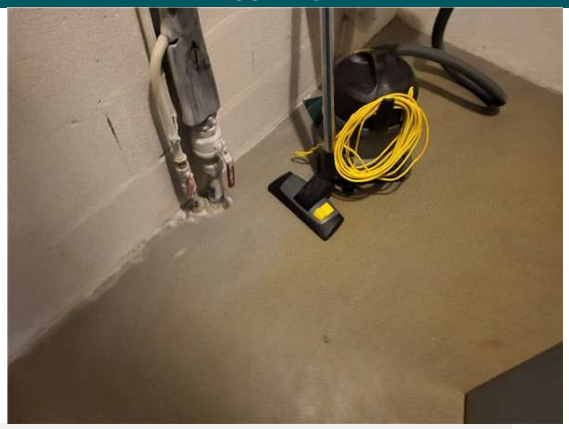

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Local ménage	Revêtements de sols	Ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P016

OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Local ménage	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P017
OUVRAGE

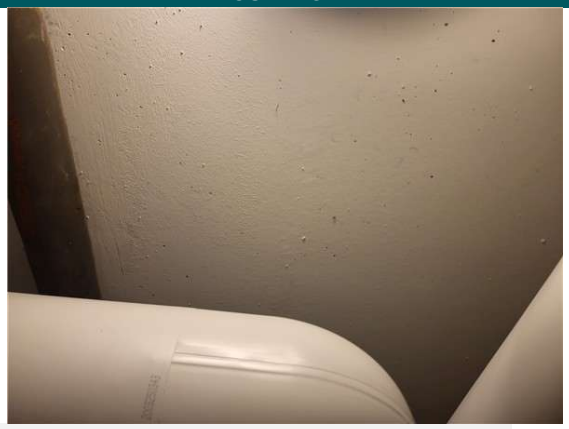

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Local ménage	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P018
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Menuiseries extérieures	Joint de vitrage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P019
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Menuiseries extérieures	Joint de compression (rdc)	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P020
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Menuiseries extérieures	Joint de compression (1er étage)	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P021
OUVRAGE

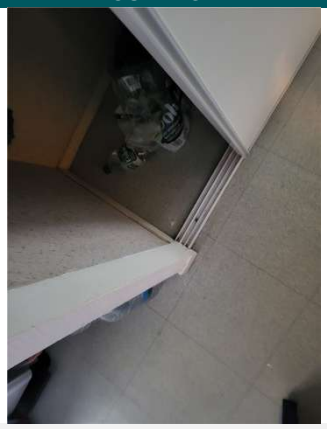

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Chambre 209 - Piece de vie	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P022
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Chambre 209 - Salle de bains	Revêtements de sols n°1	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P023
OUVRAGE

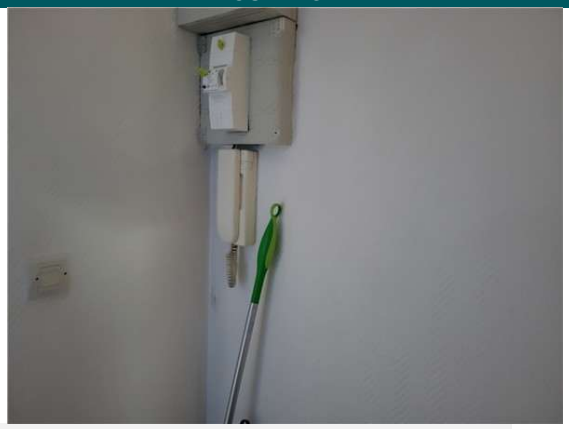


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Chambre 209 - Piece de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P024
OUVRAGE

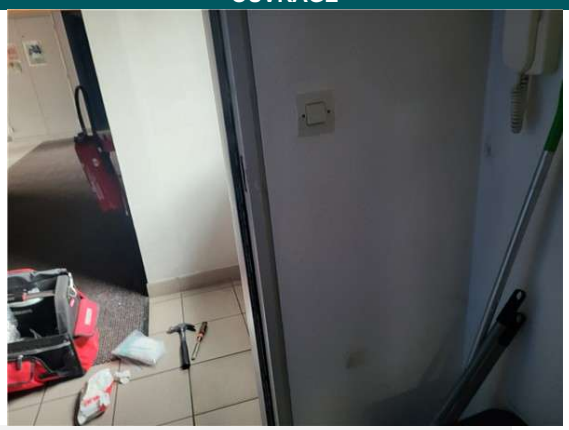

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Chambre 209 - Piece de vie	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P025
OUVRAGE

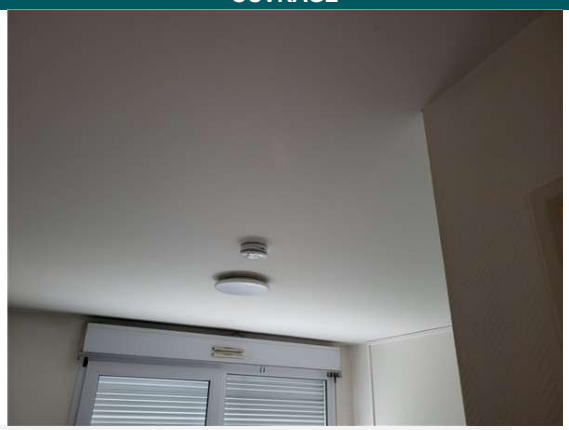


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Chambre 209 - Piece de vie	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P026
OUVRAGE

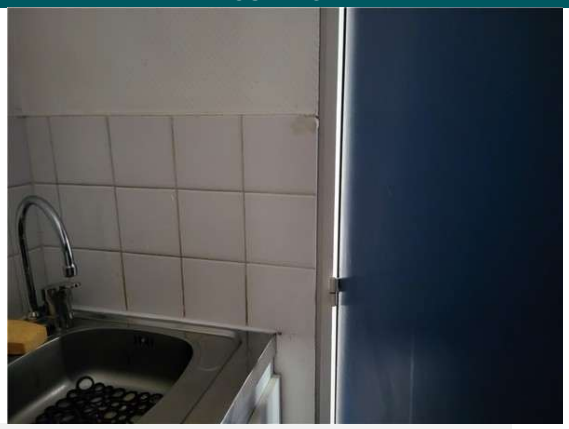


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Chambre 209 - Piece de vie	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P027
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Chambre 209 - Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P028
OUVRAGE

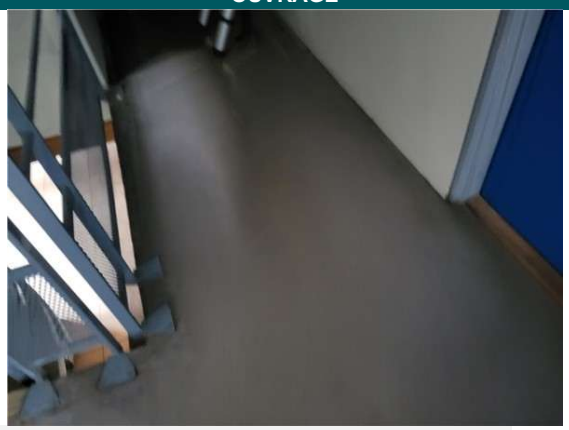


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P029
OUVRAGE

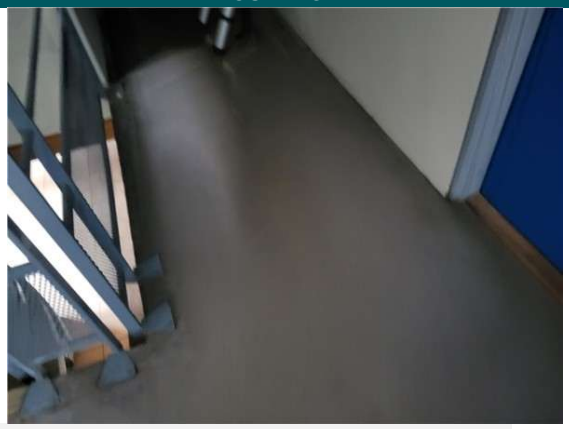


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation	Revêtements de sols	Ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P030
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P031
OUVRAGE

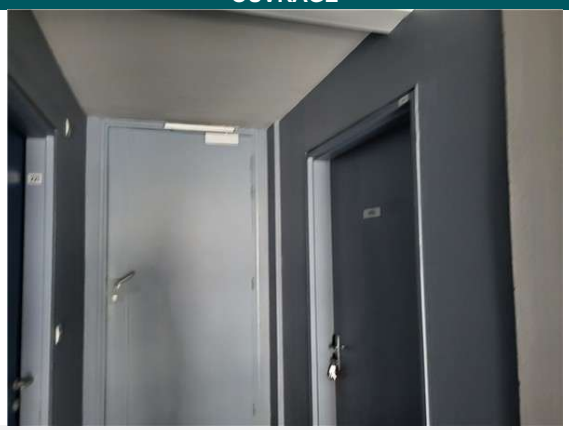

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P032
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P033
OUVRAGE

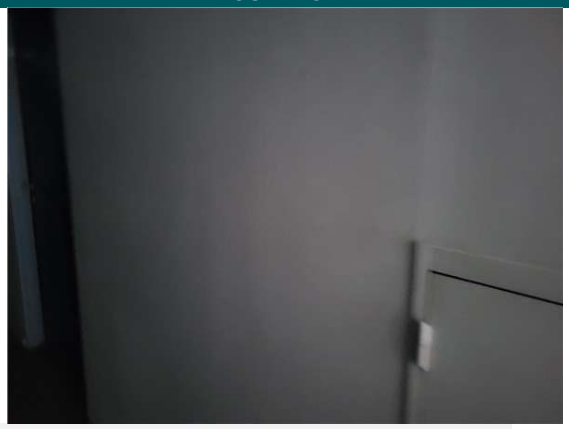

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P034
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


PRELEVEMENT : P035
OUVRAGE

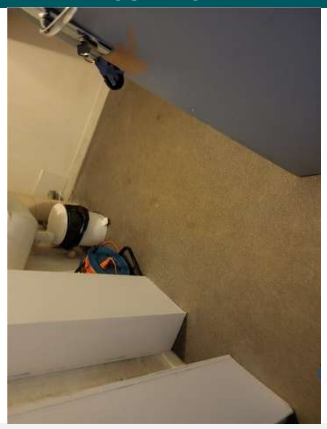

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Locla ménage	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




PRELEVEMENT : P036
OUVRAGE

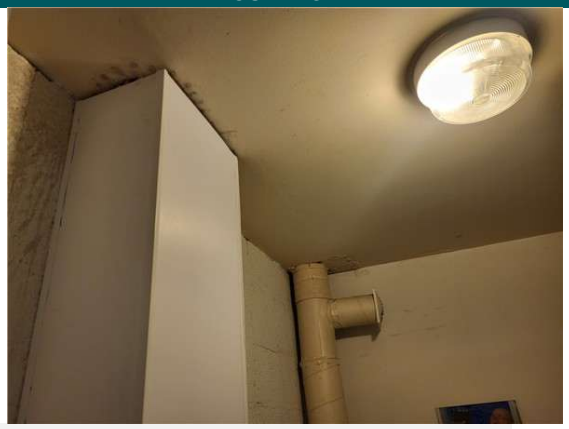

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Locla ménage	Plafond	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P037
OUVRAGE

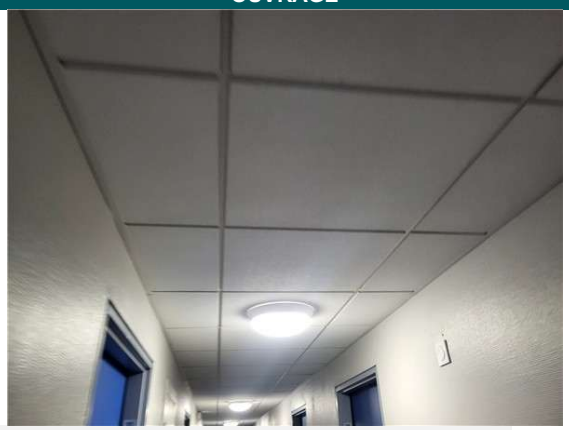


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PRELEVEMENT : P038
OUVRAGE

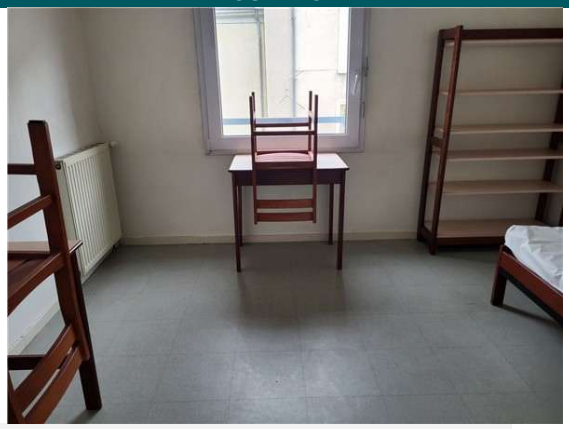

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 216 - Pièce de vie	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P039
OUVRAGE

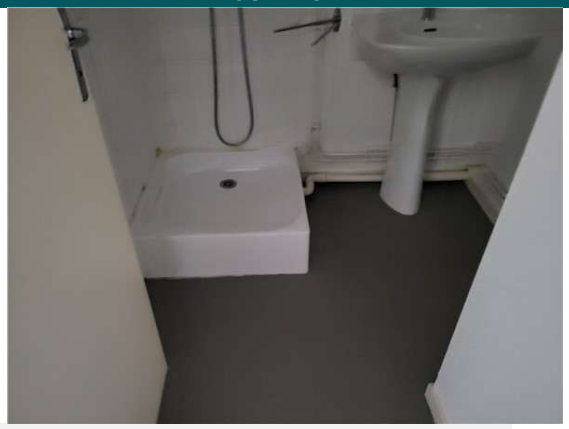

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 216 - Salle de bains	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P040
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 216 - Pièce de vie	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P041


OUVRAGE

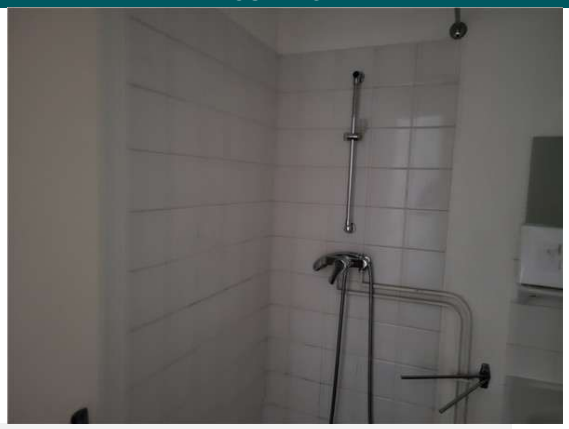

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 216 - Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P042


OUVRAGE

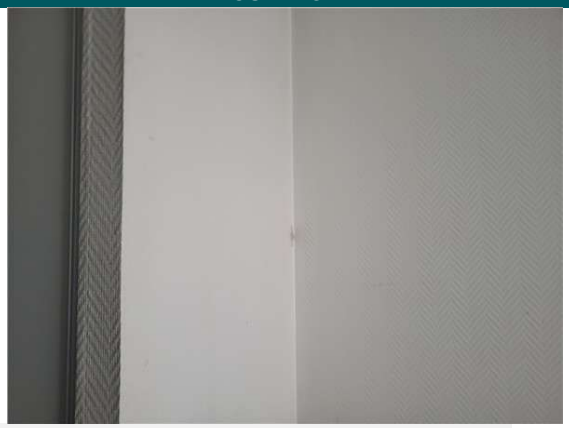

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 216 - Pièce de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P043

OUVRAGE

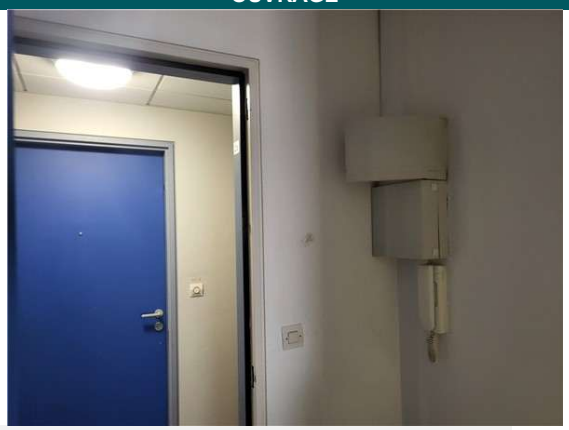


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 216 - Pièce de vie	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P044
OUVRAGE

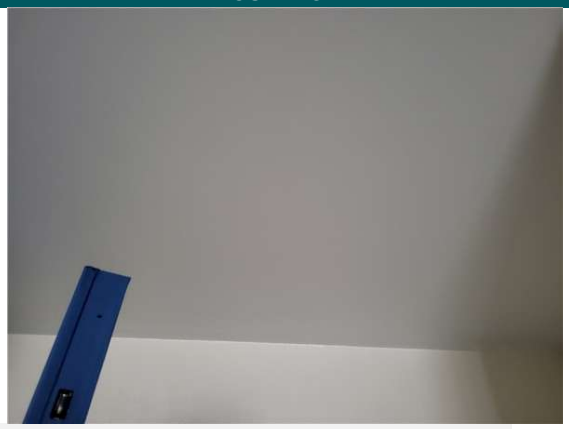


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 216 - Pièce de vie	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P045
OUVRAGE

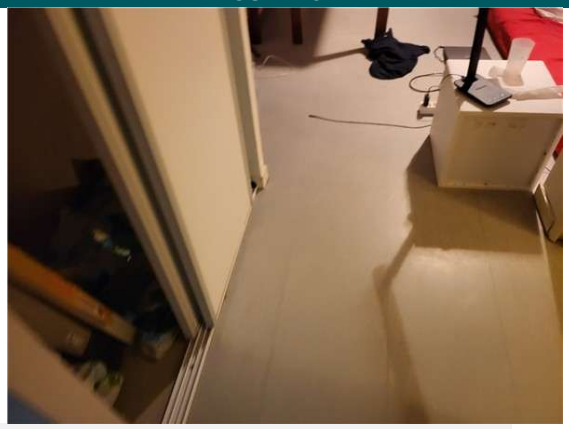

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 212 - Pièce de vie	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P046
OUVRAGE

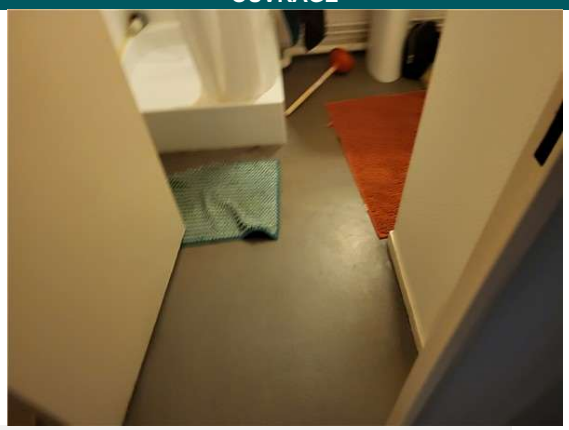

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 212 - Salle de bains	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P047
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 212 - Pièce de vie	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P048
OUVRAGE

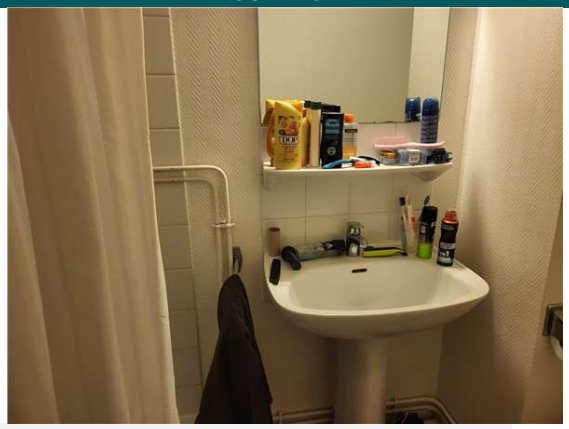

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 212 - Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P049
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 212 - Pièce de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P050
OUVRAGE

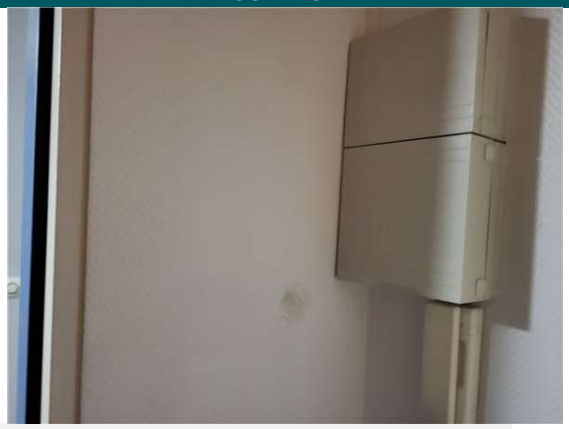


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 212 - Pièce de vie	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P051
OUVRAGE

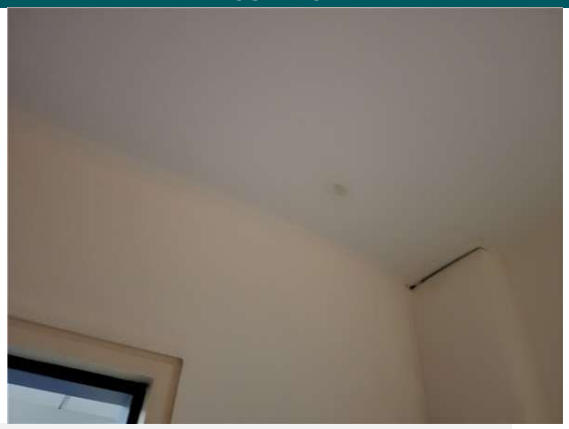

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 212 - Pièce de vie	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P052
OUVRAGE

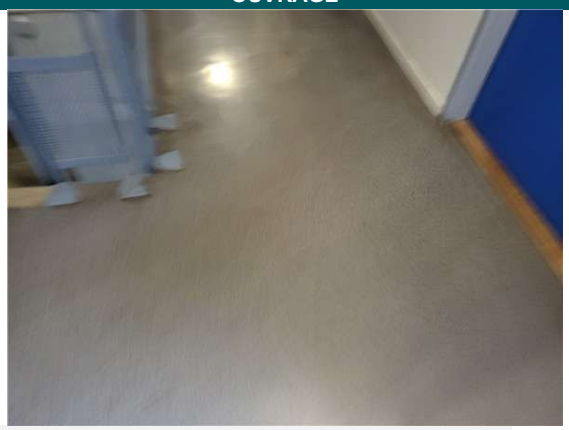

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P053


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Revêtements de sols	Ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P054


OUVRAGE

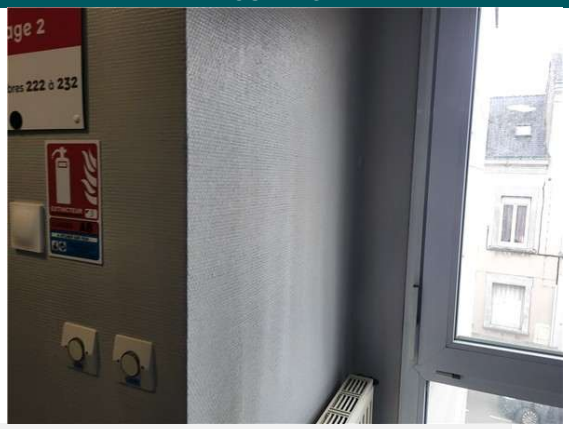

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P055

OUVRAGE

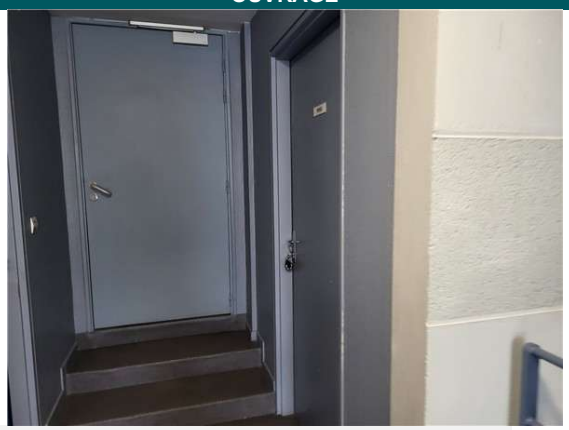


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


PRELEVEMENT : P056
OUVRAGE

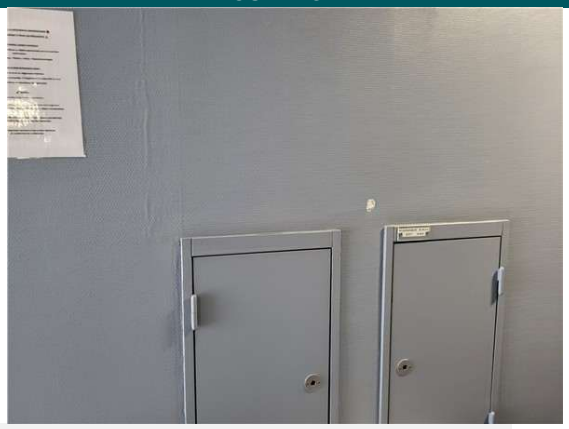

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




PRELEVEMENT : P057
OUVRAGE

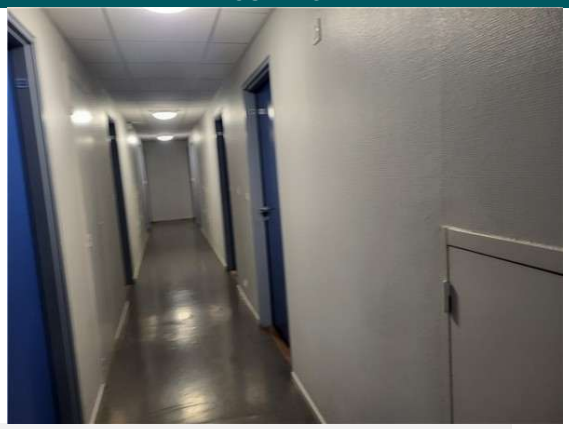

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P058
OUVRAGE

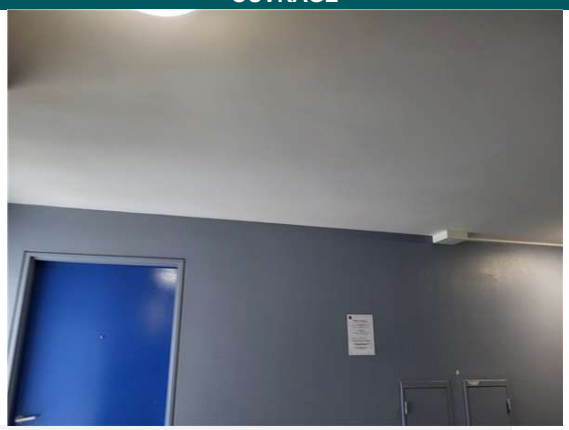

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER


Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P059
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Locla ménage	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P060
OUVRAGE

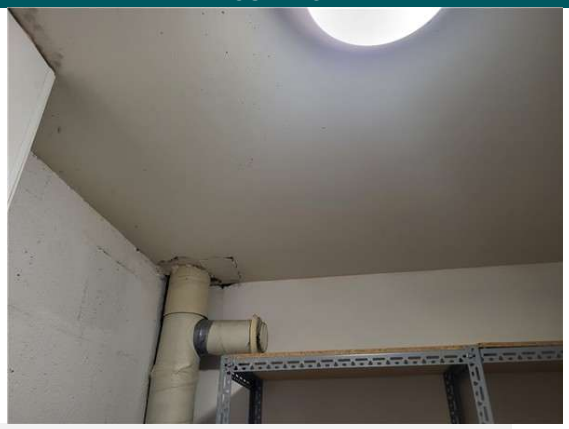

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Locla ménage	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P061
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P062
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 225 - Pièce de vie	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P063
OUVRAGE

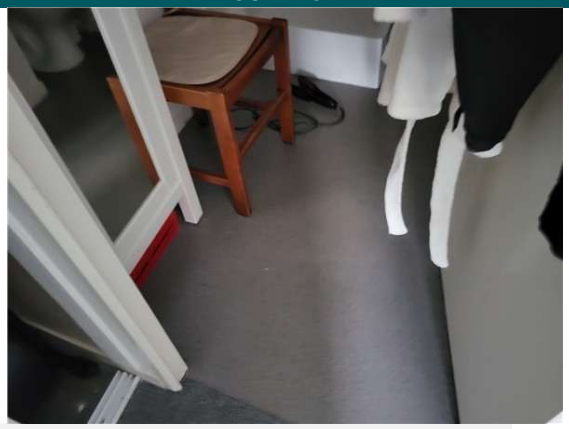

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 225 - Salle de bains	Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P064
OUVRAGE

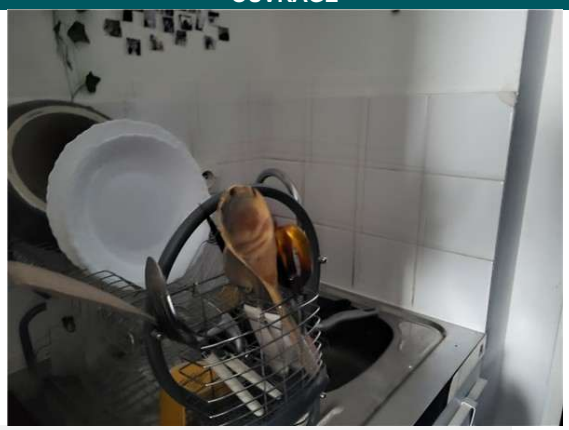


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 225 - Pièce de vie	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


PRELEVEMENT : P065
OUVRAGE

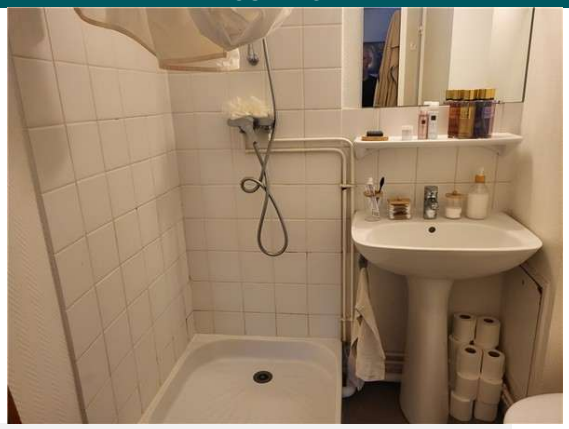

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 225 - Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




PRELEVEMENT : P066
OUVRAGE

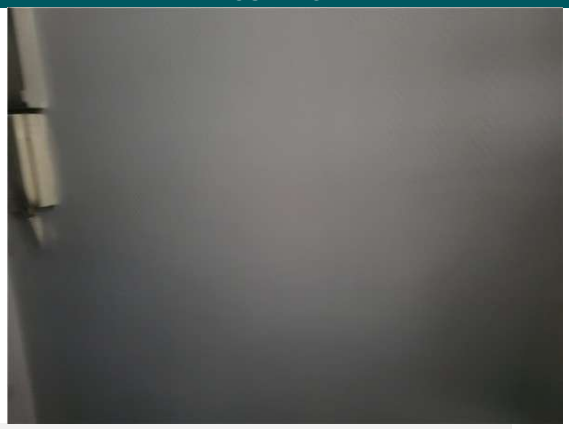

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 225 - Pièce de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P067
OUVRAGE

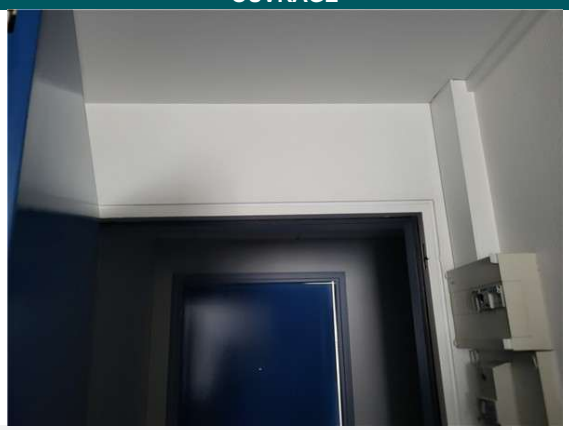

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 225 - Pièce de vie	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


PRELEVEMENT : P068
OUVRAGE

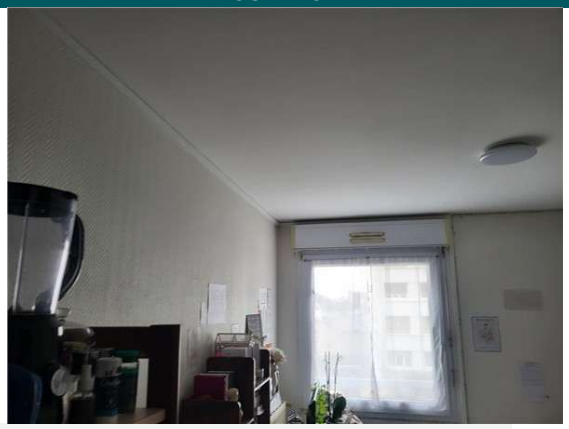

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 225 - Pièce de vie	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P069
OUVRAGE

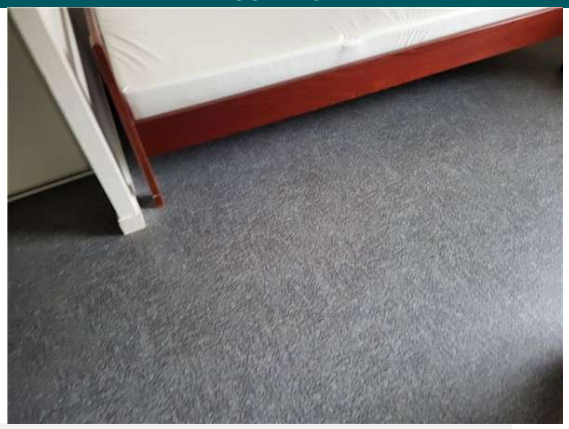

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 226 - Pièce de vie	Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P070
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 226 - Salle de bains	Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER


Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P071
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 226 - Pièce de vie	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P072
OUVRAGE

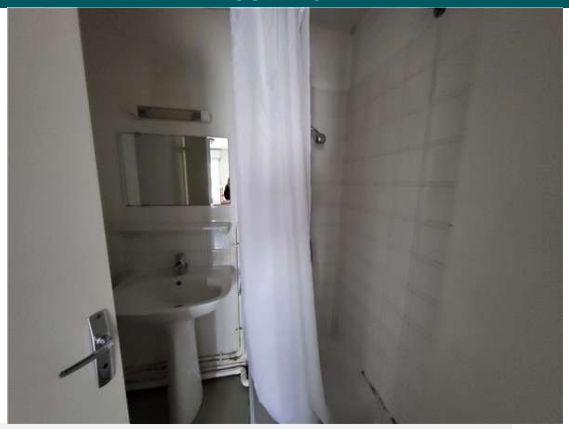

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 226 - Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P073
OUVRAGE

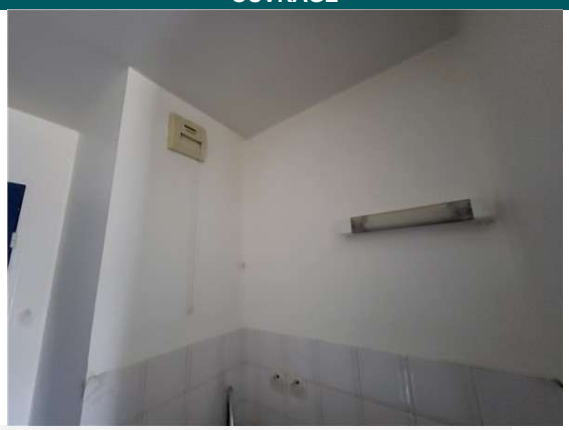


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 226 - Pièce de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


PRELEVEMENT : P074
OUVRAGE

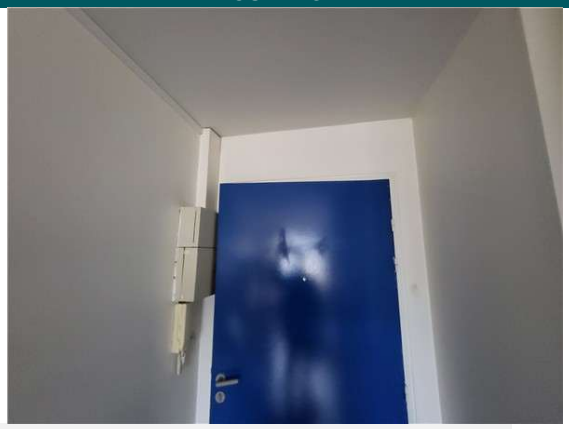

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 226 - Pièce de vie	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P075
OUVRAGE

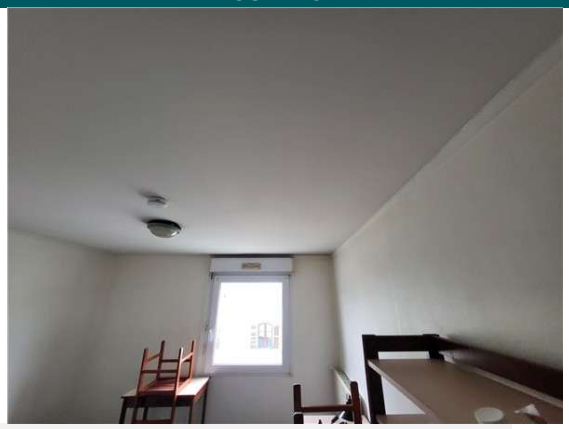

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 226 - Pièce de vie	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P076
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Circulation	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P077
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Circulation	Revêtements de sols	Ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P078
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Circulation	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P079
OUVRAGE

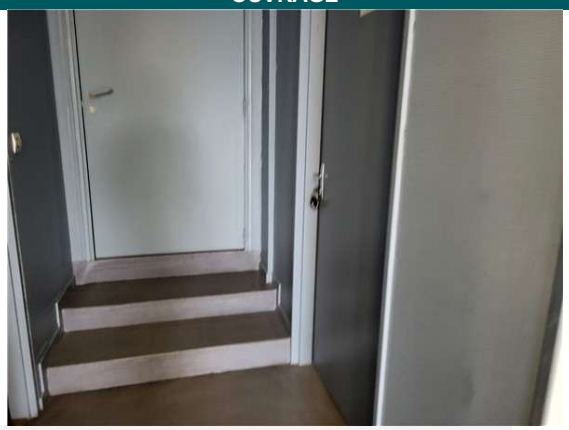


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Circulation	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


PRELEVEMENT : P080
OUVRAGE

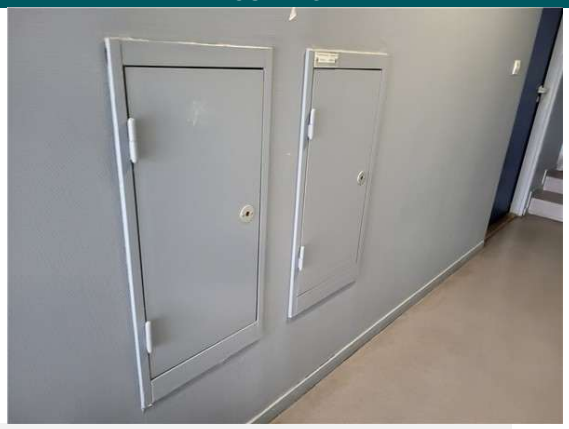

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P081
OUVRAGE

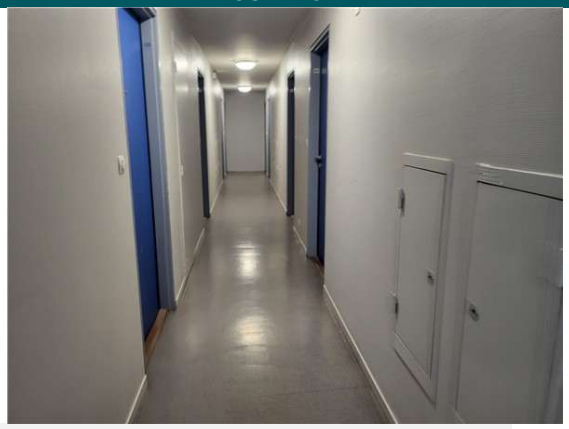

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P082
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Circulation	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P083
OUVRAGE

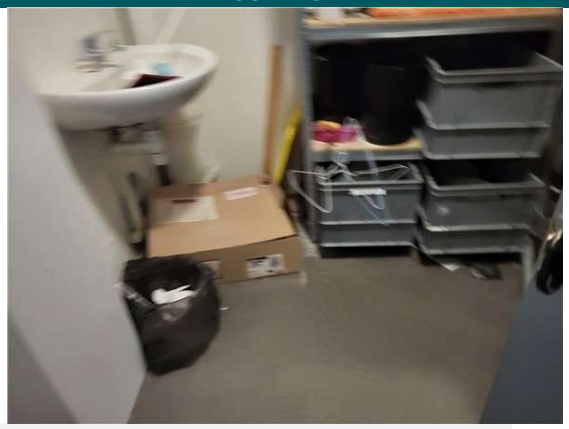


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Locla ménage	Revêtements de sols	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P084
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Locla ménage	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P085
OUVRAGE

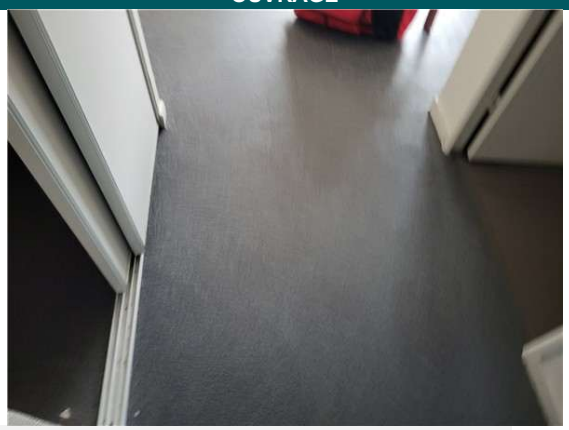


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 234 - Pièce de vie	Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P087
OUVRAGE

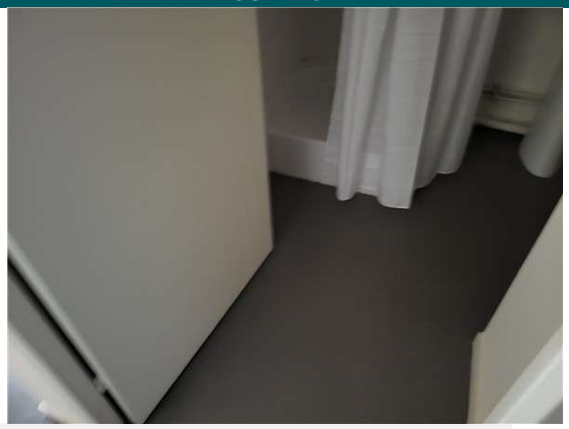

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 234 - Salle de bains	Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




PRELEVEMENT : P088
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 234 - Pièce de vie	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P089
OUVRAGE

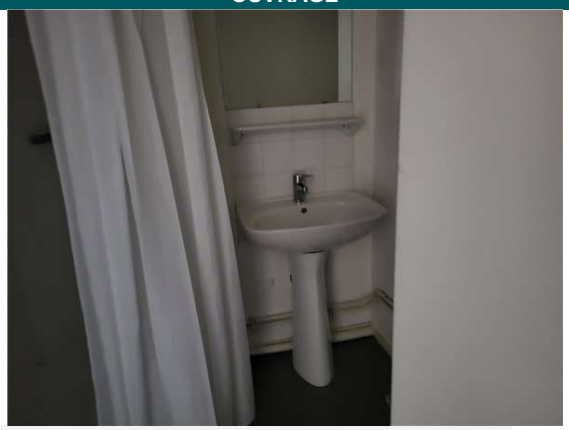

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 234 - Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P090

OUVRAGE

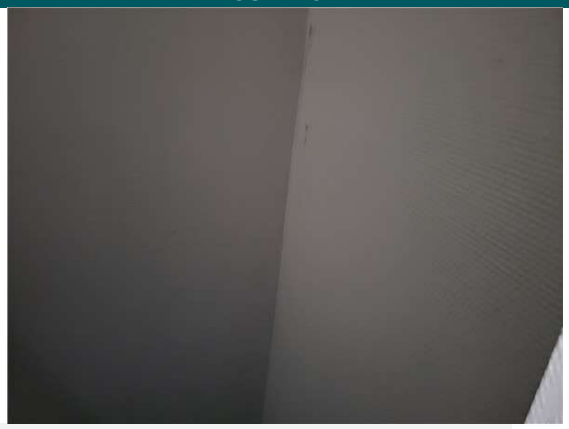

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 234 - Pièce de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P091

OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 234 - Pièce de vie	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P092

OUVRAGE

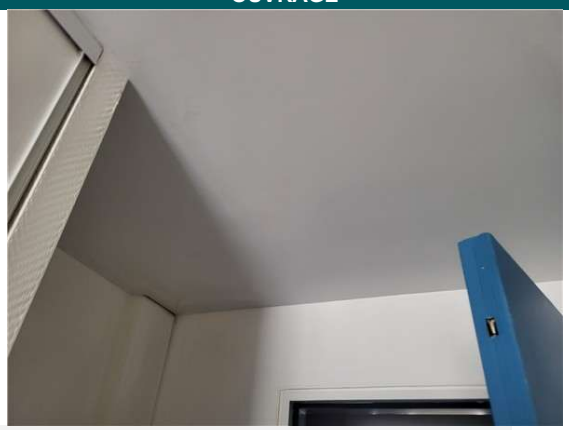

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 234 - Pièce de vie	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P093
OUVRAGE

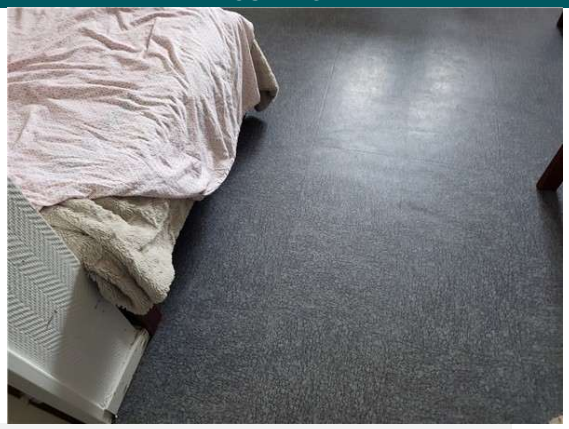

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 239 - Pièce de vie	Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P094
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 239 - Salle de bains	Revêtements de sols n°2	Revêtement souple + colle + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P095
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 239 - Pièce de vie	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P096
OUVRAGE

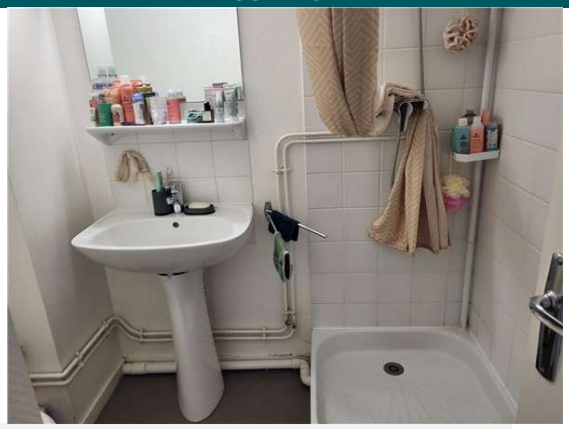


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 239 - Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P097
OUVRAGE

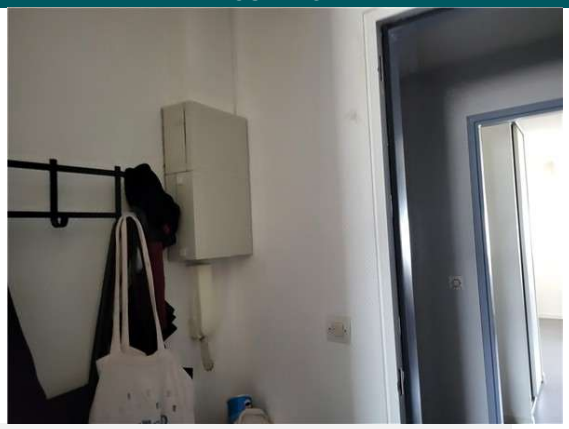

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 239 - Pièce de vie	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P098
OUVRAGE

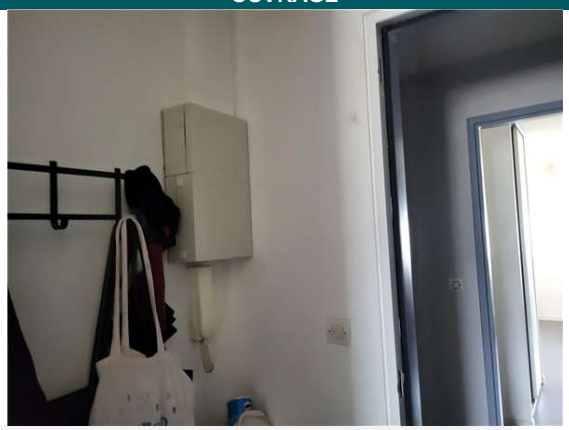

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 239 - Pièce de vie	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P099

OUVRAGE

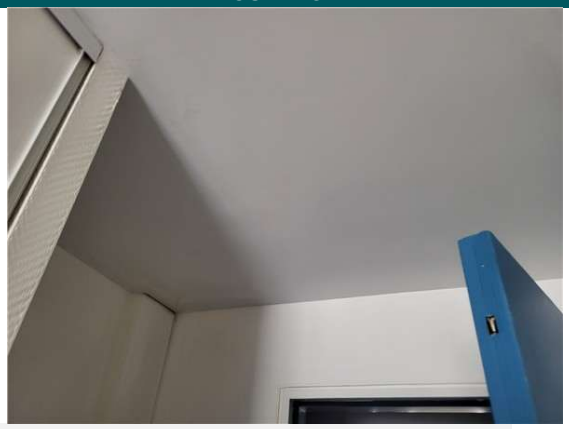

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 239 - Pièce de vie	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P100

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Chambre 209 - Piece de vie	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P101

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 212 - Pièce de vie	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P102

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Chambre 216 - Pièce de vie	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P103

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 225 - Pièce de vie	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P104

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Chambre 226 - Pièce de vie	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P105

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 234 - Pièce de vie	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P106

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chambre 239 - Pièce de vie	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P107

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Chaufferie	Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P108

OUVRAGE

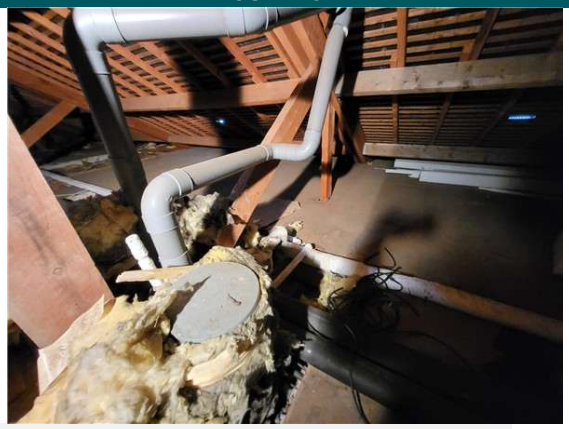


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Combles	Revêtements de sols	Laine minérale + pare vapeur	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P109

OUVRAGE

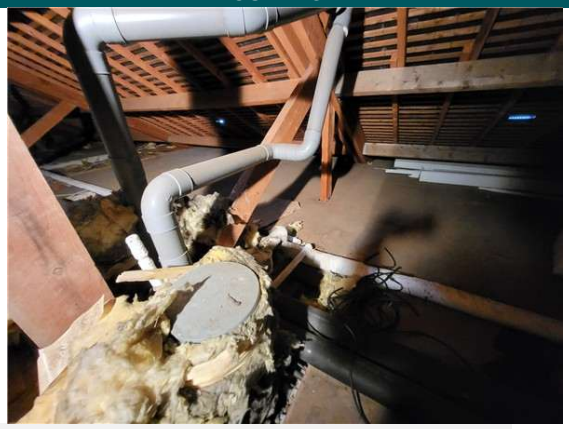


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Combles	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Enveloppe de calorifugeages (plâtre)	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P110

OUVRAGE

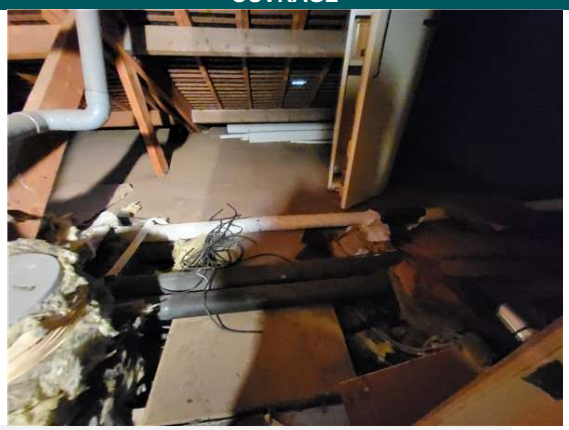

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Combles	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifugeage (noir)	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P111

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Menuiseries extérieures	Joint de vitrage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P112


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Menuiseries extérieures Tablier	Joint de vitrage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P113

OUVRAGE

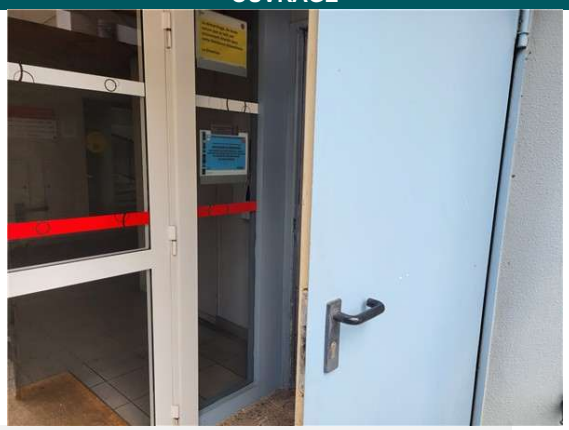


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Local ménage	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Peinture bleu	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER


Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P114
OUVRAGE

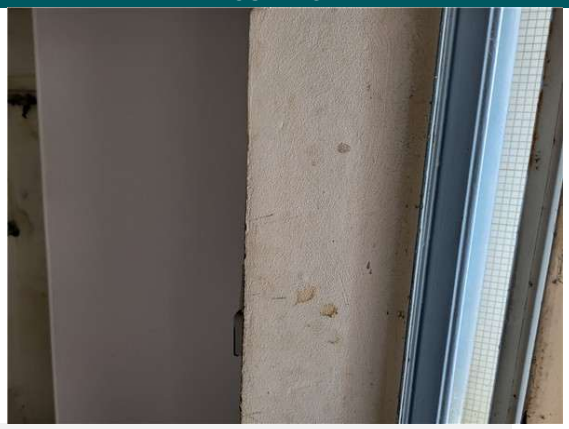

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Local ménage	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P115
OUVRAGE

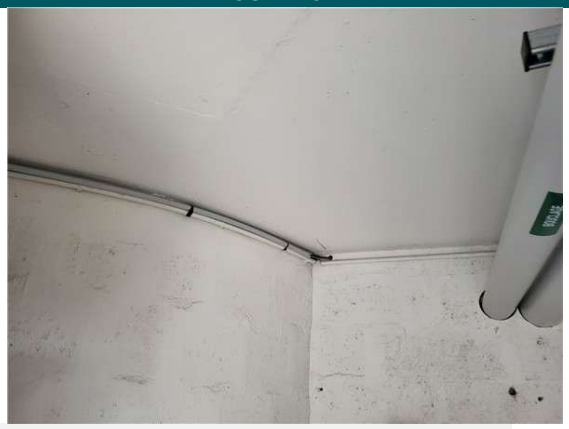

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Local ménage	Plafonds	Peinture + enduit béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P116
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Peinture + enduit béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P117

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Peinture + enduit béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P118

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades lourdes y compris poteaux (entre bâti et menuiseries extérieur)	Peinture + joint étanchéité	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P119

OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux en composites	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P120

OUVRAGE

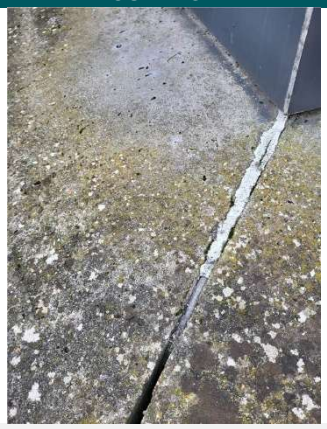

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades lourdes y compris poteaux Rejingot	Joint blanc	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PROCES VERBAUX D'ANALYSES LABORATOIRE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PV_00720260301780204

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

QUALICONSULT IMMOBILIER SAS
Monsieur Gwenael ADELIS
6 B Rue Alessandro Volta
44481 CARQUEFOU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 — Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 — Page1/35
Dossier N° : 26W010150 — Date de réception : 13/03/2026 — Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Circulation - - Revêtements de sols n°1 - Colle de carrelage 30x30 beige + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de plinthes 10x20 beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDC - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page2/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P004-RDC - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1)	P005-RDC - Circulation - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - Circulation - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page3/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-RDC - Escalier - - Poteaux - Peinture + enduit	Matériau de type peinture (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-RDC - Escalier - - Marches - Revêtement souple + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-RDC - Escalier - - Contre marches - Revêtement souple + colle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page4/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-RDC - Escalier - - Volée d'escalier - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-RDC - Escalier - - Murs et cloisons maçonnés - Enduit de façade gris granuleux	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-RDC - Circulation - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-RDC - Circulation - - Plafonds - Enduit blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page5/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P014-RDC - Local ménage - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-RDC - Local ménage - - Revêtements de sols - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-RDC - Local ménage - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-RDC - Local ménage - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page6/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P018-Ext - Façades - - Menuiseries extérieures - Joint de vitrage	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019-Ext - Façades - - Menuiseries extérieures - Joint de compression (rdc)	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020-Ext - Façades - - Menuiseries extérieures - Joint de compression (1er étage)	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-RDC - Chambre 209 - Piece de vie - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-RDC - Chambre 209 - Salle de bains - - Revêtements de sols n°1 - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page7/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023 (1)	P023-RDC - Chambre 209 - Piece de vie - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024-RDC - Chambre 209 - Piece de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-RDC - Chambre 209 - Piece de vie - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page8/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	P026-RDC - Chambre 209 - Piece de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-RDC - Chambre 209 - Salle de bains - - Murs et cloisons maçonnés n°1 - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028-1er - Circulation - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029 (1)	P029-1er - Circulation - - Revêtements de sols - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page9/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030 (1)	P030-1er - Circulation - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page10/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031 (1)	P031-1er - Circulation - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (jaune)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032-1er - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	P033-1er - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	P034-1er - Circulation - - Plafonds - Peinture + enduit maigre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page11/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035-1er - Locla ménage - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)(ii)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036-1er - Locla ménage - - Plafond - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	P037-1er - Circulation - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page12/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	P038-1er - Chambre 216 - Pièce de vie - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039-1er - Chambre 216 - Salle de bains - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040-1er - Chambre 216 - Pièce de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
041	P041-1er - Chambre 216 - Salle de bains - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page13/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	P042-1er - Chambre 216 - Pièce de vie - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
043	P043-1er - Chambre 216 - Pièce de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page14/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044 (1)	P044-1er - Chambre 216 - Pièce de vie - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
045	P045-1er - Chambre 212 - Pièce de vie - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
046	P046-1er - Chambre 212 - Salle de bains - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page15/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	P047-1er - Chambre 212 - Pièce de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
048	P048-1er - Chambre 212 - Salle de bains - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
049	P049-1er - Chambre 212 - Pièce de vie - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
050	P050-1er - Chambre 212 - Pièce de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page16/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	P051-1er - Chambre 212 - Pièce de vie - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
052	P052-2ème - Circulation - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
053	P053-2ème - Circulation - - Revêtements de sols - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
054	P054-2ème - Circulation - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page17/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
055	P055-2ème - Circulation - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page18/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
056	P056-2ème - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
057	P057-2ème - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page19/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	P058-2ème - Circulation - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
059	P059-2ème - Locla ménage - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
060	P060-2ème - Locla ménage - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
061	P061-2ème - Circulation - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanc granuleux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page20/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	P062-2ème - Chambre 225 - Pièce de vie - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
063	P063-2ème - Chambre 225 - Salle de bains - - Revêtements de sols n°2 - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
064	P064-2ème - Chambre 225 - Pièce de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page21/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	P065-2ème - Chambre 225 - Salle de bains - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
066	P066-2ème - Chambre 225 - Pièce de vie - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page22/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
067	P067-2ème - Chambre 225 - Pièce de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
068	P068-2ème - Chambre 225 - Pièce de vie - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
069	P069-2ème - Chambre 226 - Pièce de vie - - Revêtements de sols n°2 - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page23/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070	P070-2ème - Chambre 226 - Salle de bains - - Revêtements de sols n°2 - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
071	P071-2ème - Chambre 226 - Pièce de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
072	P072-2ème - Chambre 226 - Salle de bains - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page24/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	P073-2ème - Chambre 226 - Pièce de vie - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
074	P074-2ème - Chambre 226 - Pièce de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
075	P075-2ème - Chambre 226 - Pièce de vie - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
076	P076-3ème - Circulation - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
077	P077-3ème - Circulation - - Revêtements de sols - Ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page25/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
078	P078-3ème - Circulation - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
079	P079-3ème - Circulation - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
080	P080-3ème - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page26/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	P081-3ème - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
082	P082-3ème - Circulation - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
083	P083-3ème - Locla ménage - - Revêtements de sols - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) (rose) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
084	P084-3ème - Locla ménage - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
085	P085-3ème - Chambre 234 - Pièce de vie - - Revêtements de sols n°2 - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page27/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	P087-3ème - Chambre 234 - Salle de bains - - Revêtements de sols n°2 - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
087	P088-3ème - Chambre 234 - Pièce de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
088	P089-3ème - Chambre 234 - Salle de bains - - Murs et cloisons maçonnés n°1 - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
089	P090-3ème - Chambre 234 - Pièce de vie - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page28/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	P091-3ème - Chambre 234 - Pièce de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
091	P092-3ème - Chambre 234 - Pièce de vie - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
092	P093-3ème - Chambre 239 - Pièce de vie - - Revêtements de sols n°2 - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) (noir) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
093	P094-3ème - Chambre 239 - Salle de bains - - Revêtements de sols n°2 - Revêtement souple + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté) (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page29/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	P095-3ème - Chambre 239 - Pièce de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
095	P096-3ème - Chambre 239 - Salle de bains - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
096	P097-3ème - Chambre 239 - Pièce de vie - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
097	P098-3ème - Chambre 239 - Pièce de vie - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page30/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
098	P099-3ème - Chambre 239 - Pièce de vie - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
099	P100-RDC - Chambre 209 - Piece de vie - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
100	P101-1er - Chambre 212 - Pièce de vie - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple (bitumineux) (noir)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
101	P102-1er - Chambre 216 - Pièce de vie - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple (bitumineux) (noir)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page31/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102	P103-2ème - Chambre 225 - Pièce de vie - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple de type revêtement de sol (bitumineux) (noir)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
103	P104-2ème - Chambre 226 - Pièce de vie - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple (bitumineux) (noir)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
104	P105-3ème - Chambre 234 - Pièce de vie - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple de type revêtement de sol (bitumineux) (noir)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
105	P106-3ème - Chambre 239 - Pièce de vie - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple (bitumineux) (noir)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page32/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
106	P107-3ème - Chaufferie - - Plafonds - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
107 (2)	P108-3ème - Combles - - Revêtements de sols - Laine minérale + pare vapeur	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)(ii)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
108	P109-3ème - Combles - - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe de calorifugeages (plâtre)	Matériau de type mousse (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
109	P110-3ème - Combles - - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifugeage (noir)	Matériau de type mousse (noir)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
110	P111-Ext - Façades - - Menuiseries extérieures - Joint de vitrage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page33/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type joint (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
111	P112-Ext - Façades - - Menuiseries extérieures - Joint de vitrage	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type joint (blanc) + (blanc) (transparent)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
112	P113-RDC - Local ménage - - Portes coupe–feu, pare–flamme, isothermiques, frigorifiques - Peinture bleu	Matériau de type peinture (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
113	P114-RDC - Local ménage - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
114	P115-RDC - Local ménage - - Plafonds - Peinture + enduit béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page34/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
115	P116-Ext - Façades - - Façades lourdes y compris poteaux - Peinture + enduit béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
116	P117-Ext - Façades - - Façades lourdes y compris poteaux - Peinture + enduit béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
117	P118-Ext - Façades - - Façades lourdes y compris poteaux - Peinture + joint étanchéité	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type joint (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
118	P119-Ext - Façades - - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Plaques, panneaux en composites	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / YFZ9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
119	P120-Ext - Façades - - Façades lourdes y compris poteaux - Joint blanc	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-018023-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 16:25 | Page35/35
Dossier N° : 26W010150 | Date de réception : 13/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:5349011
5349011 A - BATIMENT Madeleine 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(2) Des fibres minérales susceptibles d'être inhalées (l<3 µm) ont été observées au sein de la l'échantillon. Ces fibres, de nature asbestiforme, sont de type fibres minérales artificielles et ont pu être différenciées de fibres d'amiante via leurs propriétés optiques.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Gabriel ORHAN
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 35 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

DOCUMENT(S) REMI(S)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

Document : Document 1


vignault x faure
architecte
philosophe
associés

Réhabilitation énergétique de la cité universitaire Bourgonnier et de la résidence Universitaire Madeleine à Angers

Crous Nantes - Pays de la Loire

Diagnostic - Esquisse
Réunion du 29 juillet 2025

Adresse du projet
19 et 21 rue Loiné Laroche 49000 Angers

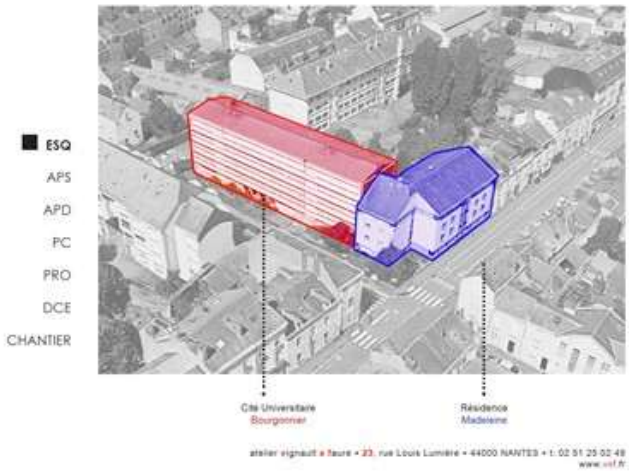

atelier vignault + faure • 23, rue Louis Lumière • 44000 NANTES • t. 02 51 25 02 48
www.vxf.fr

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

SOMMAIRE

CITÉ UNIVERSITAIRE BOURGONNIER
1/ DIAGNOSTIC
Repérage photographique p.04
Plans de niveaux p.05
Principe structurel des façades p.06


2/ ESQUISSE
Rénovation énergétique des façades p.07
Cuisines et terrasses p.08
Colorimétrie p.10

RÉSIDENCE MADELEINE
3/ DIAGNOSTIC
Repérage photographique p.11
Plans de niveaux p.12

4/ ESQUISSE
Rénovation énergétique des façades p.13

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

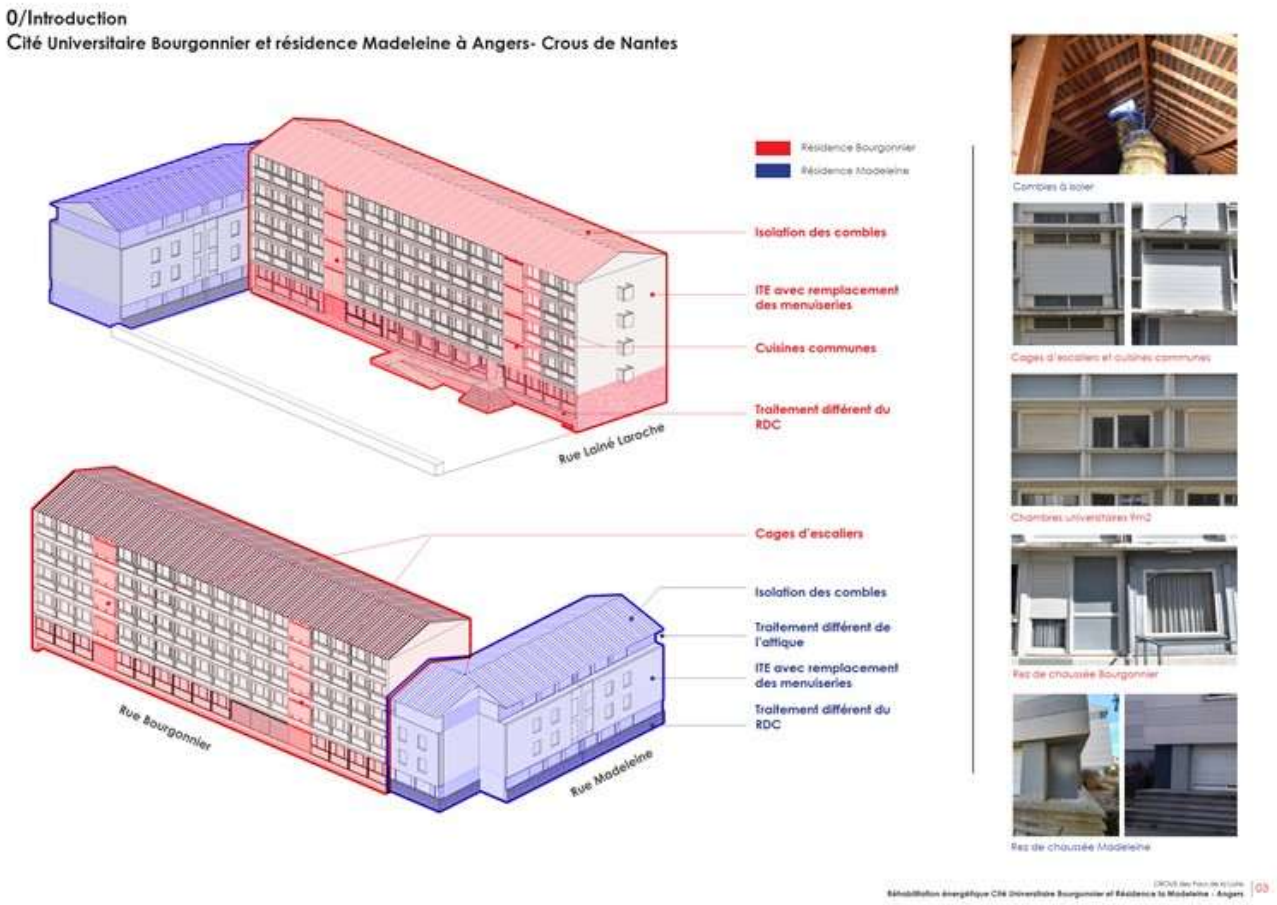


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

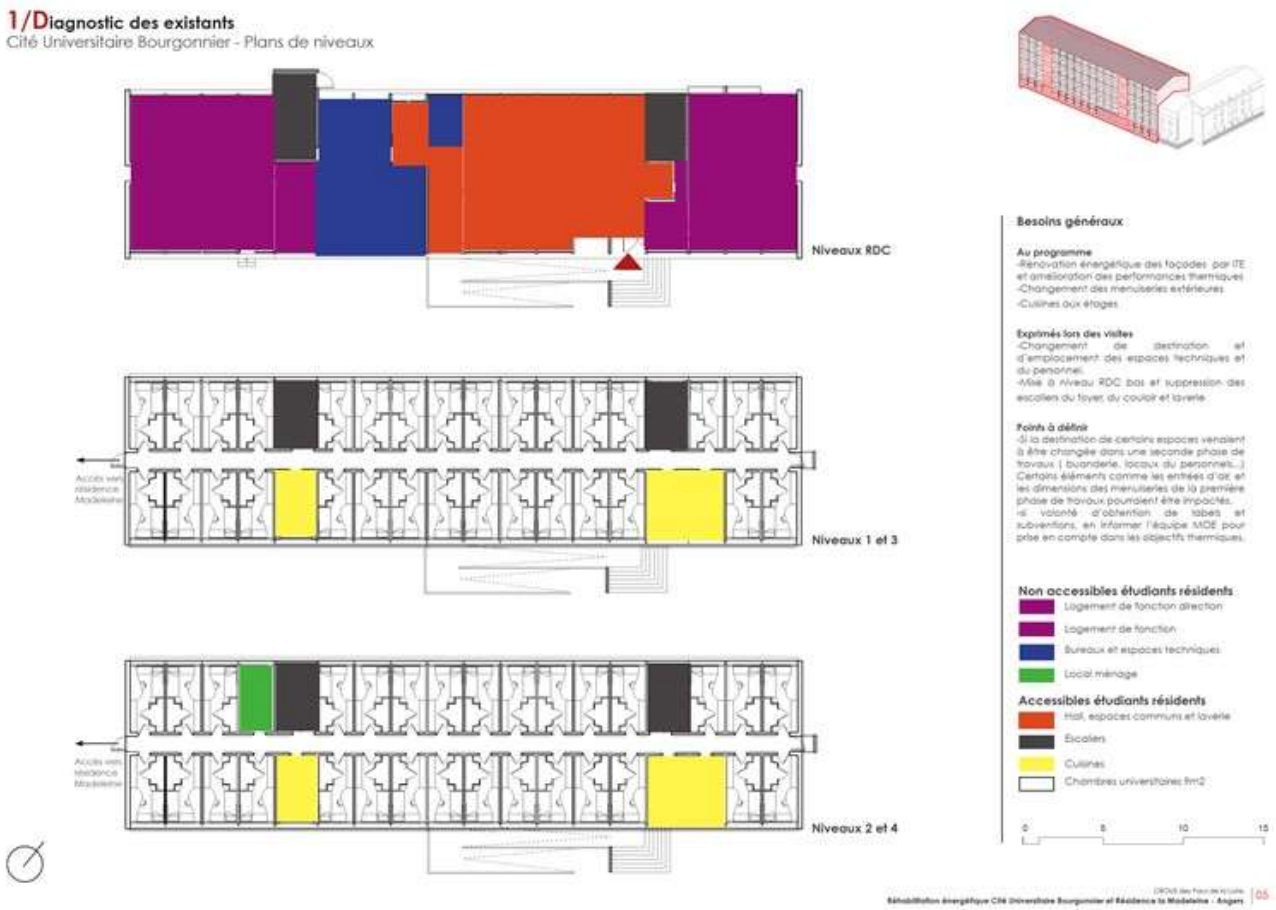


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

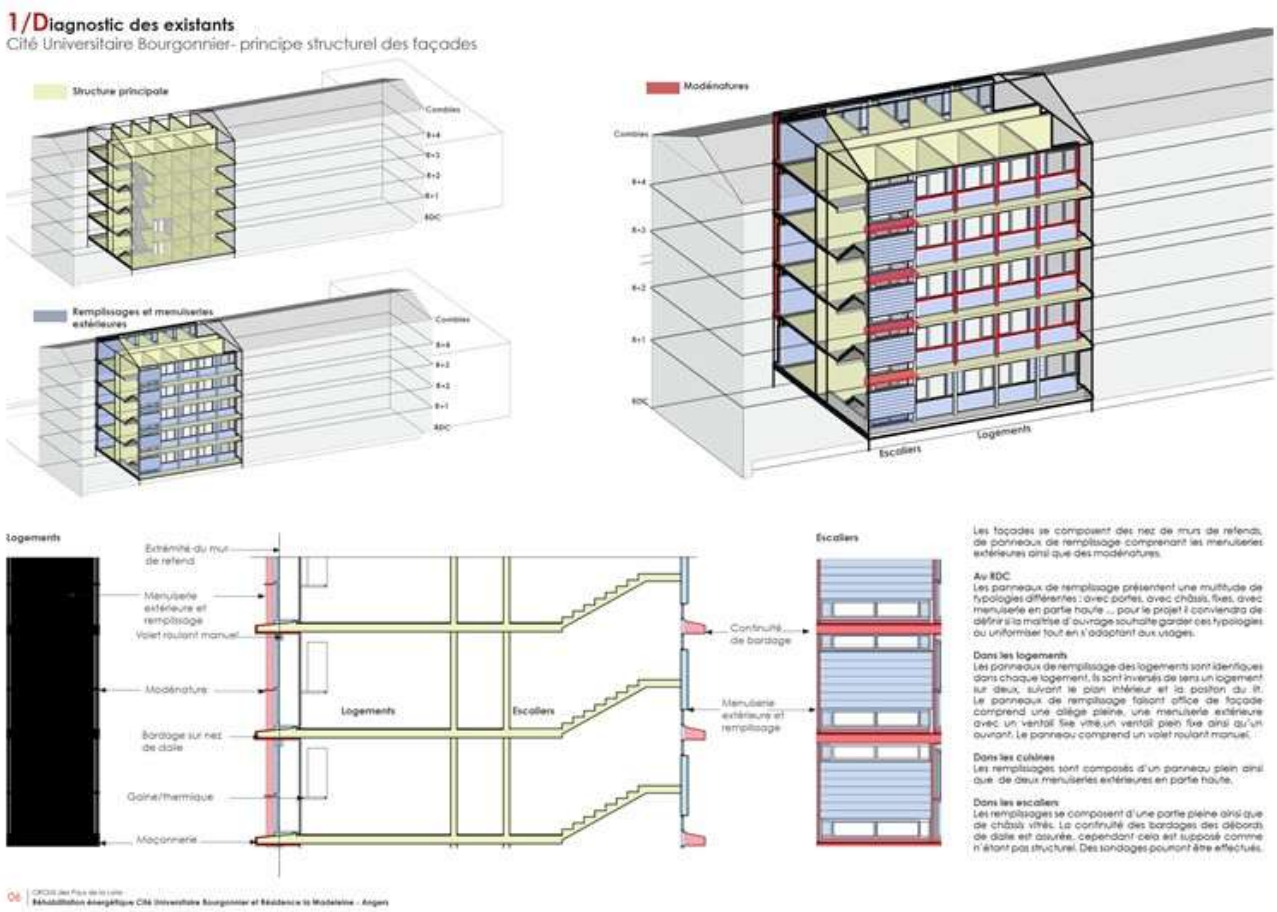

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

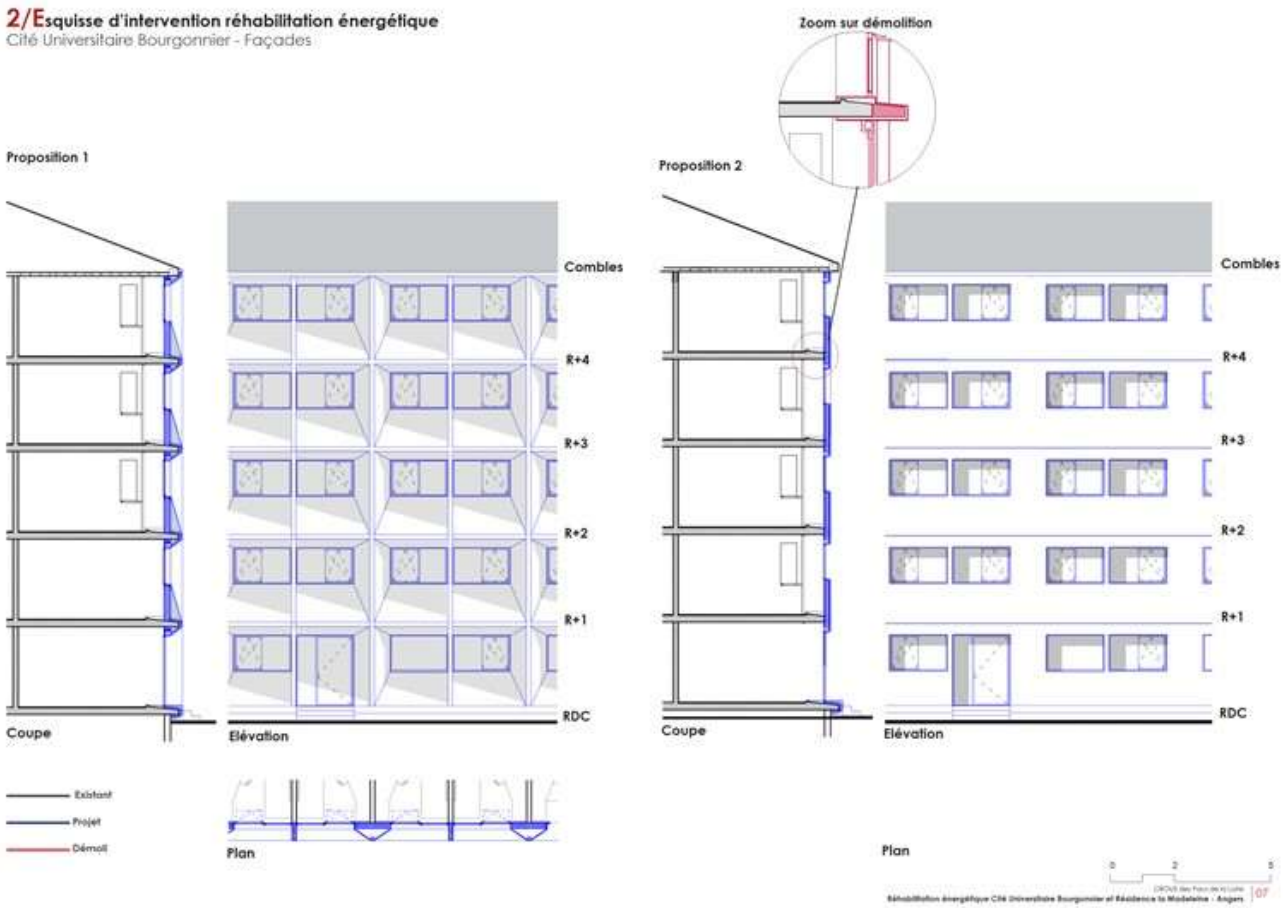


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

2/Esquisse d'intervention réhabilitation énergétique

Cité Universitaire Bourgonnier - Cuisines et terrasses

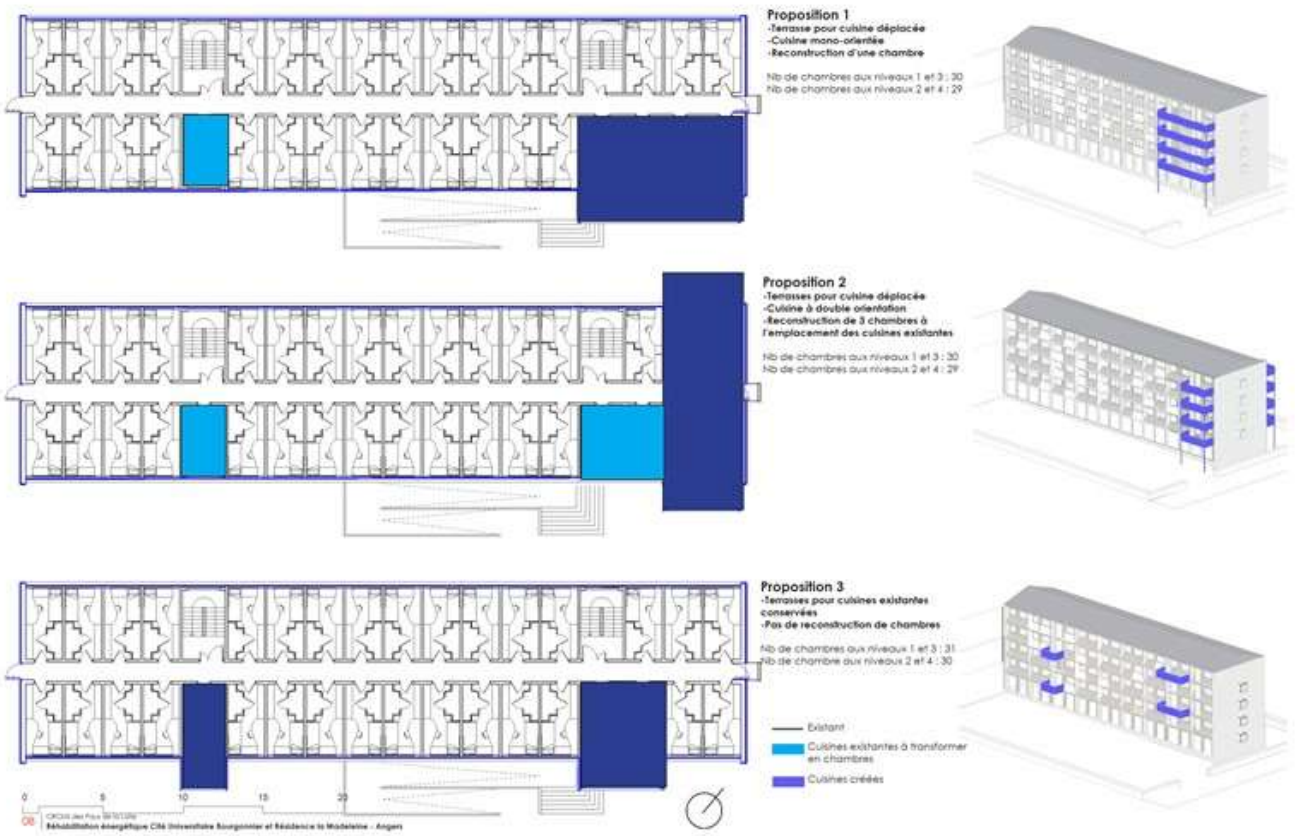


Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

2/Esquisse d'intervention réhabilitation énergétique

Cité Universitaire Bourgonnier - Cuisines et terrasses





Vue extérieure depuis le balcon
de la terrasse extérieure



Variante bardage



Vue intérieure depuis la cuisine

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

2/Esquisse d'intervention réhabilitation énergétique

Cité Universitaire Bourgonnier - Façades et colorimétrie



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293





CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


3/Diagnostic des existants

Résidence Universitaire Madeleine - Plans de niveaux







Niveaux RDC

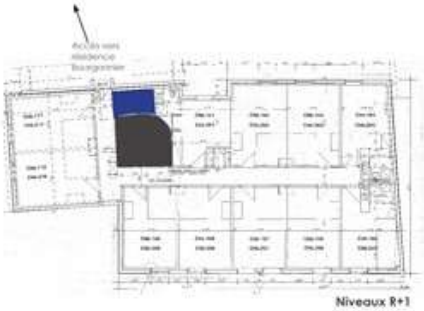

Niveaux R+1

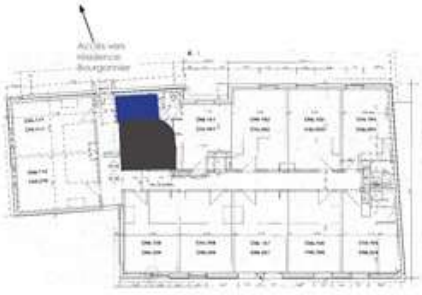

Niveaux R+2

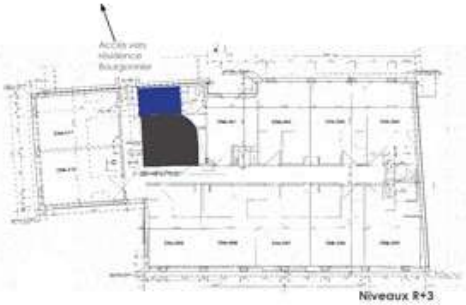

Niveaux R+3

Besoins généraux

au programme

-Rénovation énergétique des façades par ITE et amélioration des performances thermiques

-Changement des menuiseries extérieures

Non accessibles étudiants résidents

Espaces techniques

Accessibles étudiants résidents

Hall

Escaliers


Studios

0 5 10 15

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

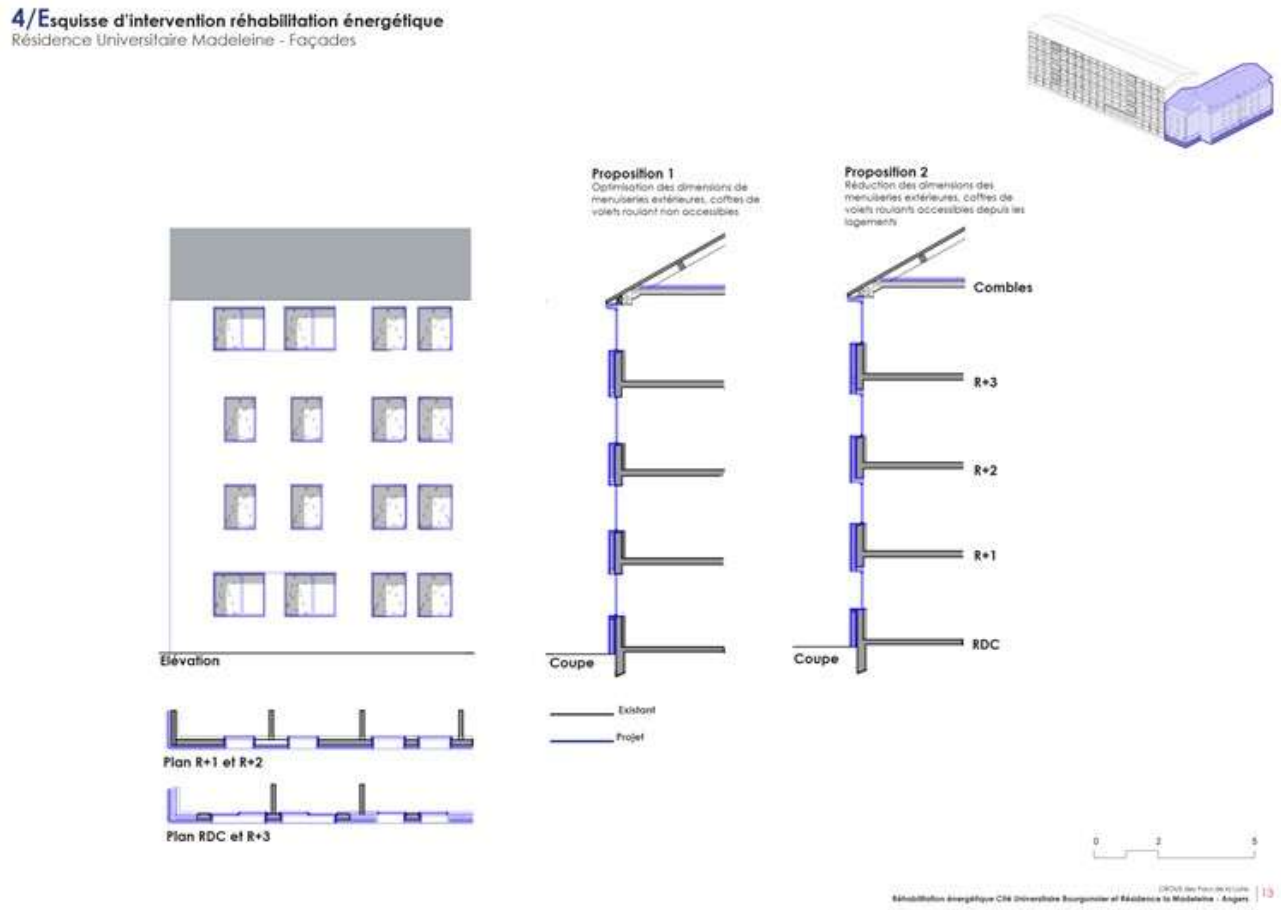

Commentaire :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre interlocuteur
ASQUA-BTP
1B RUE DU PETIT CLAMART
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Portefeuille : 201242284

01 40 83 11 83
01 40 83 76 40

SAS QUALICONSULT IMMOBILIER
1B RUE DU PETIT-CLAMART
VELIZY PLUS
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

Vos références

Contrat
11450130004

Référence client
0899602220

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS QUALICONSULT IMMOBILIER
1B RUE DU PETIT-CLAMART
VELIZY PLUS
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

a souscrit pour son compte, le contrat n° **11450130004** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers, du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat, décrites au verso de ce document.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2026 au 01/01/2027** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **19/12/2025**
Pour la société :

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

DOMAINES	MISSIONS
AMIANTE	o Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux ou démolition (immeuble bâti / infrastructures routières - réseaux / équipements) o Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant-vente o Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - liste A et ou B o Assistance à rédaction du Dossier technique amiante, o Assistance à rédactuion du Dossier amiante partie privative (DAPP) o Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante o Contrôle visuel après travaux de traitement des matériaux contenant de l'amiante o Analyse ponctuelle en recherche d'amiante o Mesure d'empoussièrement amiante
PLOMB	o Diagnostic plomb avant travaux ou démolition o Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) o Mesure de la concentration de plomb dans les poussières au sol (avant / après travaux - hors DRIPP) o Analyse ponctuelle en recherche de plomb dans les matériaux
DECHETS	o Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la demolition ou de la renovation significative DPEMD (arrêté du 26/03/2023)
RADON	o Dépistage radon
VENTE - LOCATION	o Etat de l'installation intérieure d'électricité o Etat de l'installation intérieure de gaz o Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment o Etat relatif à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et parasites dans le bâtiment o Etat des risques et pollutions, o Mesurage Loi Carrez, o Mesurage Loi Boutin, o Etats des lieux (loi 89-462) hors réglementation « Logements décents »+B36 o Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie o Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro, o Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
ANALYSES PONCTUELLES	o Analyse ponctuelle caractérisation de la silice cristalline. o Analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 – C40) o Analyse ponctuelle en recherche de zinc o Analyse ponctuelle en recherche de Fibres Céramiques Réfractaires, o Caractérisation des HAP dans les enrobés o Analyse ponctuelle caractérisation de mâchefer
EAU	o Analyse ponctuelle potabilité de l'eau o Analyse d'eau recherche de plomb o Etat relatif à la présence et concentration de légionelles (réseau d'eau) o Diagnostic de conformité de l'installation d'Assainissement non collectif o Vérification du raccordement d'installation au réseau d'assainissement collectif
ENERGIE	o Diagnostic de performance énergétique, o Audit énergétique réglementaire selon le Décret N° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L.126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
PREVENTION DES RISQUES AMIANTE ET PLOMB	o Conseil et assistance à la rédaction de note des procédures à mettre en œuvre, et aide à la gestion et suivi documentaire pour la protection des travailleurs et du publics, lors de la réalisation de travaux sur des ouvrages susceptibles de contenir du plomb et/ou de l'amiante; o Conseil dans le domaine de la prévention des risques amiante et plomb, à l'occasion de la rédaction de pièces écrites ou de réalisation de travaux.

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4649 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ADELIS Gwenaël

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/04/2024 - Date d'expiration : 16/04/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/04/2024 - Date d'expiration : 16/04/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 21/02/2024 - Date d'expiration : 20/02/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-6522 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev19

Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
