Référence dossier :
5364000 A

Qualiconsult IMMOBILIER

PRE RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX F

Code du travail :	Décret :	Arrêtés :
Article R.4412-97	n°2011-629 du 3 juin 2011 n°2012-639 du 4 mai 2012 n°2013-594 du 5 juillet 2013 n°2015-789 du 29 juin 2015 n°2017-899 du 9 mai 2017 n°2019-251 du 27 mars 2019	du 26 juin 2013 du 25 juillet 2016 du 16 juillet 2019
Code de la Santé Publique :		

Norme : Norme NFX 46 -020 d'août 2017

1. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE BÂTI

Adresse : Résidence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche
49000 ANGERS

Complément d'adresse

Bât : | Entrée :
Esc. : | Etage :
Porte n : | Lot n° :

Référence cadastrale : Non Communiqué(s)

Fonction principale du bâtiment : Tertiaire

Type de bien : ERP

Catégorie du bâtiment : de 701 à 1500 personnes

Date du permis de construire : Antérieur au 1 juillet 1997



N° de dossier	Date de la commande
5364000	09/03/2026
Date du repérage	**Accompagnateur**
09/03/2026	Le représentant du donneur d'ordre

2. DESIGNATION DE L'ORGANISME ET AUTEUR DU REPERAGE

Organisme : QUALICONSULT IMMOBILIER

Adresse : 6b, rue Volta - BP 708
44470 CARQUEFOU

Auteur du repérage : ADELIS Gwenael

ICERT

Compétence Certifié par N° CPDI4649

Depuis le 17/04/2024

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police : 11450130004

Date de validité : 31/12/2026

3. DESIGNATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE

Laboratoire : EUROFINS OUEST

N° d'accréditation : 1-5597 rév 11

Adresse : 11, rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 NANTES

REVISION	DATE	OBJET
Version 01	30/03/2026	Création du document

Amiante

SOMMAIRE

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE 3
1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS 5
1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE 5
1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE 5
2. PREAMBULE 5
3. BUT DE LA MISSION 5
3.1. REPERAGE ANTERIEUR REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE 5
3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 5
3.3. PERIMETRE DU REPERAGE 6
3.4. PROGRAMME DE REPERAGE 13
4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC 23
4.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE 23
4.2. PHASE DE REPERAGE 23
4.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON 24
5. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES 24
6. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE 30
6.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE 30
6.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 63
6.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 64
7. OBSERVATIONS & RESERVES 110
8. ANNEXES 110

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION **111**

PLANCHE(S) DE REPERAGE **116**

PLANCHE PHOTO(S) **125**

PROCES VERBAUX D'ANALYSES LABORATOIRE **192**

DOCUMENT(S) REMI(S) **244**

ATTESTATION D'ASSURANCE **258**

CERTIFICAT DE QUALIFICATION **260**

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE

DANS LE CADRE DE LA MISSION OBJET DU PRESENT PRE-RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Revêtements de sols Colle de revêtement de sol beige clair — Quantité estimée total dans la ZPSO : 20 m²

Etage	Local ou partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure	(Quantité estimée dans le local
RDC - Logement gardien	Séjour	Résultat d'analyse (P025)	20 m²

Revêtements de sols Dalle de sol beige + colle noire — Quantité estimée total dans la ZPSO : 20 m²

Etage	Local ou partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure	(Quantité estimée dans le local
RDC - Logement gardien	Séjour	Résultat d'analyse (P026)	20 m²

Revêtements de sols Dalles de sol 30x30 beige + colle noire — Quantité estimée total dans la ZPSO : 15 m²

Etage	Local ou partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure	(Quantité estimée dans le local
RDC	Lingerie	Résultat d'analyse (P161)	15 m²

Menuiseries extérieures Plaque fibre ciment — Quantité estimée total dans la ZPSO : 8 u

Etage	Local ou partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure	(Quantité estimée dans le local
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P183)	8 u

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête du présent pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifique

LISTE DES LOCAUX NON-VISITES INSCRITS DANS LE PERIMETRE DE LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION

SANS OBJET

LISTE DES OUVRAGES OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION NON INSPECTES ET JUSTIFICATION

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Justification
Façades	**Ext**	Isolation extérieurs	**ITE**	Elément sous coffrage, Bâtiment en activité. Site occupé
Façades	**Ext**	Menuiseries extérieures : Panneaux sandwichs	**Joint de compression**	Bâtiment en activité. Site occupé
Cabines de douches de l'ensemble des chambres	**Tous les étages**	Cabines de douches	**Murs, bourre de plomberies, éventuellement conduits derrière les cabines de douche thermoformées**	Bâtiment en activité. Site occupé
Logement Directrice	**Sols**	Revêtements de sols	**Parquets**	Bâtiment en activité. Site occupé

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies conformément à l'article R1334-19,
« Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Edité le : 30/03/2026
Fait à : CARQUEFOU

Cachet de l'entreprise

QUALICONSULT IMMOBILIER
6 Bis Rue Alessandro Volta, Bâtiment F9
44481 CARQUEFOU CEDEX
Tél. 02 51 13 12 31 - Fax 02 51 13 99 44
nantes.facilities@qualiconsult.fr
SIRET 490 676 293 00569

Signature de l'opérateur



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Nom : CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

Qualité du donneur d'ordre :
Sur déclaration de l'intéressé

Adresse : 2 BOULEVARD GUY MOLLET
44322 NANTES CEDEX 3

1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Nom : CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

Qualité du donneur d'ordre :
Sur déclaration de l'intéressé

Adresse : 2 BOULEVARD GUY MOLLET
44322 NANTES CEDEX 3

2. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **de travaux de l'immeuble sis :**

Residence Bourgonnier
19-21 Rue Lainé Laroche
49000 ANGERS

Date de délivrance du permis de construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**

Destination présente et passée de l'immeuble bâti : **Tertiaire**

Les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention sont définies à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique ainsi que par arrêté.

ANCIENS REPERAGE REMIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE :

Moyens mis à disposition par le maître d'ouvrage : Néant

3. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les ouvrages ou composant de la construction susceptibles d'être affectés par les travaux.

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 d'août 2017 :

Sans Objet

3.1. REPERAGE ANTERIEUR REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun repérages antérieure nous a été remis

3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Ref. Programme de Travaux	DESCRIPTION DES TRAVAUX
	Etude de travaux en annexes.

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

3.3. PERIMETRE DU REPERAGE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage	Etage	Travaux
Hall	RDC	Concernée
Cafétéria	RDC	Concernée
WC	RDC	Concernée
Circulation	RDC - Logement Directrice	Concernée
Séjour	RDC - Logement Directrice	Concernée
Chambre 1	RDC - Logement Directrice	Concernée
Chambre 2	RDC - Logement Directrice	Concernée
Cellier	RDC - Logement gardien	Concernée
Salle de Bains	RDC - Logement gardien	Concernée
Cuisine	RDC - Logement gardien	Concernée
WC	RDC - Logement gardien	Concernée
Sous-sol Garage vélo	1er SS	Concernée
Cuisine n°1	1er	Concernée
Cuisine n°2	1er	Concernée
Circulation n°1	1er	Concernée
Chambre	1er Lot 108	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 108	Concernée
Chambre	1er Lot 124	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 124	Concernée
Cuisine n°1	2ème	Concernée
Cuisine n°2	2ème	Concernée
Circulation	2ème	Concernée
Cuisine n°1	3ème	Concernée
Cuisine n°2	3ème	Concernée
Circulation	3ème	Concernée
Cuisine n°1	4ème	Concernée
Cuisine n°2	4ème	Concernée
Circulation	4ème	Concernée
Chambre	2ème Lot 230	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 230	Concernée
Chambre	2ème Lot 214	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 214	Concernée
Chambre	3ème lot 303	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 303	Concernée
Chambre	3ème lot 302	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 302	Concernée
Chambre	4ème Lot 428	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 428	Concernée
Chambre	4ème Lot 410	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 410	Concernée
Cage d'escalier n°1	RDC	Concernée
Cage d'escalier n°2	RDC	Concernée

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage	Etage	Travaux
Entrée	RDC - Logement Directrice	Concernée
Circulation	RDC - Logement gardien	Concernée
Cuisine	RDC - Logement Directrice	Concernée
Séjour	RDC - Logement gardien	Concernée
Chambre n°1	RDC - Logement gardien	Concernée
Chambre n°2	RDC - Logement gardien	Concernée
Chambre 3	RDC - Logement Directrice	Concernée
Salle de Bains	RDC - Logement Directrice	Concernée
WC	RDC - Logement Directrice	Concernée
Combles	5ème	Concernée
Façades	Ext	Concernée
Lingerie	RDC	Concernée
Réserves	RDC	Concernée
Circulation (technique)	RDC	Concernée
Atelier	RDC	Concernée
Couverture	Ext	Concernée
Loge	RDC	Concernée
Cage d'escalier n°1	1er	Concernée
Cage d'escalier n°2	1er	Concernée
Cage d'escalier n°1	2ème	Concernée
Cage d'escalier n°2	2ème	Concernée
Cage d'escalier n°1	3ème	Concernée
Cage d'escalier n°2	3ème	Concernée
Cage d'escalier n°1	4ème	Concernée
Cage d'escalier n°2	4ème	Concernée
Foyer Télévision	RDC	Concernée
Bureau n°1	RDC	Concernée
Bureau n°2	RDC	Concernée
Laverie	RDC	Concernée
Vestiaire personnels	RDC	Concernée
Chambre 5 (Atelier)	RDC	Concernée
Garage	RDC	Concernée
Chambre	1er Lot 101	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 101	Concernée
Chambre	1er Lot 102	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 102	Concernée
Chambre	1er Lot 103	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 103	Concernée
Chambre	1er Lot 104	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 104	Concernée
Chambre	1er Lot 105	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 105	Concernée

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage	Etage	Travaux
Chambre	1er Lot 106	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 106	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 107	Concernée
Chambre	1er Lot 109	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 109	Concernée
Chambre	1er Lot 107	Concernée
Chambre	1er Lot 110	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 110	Concernée
Chambre	1er Lot 111	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 111	Concernée
Chambre	1er Lot 112	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 112	Concernée
Chambre	1er Lot 113	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 113	Concernée
Chambre	1er Lot 114	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 114	Concernée
Chambre	1er Lot 115	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 115	Concernée
Chambre	1er Lot 116	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 116	Concernée
Chambre	1er Lot 117	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 117	Concernée
Chambre	1er Lot 118	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 118	Concernée
Chambre	1er Lot 119	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 119	Concernée
Chambre	1er Lot 120	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 129	Concernée
Chambre	1er Lot 121	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 121	Concernée
Chambre	1er Lot 122	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 122	Concernée
Chambre	1er Lot 123	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 123	Concernée
Chambre	1er Lot 125	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 125	Concernée
Chambre	1er Lot 126	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 126	Concernée
Chambre	1er Lot 127	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 127	Concernée
Chambre	1er Lot 128	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 128	Concernée
Chambre	1er Lot 129	Concernée
Cabine de 9ouche	1er Lot 120	Concernée
Cabine de douche	1er Lot 130	Concernée
Chambre	1er Lot 130	Concernée
Chambre	2ème Lot 201	Concernée

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage	Etage	Travaux
Cabine de douche	2ème Lot 201	Concernée
Chambre	2ème Lot 202	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 202	Concernée
Chambre	2ème Lot 203	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 203	Concernée
Chambre	2ème Lot 204	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 204	Concernée
Chambre	2ème Lot 205	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 205	Concernée
Chambre	2ème Lot 206	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 206	Concernée
Chambre	2ème Lot 207	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 207	Concernée
Chambre	2ème Lot 208	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 208	Concernée
Chambre	2ème Lot 209	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 209	Concernée
Chambre	2ème Lot 210	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 210	Concernée
Chambre	2ème Lot 211	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 211	Concernée
Chambre	2ème Lot 215	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 215	Concernée
Chambre	2ème Lot 216	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 216	Concernée
Chambre	2ème Lot 217	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 217	Concernée
Chambre	2ème Lot 218	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 218	Concernée
Chambre	2ème Lingerie	Concernée
Cabine de douche	2ème Lingerie	Concernée
Chambre	2ème Lot 220	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 220	Concernée
Chambre	2ème Lot 221	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 221	Concernée
Chambre	2ème Lot 222	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 222	Concernée
Chambre	2ème Lot 223	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 223	Concernée
Chambre	2ème Lot 224	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 224	Concernée
Chambre	2ème Lot 225	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 225	Concernée
Chambre	2ème Lot 227	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 227	Concernée
Chambre	2ème Lot 226	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 226	Concernée

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage	Etage	Travaux
Chambre	2ème Lot 228	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 228	Concernée
Chambre	2ème Lot 229	Concernée
Cabine de douche	2ème Lot 229	Concernée
Chambre	3ème lot 301	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 301	Concernée
Chambre	3ème lot 304	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 304	Concernée
Chambre	3ème lot 305	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 305	Concernée
Chambre	3ème lot 306	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 306	Concernée
Chambre	3ème lot 307	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 307	Concernée
Chambre	3ème lot 308	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 308	Concernée
Chambre	3ème lot 309	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 309	Concernée
Chambre	3ème lot 310	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 310	Concernée
Chambre	3ème lot 311	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 311	Concernée
Chambre	3ème lot 312	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 312	Concernée
Chambre	3ème lot 313	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 313	Concernée
Chambre	3ème lot 314	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 314	Concernée
Chambre	3ème lot 315	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 315	Concernée
Chambre	3ème lot 316	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 316	Concernée
Chambre	3ème lot 317	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 317	Concernée
Chambre	3ème lot 318	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 318	Concernée
Chambre	3ème lot 319	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 319	Concernée
Chambre	3ème lot 320	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 320	Concernée
Chambre	3ème lot 321	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 321	Concernée
Chambre	3ème lot 322	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 322	Concernée
Chambre	3ème lot 323	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 323	Concernée
Chambre	3ème lot 324	Concernée

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage	Etage	Travaux
Cabine de douche	3ème lot 324	Concernée
Chambre	3ème lot 325	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 325	Concernée
Chambre	3ème lot 326	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 326	Concernée
Chambre	3ème lot 327	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 327	Concernée
Chambre	3ème lot 328	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 328	Concernée
Chambre	3ème lot 329	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 329	Concernée
Chambre	3ème lot 330	Concernée
Cabine de douche	3ème lot 330	Concernée
Chambre	4ème Lot 401	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 401	Concernée
Chambre	4ème Lot 402	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 402	Concernée
Chambre	4ème Lot 403	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 403	Concernée
Chambre	4ème Lot 404	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 404	Concernée
Chambre	4ème Lot 405	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 405	Concernée
Chambre	3ème	Concernée
Cabine de douche	3ème	Concernée
Chambre	4ème Lot 406	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 406	Concernée
Chambre	4ème Lot 407	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 407	Concernée
Chambre	4ème Lot 408	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 408	Concernée
Chambre	4ème Lot 409	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 409	Concernée
Chambre	4ème Lot 411	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 411	Concernée
Chambre	4ème Lot 412	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 412	Concernée
Chambre	4ème Lot 413	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 413	Concernée
Chambre	4ème Lot 414	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 414	Concernée
Chambre	4ème Lot 415	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 415	Concernée
Chambre	4ème Lot 416	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 416	Concernée
Chambre	4ème Lot 417	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 417	Concernée

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage	Etage	Travaux
Chambre	4ème Lot 418	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 418	Concernée
Chambre	4ème Lot 419	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 419	Concernée
Chambre	4ème Lot 420	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 420	Concernée
Chambre	4ème Lot 421	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 421	Concernée
Chambre	4ème Lot 422	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 422	Concernée
Chambre	4ème Lot 423	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 423	Concernée
Chambre	4ème Lot 424	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 424	Concernée
Chambre	4ème Lot 425	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 425	Concernée
Chambre	4ème Lot 426	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 426	Concernée
Chambre	4ème Lot 427	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 427	Concernée
Chambre	4ème Lot 429	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 429	Concernée
Chambre	4ème Lot 430	Concernée
Cabine de douche	4ème Lot 430	Concernée

3.4. PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire(s)
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
	Plaques planes en fibre-ciment	P	
	Plaques ondulées (Plaque sous tuiles PST) en fibres-ciment	P	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux ("shingles")	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
	Conduits de fumées	P	
	Conduits de cheminée	P	
	Conduits de ventilation	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Chéneaux	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Rives	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Closoirs	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Faitages	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Mïtres	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Costières	P	
	Eléments complémentaires de toiture : Autre	P	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	
	Isolants fibreux en sous toiture	P	
	Flocages, enduits projetés	M	
	Isolans fibreux en sous-toiture	P	
	Pare-vapeur	P	
	Pare pluie	P	
	Enduits projetés	M	
	Flocages	M	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
	Colles, produits d'accrochage	M	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés,...)	P	
	Parties planes ou relevés : compexes asphaltés	M	
	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés,...)	M	
	Parties planes : écrans de semi indépendance	M	
	Parties planes : pare-vapeur	M	
	Colles	M	
	Produits d'accrochage	M	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux…)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	M	
	Mastics vitriers	M	
	Mastics bitumineux	M	
	Mastics autre	M	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
	Plaques	P	
	Panneaux	P	
	Bacs en fibres-ciment	P	
	Eléments de remplissage	P	
	Joints d'assemblage	P	
	Joints d'étanchéité	P	
	Mastics	P	
	Tresses	P	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
	Carton-amiante	M	
	Flocages	M	
	Enduits projetés	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faience, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940)	M	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
	Enduits extérieurs - projetés	M	
	Enduits extérieurs - lissés	M	
	Enduits extérieurs - talochés	M	
	Crépis extérieurs	M	
	Colles de faïence	M	
	Joints de faïence	M	
	Colles pâte de verre	M	
	Joints pâte de verre	M	
	Colles de carrelage	M	
	Joints de carrelage	M	
	Ragréages	M	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Primaires d'accrochage	M	
	Imperméabilisants	M	
	briques blanches silico-calcaire	M	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Peintures décoratives	M	
	Plaques de fibres-ciment - Allèges	P	
	Plaques de fibres-ciment - Tableaux	P	
	Plaques de fibres-ciment - Embrasures	P	
	Plques de fibres-ciment - Impostes	P	
	Plaques de fibres-ciment - Autre	P	
	Plaques - fibres-ciment - Coffres	P	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P	
	Conduits de fumées	P	
	Conduits de cheminée	P	
	Conduits de vetilation	P	
	Conduits d'aération	P	
	Conduits d'eau pluvial (EP)	P	
	Conduits d'eaux usées (EU)	P	
	Conduit d'eaux vannes (EV)	P	
	Eléments ponctuels - chéneaux	P	
	Eléments ponctuels - rives	P	
	Eléments ponctuels - corniches	P	
	Eléments ponctuels - cache moineaux	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)	P	
	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de plâtre	M	
	Enduits à base de ciment projetés	M	
	Enduits à base de ciment lissés	M	
	Enduits à base de ciment talochés	M	
	Enduits de ragréage	M	
	Enduits de débullage	M	
	Enduits de lissage	M	
	Joints de dilatation	M	
	Joints d'assemblage	M	
	Joints coupe-feu	M	
	Fourreaux - carton	P	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Fourreaux fibres-ciment	P	
	Fourreaux PVC	P	
	Fourreaux métalliques	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibresciment, matériaux sandwich…), coffrages perdus	P	
	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de ciment lissés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Enduits à base de ciment talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation	M	
	Joints d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau carton-amiante	P	
	Entourages de poteau fibres-ciment	P	
	Entourages de poteau matériaux sandwich	P	
	Entourages de poteau autre	P	
	Entourages de poteau coffrages perdus	P	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous-couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Panneaux de cloisons lisses	P	
	Panneaux de cloisons moulurées	P	
	Panneaux de cloisons préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de ciment projetés	M	
	Enduits à base de ciment lissés	M	
	Enduits à base de ciment talochés	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse	P	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : carton	P	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : fibres-ciment	P	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse	P	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : carton	P	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : fibres-ciment	P	
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, …)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P	
	Flocages	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement des plaques de plaque cartonné	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de ciment lissés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Enduits à base de ciment talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Panneaux fibres-ciment	M	
	Panneaux bois agglomérés	M	
	Panneaux autre	M	
	Jonctions entre panneaux tresses	P	
	Jonctions entre panneaux étanchéité entre panneaux	P	
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P	
	Isolants intérieurs des portes	P	
	Isolants intérieurs des portes	P	
	Joints des portes coupe-feu (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P	
	Joints des portes phoniques (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P	
	Joints des portes pare-flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P	
	Panneaux	P	
	Plaques en fibres-ciment des vantaux	P	
	Bakelite	P	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Sous-couches des tissus muraux	P	
	Sous-couches des moquettes murales	P	
	Sous-couches des les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibres-ciment (lambris)	P	
	Revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles de carrelage	M	
	Colles de faïence	M	
	Ragréage	M	
	Primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives : paillettes	M	
	Peintures décoratives : goutelettes	M	
	Peintures décoratives : autre	M	
	Joints de carrelage	M	
	Joints de faïence	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Flocages	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)	M	
	Résines	M	
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M	
	Flocages	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous-couche des tissus muraux	P	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Résines	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de ciment projetés	M	
	Enduits à base de ciment lissés	M	
	Enduits à base de ciment talochés	M	
	Coffrages perdus carton-amiante	P	
	Coffrages perdus fibres-ciment	P	
	Coffrages perdus composite	P	
	Peintures décoratives pailletées	M	
	Peintures décoratives goutelettes	M	
	Peintures décoratives autre	M	
	Colles de carrelage	M	
	Ragréages	M	
	Primaires d'accrochage	M	
	Joints de carrelage	M	
Poutres et charpentes	Flocages	M	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibresciment, matériaux sandwich)	P	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)	M	
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	
	Flocages	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de ciment projetés	M	
	Enduits à base de ciment lissés	M	
	Enduits à base de ciment talochés	M	
	Entourages de poutres carton-amiante	P	
	Entourages de poutres fibres-ciment	P	
	Entourages de poutres matériaux sandwich	P	
	Peintures décoratives pailletées	M	
	Peintures décoratives goutelettes	M	
	Peintures décoratives autre	M	
	Jonctions avec la façade	M	
	Calfeutrements	M	
	Joints coupe-feu	M	
	Joints de dilatation	M	
	Joints de structure	M	
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, …)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M	
	Flocages	M	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de ciment projetés	M	
	Enduits à base de ciment lissés	M	
	Enduits à base de ciment talochés	M	
	Panneaux fibres-ciment	P	
	Panneaux bois aggloméré	P	
	Panneaux bois	P	
	Panneaux bois autre	P	
	Panneaux PVC	P	
	Panneaux autres	P	
	Jonctions entre panneaux tresses	M	
	Jonctions entre panneaux étanchéité entre panneaux	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P	
	Pare vapeur	P	
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P	
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	
	Panneaux et plaques	P	
	Pare vapeur	P	
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P	
	Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	
	Jonctions entre faux plafond et structure	P	
	joints entre panneaux	P	
Suspentes et contrevents	Flocages	M	
	Protections en plâtre	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Flocages	M	
	Protections en plâtre	M	
	Peintures intumescentes	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P	
	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	M	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Moquette	M	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	
	Joints de dilatation et d'assemblage	P	
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	
	Enduit de cuvelage	M	
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M	
	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Moquette	M	
	Peintures de sol	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	
	Joints de dilatation et d'assemblage	P	
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	
	Enduit de cuvelage	M	
	Colles de carrelage	M	
	Joints de carrelage	M	
	Sous-couches des revêtements souples - Carton	M	
	Sous-couches des revêtements souples - Feutre	M	
	Sous-couches des revêtements souples - Autre	M	
	Sols coulés à base ciment - Terrazolith	M	
	Sols coulés à base ciment - Autre	M	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

	Ragréages	M	
	Primaires d'accrochage	M	
	Rebouchages autour de conduits (principalement immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public), fourreaux en carton	M	
	Rebouchages autour de conduits (principalement immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public), fibres-ciment	M	
8 - Équipements divers et accessoires			
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages	M	
	Bourres	M	
	Tresses	M	
	Calorifugeages	M	
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M	
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P	
	Flocages	M	
	Bourres	M	
	Tresses	M	
	Calorifugeages	M	
	Joints d'étanchéité	M	
	Joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Dispositifs anti condensation- peintures	M	
	Dispositifs anti condensation - films	M	
	Dispositifs anti condensation - Autre	M	
	Tissus	P	
	Soufflets amortisseurs acoustiques	P	
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P	
	Tresses des diffuseurs	M	
	Isolants thermiques cartonnés	P	
	Tresses des diffuseurs	M	
Fusibles à broche	Carton, tresse	P	
	Tresse	P	
	Carton	P	
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P	
	Isolants	P	
Coffres-forts	Portes et parois	P	
	Portes	P	
	Parois	P	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P	
	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P	
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P	
	Eléments en fibres-ciment	P	

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

4.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE

Dans le cadre d'une mission de repérage amiante avant travaux, **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER** les plans du bâtiment à jour ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche et le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante (ancien rapport de repérage, DTA, DIUO, DOE, etc…)

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit définir précisément la nature des travaux projeté ainsi que le périmètre de l'opération.
Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre n'est pas en mesure d'imposer :

- La méthodologie de repérage, celle-ci étant définie par l'arrêté du 16 juillet 2019 et la norme NF X 46-020 d'août 2017 satisfait également aux exigences de l'arrêté,
- Le nombre de prélèvement à analyser,

Le nombre d'investigations approfondies, le nombre de sondages, ainsi que le nombre de prélèvements et analyses à effectuer ne peut être déterminé avant l'achèvement du repérage.

Le maitre d'ouvrage / donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à **QUALICONSULT IMMOBILIER** tous les moyens d'accès pour le bon déroulement du repérage et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de toutes les autorisations et instrument d'accès nécessaires.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre informe les occupants et exploitant, de l'intervention qui doit être réalisé dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. **Le maitre d'ouvrage / donneur d'ordre** ou son représentant prend, à la demande l'opérateur de repérage, les dispositions ^pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre est tenu :

- De vérifier la cohérence entre le programme de travaux et le programme de repérage et son périmètre proposés.
- De fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisations,
- De procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage,
- D'informer l'opérateur de repérage de toute modification du programme de travaux

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

4.2. PHASE DE REPERAGE

La phase de repérage comporte deux étapes :
- **1er Etape** : l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble bâti, pour cela il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
- **2ème Etape** : l'opérateur de repérage :
  - Recherche et identifie les matériaux ou produit inscrit dans le programme de repérage
  - Repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante
  - Conclut sur la présence ou l'absence d'amiante

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leur caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

/!\ Avertissement :
Le repérage est réalisé conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019 et à la norme NF X46-020 d'août 2017, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (exemple des enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.
Les sondages et investigation approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020, il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages …) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore occupé et meublé, ces revêtements étant encore en place

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

4.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du matériau ou produit inscrit dans le programme de repérage, sera placé dans un contenant étanche doublé sir lequel seront reportées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel est soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront besoins l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le **COFRAC** au titre du LAB GTA 44 et de la norme NF X43-050.
Les méthodes d'analyse appliquée est conforme au conforme au programme d'accréditation des laboratoires LAB GTA 44 « Recherche d'amiante dans les échantillons massifs » du **COFRAC**.
En fonction de la nature du matériau ou produit à analyser, les techniques d'analyse appliquées sont les suivantes :
- La microscopie optique à lumière polarisée (**MOLP**)
- La microscopie électronique à transmission analytique (**META**)

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ».

5. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	⚠ Justification
RDC	Hall	OUI	
RDC	Cafétéria	OUI	
RDC	WC	OUI	
RDC - Logement Directrice	Circulation	OUI	
RDC - Logement Directrice	Séjour	OUI	
RDC - Logement Directrice	Chambre 1	OUI	
RDC - Logement Directrice	Chambre 2	OUI	
RDC - Logement gardien	Cellier	OUI	
RDC - Logement gardien	Salle de Bains	OUI	
RDC - Logement gardien	Cuisine	OUI	
RDC - Logement gardien	WC	OUI	
1er SS	Sous sol Garage vélo	OUI	
1er	Cuisine n°1	OUI	
1er	Cuisine n°2	OUI	
1er	Circulation n°1	OUI	
1er Lot 108	Chambre	OUI	
1er Lot 108	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 124	Chambre	OUI	
1er Lot 124	Cabine de douche	OUI	
2ème	Cuisine n°1	OUI	
2ème	Cuisine n°2	OUI	
2ème	Circulation	OUI	
3ème	Cuisine n°1	OUI	
3ème	Cuisine n°2	OUI	
3ème	Circulation	OUI	
4ème	Cuisine n°1	OUI	
4ème	Cuisine n°2	OUI	
4ème	Circulation	OUI	
2ème Lot 230	Chambre	OUI	
2ème Lot 230	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 214	Chambre	OUI	
2ème Lot 214	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 303	Chambre	OUI	
3ème lot 303	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 302	Chambre	OUI	
3ème lot 302	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 428	Chambre	OUI	
4ème Lot 428	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 410	Chambre	OUI	
4ème Lot 410	Cabine de douche	OUI	
RDC	Cage d'escalier n°1	OUI	
RDC	Cage d'escalier n°2	OUI	
RDC - Logement Directrice	Entrée	OUI	
RDC - Logement gardien	Circulation	OUI	
RDC - Logement Directrice	Cuisine	OUI	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

RDC - Logement gardien	Séjour	OUI	
RDC - Logement gardien	Chambre n°1	OUI	
RDC - Logement gardien	Chambre n°2	OUI	
RDC - Logement Directrice	Chambre 3	OUI	
RDC - Logement Directrice	Salle de Bains	OUI	
RDC - Logement Directrice	WC	OUI	
5ème	Combles	OUI	
Ext	Façades	OUI	
RDC	Lingerie	OUI	
RDC	Réserves	OUI	
RDC	Circulation (technique)	OUI	
RDC	Atelier	OUI	
Ext	Couverture	OUI	
RDC	Loge	OUI	
1er	Cage d'escalier n°1	OUI	
1er	Cage d'escalier n°2	OUI	
2ème	Cage d'escalier n°1	OUI	
2ème	Cage d'escalier n°2	OUI	
3ème	Cage d'escalier n°1	OUI	
3ème	Cage d'escalier n°2	OUI	
4ème	Cage d'escalier n°1	OUI	
4ème	Cage d'escalier n°2	OUI	
RDC	Foyer Télévision	OUI	
RDC	Bureau n°1	OUI	
RDC	Bureau n°2	OUI	
RDC	Laverie	OUI	
RDC	Vestiaire personnels	OUI	
RDC	Chambre 5 (Atelier)	OUI	
RDC	Garage	OUI	
1er Lot 101	Chambre	OUI	
1er Lot 101	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 102	Chambre	OUI	
1er Lot 102	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 103	Chambre	OUI	
1er Lot 103	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 104	Chambre	OUI	
1er Lot 104	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 105	Chambre	OUI	
1er Lot 105	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 106	Chambre	OUI	
1er Lot 106	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 107	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 109	Chambre	OUI	
1er Lot 109	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 107	Chambre	OUI	
1er Lot 110	Chambre	OUI	
1er Lot 110	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 111	Chambre	OUI	
1er Lot 111	Cabine de douche	OUI	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

1er Lot 112	Chambre	OUI	
1er Lot 112	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 113	Chambre	OUI	
1er Lot 113	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 114	Chambre	OUI	
1er Lot 114	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 115	Chambre	OUI	
1er Lot 115	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 116	Chambre	OUI	
1er Lot 116	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 117	Chambre	OUI	
1er Lot 117	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 118	Chambre	OUI	
1er Lot 118	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 119	Chambre	OUI	
1er Lot 119	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 120	Chambre	OUI	
1er Lot 129	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 121	Chambre	OUI	
1er Lot 121	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 122	Chambre	OUI	
1er Lot 122	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 123	Chambre	OUI	
1er Lot 123	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 125	Chambre	OUI	
1er Lot 125	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 126	Chambre	OUI	
1er Lot 126	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 127	Chambre	OUI	
1er Lot 127	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 128	Chambre	OUI	
1er Lot 128	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 129	Chambre	OUI	
1er Lot 120	Cabine de 9ouche	OUI	
1er Lot 130	Cabine de douche	OUI	
1er Lot 130	Chambre	OUI	
2ème Lot 201	Chambre	OUI	
2ème Lot 201	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 202	Chambre	OUI	
2ème Lot 202	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 203	Chambre	OUI	
2ème Lot 203	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 204	Chambre	OUI	
2ème Lot 204	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 205	Chambre	OUI	
2ème Lot 205	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 206	Chambre	OUI	
2ème Lot 206	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 207	Chambre	OUI	
2ème Lot 207	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 208	Chambre	OUI	
2ème Lot 208	Cabine de douche	OUI	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

2ème Lot 209	Chambre	OUI	
2ème Lot 209	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 210	Chambre	OUI	
2ème Lot 210	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 211	Chambre	OUI	
2ème Lot 211	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 215	Chambre	OUI	
2ème Lot 215	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 216	Chambre	OUI	
2ème Lot 216	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 217	Chambre	OUI	
2ème Lot 217	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 218	Chambre	OUI	
2ème Lot 218	Cabine de douche	OUI	
2ème Lingerie	Chambre	OUI	
2ème Lingerie	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 220	Chambre	OUI	
2ème Lot 220	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 221	Chambre	OUI	
2ème Lot 221	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 222	Chambre	OUI	
2ème Lot 222	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 223	Chambre	OUI	
2ème Lot 223	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 224	Chambre	OUI	
2ème Lot 224	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 225	Chambre	OUI	
2ème Lot 225	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 227	Chambre	OUI	
2ème Lot 227	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 226	Chambre	OUI	
2ème Lot 226	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 228	Chambre	OUI	
2ème Lot 228	Cabine de douche	OUI	
2ème Lot 229	Chambre	OUI	
2ème Lot 229	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 301	Chambre	OUI	
3ème lot 301	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 304	Chambre	OUI	
3ème lot 304	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 305	Chambre	OUI	
3ème lot 305	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 306	Chambre	OUI	
3ème lot 306	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 307	Chambre	OUI	
3ème lot 307	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 308	Chambre	OUI	
3ème lot 308	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 309	Chambre	OUI	
3ème lot 309	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 310	Chambre	OUI	
3ème lot 310	Cabine de douche	OUI	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

3ème lot 311	Chambre	OUI	
3ème lot 311	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 312	Chambre	OUI	
3ème lot 312	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 313	Chambre	OUI	
3ème lot 313	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 314	Chambre	OUI	
3ème lot 314	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 315	Chambre	OUI	
3ème lot 315	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 316	Chambre	OUI	
3ème lot 316	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 317	Chambre	OUI	
3ème lot 317	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 318	Chambre	OUI	
3ème lot 318	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 319	Chambre	OUI	
3ème lot 319	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 320	Chambre	OUI	
3ème lot 320	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 321	Chambre	OUI	
3ème lot 321	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 322	Chambre	OUI	
3ème lot 322	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 323	Chambre	OUI	
3ème lot 323	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 324	Chambre	OUI	
3ème lot 324	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 325	Chambre	OUI	
3ème lot 325	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 326	Chambre	OUI	
3ème lot 326	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 327	Chambre	OUI	
3ème lot 327	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 328	Chambre	OUI	
3ème lot 328	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 329	Chambre	OUI	
3ème lot 329	Cabine de douche	OUI	
3ème lot 330	Chambre	OUI	
3ème lot 330	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 401	Chambre	OUI	
4ème Lot 401	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 402	Chambre	OUI	
4ème Lot 402	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 403	Chambre	OUI	
4ème Lot 403	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 404	Chambre	OUI	
4ème Lot 404	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 405	Chambre	OUI	
4ème Lot 405	Cabine de douche	OUI	
3ème	Chambre	OUI	
3ème	Cabine de douche	OUI	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

4ème Lot 406	Chambre	OUI	
4ème Lot 406	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 407	Chambre	OUI	
4ème Lot 407	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 408	Chambre	OUI	
4ème Lot 408	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 409	Chambre	OUI	
4ème Lot 409	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 411	Chambre	OUI	
4ème Lot 411	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 412	Chambre	OUI	
4ème Lot 412	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 413	Chambre	OUI	
4ème Lot 413	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 414	Chambre	OUI	
4ème Lot 414	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 415	Chambre	OUI	
4ème Lot 415	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 416	Chambre	OUI	
4ème Lot 416	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 417	Chambre	OUI	
4ème Lot 417	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 418	Chambre	OUI	
4ème Lot 418	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 419	Chambre	OUI	
4ème Lot 419	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 420	Chambre	OUI	
4ème Lot 420	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 421	Chambre	OUI	
4ème Lot 421	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 422	Chambre	OUI	
4ème Lot 422	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 423	Chambre	OUI	
4ème Lot 423	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 424	Chambre	OUI	
4ème Lot 424	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 425	Chambre	OUI	
4ème Lot 425	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 426	Chambre	OUI	
4ème Lot 426	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 427	Chambre	OUI	
4ème Lot 427	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 429	Chambre	OUI	
4ème Lot 429	Cabine de douche	OUI	
4ème Lot 430	Chambre	OUI	
4ème Lot 430	Cabine de douche	OUI	

6. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

6.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
RDC	Hall	Revêtements de sols	Colle de revêtement de sol Verte + ragréage
		Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés - Plinthes	Peinture + composites
		Poteaux	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Faux plafonds	Isolant noir
		Plafonds	Peinture + plâtre
		Revêtements de sols	Colle de carrelage Blanche (sous moquette)
		Menuiseries Intérieurs	Peinture + bois
		Menuiseries Intérieurs	Joint coupe feu
RDC	Caféteria	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Plafonds	Peinture + plâtre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°1	Colle de revêtements de sol orange + ragréage
RDC	WC	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïences 20x20 blanche
RDC - Logement Directrice	Circulation	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plinthes	Peinture + bois
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Colle de carrelage marron
RDC - Logement Directrice	Séjour	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plinthes	Peinture + bois
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Parquet massif
RDC - Logement Directrice	Chambre 1	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plinthes	Peinture + bois
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
	Chambre 2	Revêtements de sols	Ragréage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
RDC - Logement Directrice		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plinthes	Peinture + bois
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
RDC - Logement gardien	Cellier	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plinthes	Peinture + bois
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement beige clair + ragréage
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche
RDC - Logement gardien	Salle de Bains	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°5	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de carrelage gris/bleu + ragréage
		Plinthes	Colle de plinthes 10x20 grises
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche
RDC - Logement gardien	Cuisine	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Plafonds n°1	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de carrelage 20x20 gris + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + plâtre
		Plinthes	Peinture + bois
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche
		Plinthes	Colle de plinthes 10x20 grises
RDC - Logement gardien	WC	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
1er SS	Sous sol Garage vélo	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit béton
		Plafonds	Flocages
		Revêtements de sols	Beton brut
1er	Cuisine n°1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage
		Revêtements de sols	Ragréage
1er	Cuisine n°2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage
1er	Circulation n°1	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
1er Lot 108	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 108	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 124	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 124	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème	Cuisine n°1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage
		Revêtements de sols	Ragréage
2ème	Cuisine n°2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage
2ème	Circulation	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
3ème	Cuisine n°1	Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage
		Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
3ème	Cuisine n°2	Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
3ème	Circulation	Revêtements de sols	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
4ème	Cuisine n°1	Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage
		Revêtements de sols	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
4ème	Cuisine n°2	Revêtements de sols	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise
		Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
4ème	Circulation	Revêtements de sols	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Faux plafonds	Laine minérale + pare vapeur
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses
2ème Lot 230	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 230	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 214	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 214	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 303	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
3ème lot 303	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 302	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
3ème lot 302	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 428	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 428	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 410	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
4ème Lot 410	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
RDC	Cage d'escalier n°1	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Revêtements de sols n°1 - Marche	Colle de revêtement bleu

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Revêtements de sols n°1 - Contre marche	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés - Escalier	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés - Escalier	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds - Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Plafonds - Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 2x2 grises
		Gardes corps	Peinture
RDC	Cage d'escalier n°2	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Revêtements de sols - Marches	Colle de revêtement bleu
		Revêtements de sols - Contre marches	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de plinthes 10x10 grises
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds - Sous escalier	Peinture + enduit maigre
		Plafonds - Sous escalier	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 2x2 grises
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Gardes corps	Peinture
RDC - Logement Directrice	Entrée	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plinthes	Peinture + bois
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de carrelage marron
RDC - Logement gardien	Circulation	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Plinthes	Peinture + bois
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement de sol beige tacheté + ragréage
		Revêtements de sols	Revêtement fibreux + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
RDC - Logement Directrice	Cuisine	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°2	Colle de carrelage marron
	Séjour	Revêtements de sols n°2	Ragréage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
RDC - Logement gardien		Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plinthes	Peinture + bois
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement de sol beige clair
		Revêtements de sols	Dalle de sol beige + colle noire
		Plafonds n°1	Peinture + enduit maigre
RDC - Logement gardien	Chambre n°1	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plinthes	Peinture + bois
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement beige clair + ragréage
RDC - Logement gardien	Chambre n°2	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plinthes	Peinture + bois
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement beige clair + ragréage
RDC - Logement Directrice	Chambre 3	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plinthes	Peinture + bois
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
RDC - Logement Directrice	Salle de Bains	Revêtements de sols	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Carrelage 30x30 gris
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïences 20x20 blanche
RDC - Logement Directrice	WC	Revêtements de sols n°1	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°2	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Revêtements de sols n°2	Colle de carrelage marron
5ème	Combles	Isolation	Laine minérale + pare vapeur
Ext	Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Peinture + bois (Allèges)
		Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint de vitrage
		Menuiseries extérieures	Joint de vitrage
		Menuiseries extérieures	Joint de vitrage
		Menuiseries extérieures	Joint de vitrage
		Menuiseries extérieures	Plaque fibre ciment
		Menuiseries extérieures - Entre bati et menuiseries	Joint blanc
		Menuiseries extérieures - Entre bati et menuiseries	Joint blanc
		Façades lourdes y compris poteaux	Peinture + béton
		Façades lourdes y compris poteaux	Peinture + béton
		Menuiseries extérieures	Peinture + bois
		Façades lourdes y compris poteaux	Colle de carrelage 2x2 grises
		Isolation extérieurs	ITE
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduit Béton
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduit Béton
		Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint de compression
RDC	Lingerie	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°1	Dalles de sol 30x30 beige + colle noire
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
RDC	Réserves	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°3	Ragréage
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°1	Peinture + enduit béton
RDC	Circulation (technique)	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°1	Colle de carrelage 30x30 grises + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de plinthes 10x20 grises
RDC	Atelier	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°3	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°1	Colle de carrelage 20x20 blanc

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
Ext	Couverture	Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises
RDC	Loge	Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Faux plafonds	Isolant noir
		Menuiseries Intérieurs	Peinture + bois
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols n°1	Colle de revêtements de sol orange + ragréage
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
1er	Cage d'escalier n°1	Revêtements de sols - Marche	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés - Escalier	Peinture + plâtre
		Plafonds - Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Gardes corps	Peinture
		Revêtements de sols - Contre marche	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés - Escalier	Peinture + plâtre
		Plafonds - Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 2x2 grises
1er	Cage d'escalier n°2	Revêtements de sols - Marches	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de plinthes 10x10 grises
		Plafonds - Sous escalier	Peinture + enduit maigre
		Gardes corps	Peinture
		Revêtements de sols - Contre marches	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds - Sous escalier	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 2x2 grises
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
2ème	Cage d'escalier n°1	Revêtements de sols - Marche	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés - Escalier	Peinture + plâtre
		Plafonds - Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Gardes corps	Peinture
		Revêtements de sols - Contre marche	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés - Escalier	Peinture + plâtre
		Plafonds - Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 2x2 grises
2ème	Cage d'escalier n°2	Revêtements de sols - Marches	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de plinthes 10x10 grises
		Plafonds - Sous escalier	Peinture + enduit maigre
		Gardes corps	Peinture
		Revêtements de sols - Contre marches	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds - Sous escalier	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 2x2 grises
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
3ème	Cage d'escalier n°1	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Revêtements de sols - Marche	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés - Escalier	Peinture + plâtre
		Plafonds - Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Gardes corps	Peinture
		Revêtements de sols - Contre marche	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés - Escalier	Peinture + plâtre
		Plafonds - Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 2x2 grises
3ème	Cage d'escalier n°2	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Revêtements de sols - Marches	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de plinthes 10x10 grises
		Plafonds - Sous escalier	Peinture + enduit maigre
		Gardes corps	Peinture
		Revêtements de sols - Contre marches	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds - Sous escalier	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 2x2 grises
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
4ème	Cage d'escalier n°1	Revêtements de sols - Marche	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés - Escalier	Peinture + plâtre
		Plafonds - Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Gardes corps	Peinture
		Revêtements de sols - Contre marche	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés - Escalier	Peinture + plâtre
		Plafonds - Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 2x2 grises
4ème	Cage d'escalier n°2	Revêtements de sols - Marches	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de plinthes 10x10 grises
		Plafonds - Sous escalier	Peinture + enduit maigre
		Gardes corps	Peinture
		Revêtements de sols - Contre marches	Colle de revêtement bleu
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Plafonds - Sous escalier	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 2x2 grises
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
RDC	Foyer Télévision	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Menuiseries Intérieurs	Peinture + bois
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + plâtre
		Revêtements de sols	Colle de revêtements de sol orange + ragréage
		Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
RDC	Bureau n°1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Menuiseries Intérieurs	Peinture + bois
		Plafonds n°3	Peinture + plâtre
		Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°5	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
RDC	Bureau n°2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Menuiseries Intérieurs	Peinture + bois
		Murs et cloisons maçonnés n°5	Peinture + enduit maigre
		Plafonds n°3	Peinture + plâtre
		Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Peinture + plâtre
		Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
RDC	Laverie	Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de plinthes 10x20 grises
		Revêtements de sols n°1	Colle de carrelage 30x30 grises + ragréage
		Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
RDC	Vestiaire personnels	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°3	Colle de plinthes 10x20 grises
		Murs et cloisons maçonnés n°2	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de carrelage 30x30 grises + ragréage
		Revêtements de sols n°2	Ragréage
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés n°4	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
RDC	Chambre 5 (Atelier)	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
RDC	Garage	Façades lourdes y compris poteaux n°1	Peinture + béton
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Poteaux	Peinture + enduit maigre
		Façades lourdes y compris poteaux n°2	Béton brut
1er Lot 101	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 101	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 102	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 102	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 103	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 103	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 104	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 104	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 105	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 105	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 106	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 106	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 107	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 109	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 109	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 107	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 110	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 110	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 111	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 111	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 112	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
1er Lot 112	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 113	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 113	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 114	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 114	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 115	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 115	Cabine de douche	Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
1er Lot 116	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 116	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 117	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 117	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 118	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 118	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
1er Lot 119	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 119	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 120	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 129	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 121	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 121	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 122	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 122	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 123	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 123	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 125	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 125	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 126	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 126	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 127	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 127	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 128	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 128	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 129	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
1er Lot 120	Cabine de 9ouche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 130	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
1er Lot 130	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 201	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 201	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 202	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 202	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 203	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 203	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 204	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 204	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 205	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 205	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 206	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 206	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 207	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 207	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 208	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 208	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 209	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 209	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 210	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
2ème Lot 210	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 211	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 211	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 215	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 215	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 216	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 216	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 217	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 217	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 218	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 218	Cabine de douche	Murs	Thermoformé

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lingerie	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lingerie	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 220	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 220	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 221	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 221	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 222	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 222	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 223	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 223	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 224	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 224	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 225	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 225	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 227	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 227	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 226	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 226	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 228	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 228	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
2ème Lot 229	Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
2ème Lot 229	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 301	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 301	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 304	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 304	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 305	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 305	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 306	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 306	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 307	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 307	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 308	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 308	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 309	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 309	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 310	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 310	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 311	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 311	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Sol	Thermoformé
3ème lot 312	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 312	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 313	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 313	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 314	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 314	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 315	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 315	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 316	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 316	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
3ème lot 317	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 317	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 318	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 318	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 319	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 319	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 320	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 320	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 321	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 321	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 322	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 322	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 323	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 323	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 324	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 324	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 325	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 325	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 326	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 326	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 327	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 327	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 328	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 328	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 329	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 329	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème lot 330	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
		Plafonds	Peinture + enduit maigre
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
3ème lot 330	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 401	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 401	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 402	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 402	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 403	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 403	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 404	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 404	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 405	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 405	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
3ème	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
3ème	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
4ème Lot 406	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 406	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 407	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 407	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 408	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 408	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 409	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 409	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 411	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 411	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 412	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 412	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 413	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 413	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 414	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 414	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 415	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 415	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 416	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 416	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 417	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 417	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 418	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 418	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 419	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 419	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 420	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 420	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 421	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
4ème Lot 421	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 422	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 422	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 423	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 423	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 424	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 424	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 425	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 425	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 426	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 426	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 427	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 427	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 429	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 429	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
4ème Lot 430	Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre
		Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande
		Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre
4ème Lot 430	Cabine de douche	Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé
		Murs	Thermoformé
		Plafond	Thermoformé
		Sol	Thermoformé

6.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Revêtements de sols Colle de revêtement de sol beige clair

Etage	Local / partie d'immeuble	Critère ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	**Séjour**	**Résultat d'analyse (P025)**

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Dalle de sol beige + colle noire		
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Critère ayant permis de conclure**
RDC - Logement gardien	Séjour	Résultat d'analyse (P026)

Revêtements de sols Dalles de sol 30x30 beige + colle noire		
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Critère ayant permis de conclure**
RDC	Lingerie	Résultat d'analyse (P161)

Menuiseries extérieures Plaque fibre ciment		
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Critère ayant permis de conclure**
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P183)

6.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Revêtements de sols Colle de revêtement de sol Verte + ragréage		
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Critères(s) ayant permis de conclure**
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P001)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P002)
RDC	Caféteria	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	WC	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Circulation	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Séjour	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 1	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 2	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cellier	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cuisine	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement gardien	WC	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Entrée	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Circulation	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Cuisine	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Séjour	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°1	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°2	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 3	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	WC	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Lingerie	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Réserves	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Circulation (technique)	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Atelier	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Loge	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Foyer Télévision	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Bureau n°1	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Bureau n°2	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Laverie	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Vestiaire personnels	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Plinthes Peinture + composites

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P003)

Poteaux Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P004)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P005)
RDC	Réserves	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
RDC	Atelier	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
RDC	Foyer Télévision	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
RDC	Bureau n°1	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
RDC	Bureau n°2	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
RDC	Laverie	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
RDC	Vestiaire personnels	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
RDC	Chambre 5 (Atelier)	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P006)
RDC	Réserves	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
RDC	Atelier	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
RDC	Foyer Télévision	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
RDC	Bureau n°1	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
RDC	Bureau n°2	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
RDC	Laverie	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
RDC	Vestiaire personnels	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P007)
RDC	Circulation (technique)	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
RDC	Atelier	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
RDC	Loge	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
RDC	Foyer Télévision	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
RDC	Bureau n°1	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
RDC	Vestiaire personnels	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
RDC	Chambre 5 (Atelier)	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
RDC	Garage	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P008)
RDC	Circulation (technique)	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
RDC	Atelier	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
RDC	Loge	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
RDC	Foyer Télévision	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
		Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
RDC	Bureau n°2	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
RDC	Vestiaire personnels	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
RDC	Chambre 5 (Atelier)	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
RDC	Garage	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)

Faux plafonds Isolant noir

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P009)
RDC	Loge	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)

Plafonds Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P010)
RDC	Foyer Télévision	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
RDC	Bureau n°1	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
RDC	Bureau n°2	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)

Plafonds Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Caféteria	Résultat d'analyse (P011)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	WC	Résultat d'analyse (P012)
RDC	Bureau n°1	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)
RDC	Bureau n°2	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)

Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Peinture + bois (Allèges)

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P013)

Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Joint de vitrage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P014)

Revêtements de sols Colle de carrelage Blanche (sous moquette)

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P015)

Poteaux Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Caféteria	Résultat d'analyse (P016)
RDC	Lingerie	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
RDC	Réserves	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
RDC	Atelier	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
RDC	Loge	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
RDC	Foyer Télévision	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
RDC	Bureau n°1	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
RDC	Bureau n°2	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
RDC	Laverie	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
RDC	Vestiaire personnels	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
RDC	Chambre 5 (Atelier)	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
RDC	Garage	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Poteaux Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Caféteria	Résultat d'analyse (P017)
RDC	Lingerie	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
RDC	Réserves	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
RDC	Atelier	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
RDC	Loge	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
RDC	Foyer Télévision	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
RDC	Bureau n°1	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
RDC	Bureau n°2	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
RDC	Laverie	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
RDC	Vestiaire personnels	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
RDC	Chambre 5 (Atelier)	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
RDC	Garage	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)

Revêtements de sols Colle de revêtement bleu

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	WC	Résultat d'analyse (P018)
RDC	Bureau n°1	Résultat d'analyse (P018-ZPSO)
RDC	Bureau n°2	Résultat d'analyse (P018-ZPSO)

Menuiseries Intérieurs Peinture + bois

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P019)
RDC	Loge	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)
RDC	Foyer Télévision	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)
RDC	Bureau n°1	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)
RDC	Bureau n°2	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)

Menuiseries Intérieurs Joint coupe feu

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Hall	Résultat d'analyse (P020)

Revêtements de sols Colle de revêtements de sol orange + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Caféteria	Résultat d'analyse (P021)
RDC	Loge	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)
RDC	Foyer Télévision	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïences 20x20 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	WC	Résultat d'analyse (P022)

Revêtements de sols Colle de revêtement de sol beige tacheté + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	Circulation	Résultat d'analyse (P023)

Revêtements de sols Revêtement fibreux + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	Circulation	Résultat d'analyse (P024)

Revêtements de sols Colle de revêtement beige clair + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	Chambre n°1	Résultat d'analyse (P027)

Revêtements de sols Colle de revêtement beige clair + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	Chambre n°2	Résultat d'analyse (P028)

Revêtements de sols Colle de revêtement beige clair + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	Cellier	Résultat d'analyse (P029)

Revêtements de sols Colle de carrelage 20x20 gris + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	Cuisine	Résultat d'analyse (P030)

Revêtements de sols Colle de carrelage gris/bleu + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P031)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement Directrice	Circulation	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Séjour	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 1	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 2	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cellier	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cuisine	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement gardien	WC	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Entrée	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Circulation	Résultat d'analyse (P032)
RDC - Logement Directrice	Cuisine	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Séjour	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°1	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°2	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 3	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	WC	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement Directrice	Circulation	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Séjour	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 1	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 2	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cellier	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cuisine	Résultat d'analyse (P033)
RDC - Logement gardien	WC	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Entrée	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Circulation	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Cuisine	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Séjour	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°1	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°2	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 3	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	WC	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC	Bureau n°1	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)
RDC	Bureau n°2	Résultat d'analyse (P033-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement Directrice	Circulation	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Séjour	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 1	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 2	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cellier	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cuisine	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement gardien	WC	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Entrée	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Circulation	Résultat d'analyse (P034)
RDC - Logement Directrice	Cuisine	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Séjour	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°1	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°2	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 3	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	WC	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement Directrice	Circulation	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Séjour	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 1	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 2	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cellier	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cuisine	Résultat d'analyse (P035)
RDC - Logement gardien	WC	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Entrée	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Circulation	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Cuisine	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Séjour	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°1	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°2	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 3	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	WC	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC	Bureau n°1	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)
RDC	Bureau n°2	Résultat d'analyse (P035-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Plinthes Peinture + bois

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement Directrice	Circulation	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Séjour	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 1	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 2	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cellier	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cuisine	Résultat d'analyse (P036)
RDC - Logement Directrice	Entrée	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Circulation	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Séjour	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°1	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°2	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 3	Résultat d'analyse (P036-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	Cuisine	Résultat d'analyse (P037)

Plinthes Colle de plinthes 10x20 grises

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P038)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 10x10 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P039)

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanche

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	Cellier	Résultat d'analyse (P040)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement Directrice	Circulation	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Séjour	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 1	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 2	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cellier	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cuisine	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement gardien	WC	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Entrée	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Circulation	Résultat d'analyse (P041)
RDC - Logement Directrice	Cuisine	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Séjour	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°1	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°2	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 3	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	WC	Résultat d'analyse (P041-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement Directrice	Circulation	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Séjour	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 1	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 2	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cellier	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Cuisine	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement gardien	WC	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Entrée	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Circulation	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Cuisine	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Séjour	Résultat d'analyse (P042)
RDC - Logement gardien	Chambre n°1	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement gardien	Chambre n°2	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Chambre 3	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	WC	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)

Plinthes Colle de plinthes 10x20 grises

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement gardien	Cuisine	Résultat d'analyse (P043)

Menuiseries extérieures Joint de vitrage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P059)

Menuiseries extérieures Joint de vitrage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P044)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Colle de revêtement souple + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P045)

Revêtements de sols Ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P046)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P047)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P048)

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P049)

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P050)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 20x20 grise

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P051)

Revêtements de sols Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Circulation	Résultat d'analyse (P052)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Circulation	Résultat d'analyse (P054)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Circulation	Résultat d'analyse (P053)

Faux plafonds Laine minérale + pare vapeur

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Circulation	Résultat d'analyse (P057)

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Circulation	Résultat d'analyse (P058)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème Lot 428	Chambre	Résultat d'analyse (P061)
4ème Lot 416	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 417	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 418	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 419	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 420	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 421	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 422	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 423	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 424	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 425	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 426	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 427	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 429	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)
4ème Lot 430	Chambre	Résultat d'analyse (P061-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Colle de revêtement bleu + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème Lot 428	Chambre	Résultat d'analyse (P060)
4ème Lot 416	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 417	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 418	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 419	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 420	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 421	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 422	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 423	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 424	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 425	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 426	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 427	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 429	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)
4ème Lot 430	Chambre	Résultat d'analyse (P060-ZPSO)

Plafond Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème Lot 428	Chambre	Résultat d'analyse (P062)
4ème Lot 416	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 417	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 418	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 419	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 420	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 421	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 422	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 423	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 424	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 425	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 426	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 427	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 429	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)
4ème Lot 430	Chambre	Résultat d'analyse (P062-ZPSO)

Menuiseries extérieures Joint de vitrage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P063)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème Lot 428	Chambre	Résultat d'analyse (P064)
4ème Lot 416	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 417	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 418	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 419	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 420	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 421	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 422	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 423	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 424	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 425	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 426	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 427	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 429	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)
4ème Lot 430	Chambre	Résultat d'analyse (P064-ZPSO)

Plafonds Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P056)

Plafonds Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P055)

Revêtements de sols Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P065)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P066)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 20x20 grise

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P067)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P068)

Revêtements de sols Colle de revêtement bleu + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème Lot 410	Chambre	Résultat d'analyse (P069)
4ème Lot 401	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 402	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 403	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 404	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 405	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
3ème	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 406	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 407	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 408	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 409	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 411	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 412	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 413	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 414	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)
4ème Lot 415	Chambre	Résultat d'analyse (P069-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème Lot 410	Chambre	Résultat d'analyse (P070)
4ème Lot 401	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 402	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 403	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 404	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 405	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
3ème	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 406	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 407	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 408	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 409	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 411	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 412	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 413	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 414	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)
4ème Lot 415	Chambre	Résultat d'analyse (P070-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème Lot 410	Chambre	Résultat d'analyse (P071)
4ème Lot 401	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 402	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 403	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 404	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 405	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
3ème	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 406	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 407	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 408	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 409	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 411	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 412	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 413	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 414	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
4ème Lot 415	Chambre	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)

Plafonds Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
4ème Lot 410	Chambre	Résultat d'analyse (P072)
4ème Lot 401	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 402	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 403	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 404	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 405	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
3ème	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 406	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 407	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 408	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 409	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 411	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 412	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 413	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 414	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)
4ème Lot 415	Chambre	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)

Revêtements de sols Colle de revêtement souple + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P073)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P074)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P075)

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P076)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P077)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 20x20 grise

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P078)

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P079)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Colle de revêtement bleu + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème lot 302	Chambre	Résultat d'analyse (P080)
3ème lot 301	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)
3ème lot 304	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)
3ème lot 305	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)
3ème lot 306	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)
3ème lot 307	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)
3ème lot 308	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)
3ème lot 309	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)
3ème lot 310	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)
3ème lot 311	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)
3ème lot 312	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)
3ème lot 313	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)
3ème lot 314	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)
3ème lot 315	Chambre	Résultat d'analyse (P080-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème lot 302	Chambre	Résultat d'analyse (P081)
3ème lot 301	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)
3ème lot 304	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)
3ème lot 305	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)
3ème lot 306	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)
3ème lot 307	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)
3ème lot 308	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)
3ème lot 309	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)
3ème lot 310	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)
3ème lot 311	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)
3ème lot 312	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)
3ème lot 313	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)
3ème lot 314	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)
3ème lot 315	Chambre	Résultat d'analyse (P081-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème lot 302	Chambre	Résultat d'analyse (P082)
3ème lot 301	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)
3ème lot 304	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)
3ème lot 305	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)
3ème lot 306	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)
3ème lot 307	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)
3ème lot 308	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)
3ème lot 309	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)
3ème lot 310	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)
3ème lot 311	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)
3ème lot 312	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)
3ème lot 313	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)
3ème lot 314	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)
3ème lot 315	Chambre	Résultat d'analyse (P082-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème lot 302	Chambre	Résultat d'analyse (P083)
3ème lot 301	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)
3ème lot 304	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)
3ème lot 305	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)
3ème lot 306	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)
3ème lot 307	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)
3ème lot 308	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)
3ème lot 309	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)
3ème lot 310	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)
3ème lot 311	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)
3ème lot 312	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)
3ème lot 313	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)
3ème lot 314	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)
3ème lot 315	Chambre	Résultat d'analyse (P083-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Colle de revêtement bleu + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème lot 303	Chambre	Résultat d'analyse (P084)
3ème lot 316	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 317	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 318	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 319	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 320	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 321	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 322	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 323	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 324	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 325	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 326	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 327	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 328	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 329	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)
3ème lot 330	Chambre	Résultat d'analyse (P084-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème lot 303	Chambre	Résultat d'analyse (P085)
3ème lot 316	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 317	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 318	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 319	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 320	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 321	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 322	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 323	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 324	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 325	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 326	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 327	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 328	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 329	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)
3ème lot 330	Chambre	Résultat d'analyse (P085-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème lot 303	Chambre	Résultat d'analyse (P086)
3ème lot 316	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 317	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 318	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 319	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 320	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 321	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 322	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 323	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 324	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 325	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 326	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 327	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 328	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 329	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)
3ème lot 330	Chambre	Résultat d'analyse (P086-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème lot 303	Chambre	Résultat d'analyse (P087)
3ème lot 316	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 317	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 318	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 319	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 320	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 321	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 322	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 323	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 324	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 325	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 326	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 327	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 328	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 329	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)
3ème lot 330	Chambre	Résultat d'analyse (P087-ZPSO)

Revêtements de sols Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Circulation	Résultat d'analyse (P088)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Circulation	Résultat d'analyse (P089)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Circulation	Résultat d'analyse (P090)

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Circulation	Résultat d'analyse (P091)

Revêtements de sols Colle de revêtement souple + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P093)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P094)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 20x20 grise

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P095)

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P096)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
3ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P097)

Revêtements de sols Colle de revêtement souple + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P098)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P099)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P100)

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P101)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P102)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 20x20 grise

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P103)

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P104)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Colle de revêtement bleu + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème Lot 214	Chambre	Résultat d'analyse (P105)
2ème Lot 201	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
2ème Lot 202	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
2ème Lot 203	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
2ème Lot 204	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
2ème Lot 205	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
2ème Lot 206	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
2ème Lot 207	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
2ème Lot 208	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
2ème Lot 209	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
2ème Lot 210	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
2ème Lot 211	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
2ème Lot 215	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)
2ème Lot 216	Chambre	Résultat d'analyse (P105-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème Lot 214	Chambre	Résultat d'analyse (P106)
2ème Lot 201	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
2ème Lot 202	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
2ème Lot 203	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
2ème Lot 204	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
2ème Lot 205	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
2ème Lot 206	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
2ème Lot 207	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
2ème Lot 208	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
2ème Lot 209	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
2ème Lot 210	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
2ème Lot 211	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
2ème Lot 215	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)
2ème Lot 216	Chambre	Résultat d'analyse (P106-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème Lot 214	Chambre	Résultat d'analyse (P107)
2ème Lot 201	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)
2ème Lot 202	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)
2ème Lot 203	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)
2ème Lot 204	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)
2ème Lot 205	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)
2ème Lot 206	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)
2ème Lot 207	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)
2ème Lot 208	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)
2ème Lot 209	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)
2ème Lot 210	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)
2ème Lot 211	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)
2ème Lot 215	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)
2ème Lot 216	Chambre	Résultat d'analyse (P107-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème Lot 214	Chambre	Résultat d'analyse (P108)
2ème Lot 201	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)
2ème Lot 202	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)
2ème Lot 203	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)
2ème Lot 204	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)
2ème Lot 205	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)
2ème Lot 206	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)
2ème Lot 207	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)
2ème Lot 208	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)
2ème Lot 209	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)
2ème Lot 210	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)
2ème Lot 211	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)
2ème Lot 215	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)
2ème Lot 216	Chambre	Résultat d'analyse (P108-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Colle de revêtement bleu + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème Lot 230	Chambre	Résultat d'analyse (P109)
2ème Lot 217	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
2ème Lot 218	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
2ème Lingerie	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
2ème Lot 220	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
2ème Lot 221	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
2ème Lot 222	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
2ème Lot 223	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
2ème Lot 224	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
2ème Lot 225	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
2ème Lot 227	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
2ème Lot 226	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
2ème Lot 228	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)
2ème Lot 229	Chambre	Résultat d'analyse (P109-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème Lot 230	Chambre	Résultat d'analyse (P110)
2ème Lot 217	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)
2ème Lot 218	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)
2ème Lingerie	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)
2ème Lot 220	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)
2ème Lot 221	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)
2ème Lot 222	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)
2ème Lot 223	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)
2ème Lot 224	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)
2ème Lot 225	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)
2ème Lot 227	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)
2ème Lot 226	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)
2ème Lot 228	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)
2ème Lot 229	Chambre	Résultat d'analyse (P110-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème Lot 230	Chambre	Résultat d'analyse (P111)
2ème Lot 217	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
2ème Lot 218	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
2ème Lingerie	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
2ème Lot 220	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
2ème Lot 221	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
2ème Lot 222	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
2ème Lot 223	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
2ème Lot 224	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
2ème Lot 225	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
2ème Lot 227	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
2ème Lot 226	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
2ème Lot 228	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)
2ème Lot 229	Chambre	Résultat d'analyse (P111-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème Lot 230	Chambre	Résultat d'analyse (P112)
2ème Lot 217	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)
2ème Lot 218	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)
2ème Lingerie	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)
2ème Lot 220	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)
2ème Lot 221	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)
2ème Lot 222	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)
2ème Lot 223	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)
2ème Lot 224	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)
2ème Lot 225	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)
2ème Lot 227	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)
2ème Lot 226	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)
2ème Lot 228	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)
2ème Lot 229	Chambre	Résultat d'analyse (P112-ZPSO)

Revêtements de sols Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P113)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P114)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P115)

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P116)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Circulation	Résultat d'analyse (P117)

Revêtements de sols Colle de revêtement souple + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P118)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P119)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 20x20 grise

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P120)

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P121)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P122)

Revêtements de sols Colle de revêtement souple + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P123)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P124)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P125)

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P126)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P127)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 20x20 grise

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P128)

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine n°1	Résultat d'analyse (P129)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Colle de revêtement bleu + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er Lot 108	Chambre	Résultat d'analyse (P130)
1er Lot 101	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 102	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 103	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 104	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 105	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 106	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 109	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 107	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 110	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 111	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 112	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 113	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 114	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)
1er Lot 115	Chambre	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er Lot 108	Chambre	Résultat d'analyse (P131)
1er Lot 101	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 102	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 103	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 104	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 105	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 106	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 109	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 107	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 110	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 111	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 112	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 113	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 114	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)
1er Lot 115	Chambre	Résultat d'analyse (P131-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er Lot 108	Chambre	Résultat d'analyse (P132)
1er Lot 101	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 102	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 103	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 104	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 105	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 106	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 109	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 107	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 110	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 111	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 112	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 113	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 114	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)
1er Lot 115	Chambre	Résultat d'analyse (P132-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er Lot 108	Chambre	Résultat d'analyse (P133)
1er Lot 101	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 102	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 103	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 104	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 105	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 106	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 109	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 107	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 110	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 111	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 112	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 113	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 114	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)
1er Lot 115	Chambre	Résultat d'analyse (P133-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Colle de revêtement bleu + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er Lot 124	Chambre	Résultat d'analyse (P134)
1er Lot 116	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 117	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 118	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 119	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 120	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 121	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 122	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 123	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 125	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 126	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 127	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 128	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 129	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)
1er Lot 130	Chambre	Résultat d'analyse (P134-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er Lot 124	Chambre	Résultat d'analyse (P135)
1er Lot 116	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 117	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 118	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 119	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 120	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 121	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 122	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 123	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 125	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 126	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 127	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 128	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 129	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
1er Lot 130	Chambre	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er Lot 124	Chambre	Résultat d'analyse (P136)
1er Lot 116	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 117	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 118	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 119	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 120	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 121	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 122	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 123	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 125	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 126	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 127	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 128	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 129	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)
1er Lot 130	Chambre	Résultat d'analyse (P136-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er Lot 124	Chambre	Résultat d'analyse (P137)
1er Lot 116	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 117	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 118	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 119	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 120	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 121	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 122	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 123	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 125	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 126	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 127	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 128	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 129	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)
1er Lot 130	Chambre	Résultat d'analyse (P137-ZPSO)

Revêtements de sols Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation n°1	Résultat d'analyse (P138)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation n°1	Résultat d'analyse (P139)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation n°1	Résultat d'analyse (P140)

Faux plafonds Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation n°1	Résultat d'analyse (P141)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Circulation n°1	Résultat d'analyse (P142)

Revêtements de sols Colle de revêtement souple + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P143)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P144)

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 20x20 grise

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P145)

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P146)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine n°2	Résultat d'analyse (P147)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Marche Colle de revêtement bleu

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P148)
1er	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P148-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P148-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P148-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P148-ZPSO)

Revêtements de sols Contre marche Colle de revêtement bleu

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P149)
1er	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P149-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P149-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P149-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P149-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Escalier Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P150)
1er	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P150-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P150-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P150-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P150-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Escalier Peinture + plâtre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P151)
1er	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P151-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P151-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P151-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P151-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P152)
1er	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P152-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P152-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P152-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P152-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P153)
1er	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P153-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P153-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P153-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P153-ZPSO)

Plafonds Volée d'escalier Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P154)
1er	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P154-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P154-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P154-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P154-ZPSO)

Plafonds Volée d'escalier Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P155)
1er	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P155-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P155-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P155-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P155-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P156)
1er	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P156-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P156-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P156-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P156-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P157)
1er	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P157-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 2x2 grises

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P158)
1er	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P158-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P158-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P158-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P158-ZPSO)

Gardes corps Peinture

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P159)
1er	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P159-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P159-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P159-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°1	Résultat d'analyse (P159-ZPSO)

Revêtements de sols Colle de carrelage marron

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC - Logement Directrice	Circulation	Résultat d'analyse (P160-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	Entrée	Résultat d'analyse (P160)
RDC - Logement Directrice	Cuisine	Résultat d'analyse (P160-ZPSO)
RDC - Logement Directrice	WC	Résultat d'analyse (P160-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Lingerie	Résultat d'analyse (P162)
RDC	Réserves	Résultat d'analyse (P162-ZPSO)
RDC	Atelier	Résultat d'analyse (P162-ZPSO)
RDC	Laverie	Résultat d'analyse (P162-ZPSO)
RDC	Vestiaire personnels	Résultat d'analyse (P162-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Lingerie	Résultat d'analyse (P163)
RDC	Réserves	Résultat d'analyse (P163-ZPSO)
RDC	Atelier	Résultat d'analyse (P163-ZPSO)
RDC	Laverie	Résultat d'analyse (P163-ZPSO)
RDC	Vestiaire personnels	Résultat d'analyse (P163-ZPSO)
RDC	Chambre 5 (Atelier)	Résultat d'analyse (P163-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Revêtements de sols Colle de carrelage 30x30 grises + ragréage

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Circulation (technique)	Résultat d'analyse (P164)
RDC	Laverie	Résultat d'analyse (P164-ZPSO)
RDC	Vestiaire personnels	Résultat d'analyse (P164-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Colle de plinthes 10x20 grises

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Circulation (technique)	Résultat d'analyse (P165)
RDC	Laverie	Résultat d'analyse (P165-ZPSO)
RDC	Vestiaire personnels	Résultat d'analyse (P165-ZPSO)

Revêtements de sols Peinture + enduit béton

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Réserves	Résultat d'analyse (P166)

Revêtements de sols Colle de carrelage 20x20 blanc

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Atelier	Résultat d'analyse (P167)

Revêtements de sols Marches Colle de revêtement bleu

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P168)
1er	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P168-ZPSO)

Revêtements de sols Contre marches Colle de revêtement bleu

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P169)
1er	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P169-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P169-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P169-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P169-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Colle de plinthes 10x10 grises

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P170)
1er	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P170-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P170-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P170-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P170-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P171)
1er	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P171-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P171-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P171-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P171-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P172)
1er	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P172-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P172-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P172-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P172-ZPSO)

Plafonds Sous escalier Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P173)
1er	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P173-ZPSO)

Plafonds Sous escalier Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P174)
1er	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P174-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P174-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P174-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P174-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Murs et cloisons maçonnés Colle de faïence 2x2 grises

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P175)
1er	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P175-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P176)
1er	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P176-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P176-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P176-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P176-ZPSO)

Plafonds Peinture + enduit maigre

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P177)
1er	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P177-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P177-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P177-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P177-ZPSO)

Gardes corps Peinture

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P178)
1er	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P178-ZPSO)
2ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P178-ZPSO)
3ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P178-ZPSO)
4ème	Cage d'escalier n°2	Résultat d'analyse (P178-ZPSO)

Murs et cloisons maçonnés Peinture + enduit béton

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er SS	Sous sol Garage vélo	Résultat d'analyse (P179)

Plafonds Flocages

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er SS	Sous sol Garage vélo	Résultat d'analyse (P180)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Isolation Laine minérale + pare vapeur

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
5ème	Combles	Résultat d'analyse (P181)

Ardoises, bardeaux bitumineux Ardoises

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Couverture	Résultat d'analyse (P182)

Menuiseries extérieures Entre bati et menuiseries Joint blanc

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P184)

Menuiseries extérieures Entre bati et menuiseries Joint blanc

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P185)

Façades lourdes y compris poteaux Peinture + béton

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P186)
RDC	Garage	Résultat d'analyse (P186-ZPSO)

Façades lourdes y compris poteaux Peinture + béton

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P187)

Menuiseries extérieures Peinture + bois

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P190)

Façades lourdes y compris poteaux Colle de carrelage 2x2 grises

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P191)

Façades lourdes y compris poteaux Enduit Béton

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P188)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Façades lourdes y compris poteaux Enduit Béton

Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Façades	Résultat d'analyse (P189)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

7. OBSERVATIONS & RESERVES

Couverture en ardoises naturelles,
Présence d'ITE en pignon,
Descentes EP : Galvanisé, Dauphin en fonte

8. ANNEXES

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P001	09/03/2026	Colle de revêtement de sol Verte + ragréage	Négatif
P002	09/03/2026	Ragréage	Négatif
P003	09/03/2026	Peinture + composites	Négatif
P004	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P005	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P006	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P007	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P008	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P009	09/03/2026	Isolant noir	Négatif
P010	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P011	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P012	09/03/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche	Négatif
P013	09/03/2026	Peinture + bois (Allèges)	Négatif
P014	09/03/2026	Joint de vitrage	Négatif
P015	09/03/2026	Colle de carrelage Blanche (sous moquette)	Négatif
P016	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P017	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P018	09/03/2026	Colle de revêtement bleu	Négatif
P019	09/03/2026	Peinture + bois	Négatif
P020	09/03/2026	Joint coupe feu	Négatif
P021	09/03/2026	Colle de revêtements de sol orange + ragréage	Négatif
P022	09/03/2026	Colle de faïences 20x20 blanche	Négatif
P023	09/03/2026	Colle de revêtement de sol beige tacheté + ragréage	Négatif
P024	09/03/2026	Revêtement fibreux + ragréage	Négatif
P025	09/03/2026	Colle de revêtement de sol beige clair	Positif
P026	09/03/2026	Dalle de sol beige + colle noire	Positif
P027	09/03/2026	Colle de revêtement beige clair + ragréage	Négatif
P028	09/03/2026	Colle de revêtement beige clair + ragréage	Négatif
P029	09/03/2026	Colle de revêtement beige clair + ragréage	Négatif
P030	09/03/2026	Colle de carrelage 20x20 gris + ragréage	Négatif
P031	09/03/2026	Colle de carrelage gris/bleu + ragréage	Négatif
P032	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P033	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P034	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P035	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P036	09/03/2026	Peinture + bois	Négatif
P037	09/03/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P038	09/03/2026	Colle de plinthes 10x20 grises	Négatif
P039	09/03/2026	Colle de faïence 10x10 blanche	Négatif
P040	09/03/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche	Négatif
P041	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P042	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P043	09/03/2026	Colle de plinthes 10x20 grises	Négatif
P044	09/03/2026	Joint de vitrage	Négatif

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P045	09/03/2026	Colle de revêtement souple + ragréage	Négatif
P046	09/03/2026	Ragréage	Négatif
P047	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P048	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P049	09/03/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées	Négatif
P050	09/03/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P051	09/03/2026	Colle de faïence 20x20 grise	Négatif
P052	09/03/2026	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	Négatif
P053	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P054	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P055	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P056	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P057	09/03/2026	Laine minérale + pare vapeur	Négatif
P058	09/03/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses	Négatif
P059	09/03/2026	Joint de vitrage	Négatif
P060	09/03/2026	Colle de revêtement bleu + ragréage	Négatif
P061	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P062	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P063	09/03/2026	Joint de vitrage	Négatif
P064	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P065	09/03/2026	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	Négatif
P066	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P067	09/03/2026	Colle de faïence 20x20 grise	Négatif
P068	09/03/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P069	09/03/2026	Colle de revêtement bleu + ragréage	Négatif
P070	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P071	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P072	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P073	09/03/2026	Colle de revêtement souple + ragréage	Négatif
P074	09/03/2026	Ragréage	Négatif
P075	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P076	09/03/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées	Négatif
P077	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P078	09/03/2026	Colle de faïence 20x20 grise	Négatif
P079	09/03/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P080	09/03/2026	Colle de revêtement bleu + ragréage	Négatif
P081	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P082	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P083	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P084	09/03/2026	Colle de revêtement bleu + ragréage	Négatif
P085	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P086	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P087	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P088	09/03/2026	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	Négatif

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P089	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P090	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P091	09/03/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses	Négatif
P092	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P093	09/03/2026	Colle de revêtement souple + ragréage	Négatif
P094	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P095	09/03/2026	Colle de faïence 20x20 grise	Négatif
P096	09/03/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P097	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P098	09/03/2026	Colle de revêtement souple + ragréage	Négatif
P099	09/03/2026	Ragréage	Négatif
P100	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P101	09/03/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées	Négatif
P102	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P103	09/03/2026	Colle de faïence 20x20 grise	Négatif
P104	09/03/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P105	09/03/2026	Colle de revêtement bleu + ragréage	Négatif
P106	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P107	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P108	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P109	09/03/2026	Colle de revêtement bleu + ragréage	Négatif
P110	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P111	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P112	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P113	09/03/2026	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	Négatif
P114	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P115	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P116	09/03/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses	Négatif
P117	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P118	09/03/2026	Colle de revêtement souple + ragréage	Négatif
P119	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P120	09/03/2026	Colle de faïence 20x20 grise	Négatif
P121	09/03/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P122	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P123	09/03/2026	Colle de revêtement souple + ragréage	Négatif
P124	09/03/2026	Ragréage	Négatif
P125	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P126	09/03/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées	Négatif
P127	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P128	09/03/2026	Colle de faïence 20x20 grise	Négatif
P129	09/03/2026	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Négatif
P130	09/03/2026	Colle de revêtement bleu + ragréage	Négatif
P131	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P132	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P133	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P134	09/03/2026	Colle de revêtement bleu + ragréage	Négatif
P135	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P136	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P137	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P138	09/03/2026	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	Négatif
P139	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P140	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P141	09/03/2026	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses	Négatif
P142	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P143	09/03/2026	Colle de revêtement souple + ragréage	Négatif
P144	09/03/2026	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Négatif
P145	09/03/2026	Colle de faïence 20x20 grise	Négatif
P146	09/03/2026	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles	Négatif
P147	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P148	09/03/2026	Colle de revêtement bleu	Négatif
P149	09/03/2026	Colle de revêtement bleu	Négatif
P150	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P151	09/03/2026	Peinture + plâtre	Négatif
P152	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P153	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P154	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P155	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P156	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P157	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P158	09/03/2026	Colle de faïence 2x2 grises	Négatif
P159	09/03/2026	Peinture	Négatif
P160	09/03/2026	Colle de carrelage marron	Négatif
P161	09/03/2026	Dalles de sol 30x30 beige + colle noire	Positif
P162	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P163	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P164	09/03/2026	Colle de carrelage 30x30 grises + ragréage	Négatif
P165	09/03/2026	Colle de plinthes 10x20 grises	Négatif
P166	09/03/2026	Peinture + enduit béton	Négatif
P167	09/03/2026	Colle de carrelage 20x20 blanc	Négatif
P168	09/03/2026	Colle de revêtement bleu	Négatif
P169	09/03/2026	Colle de revêtement bleu	Négatif
P170	09/03/2026	Colle de plinthes 10x10 grises	Négatif
P171	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P172	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P173	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P174	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P175	09/03/2026	Colle de faïence 2x2 grises	Négatif
P176	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P177	09/03/2026	Peinture + enduit maigre	Négatif
P178	09/03/2026	Peinture	Négatif
P179	09/03/2026	Peinture + enduit béton	Négatif
P180	09/03/2026	Flocages	Négatif
P181	09/03/2026	Laine minérale + pare vapeur	Négatif
P182	09/03/2026	Ardoises	Négatif
P183	09/03/2026	Plaque fibre ciment	Positif
P184	09/03/2026	Joint blanc	Négatif
P185	09/03/2026	Joint blanc	Négatif
P186	09/03/2026	Peinture + béton	Négatif
P187	09/03/2026	Peinture + béton	Négatif
P188	09/03/2026	Enduit Béton	Négatif
P189	09/03/2026	Enduit Béton	Négatif
P190	09/03/2026	Peinture + bois	Négatif
P191	09/03/2026	Colle de carrelage 2x2 grises	Négatif
P192	09/03/2026		Négatif

PLANCHE(S) DE REPERAGE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	Résidence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS
N° dossier :	5364000
N° planche :	1/7 — Version : 1
Type :	RDC
Date :	01/03/2026
Intervenant	Gwenael ADELIS
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE
Dalles de sol + colle noire	
Plaques fibre ciment	

Divers	REPRESENTATION GRAPHIQUE

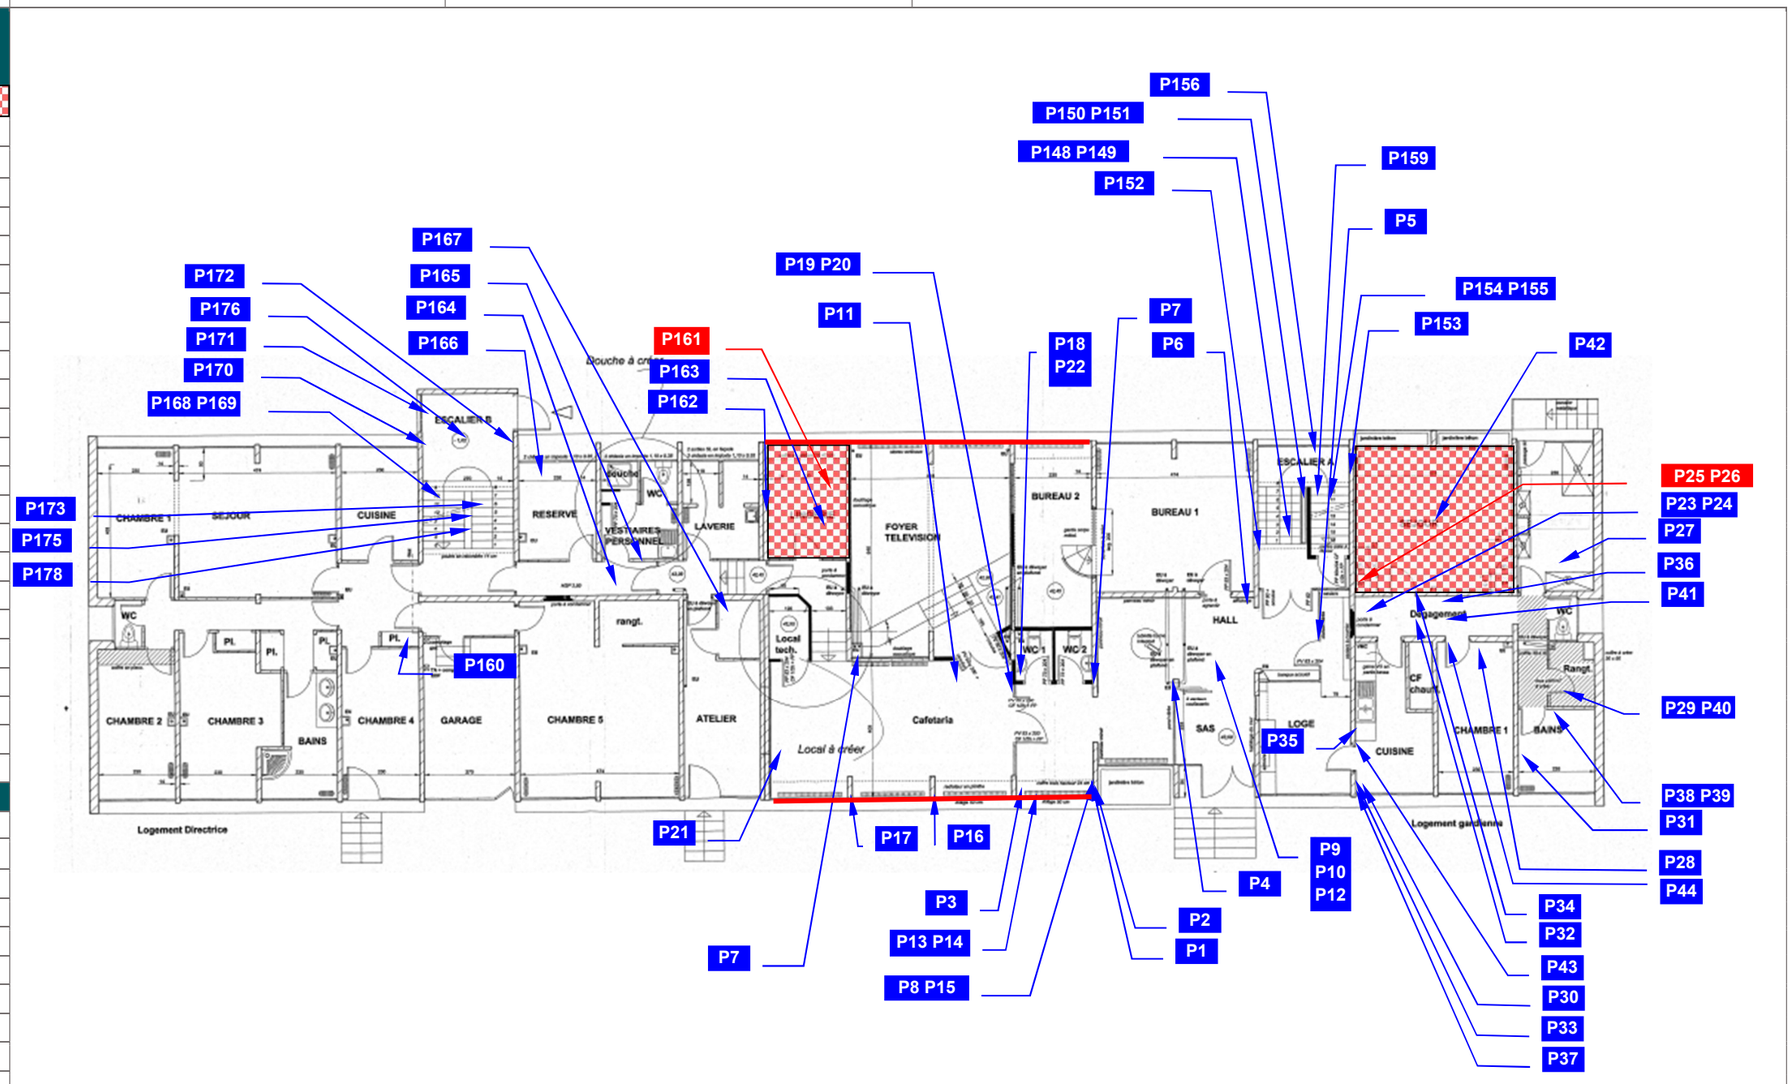

Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	Résidence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS
N° dossier :	5364000
N° planche :	2/7 — Version : 1
Type :	1er étage
Date :	01/03/2026
Intervenant	Gwenael ADELIS
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE

Divers	REPRESENTATION GRAPHIQUE

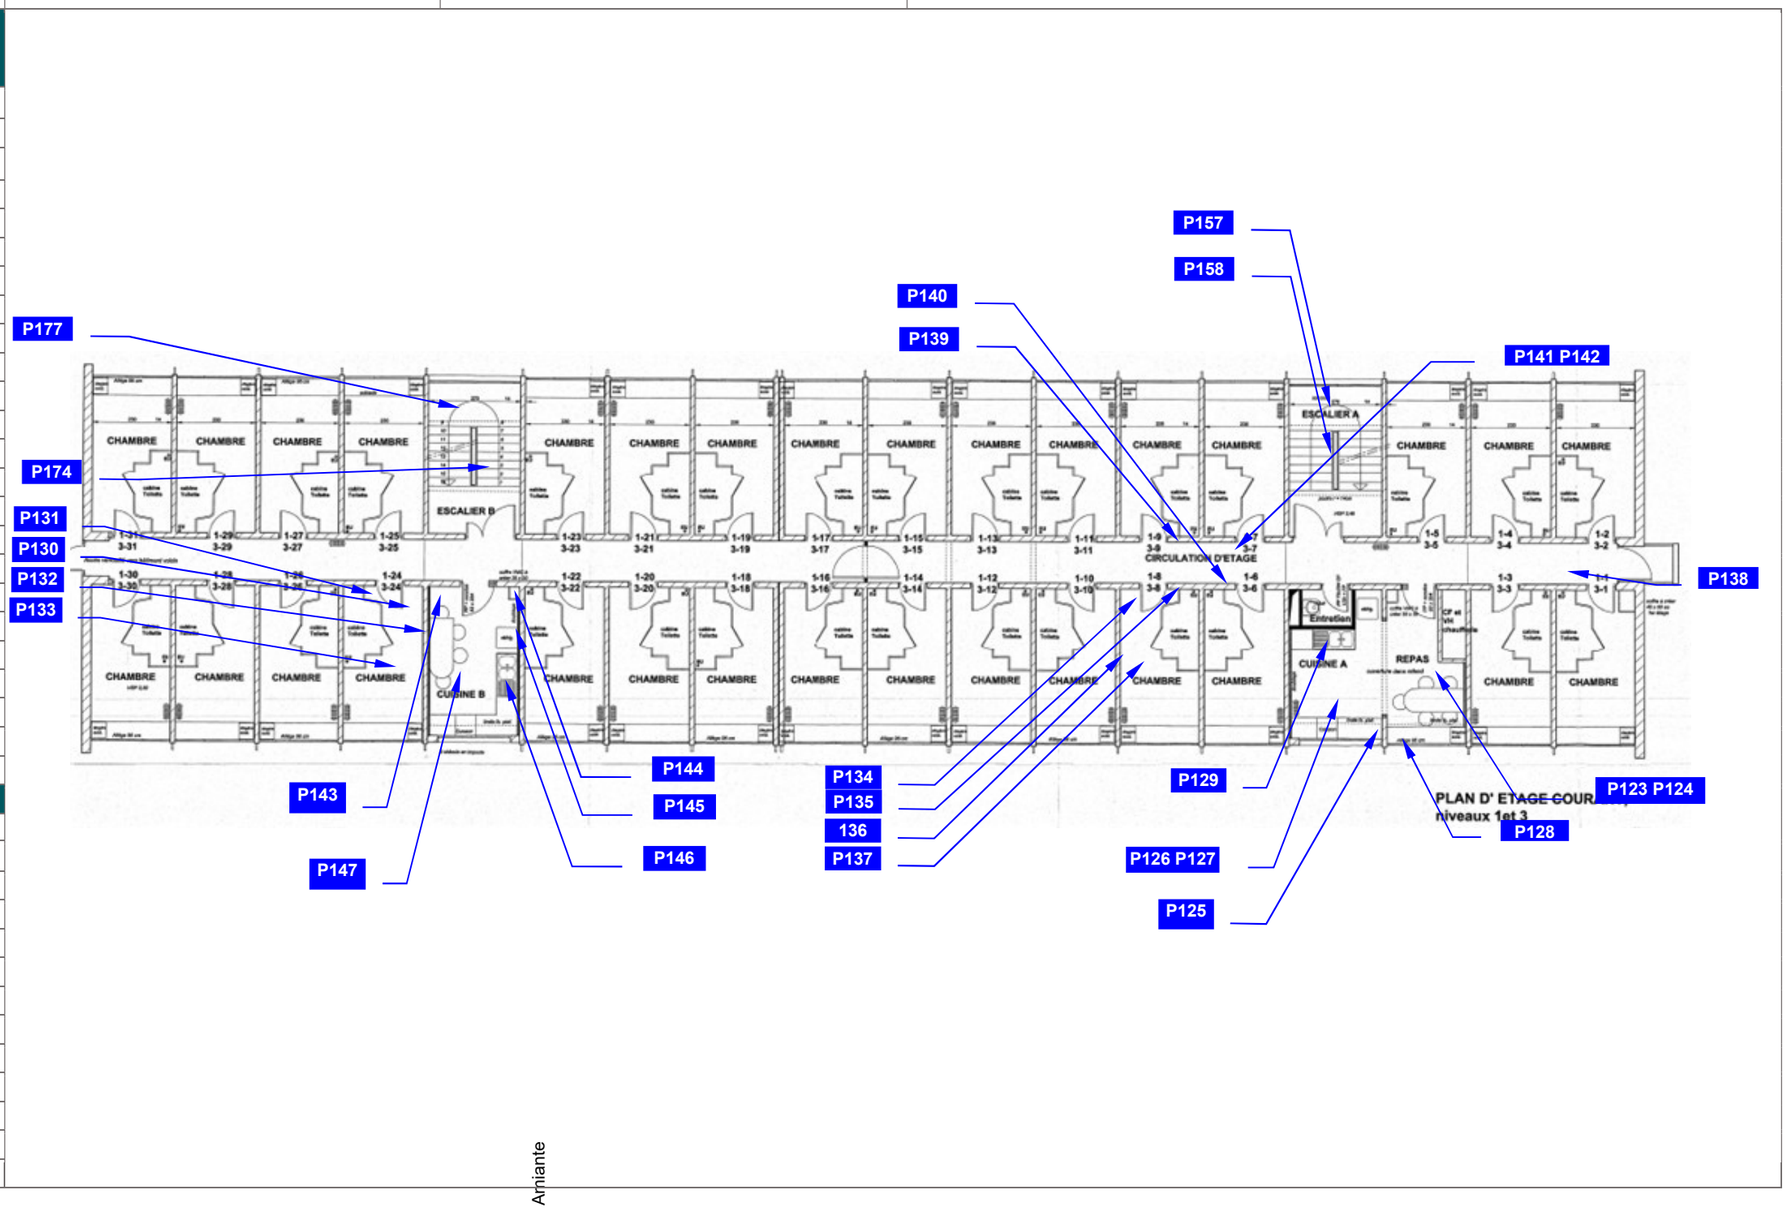

PLAN D' ETAGE COURANT niveaux 1et 3

Arniante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	Résidence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS
N° dossier :	5364000
N° planche :	3/7 — Version : 1
Type :	2ème étage
Date :	01/03/2026
Intervenant	Gwenael ADELIS
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE

Divers	REPRESENTATION GRAPHIQUE

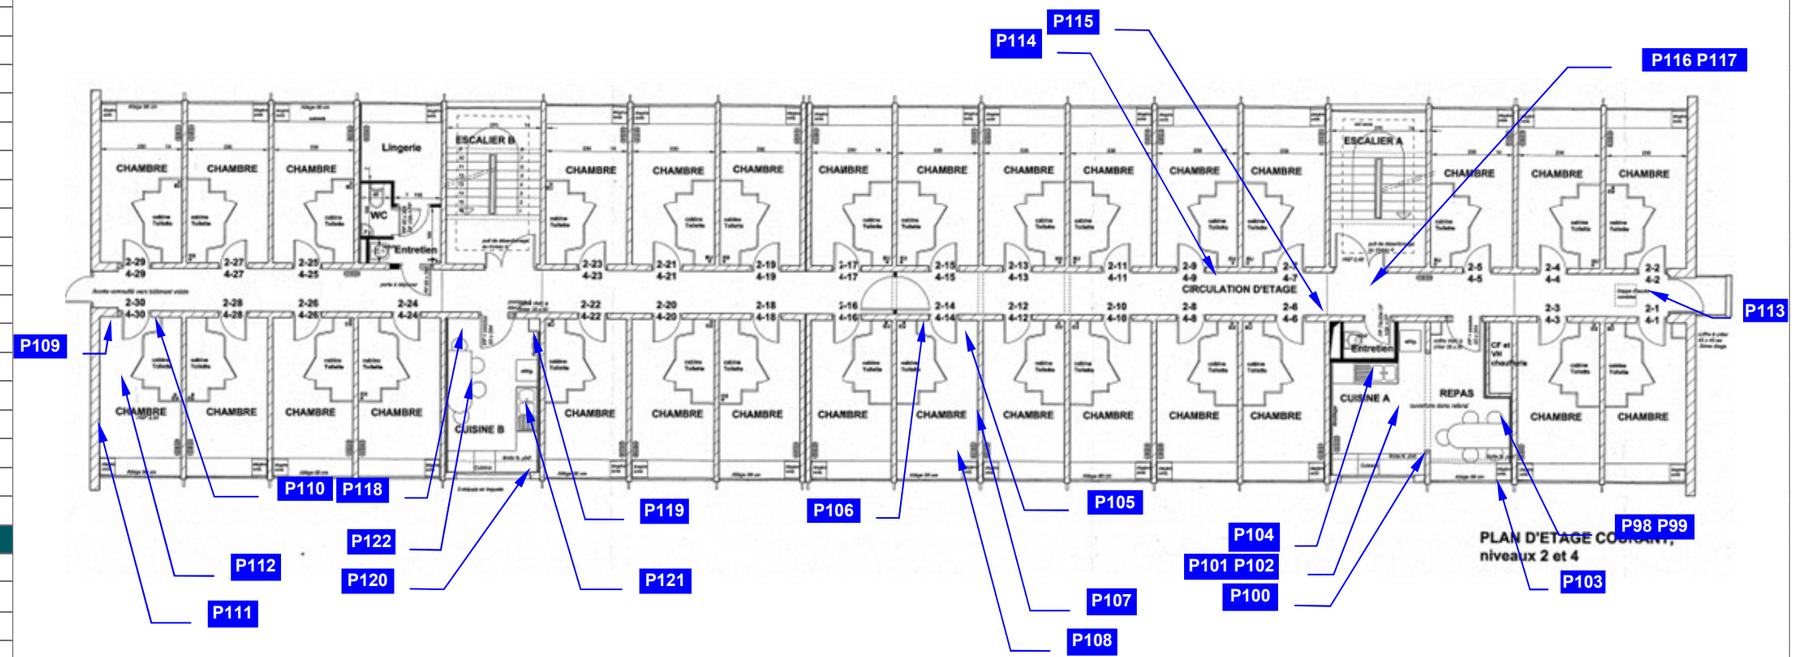

Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	Résidence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS
N° dossier :	5364000
N° planche :	4/7 — Version : 1
Type :	3ème étage
Date :	01/03/2026
Intervenant	Gwenael ADELIS
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE

Divers	REPRESENTATION GRAPHIQUE

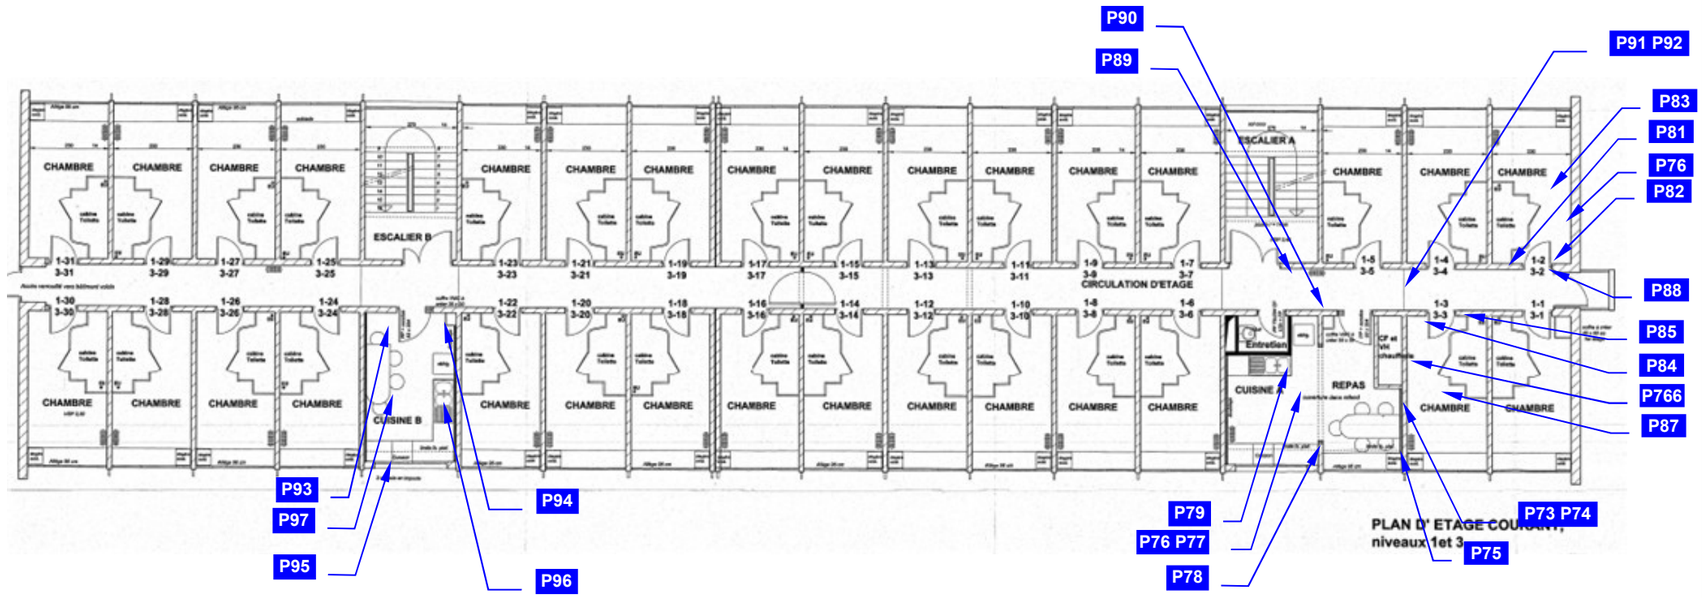

Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

Qualiconsult

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	Résidence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS
N° dossier :	5364000
N° planche :	5/7 — Version : 1
Type :	4ème étage
Date :	01/03/2026
Intervenant	Gwenael ADELIS
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	Résidence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS
N° dossier :	5364000
N° planche :	6/7 — Version : 1
Type :	Comble
Date :	01/03/2026
Intervenant	Gwenael ADELIS
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE

Divers	REPRESENTATION GRAPHIQUE

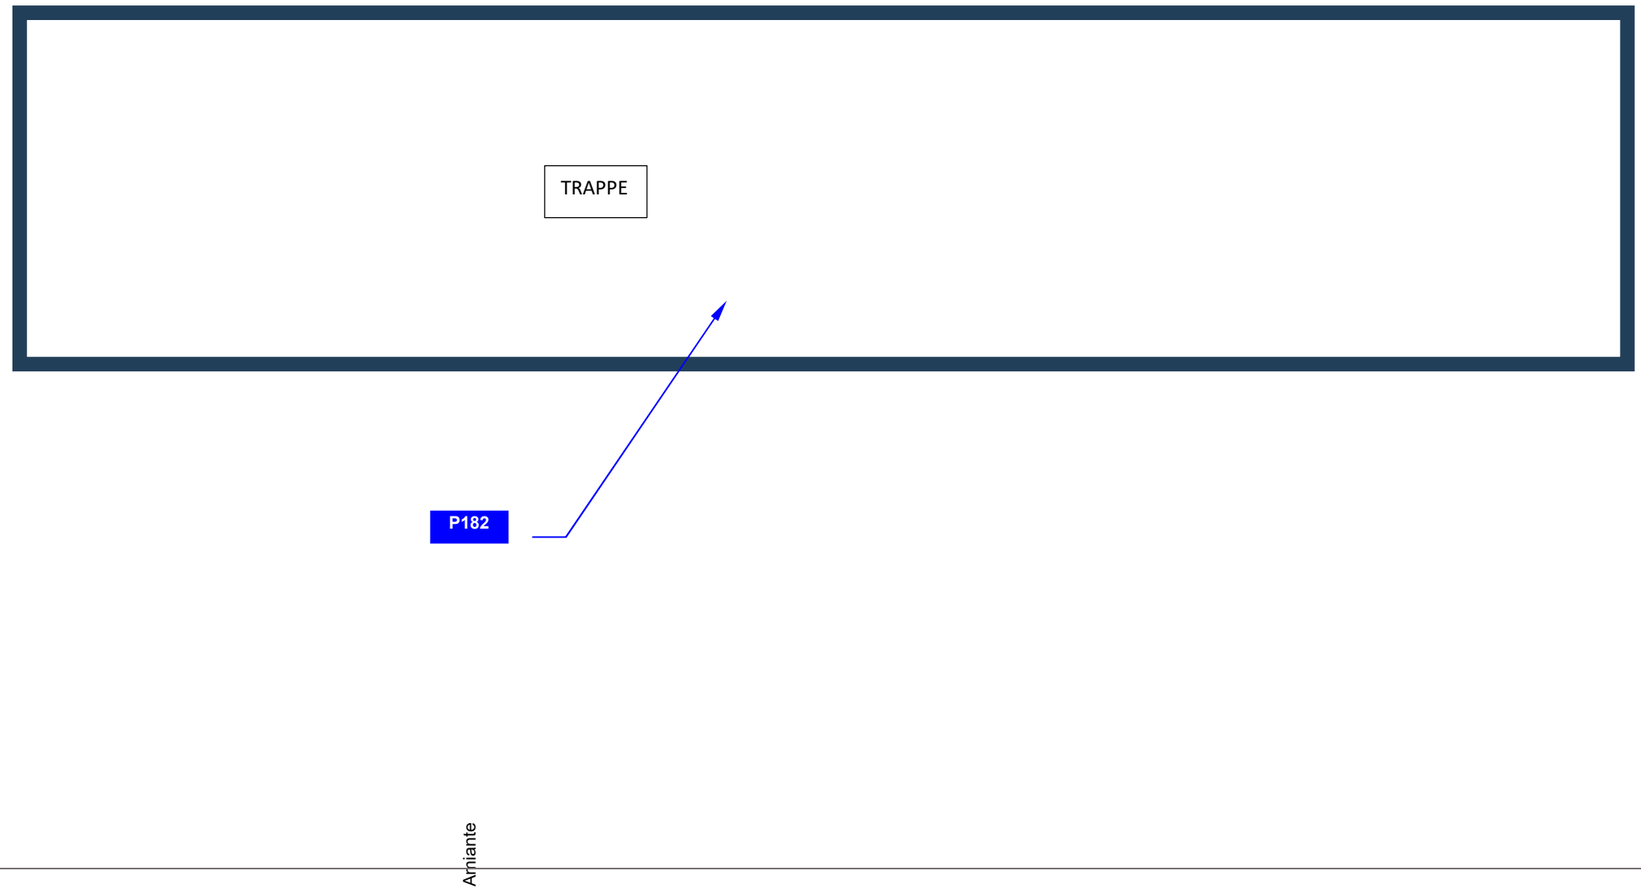

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	Résidence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS
N° dossier :	5364000
N° planche :	7/7 — Version : 1
Type :	Façades
Date :	01/03/2026
Intervenant	Gwenael ADELIS
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE
Plaques fibre ciment	

Divers	REPRESENTATION GRAPHIQUE

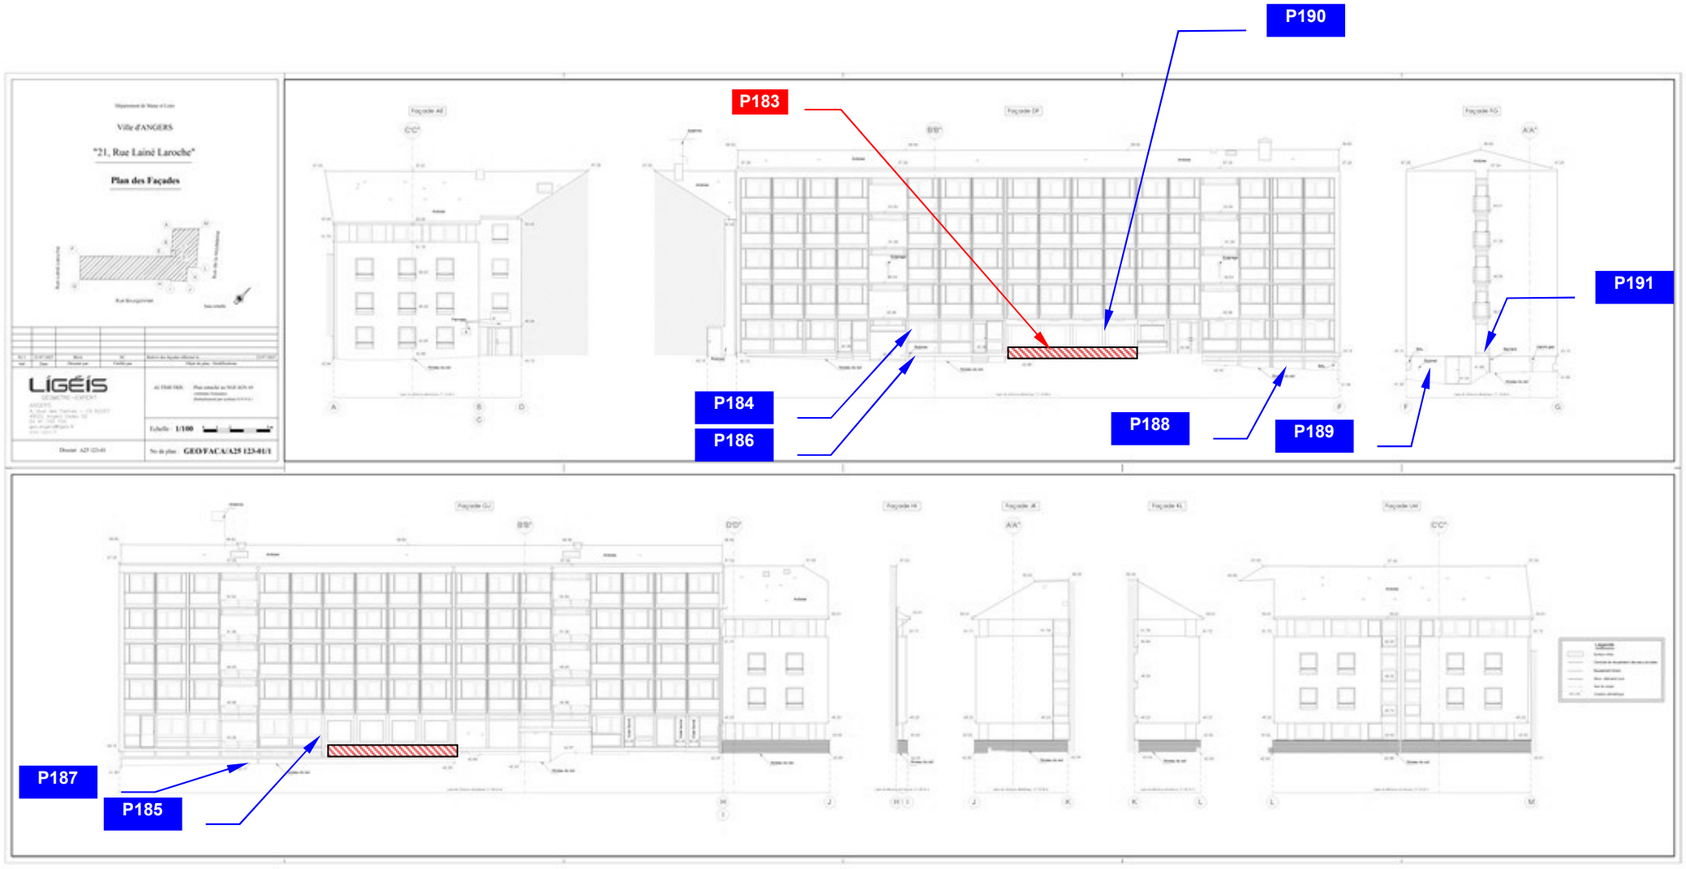

Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Niveau / Titre :	Résidence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS
N° dossier :	5364000
N° planche :	8/8 — Version : 1
Type :	Façades
Date :	01/03/2026
Intervenant	Gwenael ADELIS
Origine du plan :	CLIENT

P1	Prélèvement négatif
P1	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	REPRESENTATION GRAPHIQUE

Divers	REPRESENTATION GRAPHIQUE
Non concerné par les travaux	



P180

P179

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


PLANCHE PHOTO(S)

ELEMENT : Plafond
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er Lot 108 - Cabine de douche	Plafond - Toutes zones	Thermoformé	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

ELEMENT : Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux
OUVRAGE

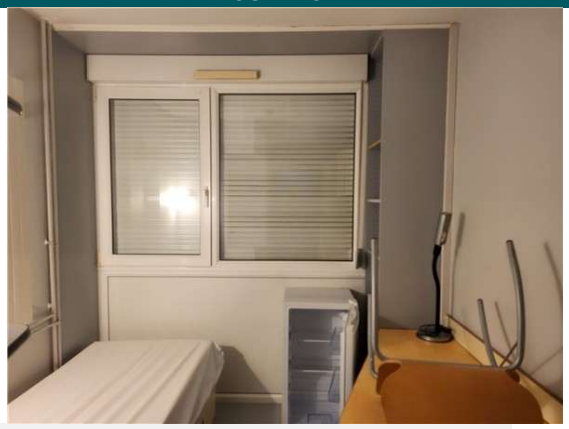

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint de compression	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

ELEMENT : Revêtements de sols
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er SS - Sous sol Garage vélo	Revêtements de sols	Beton brut	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

ELEMENT : Murs
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
1er Lot 108 - Cabine de douche	Murs - Toutes zones	Thermoformé	

ELEMENT : Sol
OUVRAGE

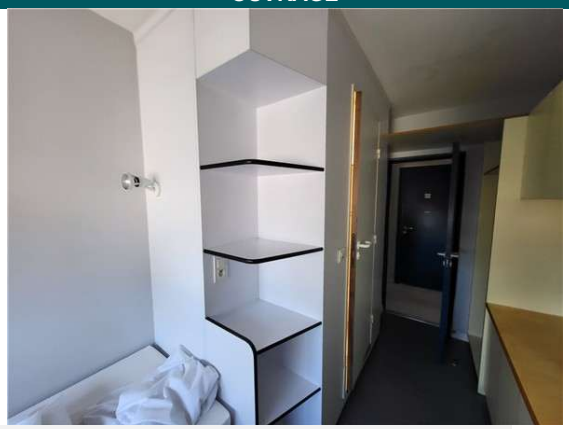

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
1er Lot 108 - Cabine de douche	Sol - Toutes zones	Thermoformé	

ELEMENT : Revêtements de sols
OUVRAGE

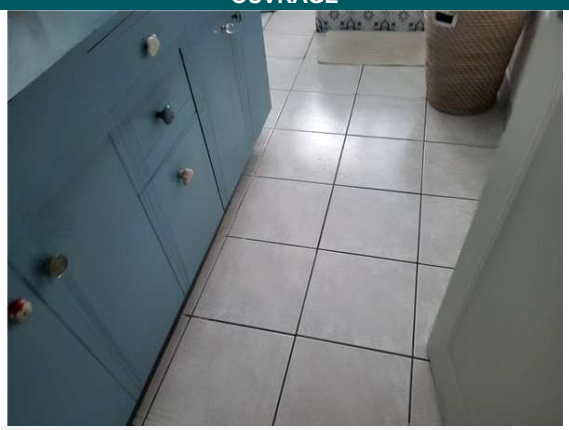


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Logement Directrice - Salle de Bains	Revêtements de sols	Carrelage 30x30 gris	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

ELEMENT : Murs et cloisons maçonnés


OUVRAGE

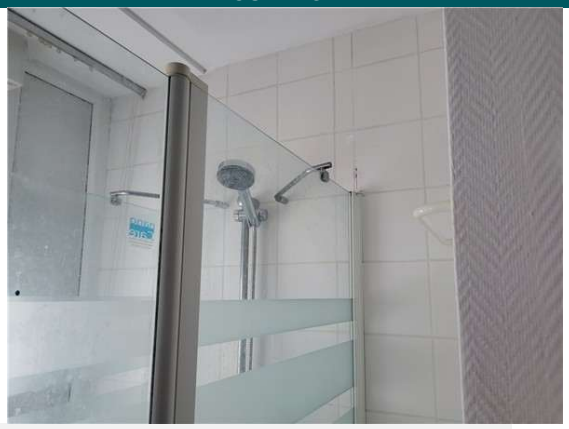

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement Directrice - Salle de Bains	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïences 20x20 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

ELEMENT : Revêtements de sols


OUVRAGE

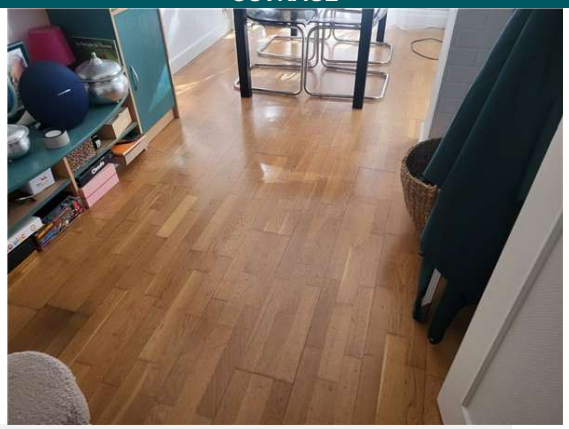

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement Directrice - Séjour	Revêtements de sols	Parquet massif	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P001

OUVRAGE

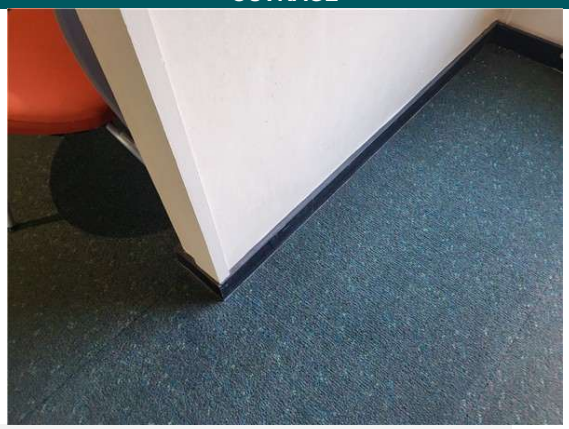


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Revêtements de sols	Colle de revêtement de sol Verte + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P002
OUVRAGE

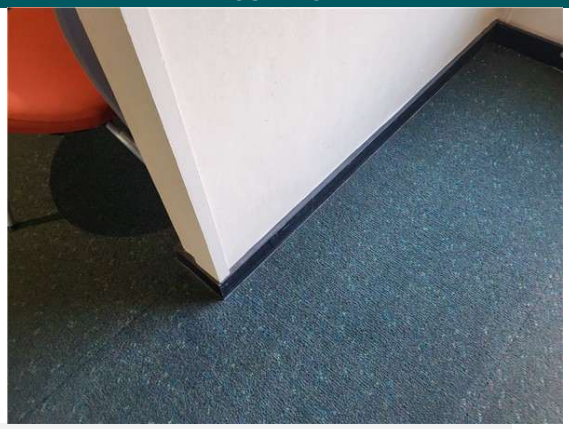


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Revêtements de sols	Ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P003
OUVRAGE

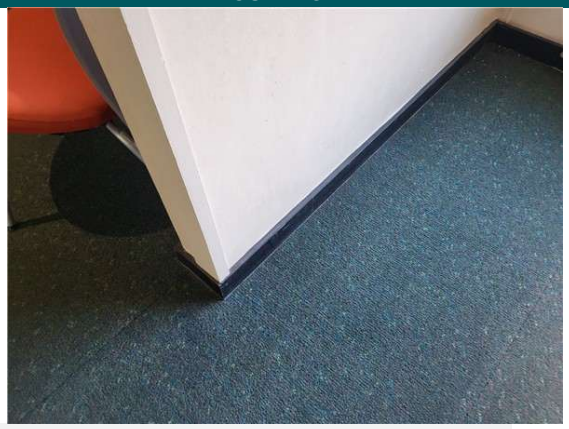

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Murs et cloisons maçonnés Plinthes	Peinture + composites	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P004
OUVRAGE

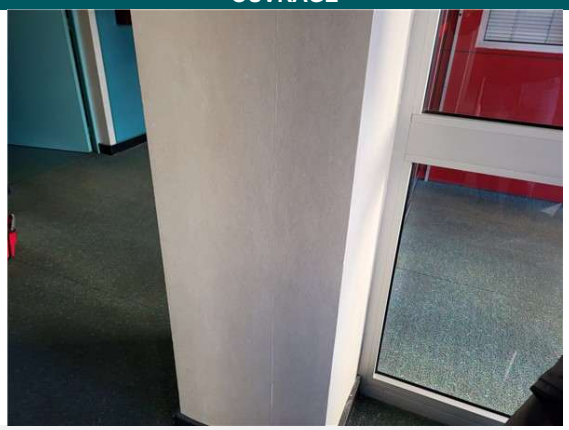


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Poteaux	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P005

OUVRAGE

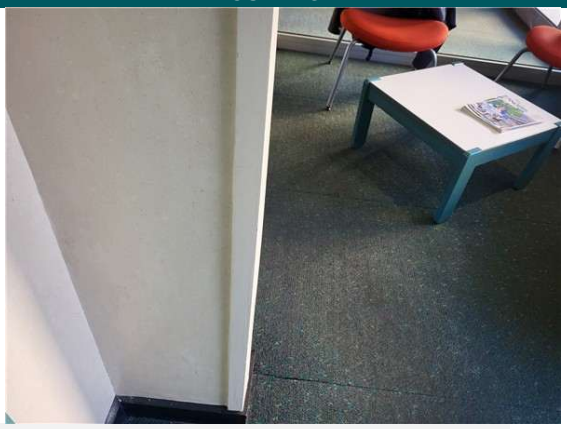

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P006

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P007

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P008

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P009


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Faux plafonds	Isolant noir	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P010

OUVRAGE

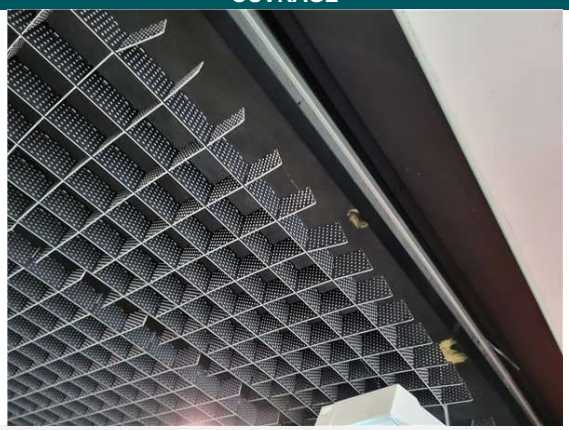


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Plafonds	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P011


OUVRAGE

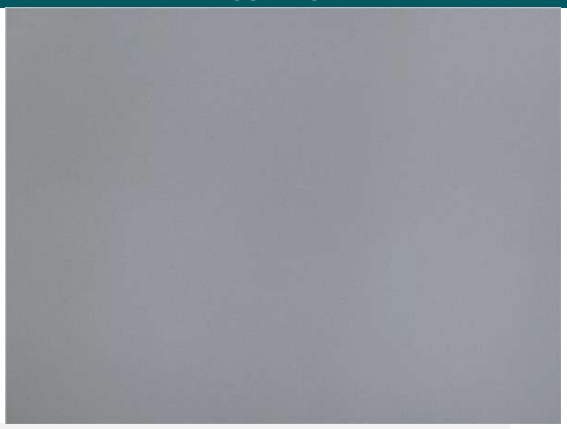

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Caféteria	Plafonds	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P012

OUVRAGE

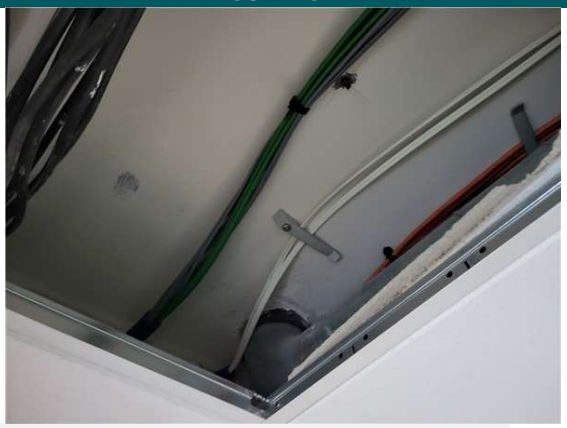

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - WC	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P013

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Peinture + bois (Allèges)	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P014


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Joint de vitrage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P015


OUVRAGE

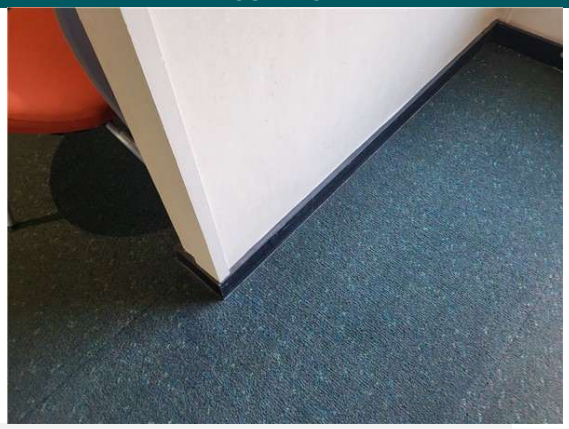

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Revêtements de sols	Colle de carrelage Blanche (sous moquette)	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P016

OUVRAGE

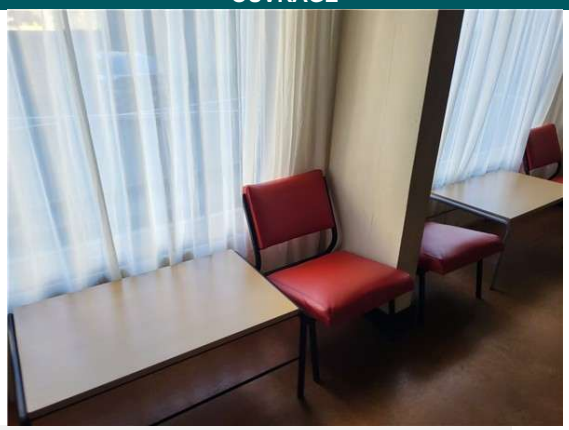


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Caféteria	Poteaux	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P017


OUVRAGE

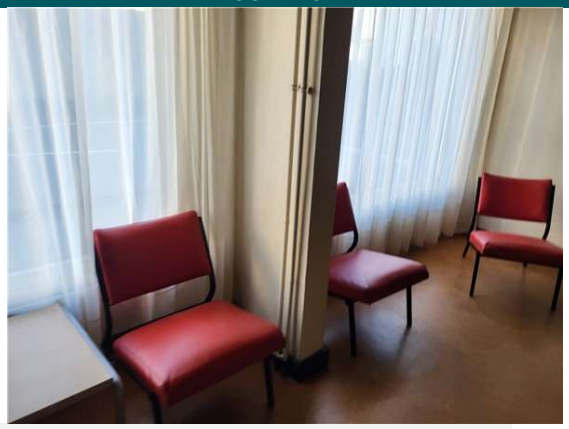

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Caféteria	Poteaux	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P018

OUVRAGE

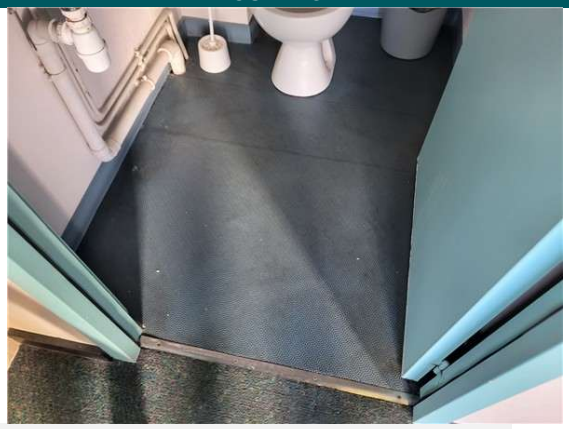

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - WC	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P019

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Menuiseries Intérieurs	Peinture + bois	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P020

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Hall	Menuiseries Intérieurs	Joint coupe feu	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P021


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Caféteria	Revêtements de sols n°1	Colle de revêtements de sol orange + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P022

OUVRAGE

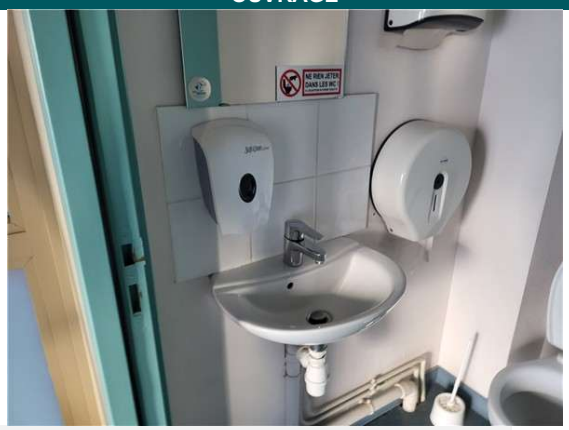

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - WC	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïences 20x20 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P023

OUVRAGE

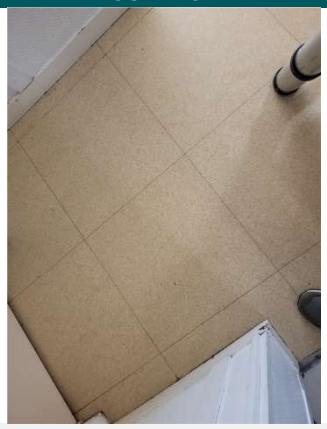


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Circulation	Revêtements de sols	Colle de revêtement de sol beige tacheté + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P024

OUVRAGE

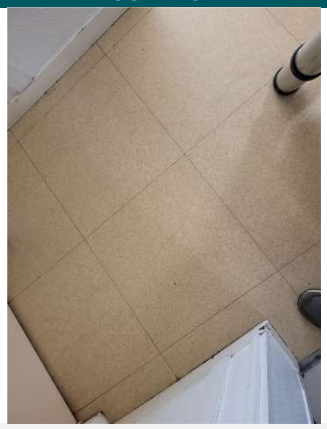


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Circulation	Revêtements de sols	Revêtement fibreux + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P025

OUVRAGE

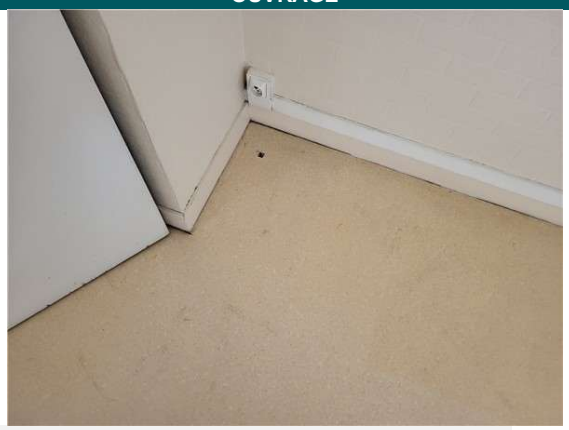

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Séjour	Revêtements de sols	Colle de revêtement de sol beige clair	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P026


OUVRAGE

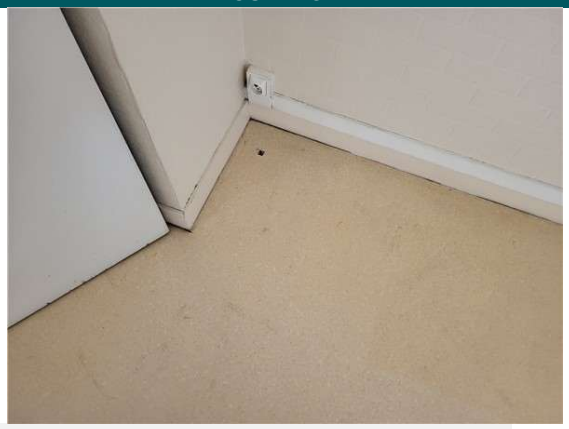

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Séjour	Revêtements de sols	Dalle de sol beige + colle noire	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P027


OUVRAGE

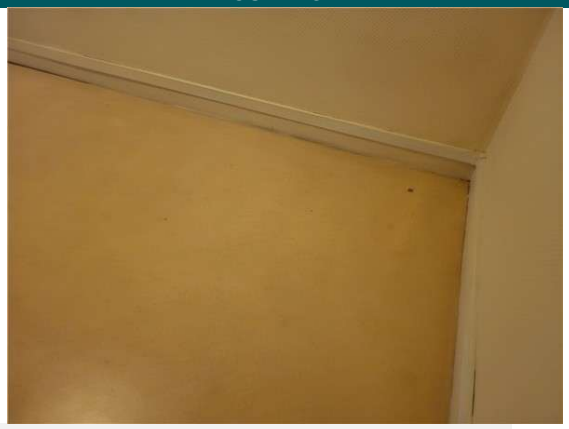

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Chambre n°1	Revêtements de sols	Colle de revêtement beige clair + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P028

OUVRAGE

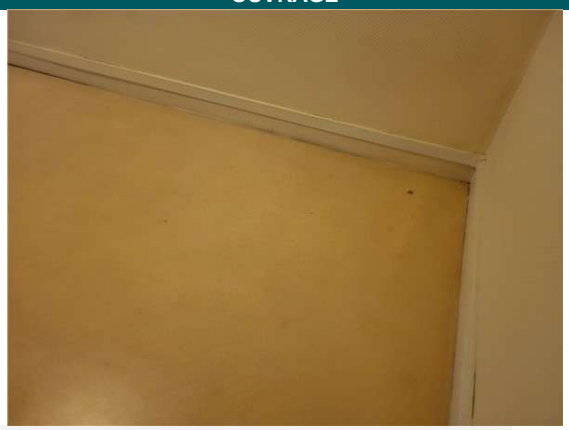

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Chambre n°2	Revêtements de sols	Colle de revêtement beige clair + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P029


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Cellier	Revêtements de sols	Colle de revêtement beige clair + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P030


OUVRAGE

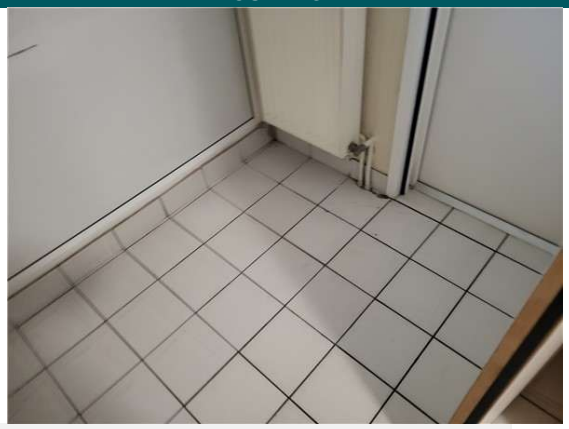

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Cuisine	Revêtements de sols	Colle de carrelage 20x20 gris + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P031

OUVRAGE

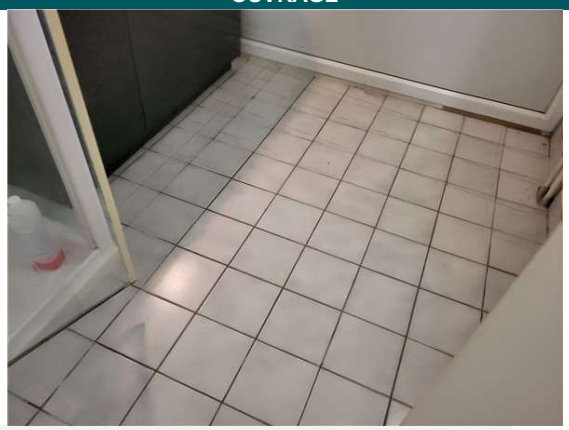


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Salle de Bains	Revêtements de sols	Colle de carrelage gris/bleu + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P032

OUVRAGE

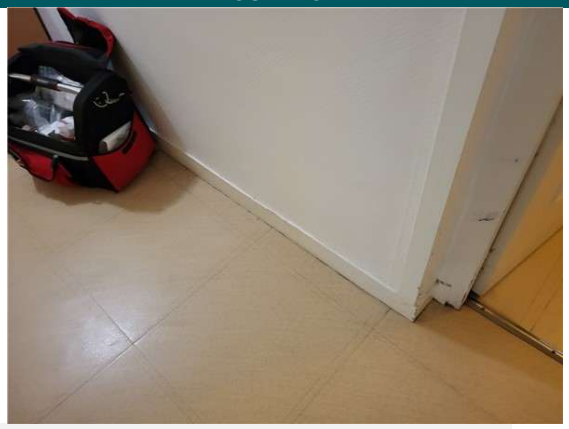


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Circulation	Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P033

OUVRAGE

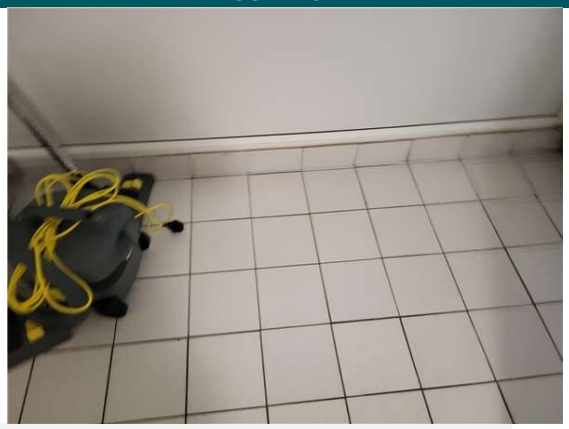


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Cuisine	Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P034

OUVRAGE

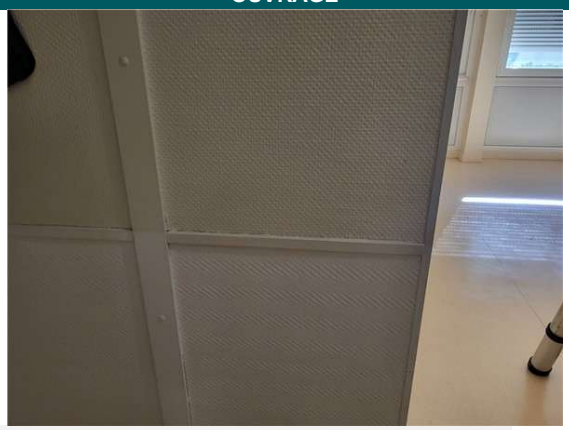

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Circulation	Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER


Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P035
OUVRAGE

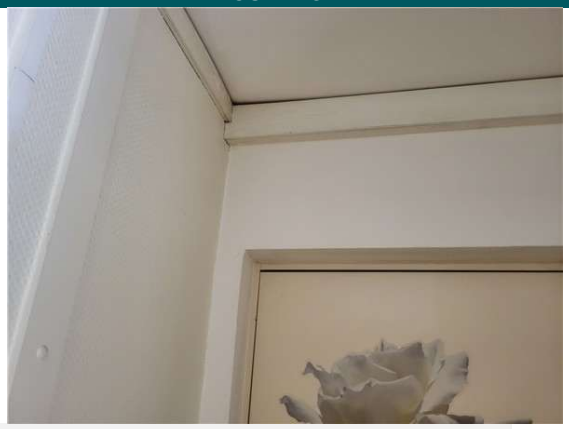

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Cuisine	Murs et cloisons maçonnés n°1	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P036
OUVRAGE

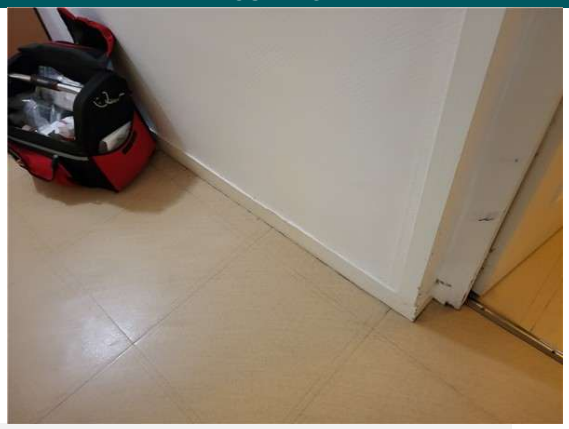

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Cuisine	Plinthes	Peinture + bois	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P037
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Cuisine	Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


PRELEVEMENT : P038
OUVRAGE

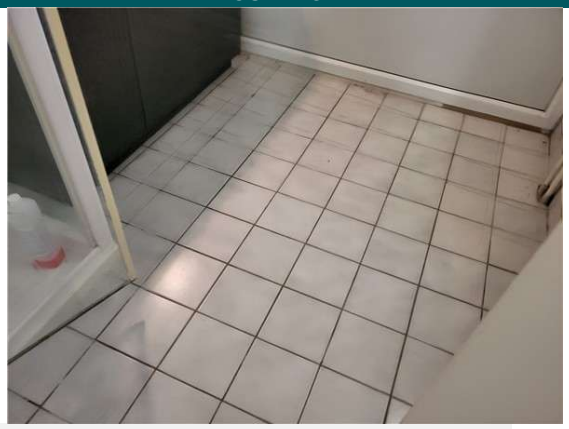

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Salle de Bains	Plinthes	Colle de plinthes 10x20 grises	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P039
OUVRAGE

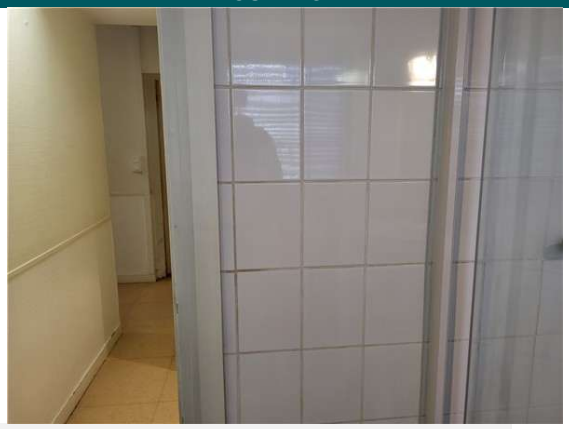

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Salle de Bains	Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de faïence 10x10 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P040
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Cellier	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P041


OUVRAGE

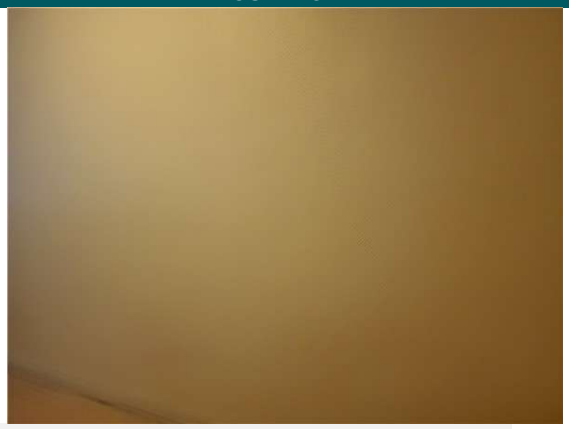

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Circulation	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P042

OUVRAGE

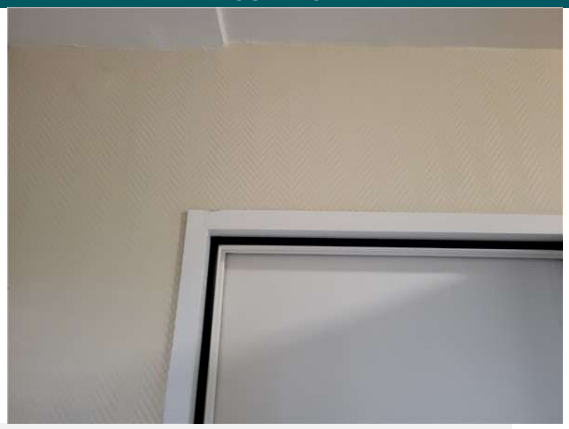

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Séjour	Plafonds n°1	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P043

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement gardien - Cuisine	Plinthes	Colle de plinthes 10x20 grises	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P044

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Menuiseries extérieures	Joint de vitrage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P045


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°1	Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P046

OUVRAGE

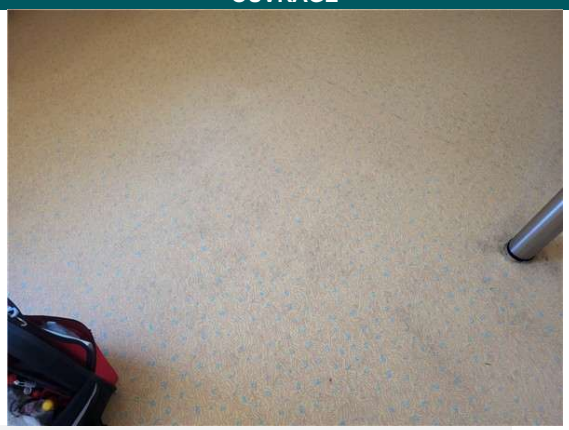

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°1	Revêtements de sols	Ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P047


OUVRAGE

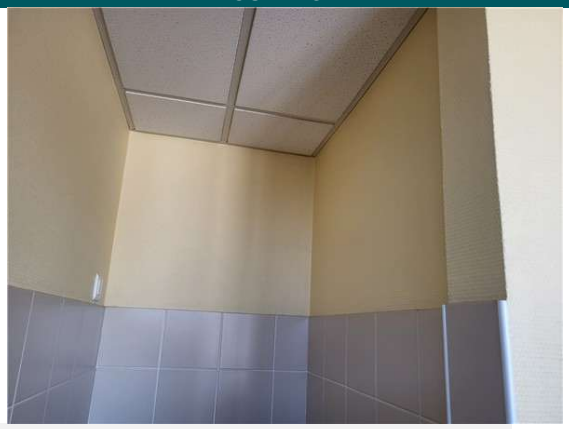

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P048

OUVRAGE

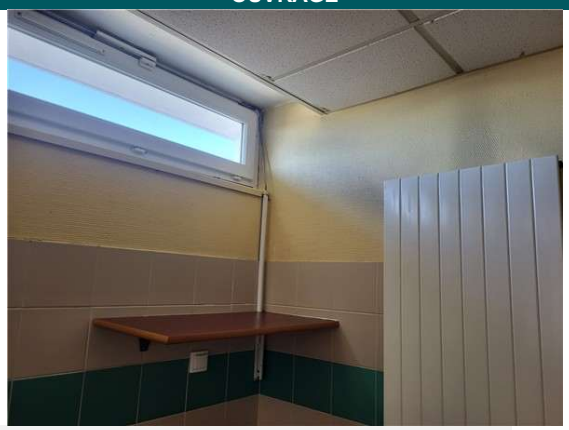

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P049

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°1	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P050

OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°1	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P051

OUVRAGE

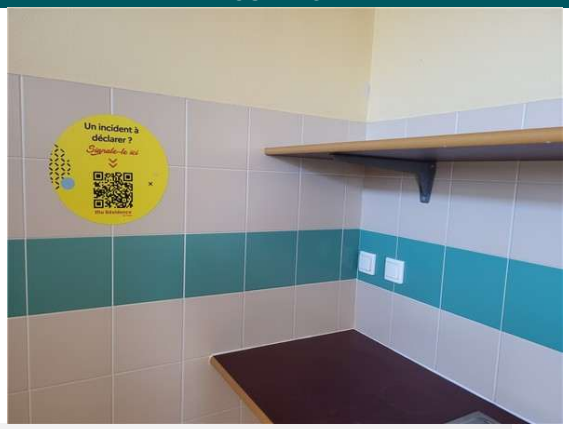


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°1	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P052

OUVRAGE

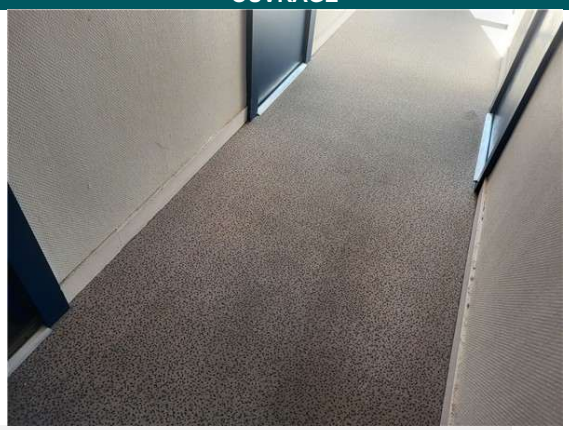

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Circulation	Revêtements de sols	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P053
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P054
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P055
OUVRAGE

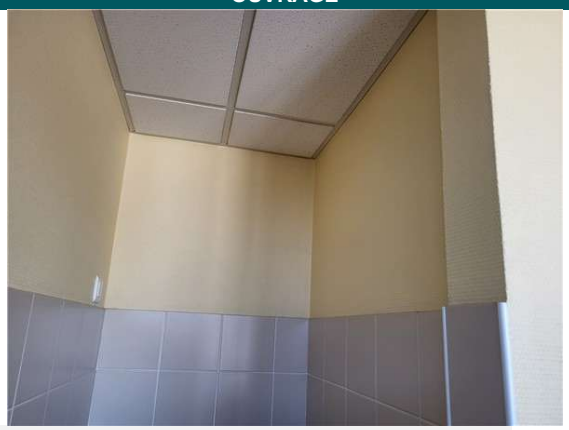


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°1	Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P056


OUVRAGE

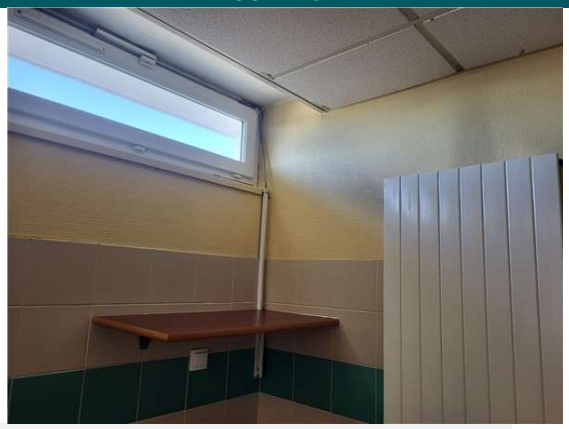

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°1	Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P057


OUVRAGE

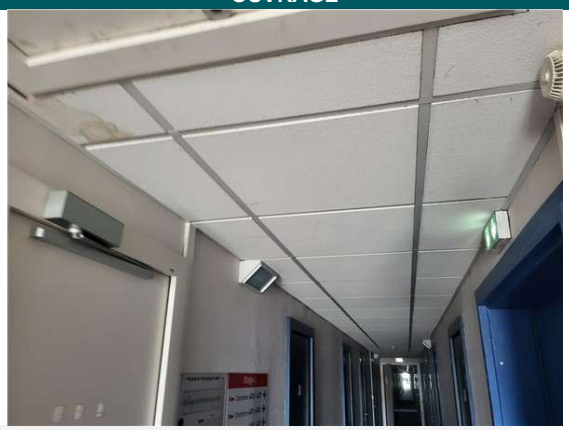

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Circulation	Faux plafonds	Laine minérale + pare vapeur	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P058

OUVRAGE

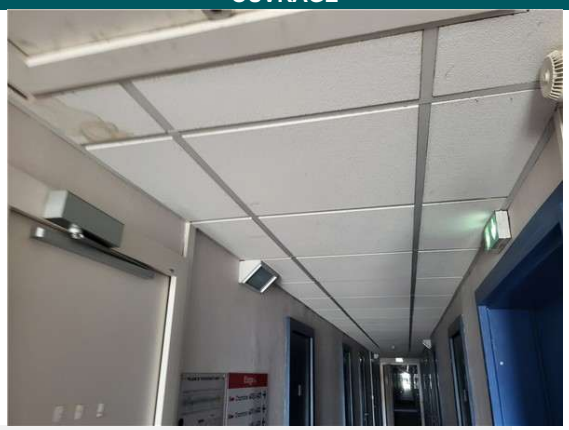

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Circulation	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P059


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Menuiseries extérieures	Joint de vitrage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P060


OUVRAGE

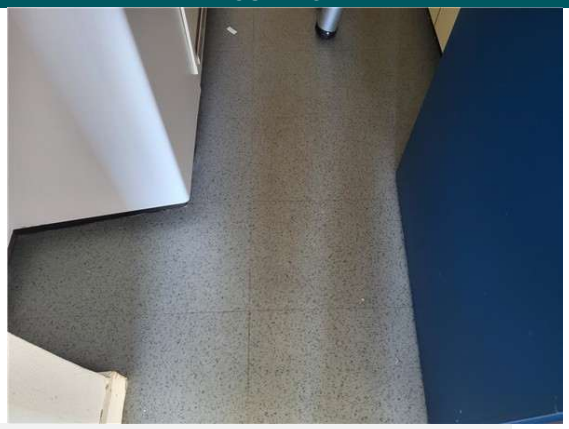

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème Lot 428 - Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P061

OUVRAGE

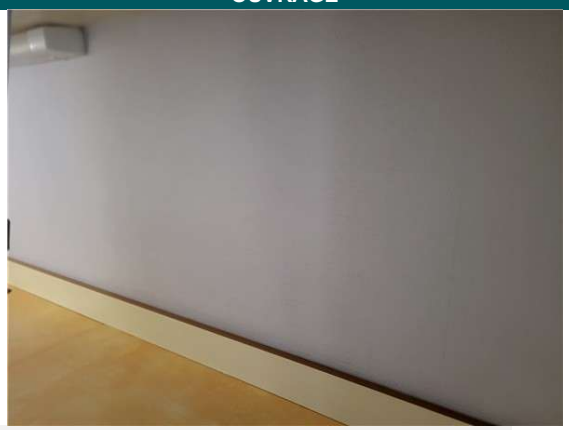


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème Lot 428 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P062
OUVRAGE

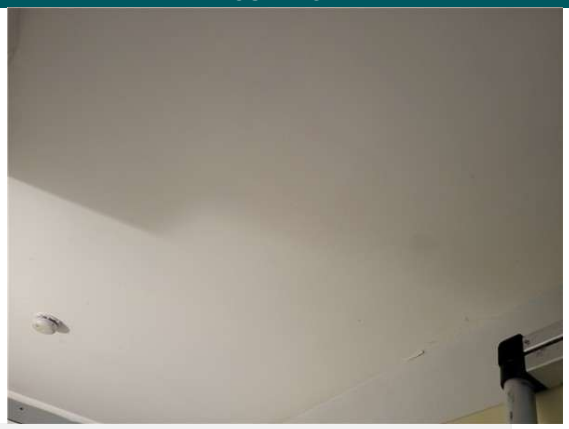


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème Lot 428 - Chambre	Plafond	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P063
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Menuiseries extérieures	Joint de vitrage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P064
OUVRAGE

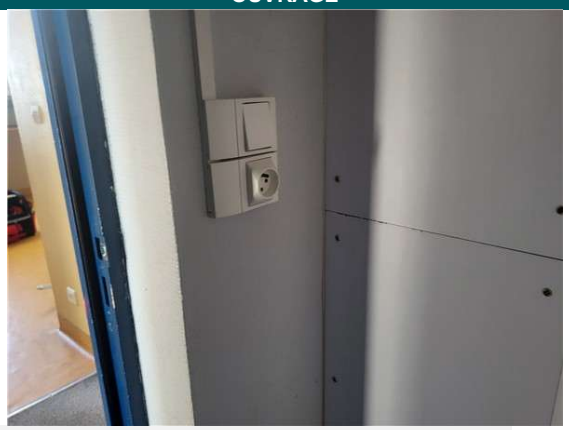

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème Lot 428 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P065


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°2	Revêtements de sols	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P066


OUVRAGE

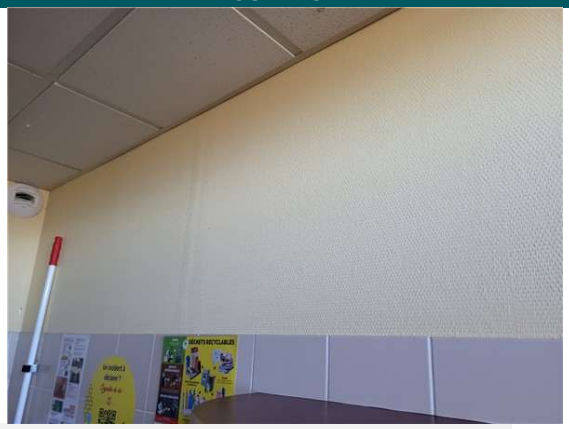

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P067

OUVRAGE

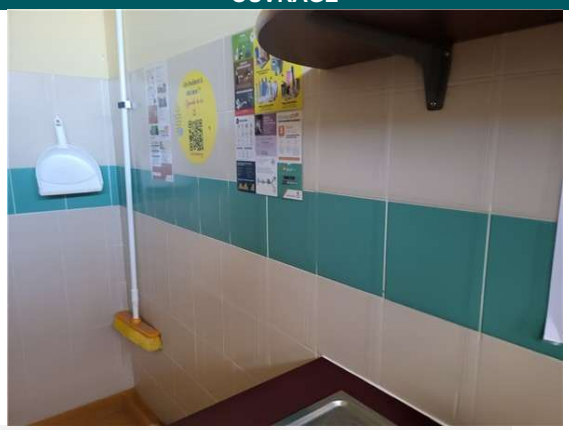

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°2	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P068

OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème - Cuisine n°2	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P069

OUVRAGE

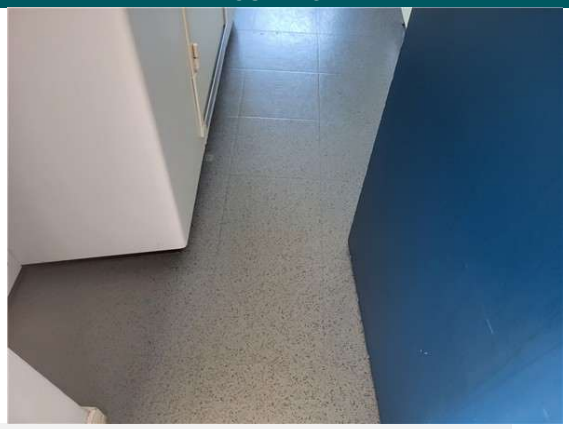


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème Lot 410 - Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P070

OUVRAGE

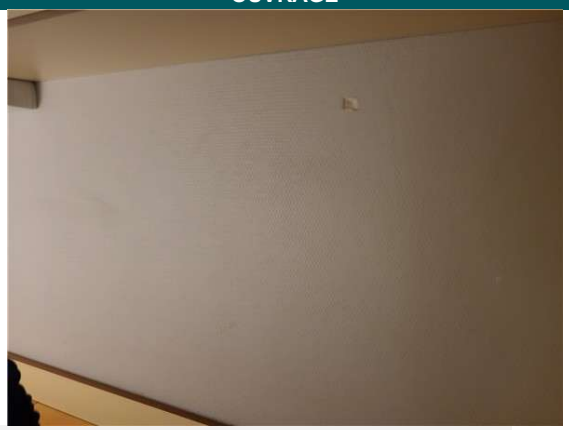

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème Lot 410 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P071


OUVRAGE

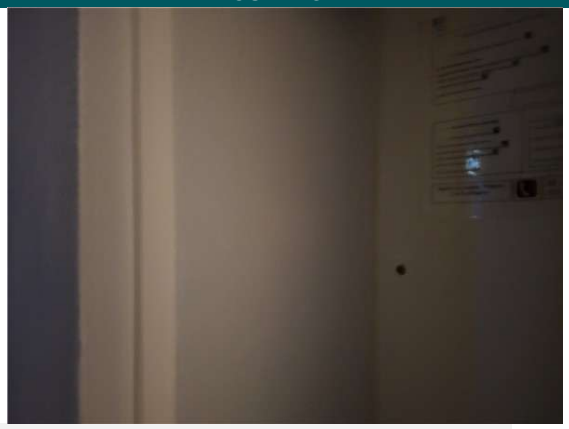

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème Lot 410 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P072


OUVRAGE

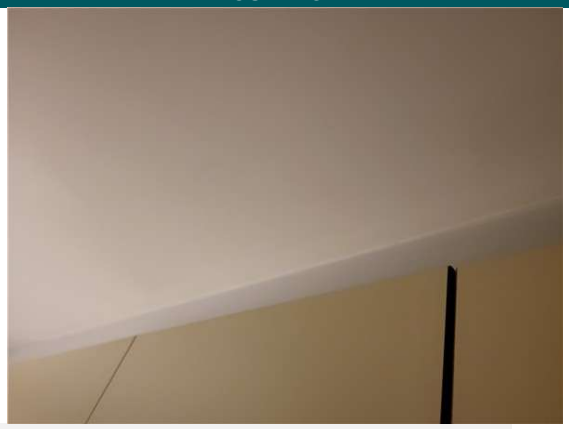

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
4ème Lot 410 - Chambre	Plafonds	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P073

OUVRAGE

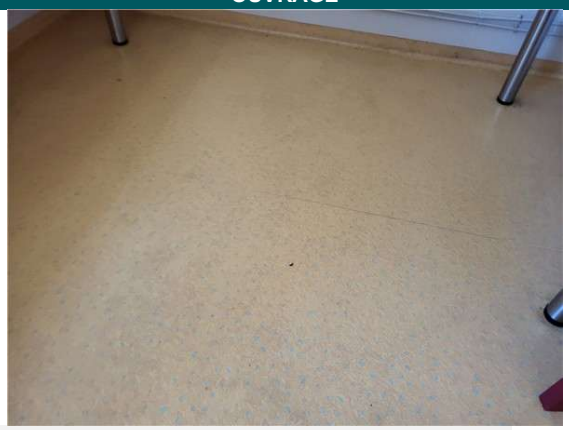

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Cuisine n°1	Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P074

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Cuisine n°1	Revêtements de sols	Ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P075

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Cuisine n°1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P076

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Cuisine n°1	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P077

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Cuisine n°1	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P078

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Cuisine n°1	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P079

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Cuisine n°1	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P080

OUVRAGE

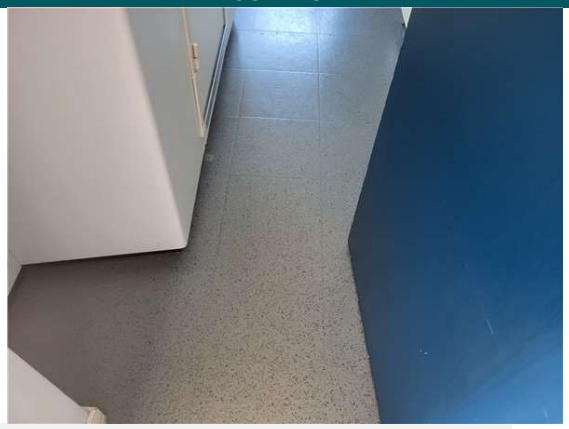

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème lot 302 - Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P081


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème lot 302 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P082

OUVRAGE

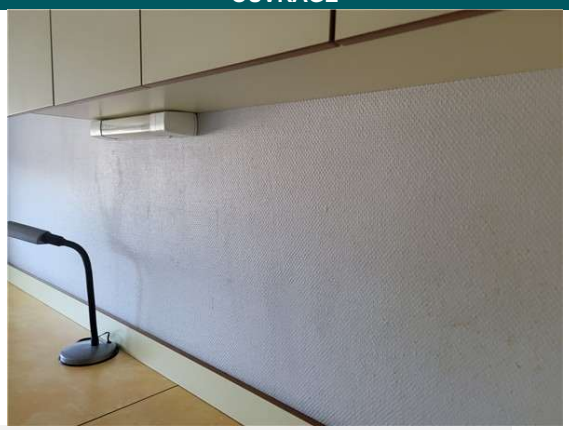

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème lot 302 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P083

OUVRAGE

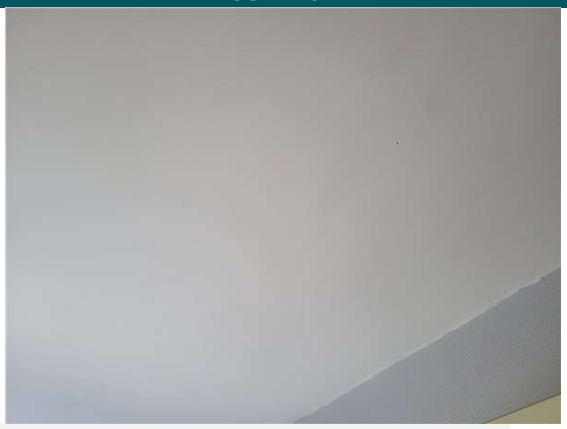


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème lot 302 - Chambre	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P084

OUVRAGE

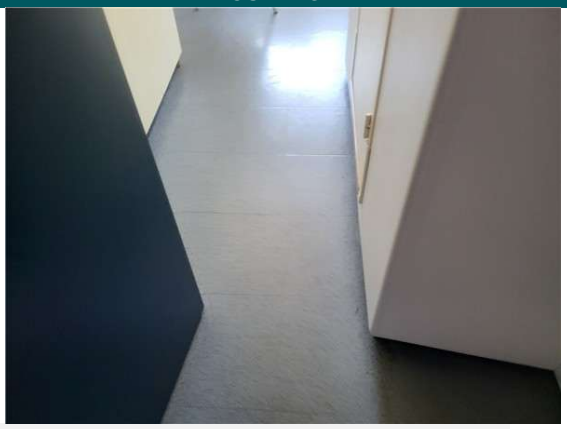

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème lot 303 - Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P085

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème lot 303 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P086

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème lot 303 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P087


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème lot 303 - Chambre	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P088

OUVRAGE

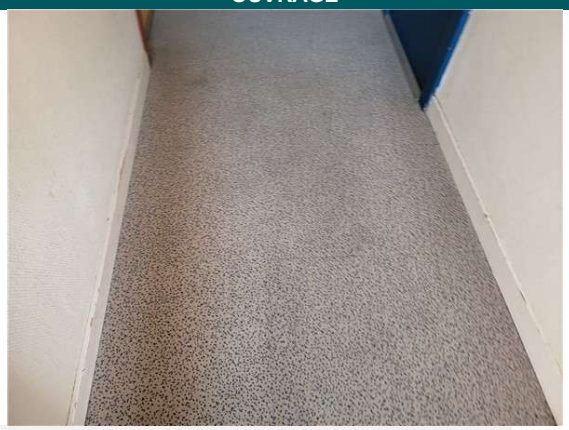

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Circulation	Revêtements de sols	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P089
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




PRELEVEMENT : P090
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P091
OUVRAGE

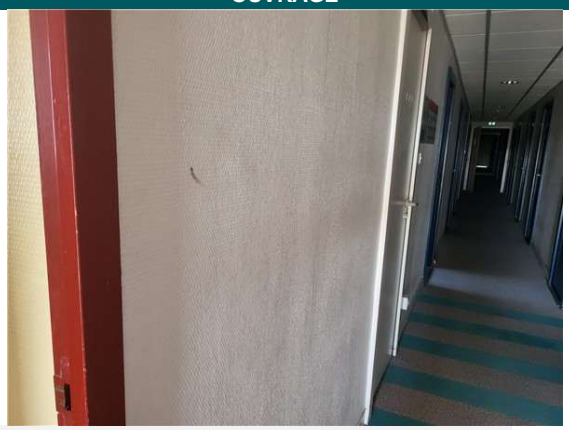

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Circulation	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P092

OUVRAGE

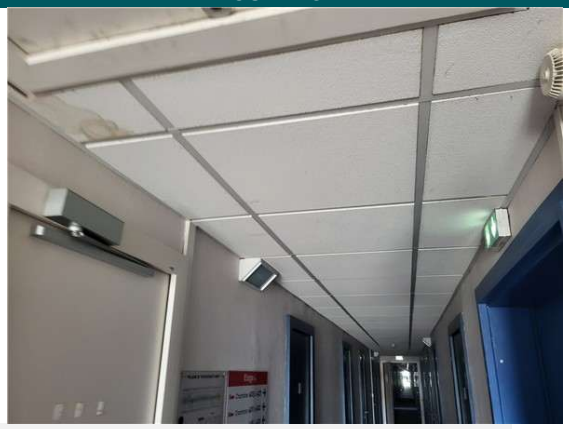

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Circulation	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P093


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Cuisine n°2	Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P094

OUVRAGE

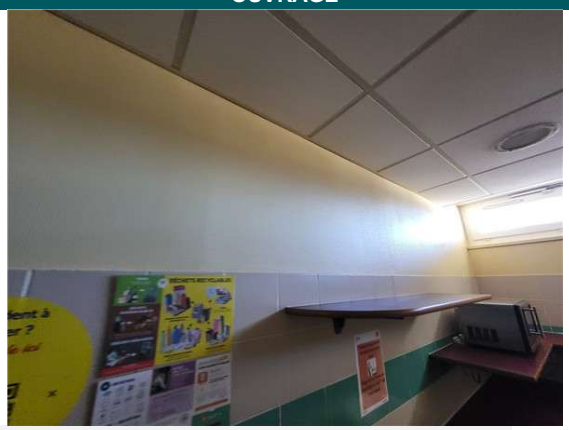

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Cuisine n°2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P095

OUVRAGE

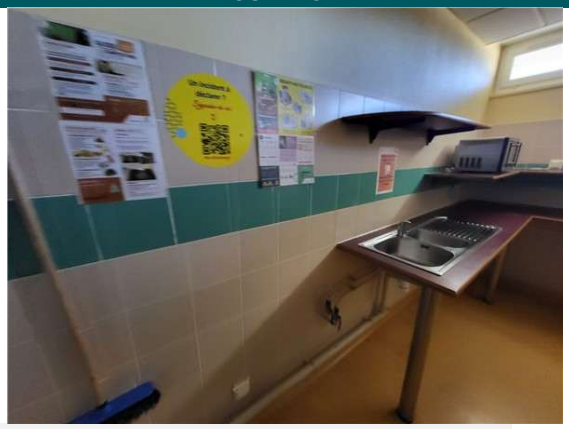

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Cuisine n°2	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P096


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Cuisine n°2	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P097

OUVRAGE

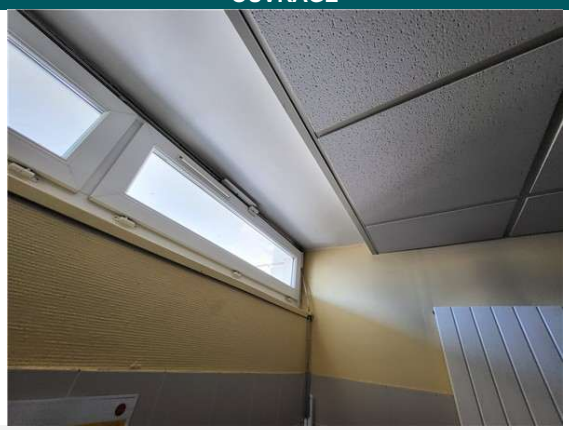

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
3ème - Cuisine n°2	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P098

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Cuisine n°1	Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P099

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Cuisine n°1	Revêtements de sols	Ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P100

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Cuisine n°1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P101

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Cuisine n°1	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P102

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Cuisine n°1	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P103

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Cuisine n°1	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P104

OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Cuisine n°1	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P105

OUVRAGE

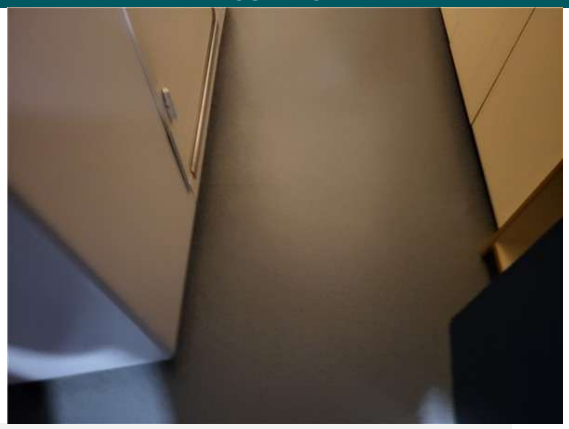


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème Lot 214 - Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P106

OUVRAGE

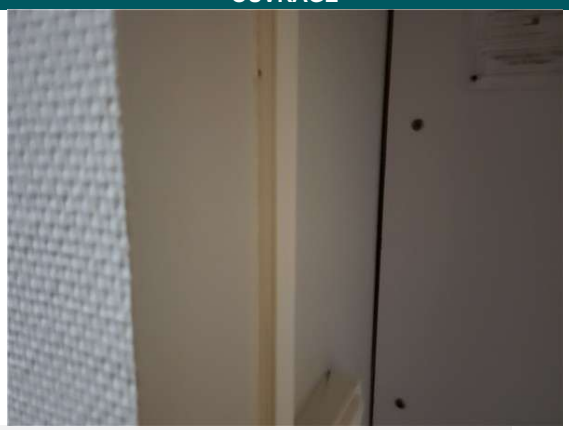

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème Lot 214 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER


Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P107
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème Lot 214 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P108
OUVRAGE

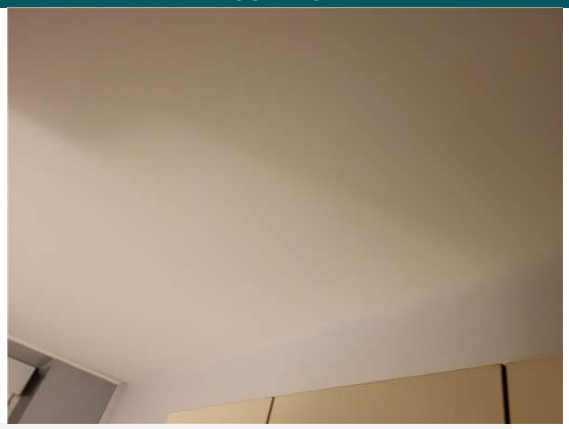

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème Lot 214 - Chambre	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P109
OUVRAGE

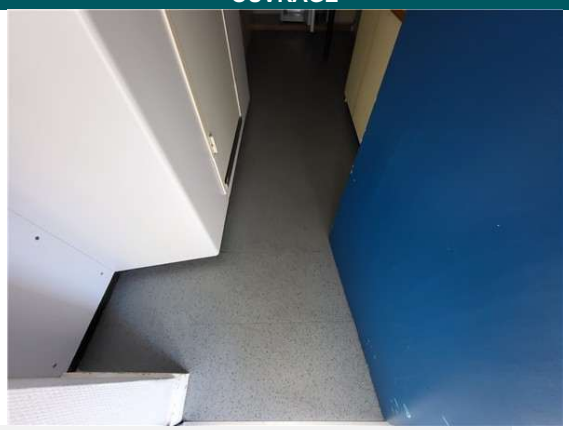


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème Lot 230 - Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P110

OUVRAGE

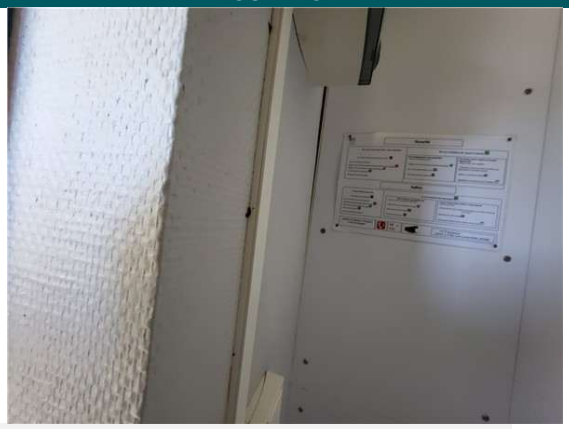


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème Lot 230 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P111

OUVRAGE

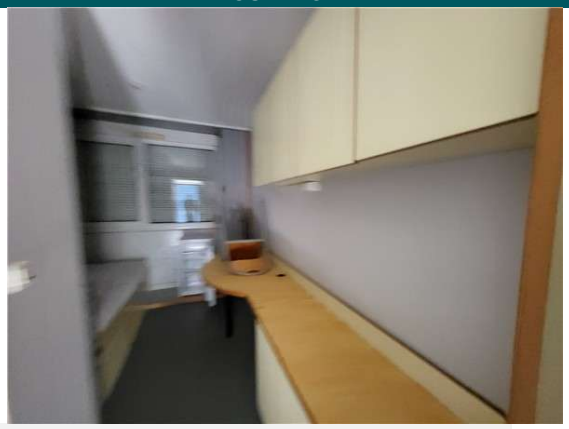


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème Lot 230 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P112

OUVRAGE

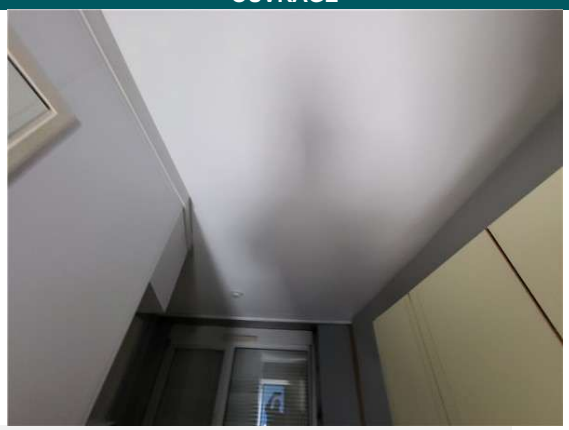

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème Lot 230 - Chambre	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P113


OUVRAGE

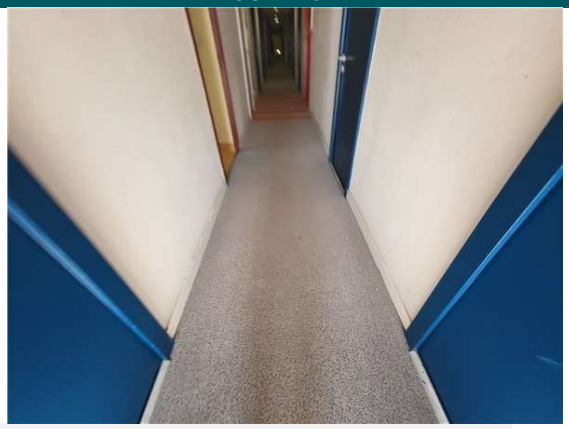

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Revêtements de sols	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P114


OUVRAGE

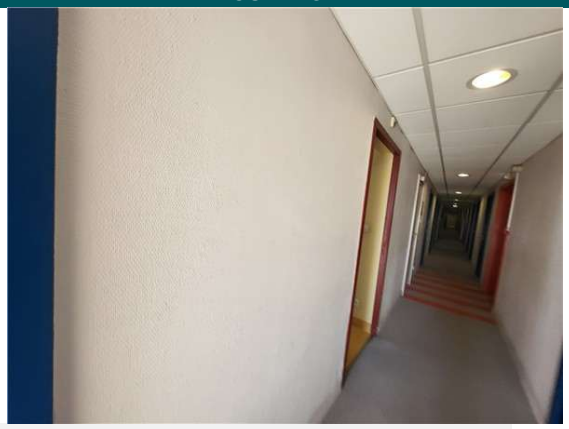

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P115

OUVRAGE

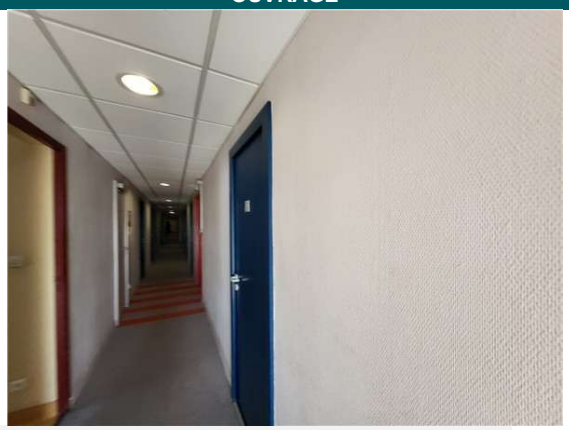

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P116


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P117


OUVRAGE

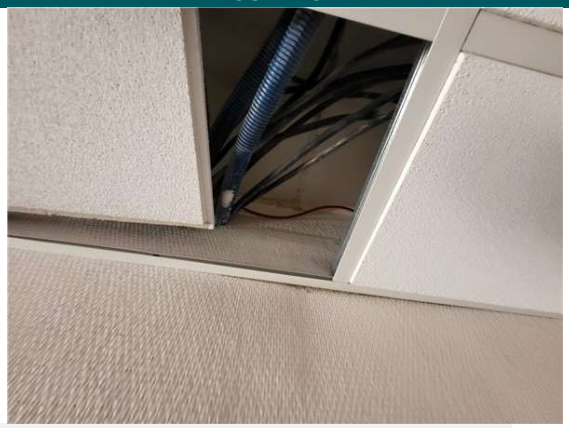

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Circulation	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P118

OUVRAGE

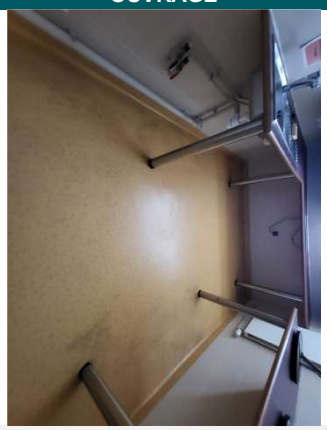

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Cuisine n°2	Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P119

OUVRAGE

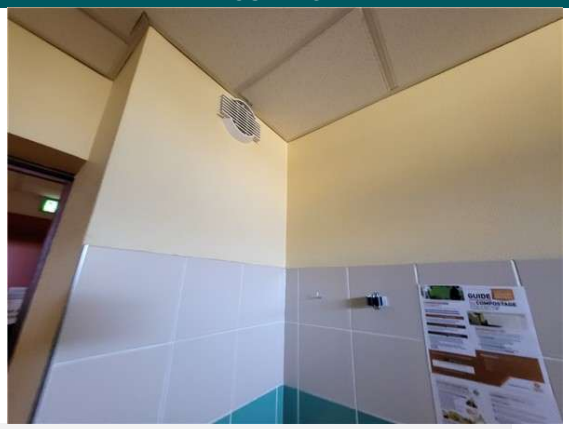

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Cuisine n°2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P120


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Cuisine n°2	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P121

OUVRAGE

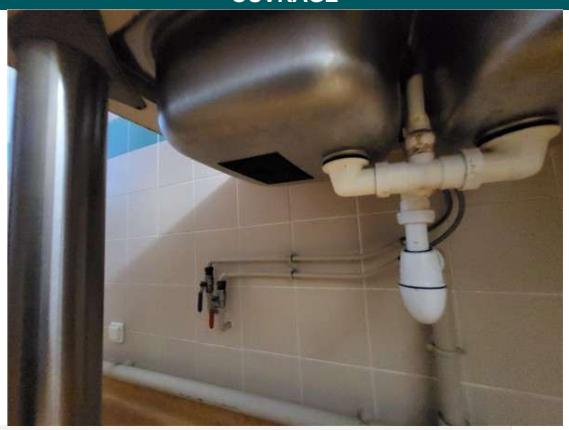

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Cuisine n°2	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P122
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
2ème - Cuisine n°2	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P123
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Cuisine n°1	Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P124
OUVRAGE

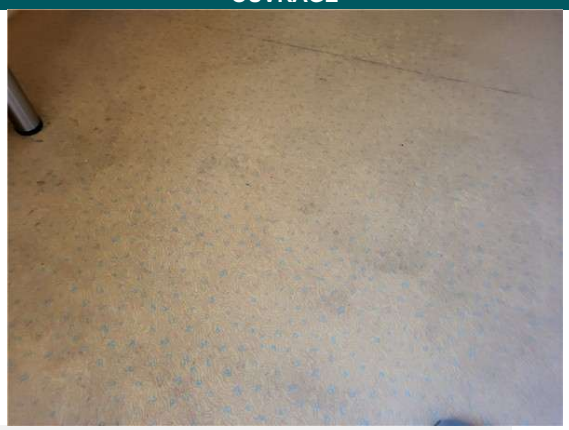


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Cuisine n°1	Revêtements de sols	Ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P125

OUVRAGE

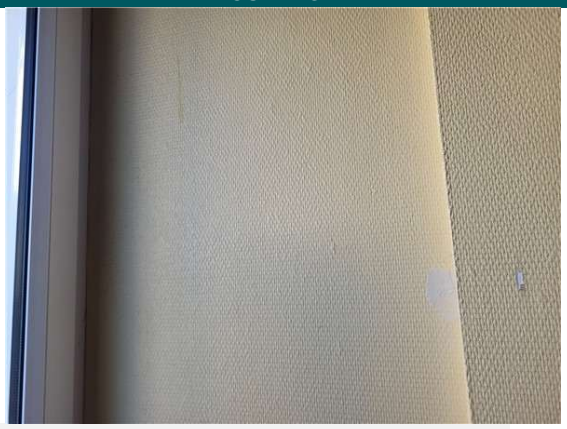

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Cuisine n°1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P126

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Cuisine n°1	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P127

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Cuisine n°1	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P128

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Cuisine n°1	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P129


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Cuisine n°1	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P130

OUVRAGE

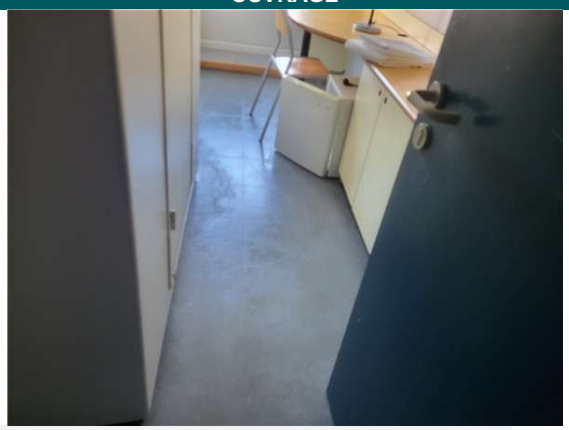

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er Lot 108 - Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P131


OUVRAGE

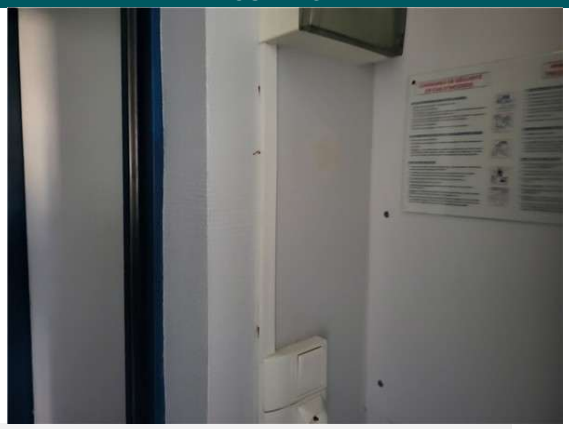

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er Lot 108 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P132

OUVRAGE

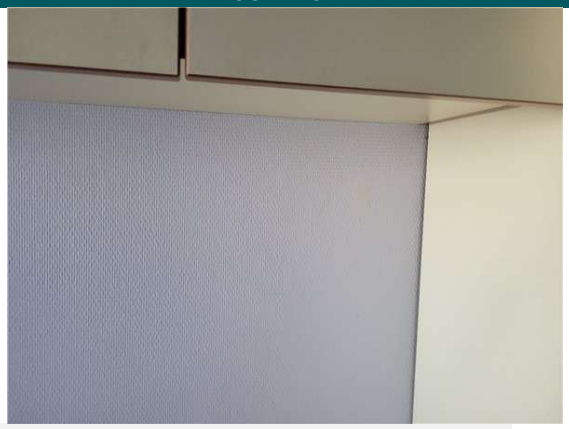

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er Lot 108 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P133

OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er Lot 108 - Chambre	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P134
OUVRAGE

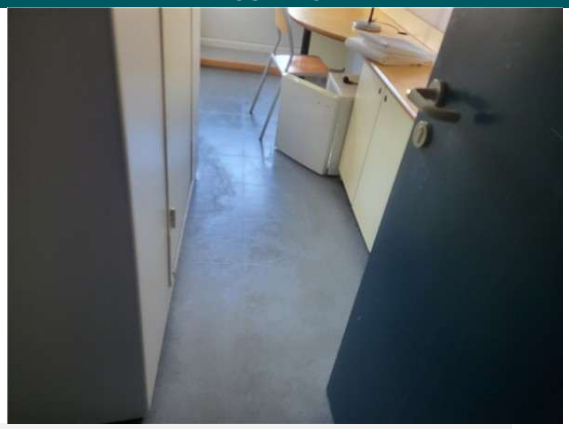


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er Lot 124 - Chambre	Revêtements de sols	Colle de revêtement bleu + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P135
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er Lot 124 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P136
OUVRAGE

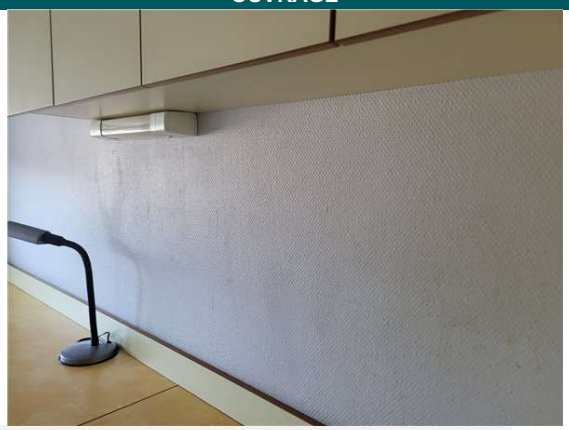

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er Lot 124 - Chambre	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

PRELEVEMENT : P137

OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er Lot 124 - Chambre	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P138

OUVRAGE

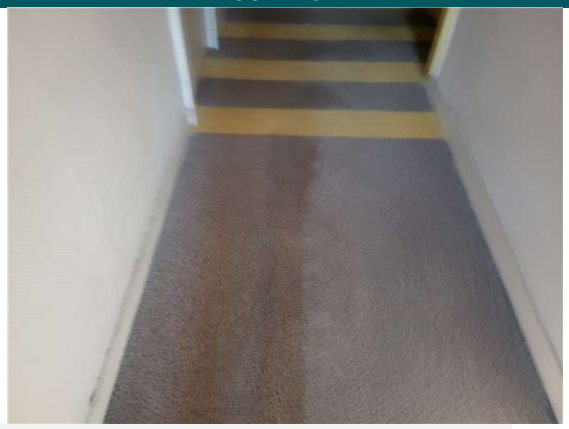


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation n°1	Revêtements de sols	Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P139

OUVRAGE

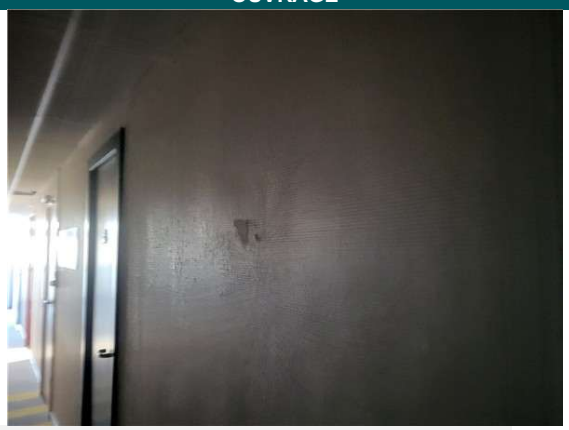

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation n°1	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P140
OUVRAGE

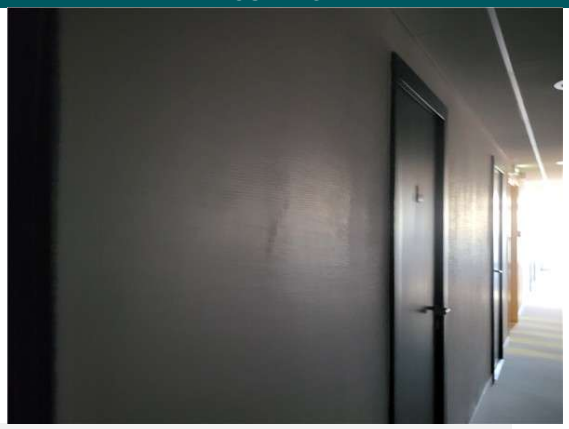

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation n°1	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P141
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation n°1	Faux plafonds	Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P142
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Circulation n°1	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P143

OUVRAGE

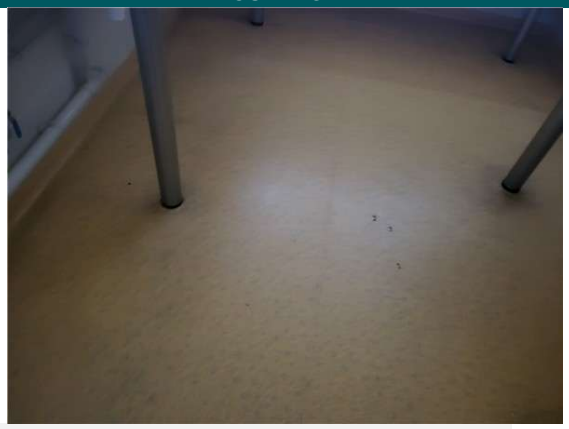


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Cuisine n°2	Revêtements de sols	Colle de revêtement souple + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P144

OUVRAGE

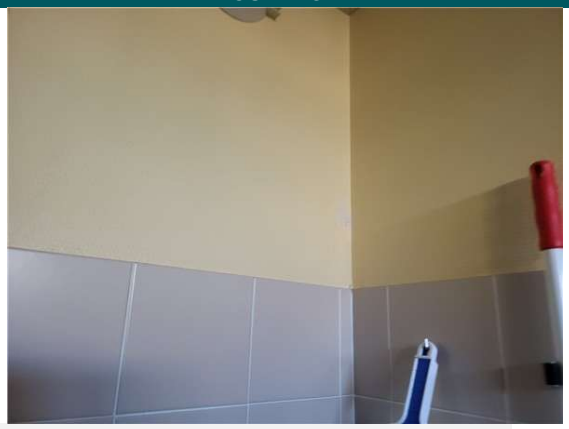


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Cuisine n°2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P145

OUVRAGE

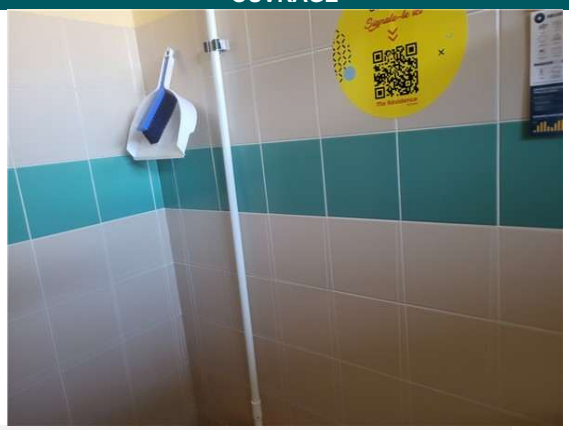

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Cuisine n°2	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 20x20 grise	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P146

OUVRAGE

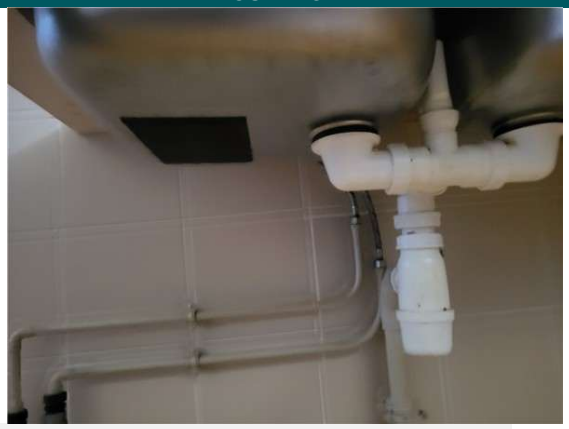


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Cuisine n°2	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P147

OUVRAGE

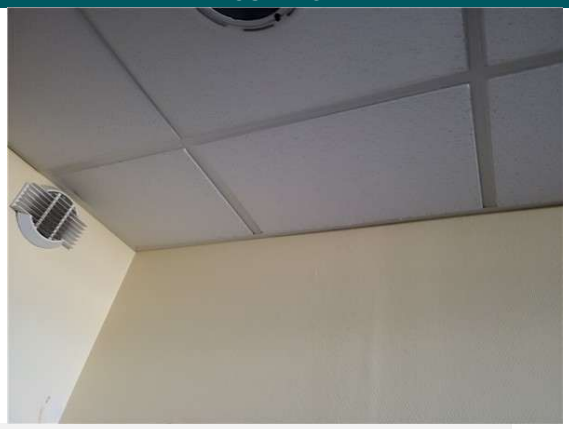

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Cuisine n°2	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P148

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°1	Revêtements de sols n°1 Marche	Colle de revêtement bleu	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P149


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°1	Revêtements de sols n°1 Contre marche	Colle de revêtement bleu	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P150


OUVRAGE

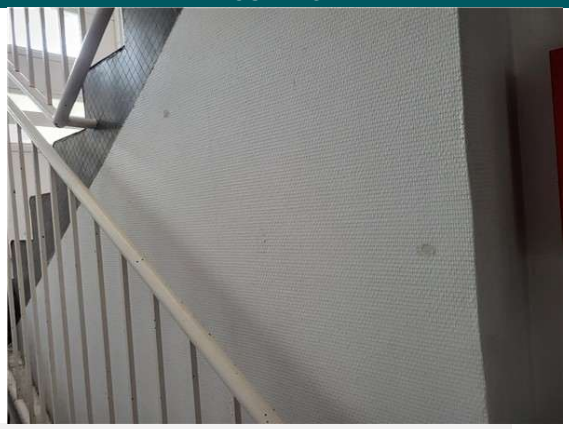

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°1	Murs et cloisons maçonnés Escalier	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P151

OUVRAGE

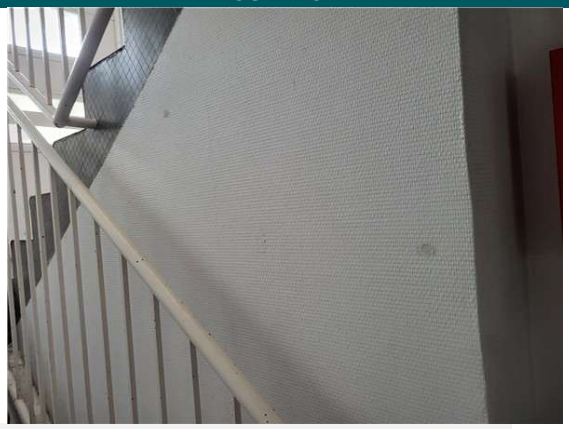

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°1	Murs et cloisons maçonnés Escalier	Peinture + plâtre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P152


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°1	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P153


OUVRAGE

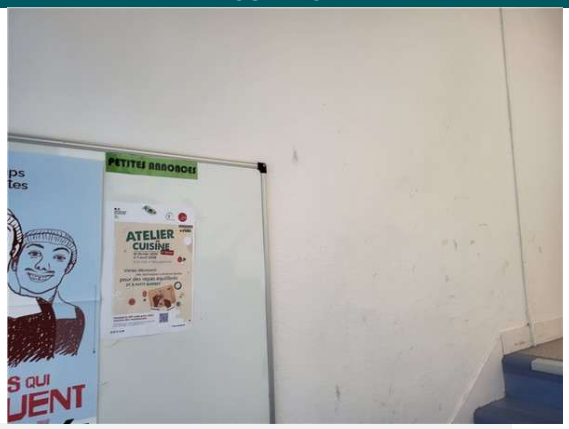

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°1	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P154

OUVRAGE

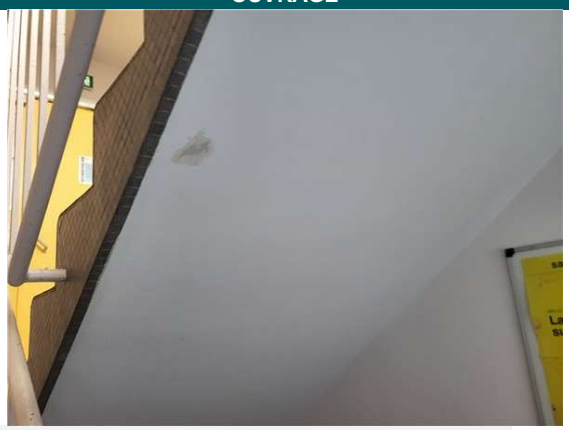

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°1	Plafonds Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P155


OUVRAGE

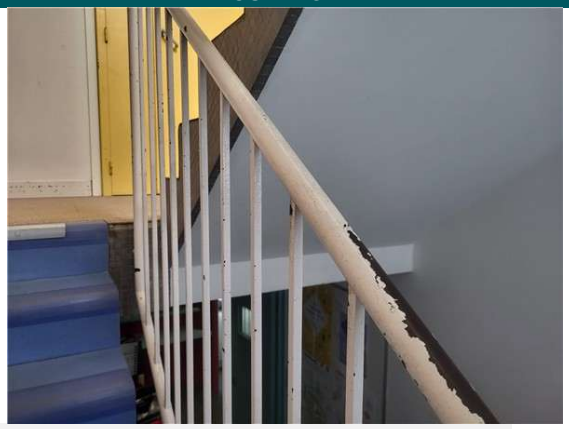

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°1	Plafonds Volée d'escalier	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P156

OUVRAGE

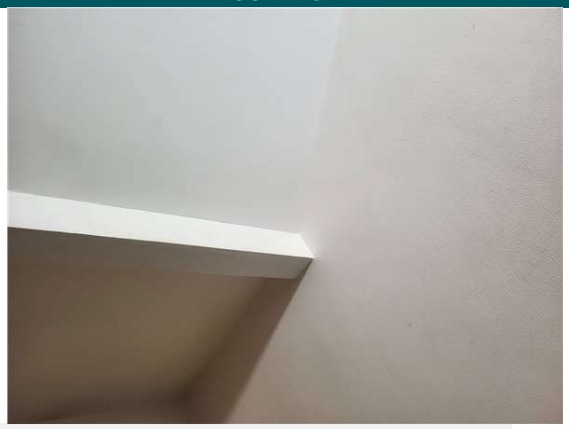

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°1	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P157

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°1	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P158


OUVRAGE

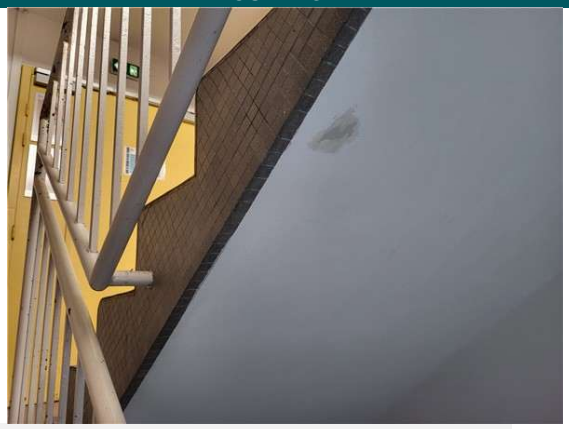

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°1	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 2x2 grises	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P159


OUVRAGE

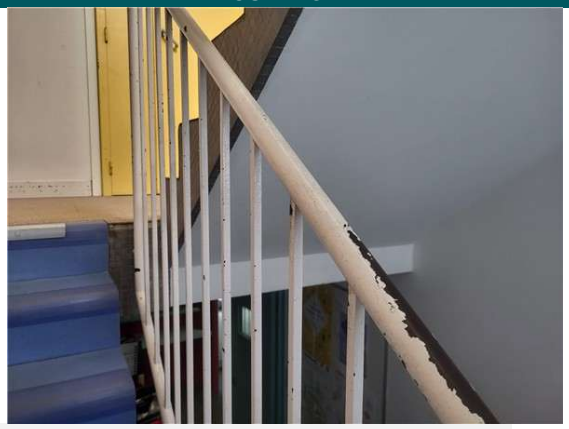

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°1	Gardes corps	Peinture	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P160

OUVRAGE

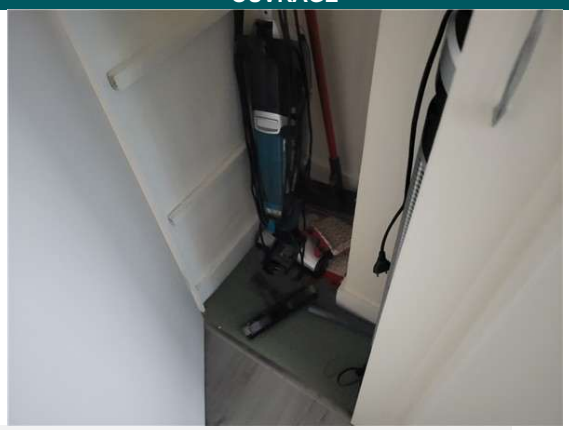

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Logement Directrice - Entrée	Revêtements de sols	Colle de carrelage marron	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P161

OUVRAGE

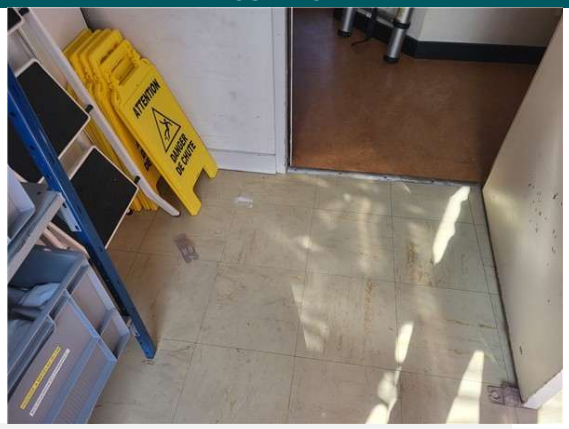

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Lingerie	Revêtements de sols n°1	Dalles de sol 30x30 beige + colle noire	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P162


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Lingerie	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P163

OUVRAGE

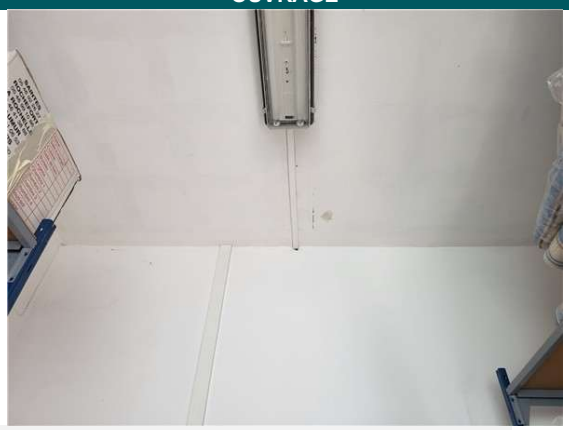


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Lingerie	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P164

OUVRAGE

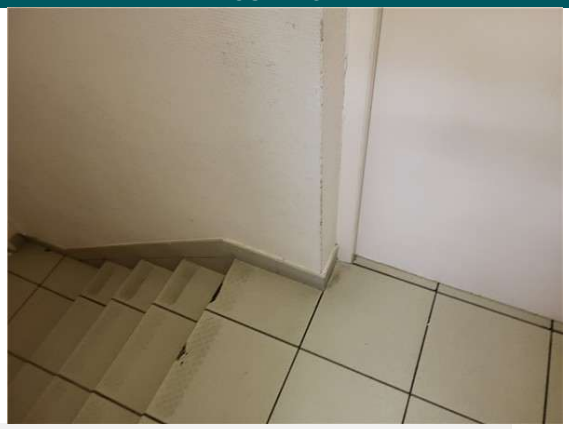

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Circulation (technique)	Revêtements de sols n°1	Colle de carrelage 30x30 grises + ragréage	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P165


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Circulation (technique)	Murs et cloisons maçonnés n°1	Colle de plinthes 10x20 grises	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P166

OUVRAGE

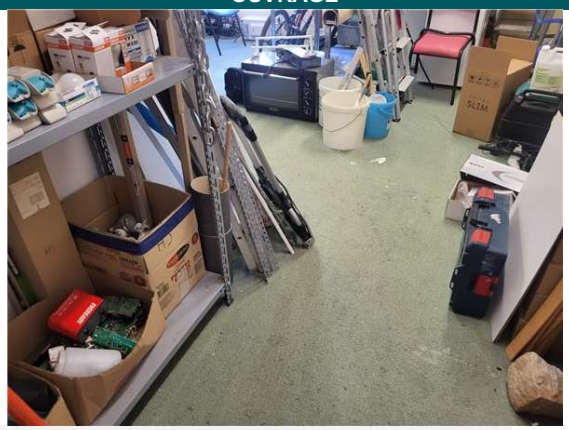

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Réserves	Revêtements de sols n°1	Peinture + enduit béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P167


OUVRAGE

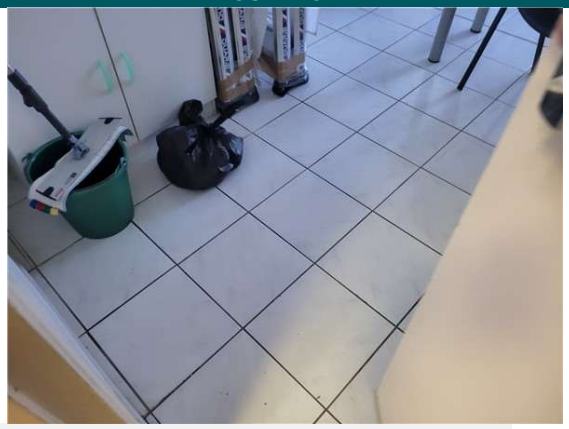

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Atelier	Revêtements de sols n°1	Colle de carrelage 20x20 blanc	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P168


OUVRAGE

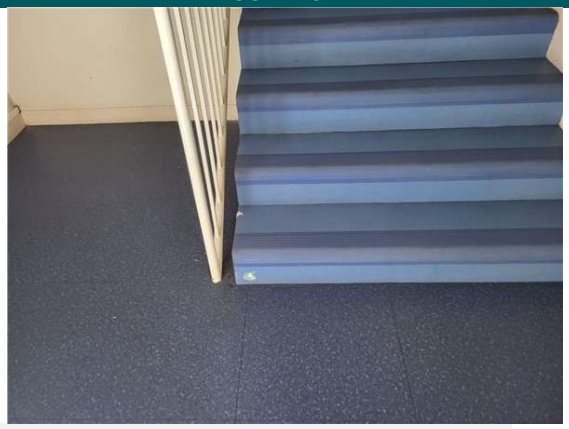

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°2	Revêtements de sols Marches	Colle de revêtement bleu	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P169

OUVRAGE

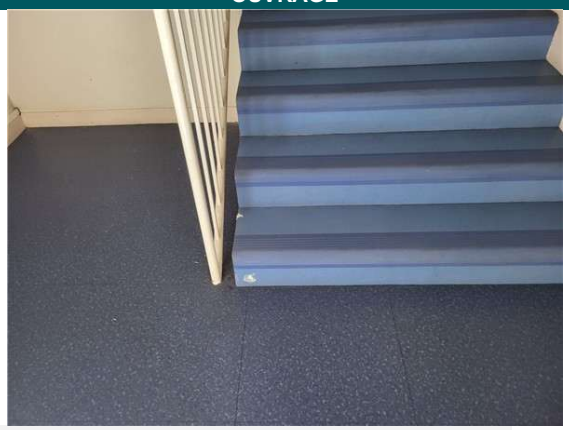

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°2	Revêtements de sols Contre marches	Colle de revêtement bleu	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P170


OUVRAGE

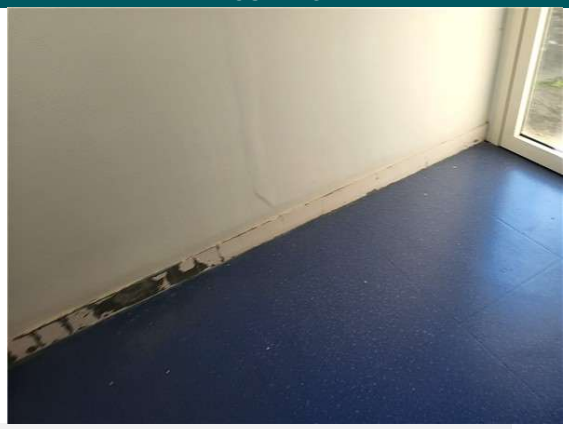

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°2	Murs et cloisons maçonnés	Colle de plinthes 10x10 grises	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P171


OUVRAGE

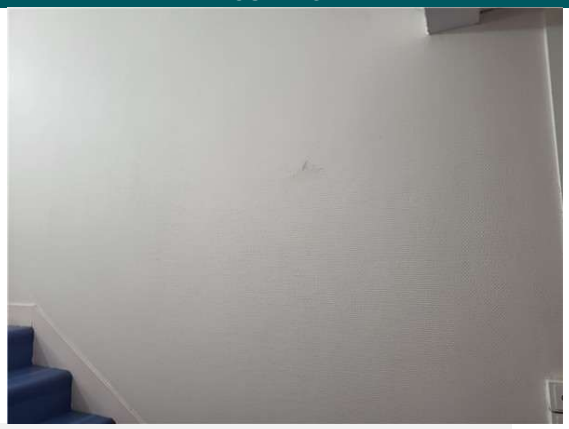

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°2	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P172

OUVRAGE

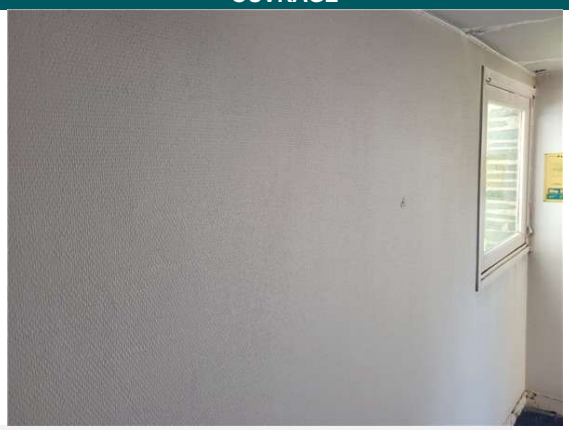

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°2	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P173


OUVRAGE

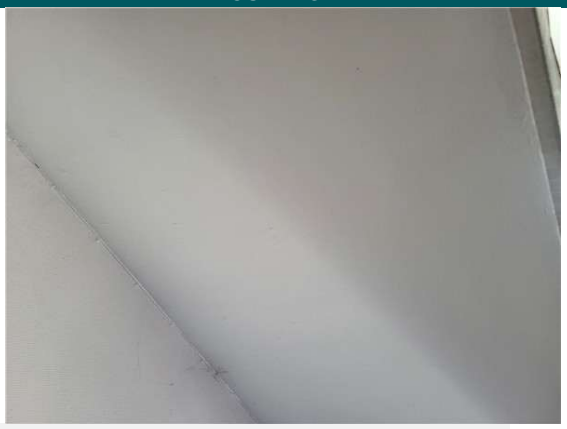

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°2	Plafonds Sous escalier	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P174


OUVRAGE

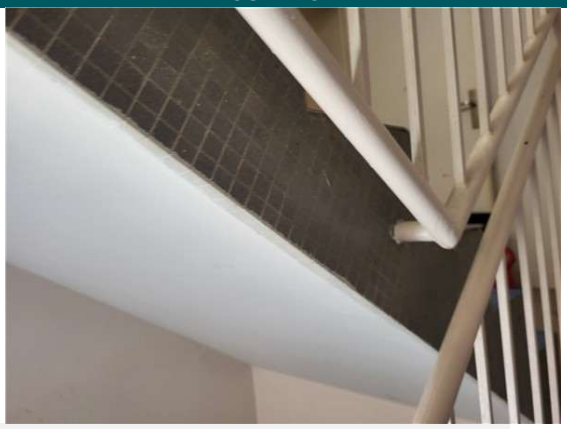

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°2	Plafonds Sous escalier	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P175

OUVRAGE

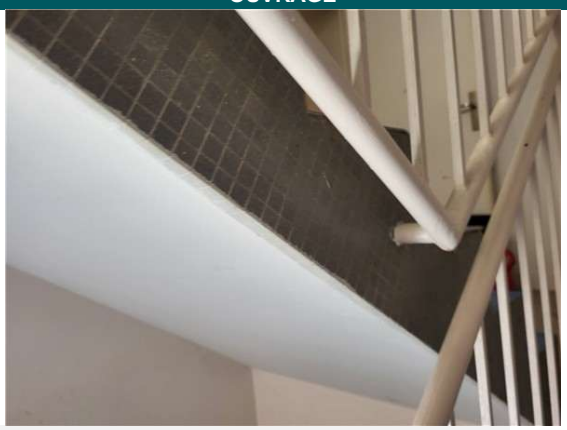

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°2	Murs et cloisons maçonnés	Colle de faïence 2x2 grises	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P176

OUVRAGE

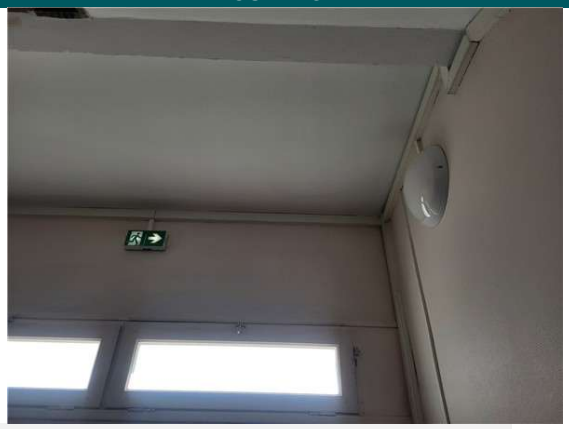


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°2	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P177

OUVRAGE

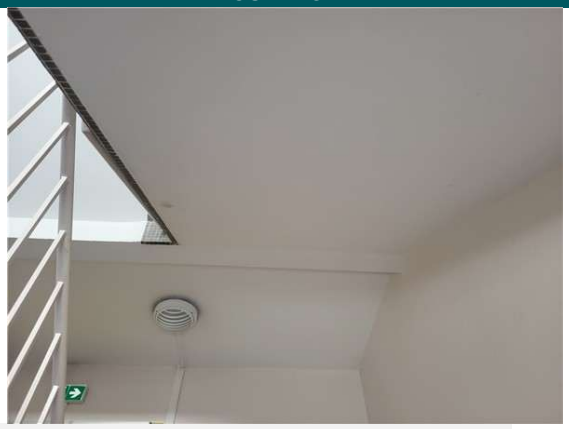


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°2	Plafonds	Peinture + enduit maigre	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P178

OUVRAGE

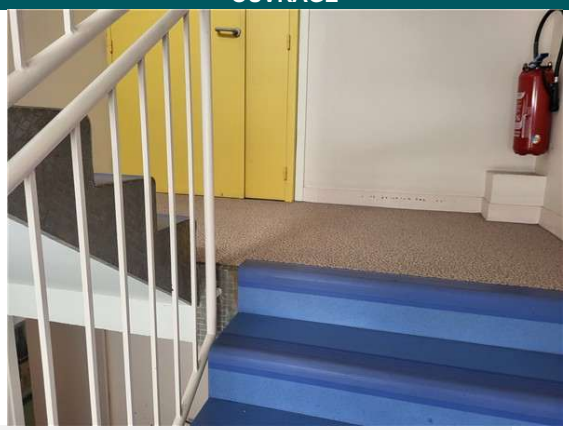

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
RDC - Cage d'escalier n°2	Gardes corps	Peinture	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P179

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er SS - Sous sol Garage vélo	Murs et cloisons maçonnés	Peinture + enduit béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P180

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er SS - Sous sol Garage vélo	Plafonds	Flocages	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P181

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
5ème - Combles	Isolation	Laine minérale + pare vapeur	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P182

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Couverture	Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P183

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Menuiseries extérieures	Plaque fibre ciment	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P184

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Menuiseries extérieures Entre bati et menuiseries	Joint blanc	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P185


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Menuiseries extérieures Entre bati et menuiseries	Joint blanc	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P186

OUVRAGE

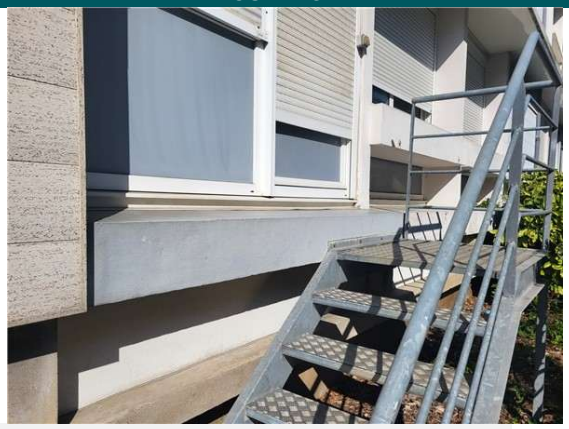

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Peinture + béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P187

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Peinture + béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P188

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit Béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P189


OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduit Béton	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

PRELEVEMENT : P190

OUVRAGE

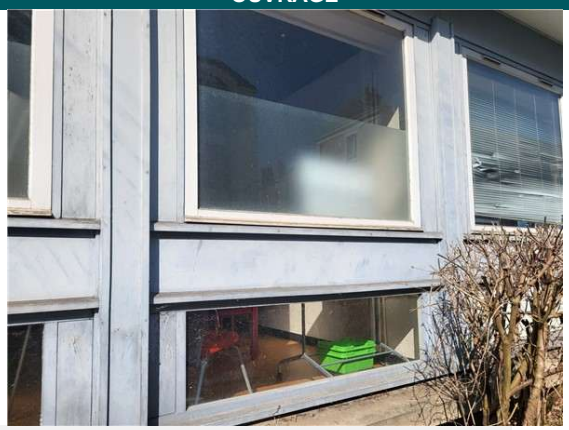

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Menuiseries extérieures	Peinture + bois	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PRELEVEMENT : P191

OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
Ext - Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Colle de carrelage 2x2 grises	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PROCES VERBAUX D'ANALYSES LABORATOIRE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

PV_00720260301779221

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

QUALICONSULT IMMOBILIER SAS
Monsieur Gwenael ADELIS
6 B Rue Alessandro Volta
44481 CARQUEFOU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page1/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Hall - - Revêtements de sols - Colle de revêtement de sol Verte + ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (vert)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - Hall - - Revêtements de sols - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	P003-RDC - Hall - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + composites	Matériau de type peinture (noir)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page2/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P004-RDC - Hall - - Poteaux - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-RDC - Hall - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - Hall - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-RDC - Hall - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page3/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	P008-RDC - Hall - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-RDC - Hall - - Faux plafonds - Isolant noir	Matériau souple (fibreux) (noir)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)(ii)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	P010-RDC - Hall - - Plafonds - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	P011-RDC - Caféteria - - Plafonds - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page4/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	P012-RDC - WC - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013 (1)	P013-Ext - Façades - - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Peinture + bois (Allèges)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014 (1)	P014-Ext - Façades - - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-RDC - Hall - - Revêtements de sols - Colle de carrelage Blanche (sous moquette)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-RDC - Caféteria - - Poteaux - Peinture + enduit maigre	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page5/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	P017-RDC - Caféteria - - Poteaux - Peinture + enduit maigre	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-RDC - WC - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur (marron)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019 (1)	P019-RDC - Hall - - Menuiseries Intérieurs - Peinture + bois	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020 (1)	P020-RDC - Hall - - Menuiseries Intérieurs - Joint coupe feu	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page6/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	P021-RDC - Caféteria - - Revêtements de sols - Colle de revêtements de sol orange + ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) ; matériau de type maillage de fibres (marron)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-RDC - WC - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïences 20x20 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-RDC - Logement gardien - Circulation - - Revêtements de sols - Colle de revêtement de sol beige tacheté + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page7/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	P024-RDC - Logement gardien - Circulation - - Revêtements de sols - Revêtement fibreux + ragréage	Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose)(i)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-RDC - Logement gardien - Séjour - - Revêtements de sols - Colle de revêtement de sol beige clair	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
026	P026-RDC - Logement gardien - Séjour - - Revêtements de sols - Dalle de sol beige + colle noire	Matériau de type colle (marron) ; matériau (poudreux) (gris) en traces	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page8/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	P027-RDC - Logement gardien - Chambre n°1 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement beige clair + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces(i)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028-RDC - Logement gardien - Chambre n°2 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement beige clair + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029-RDC - Logement gardien - Cellier - - Revêtements de sols - Colle de revêtement beige clair + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page9/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	P030-RDC - Logement gardien - Cuisine - - Revêtements de sols - Colle de carrelage 20x20 gris + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-RDC - Logement gardien - Salle de Bains - - Revêtements de sols - Colle de carrelage gris/bleu + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032-RDC - Logement gardien - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033 (1)	P033-RDC - Logement gardien - Cuisine - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page10/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	P034-RDC - Logement gardien - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035-RDC - Logement gardien - Cuisine - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036 (1)	P036-RDC - Logement gardien - Cuisine - - Plinthes - Peinture + bois	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page11/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	P037-RDC - Logement gardien - Cuisine - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
038	P038-RDC - Logement gardien - Salle de Bains - - Plinthes - Colle de plinthes 10x20 grises	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039-RDC - Logement gardien - Salle de Bains - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 10x10 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040-RDC - Logement gardien - Cellier - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanche	Matériau de type peinture (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)(iii)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page12/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041 (1)	P041-RDC - Logement gardien - Circulation - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
042 (1)	P042-RDC - Logement gardien - Séjour - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
043	P043-RDC - Logement gardien - Cuisine - - Plinthes - Colle de plinthes 10x20 grises	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
044	P044-Ext - Façades - - Menuiseries extérieures - Joint de vitrage	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
045	P045-4ème - Cuisine n°1 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement souple + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 Page13/51
Dossier N° : 26W010145 Date de réception : 16/03/2026 Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
046	P046-4ème - Cuisine n°1 - - Revêtements de sols - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
047 (1)	P047-4ème - Cuisine n°1 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
048 (1)	P048-4ème - Cuisine n°1 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page14/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	P049-4ème - Cuisine n°1 - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
050	P050-4ème - Cuisine n°1 - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
051	P051-4ème - Cuisine n°1 - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 20x20 grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
052	P052-4ème - Circulation - - Revêtements de sols - Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) + (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page15/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
053	P053-4ème - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
054	P054-4ème - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
055	P055-4ème - Cuisine n°1 - - Plafonds - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 Page16/51
Dossier N° : 26W010145 Date de réception : 16/03/2026 Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	P056-4ème - Cuisine n°1 - - Plafonds - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
057 (2)	P057-4ème - Circulation - - Faux plafonds - Laine minérale + pare vapeur	Matériau fibreux de type isolant (jaune)(iv)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
058	P058-4ème - Circulation - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
059 (1)	P059-Ext - Façades - - Menuiseries extérieures - Joint de vitrage	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
060	P060-4ème Lot 428 - Chambre - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page17/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
061	P061-4ème Lot 428 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
062	P062-4ème Lot 428 - Chambre - - Plafond - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 Page18/51
Dossier N° : 26W010145 Date de réception : 16/03/2026 Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	P063-Ext - Façades - - Menuiseries extérieures - Joint de vitrage	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
064	P064-4ème Lot 428 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
065	P065-4ème - Cuisine n°2 - - Revêtements de sols - Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (rose)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page19/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	P066-4ème - Cuisine n°2 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
067	P067-4ème - Cuisine n°2 - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 20x20 grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
068 (1)	P068-4ème - Cuisine n°2 - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
069	P069-4ème Lot 410 - Chambre - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page20/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
070	P070-4ème Lot 410 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
071	P071-4ème Lot 410 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page21/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	P072-4ème Lot 410 - Chambre - - Plafonds - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
073	P073-3ème - Cuisine n°1 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement souple + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
074	P074-3ème - Cuisine n°1 - - Revêtements de sols - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (rose)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
075 (1)	P075-3ème - Cuisine n°1 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page22/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
076	P076-3ème - Cuisine n°1 - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
077 (1)	P077-3ème - Cuisine n°1 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (poudreux) (beige)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
078	P078-3ème - Cuisine n°1 - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 20x20 grise	Matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
079 (1)	P079-3ème - Cuisine n°1 - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page23/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080	P080-3ème lot 302 - Chambre - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
081	P081-3ème lot 302 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
082	P082-3ème lot 302 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page24/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	P083-3ème lot 302 - Chambre - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
084	P084-3ème lot 303 - Chambre - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
085	P085-3ème lot 303 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page25/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	P086-3ème lot 303 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
087	P087-3ème lot 303 - Chambre - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
088	P088-3ème - Circulation - - Revêtements de sols - Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) + (noir)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
089	P089-3ème - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page26/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	P090-3ème - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
091	P091-3ème - Circulation - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
092 (1)	P092-3ème - Circulation - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
093	P093-3ème - Cuisine n°2 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement souple + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (rose)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page27/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	P094-3ème - Cuisine n°2 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
095	P095-3ème - Cuisine n°2 - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 20x20 grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
096 (1)	P096-3ème - Cuisine n°2 - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page28/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097 (1)	P097-3ème - Cuisine n°2 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
098	P098-2ème - Cuisine n°1 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement souple + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
099 (1)	P099-2ème - Cuisine n°1 - - Revêtements de sols - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
100	P100-2ème - Cuisine n°1 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau fibreux de type papier peint (vert)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page29/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
101	P101-2ème - Cuisine n°1 - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
102	P102-2ème - Cuisine n°1 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc) + (gris)(v)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
103	P103-2ème - Cuisine n°1 - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 20x20 grise	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
104	P104-2ème - Cuisine n°1 - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple bitumineux (noir)(vi)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
105	P105-2ème Lot 214 - Chambre - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page30/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
106	P106-2ème Lot 214 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(v)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
107	P107-2ème Lot 214 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
108	P108-2ème Lot 214 - Chambre - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces(v)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
109	P109-2ème Lot 230 - Chambre - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page31/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
110	P110-2ème Lot 230 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
111	P111-2ème Lot 230 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau (poudreux) (beige) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
112 (1)	P112-2ème Lot 230 - Chambre - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
113	P113-2ème - Circulation - - Revêtements de sols - Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) + (bleu)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page32/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
114 (1)	P114-2ème - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
115 (1)	P115-2ème - Circulation - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
116	P116-2ème - Circulation - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
117 (1)	P117-2ème - Circulation - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau (poudreux) (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page33/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
118	P118-2ème - Cuisine n°2 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement souple + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (rose)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
119 (1)	P119-2ème - Cuisine n°2 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
120	P120-2ème - Cuisine n°2 - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 20x20 grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page34/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
121	P121-2ème - Cuisine n°2 - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
122	P122-2ème - Cuisine n°2 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
123	P123-1er - Cuisine n°1 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement souple + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (orange)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
124	P124-1er - Cuisine n°1 - - Revêtements de sols - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (poudreux) (rose)(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page35/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
125	P125-1er - Cuisine n°1 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
126	P126-1er - Cuisine n°1 - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanche trouées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
127	P127-1er - Cuisine n°1 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)(v)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
128	P128-1er - Cuisine n°1 - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 20x20 grise	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 Page36/51
Dossier N° : 26W010145 Date de réception : 16/03/2026 Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
129	P129-1er - Cuisine n°1 - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)(v)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
130	P130-1er Lot 108 - Chambre - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
131	P131-1er Lot 108 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
132	P132-1er Lot 108 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page37/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
133	P133-1er Lot 108 - Chambre - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (gris) en traces(v)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
134	P134-1er Lot 124 - Chambre - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
135 (1)	P135-1er Lot 124 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
136	P136-1er Lot 124 - Chambre - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page38/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
137 (1)	P137-1er Lot 124 - Chambre - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (poudreux) (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
138	P138-1er - Circulation n°1 - - Revêtements de sols - Colle polymère jaune de moquette grise + ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
139	P139-1er - Circulation n°1 - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
140 (1)	P140-1er - Circulation n°1 - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page39/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
141	P141-1er - Circulation n°1 - - Faux plafonds - Dalles de faux plafonds 60x60 blanche granuleuses	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
142	P142-1er - Circulation n°1 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(v)	MET * / VGR8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
143	P143-1er - Cuisine n°2 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement souple + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (orange)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
144	P144-1er - Cuisine n°2 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Peinture + placoplâtre + enduit en zone de lissage/bande	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page40/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
145	P145-1er - Cuisine n°2 - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 20x20 grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (vii)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
146	P146-1er - Cuisine n°2 - - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
147	P147-1er - Cuisine n°2 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
148	P148-RDC - Cage d'escalier n°1 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
149	P149-RDC - Cage d'escalier n°1 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page41/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
150	P150-RDC - Cage d'escalier n°1 - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
151	P151-RDC - Cage d'escalier n°1 - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
152	P152-RDC - Cage d'escalier n°1 - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
153	P153-RDC - Cage d'escalier n°1 - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
154	P154-RDC - Cage d'escalier n°1 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page42/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
155	P155-RDC - Cage d'escalier n°1 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
156	P156-RDC - Cage d'escalier n°1 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
157	P157-RDC - Cage d'escalier n°1 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
158	P158-RDC - Cage d'escalier n°1 - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 2x2 grises	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
159	P159-RDC - Cage d'escalier n°1 - - Gardes corps - Peinture	Matériau de type peinture (beige) + (noir)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page43/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
160	P160-RDC - Logement Directrice - Entrée - - Revêtements de sols - Colle de carrelage marron	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
161	P161-RDC - Lingerie - - Revêtements de sols - Dalles de sol 30x30 beige + colle noire	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / S2MS	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
162	P162-RDC - Lingerie - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
163	P163-RDC - Lingerie - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page44/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
164	P164-RDC - Circulation (technique) - - Revêtements de sols - Colle de carrealge 30x30 grises + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
165	P165-RDC - Circulation (technique) - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de plinthes 10x20 grises	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
166	P166-RDC - Réserves - - Revêtements de sols - Peinture + enduit béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type béton (gris)(v)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
167	P167-RDC - Atelier - - Revêtements de sols - Colle de carrelage 20x20 blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
168	P168-RDC - Cage d'escalier n°2 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page45/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
169	P169-RDC - Cage d'escalier n°2 - - Revêtements de sols - Colle de revêtement bleu	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
170	P170-RDC - Cage d'escalier n°2 - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de plinthes 10x10 grises	Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
171	P171-RDC - Cage d'escalier n°2 - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
172	P172-RDC - Cage d'escalier n°2 - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
173 (1)	P173-RDC - Cage d'escalier n°2 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (poudreux) (gris) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page46/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
174 (1)	P174-RDC - Cage d'escalier n°2 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
175	P175-RDC - Cage d'escalier n°2 - - Murs et cloisons maçonnés - Colle de faïence 2x2 grises	Matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
176 (1)	P176-RDC - Cage d'escalier n°2 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
177 (1)	P177-RDC - Cage d'escalier n°2 - - Plafonds - Peinture + enduit maigre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (poudreux) (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
178 (1)	P178-RDC - Cage d'escalier n°2 - - Gardes corps - Peinture	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page47/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
179	P179-1er SS - Sous sol Garage vélo - - Murs et cloisons maçonnés - Peinture + enduit béton	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
180	P180-1er SS - Sous sol Garage vélo - - Plafonds - Flocages	Matériau friable fibreux de type flocage (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
181	P181-5ème - Combles - - Isolation - Laine minérale + pare vapeur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)(iii)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
182	P182-Ext - Couverture - - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises	Matériau dur de type ardoise (noir)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
183	P183-Ext - Façades - - Menuiseries extérieures - Plaque fibre ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page48/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
184	P184-Ext - Façades - - Menuiseries extérieures - Joint blanc	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
185	P185-Ext - Façades - - Menuiseries extérieures - Joint blanc	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
186	P186-Ext - Façades - - Façades lourdes y compris poteaux - Peinture + béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
187	P187-Ext - Façades - - Façades lourdes y compris poteaux - Peinture + béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
188	P188-Ext - Façades - - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit Béton	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page49/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
189	P189-Ext - Façades - - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit Béton	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
190 (1)	P190-Ext - Façades - - Menuiseries extérieures - Peinture + bois	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
191	P191-Ext - Façades - - Façades lourdes y compris poteaux - Colle de carrelage 2x2 grises	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page50/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(2) Des fibres minérales susceptibles d'être inhalées (l<3 µm) ont été observées au sein de la couche. Ces fibres, de nature asbestiforme, sont de type fibres minérales artificielles et ont pu être différenciées de fibres d'amiante via leurs propriétés optiques.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(ii) Des fibres minérales susceptibles d'être inhalées (l<3 µm) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres, de nature asbestiforme, sont de type fibres minérales artificielles et ont pu être différenciées de fibres d'amiante via leurs propriétés optiques.

(iii) Des fibres minérales susceptibles d'être inhalées (l<3 µm) ont été observées au sein de la couche. Ces fibres, de nature asbestiforme, sont de type fibres minérales artificielles et ont pu être différenciées de fibres d'amiante via leurs propriétés optiques.

(iv) Un matériau de type poudre noire est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

(v) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(vi) .La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(vii) Un matériau de type COLLE JAUNE est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Amiante

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-017967-01 | Date d'émission de rapport : 23/03/2026 10:40 | Page51/51
Dossier N° : 26W010145 | Date de réception : 16/03/2026 | Date d'analyse : 20/03/2026
Référence dossier Client:53664000
5364000 A - Residence Bourgonnier 19-21 Rue Lainé Laroche 49000 ANGERS - CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES



Marina RENAUD
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 51 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5697
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

DOCUMENT(S) REMI(S)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

Document : Document 1


vignault x faure
architecte
philosophe
associés

Réhabilitation énergétique de la cité universitaire Bourgonnier et de la résidence Universitaire Madeleine à Angers

Crous Nantes - Pays de la Loire

Diagnostic - Esquisse
Réunion du 29 juillet 2025

Adresse du projet
19 et 21 rue Loiné Laroche 49000 Angers

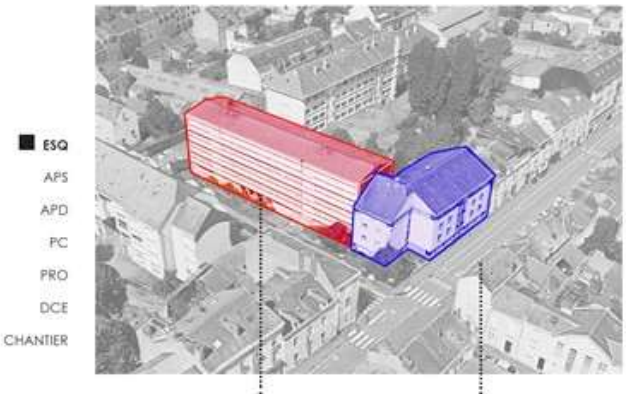

atelier vignault + faure • 23, rue Louis Lumière • 44000 NANTES • t. 02 51 25 02 48
www.vxf.fr

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


SOMMAIRE

CITÉ UNIVERSITAIRE BOURGONNIER
1/ DIAGNOSTIC
Repérage photographique p.04
Plans de niveaux p.05
Principe structurel des façades p.06
2/ ESQUISSE
Rénovation énergétique des façades p.07
Cuisines et terrasses p.08
Colorimétrie p.10

RÉSIDENCE MADELEINE
3/ DIAGNOSTIC
Repérage photographique p.11
Plans de niveaux p.12
4/ ESQUISSE
Rénovation énergétique des façades p.13

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

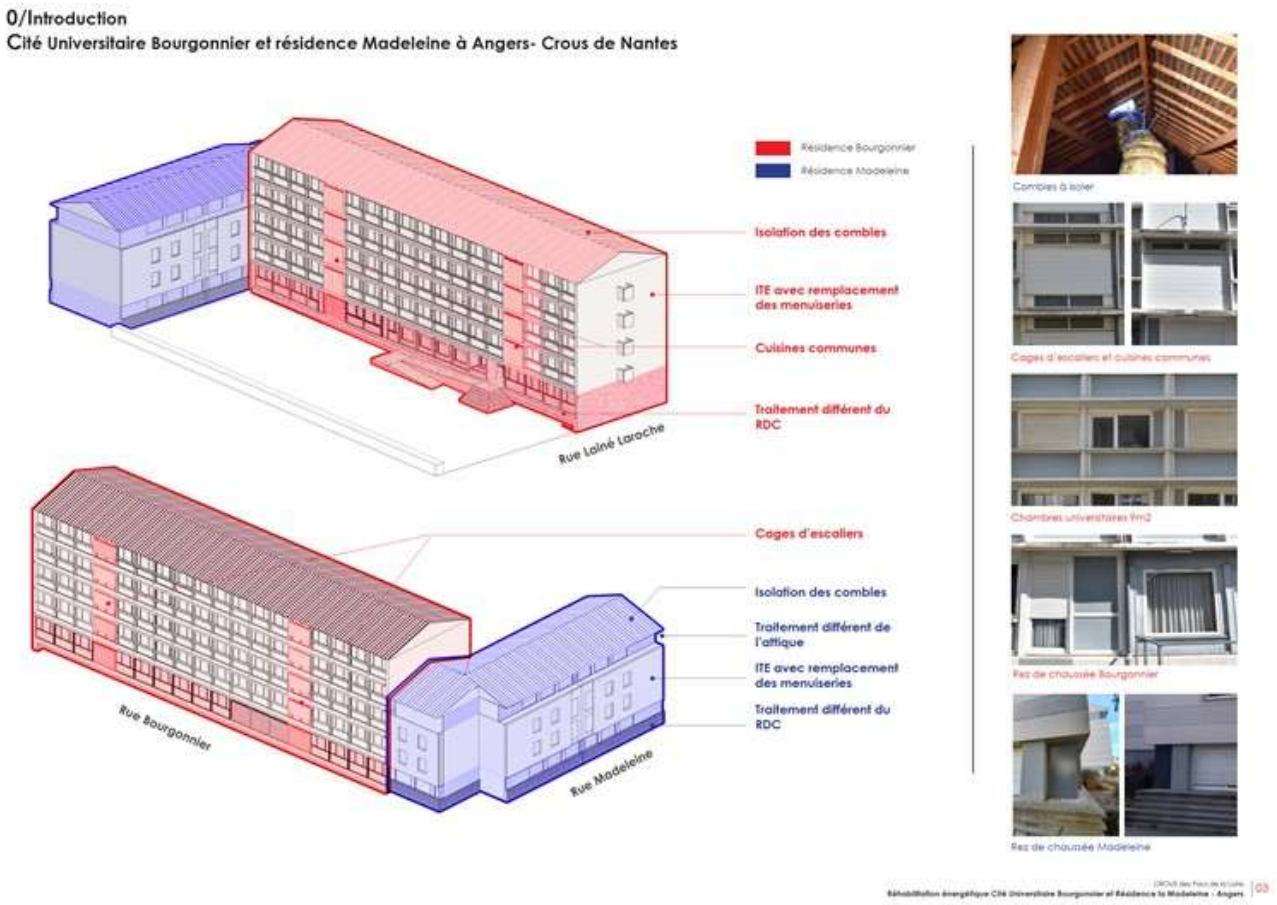


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

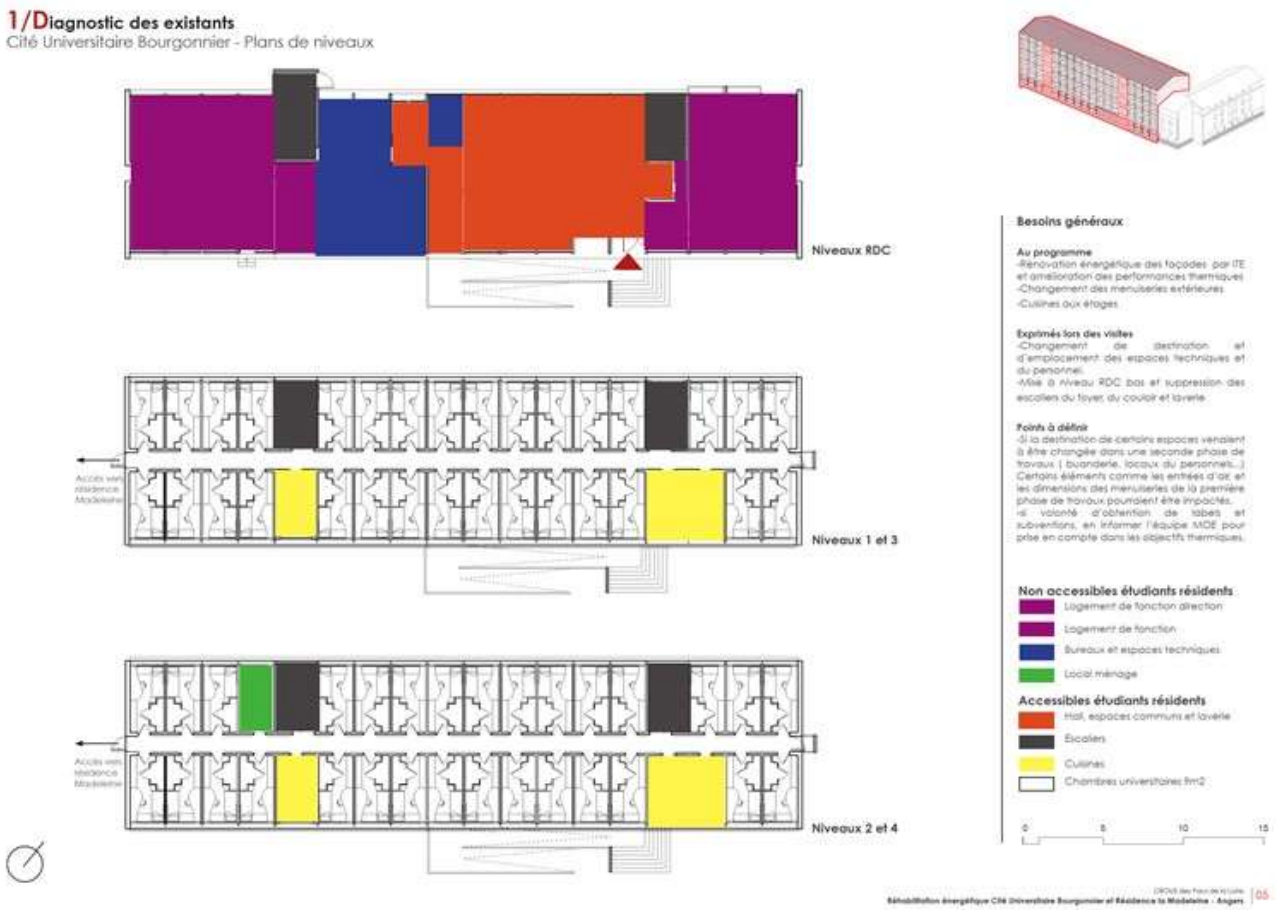


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

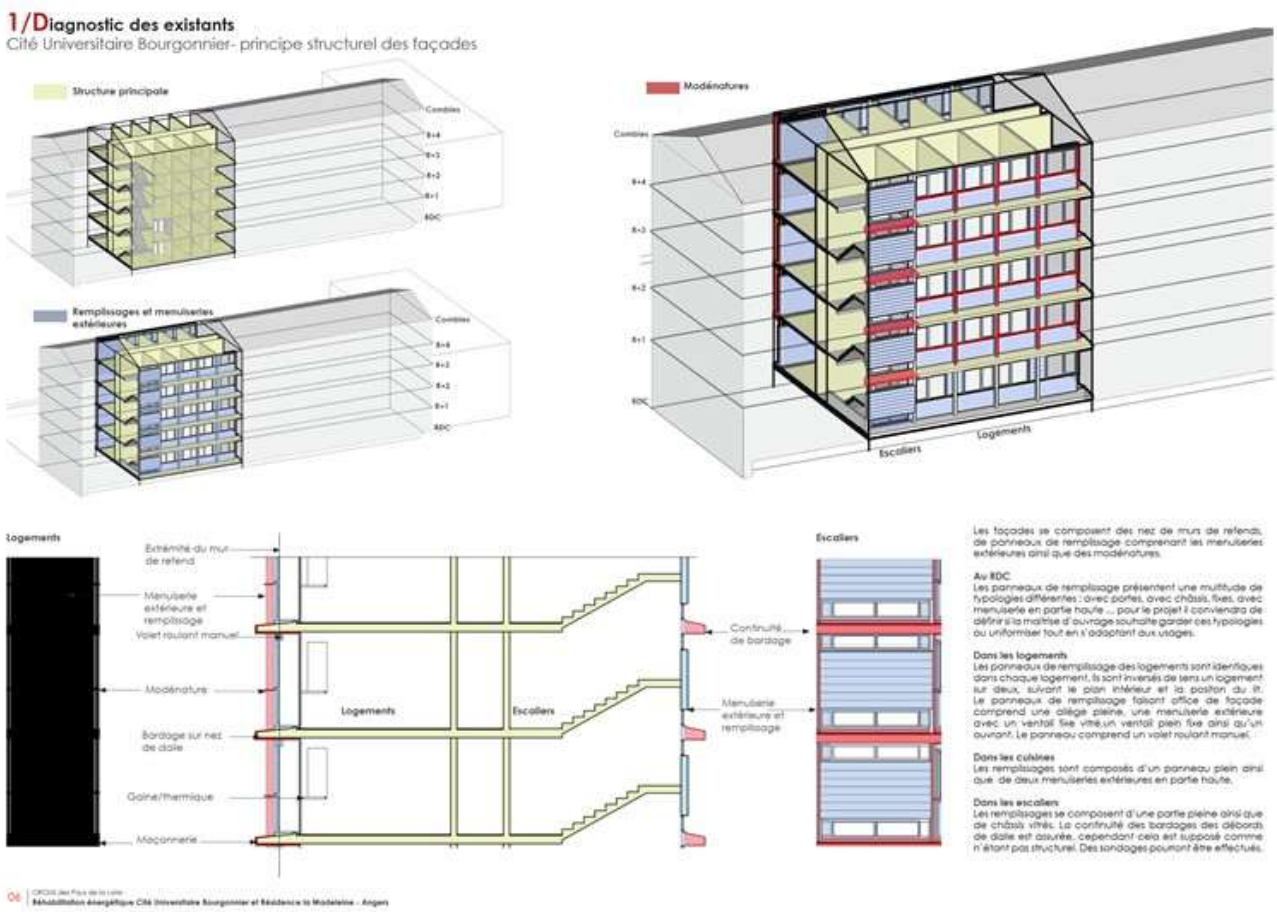

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

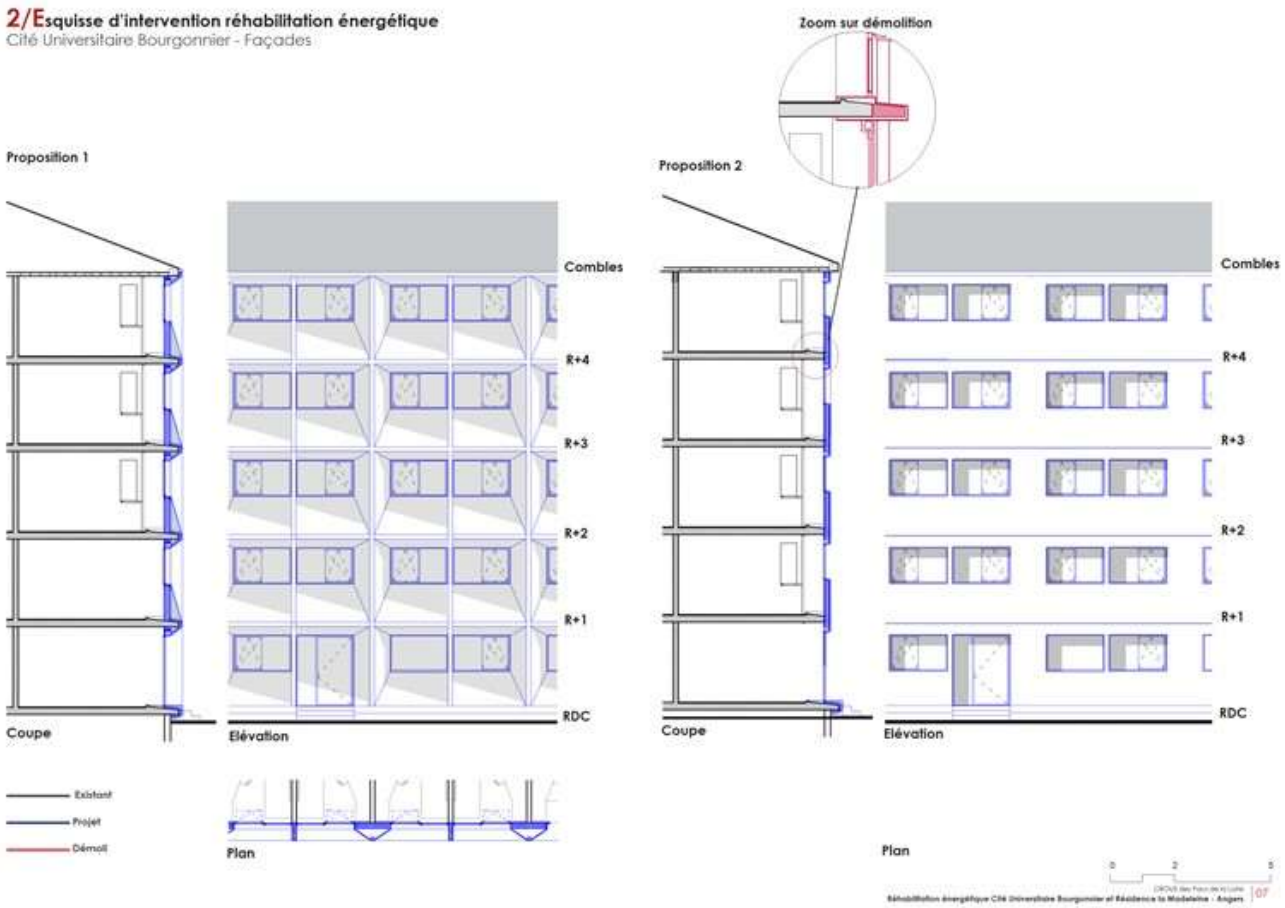


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

2/Esquisse d'intervention réhabilitation énergétique

Cité Universitaire Bourgonnier - Cuisines et terrasses

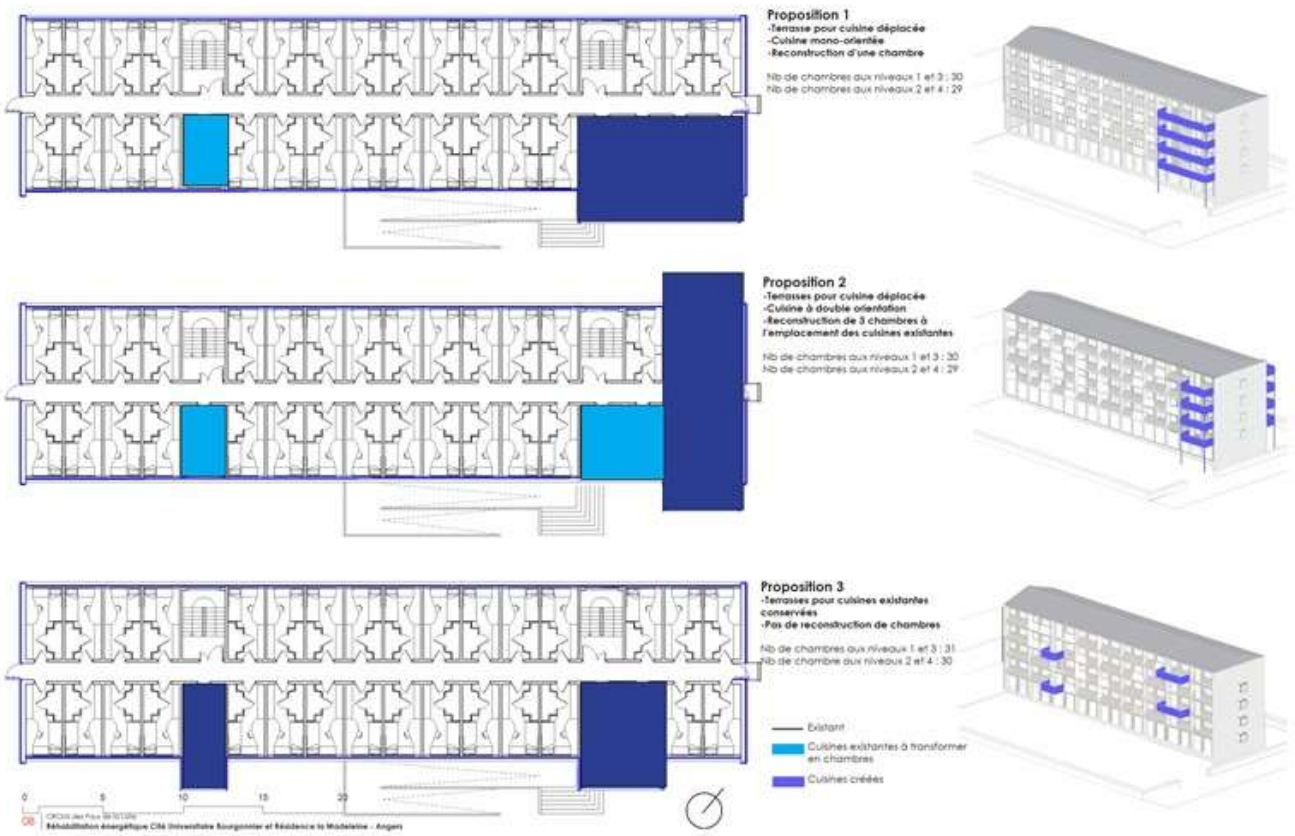


Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

2/Esquisse d'intervention réhabilitation énergétique

Cité Universitaire Bourgonnier - Cuisines et terrasses





Vue extérieure depuis le balcon
de la terrasse extérieure



Variante bardage



Vue intérieure depuis la cuisine

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

2/Esquisse d'intervention réhabilitation énergétique

Cité Universitaire Bourgonnier - Façades et colorimétrie



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293





CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293


3/Diagnostic des existants

Résidence Universitaire Madeleine - Plans de niveaux







Niveaux RDC

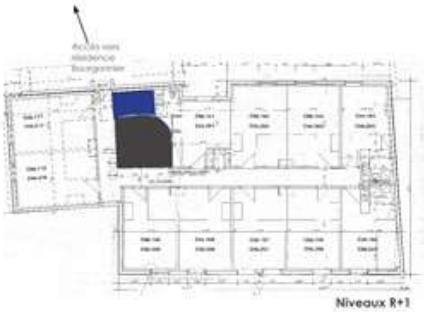

Niveaux R+1

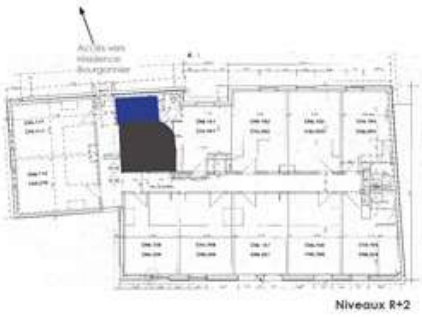

Niveaux R+2

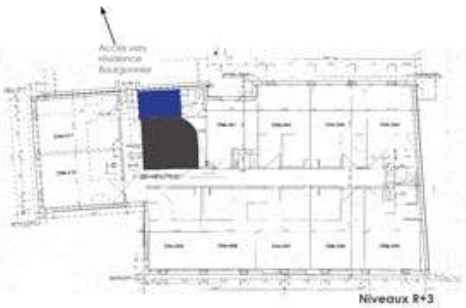

Niveaux R+3

Besoins généraux

au programme

-Rénovation énergétique des façades par ITE et amélioration des performances thermiques

-Changement des menuiseries extérieures

Non accessibles étudiants résidents

Espaces techniques

Accessibles étudiants résidents

Hall

Escaliers


Studios

0 5 10 15

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU

Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

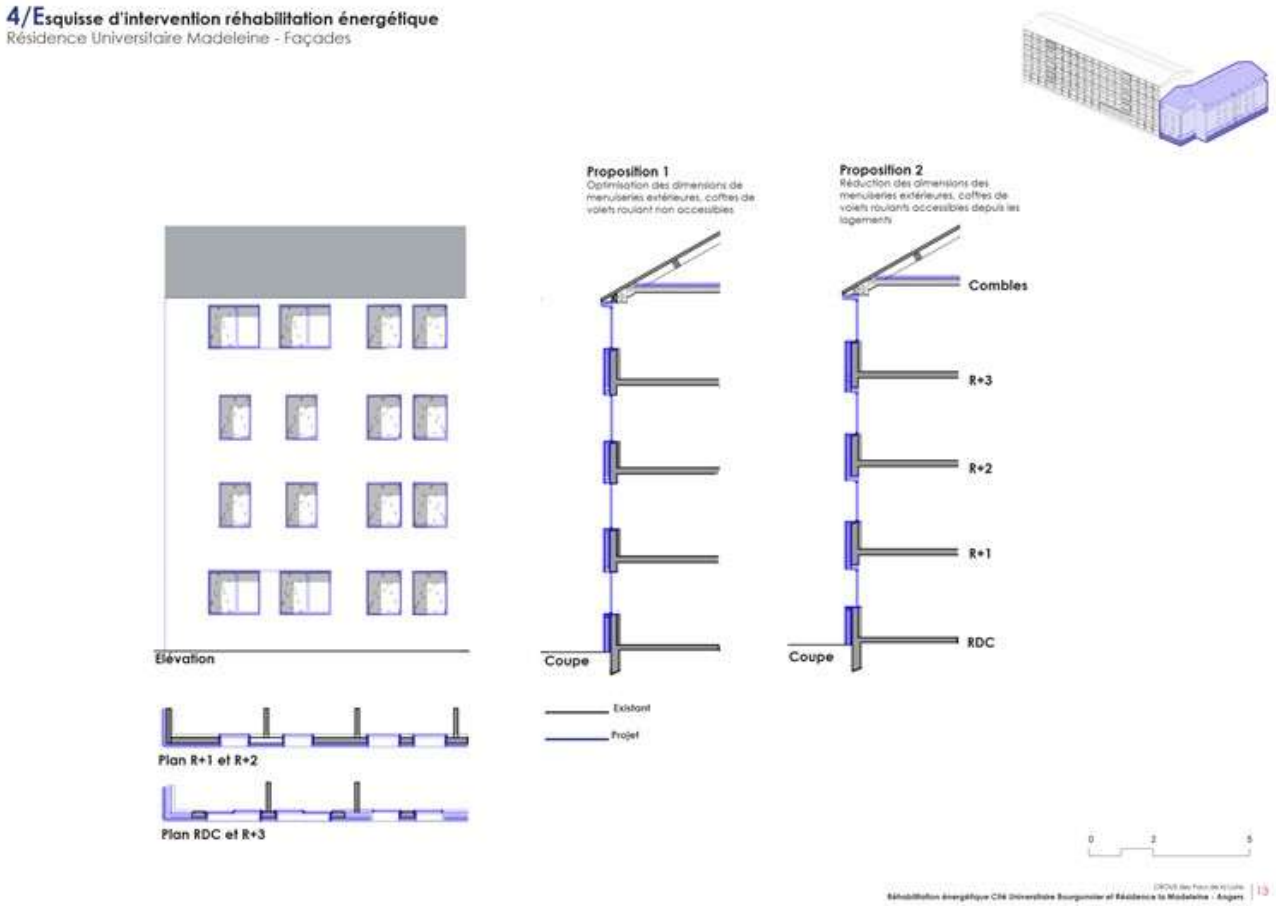

Commentaire :

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre interlocuteur
ASQUA-BTP
1B RUE DU PETIT CLAMART
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Portefeuille : 201242284

01 40 83 11 83
01 40 83 76 40

SAS QUALICONSULT IMMOBILIER
1B RUE DU PETIT-CLAMART
VELIZY PLUS
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

Vos références

Contrat
11450130004

Référence client
0899602220

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS QUALICONSULT IMMOBILIER
1B RUE DU PETIT-CLAMART
VELIZY PLUS
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

a souscrit pour son compte, le contrat n° **11450130004** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers, du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat, décrites au verso de ce document.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2026 au 01/01/2027** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **19/12/2025**
Pour la société :

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

DOMAINES	MISSIONS
AMIANTE	o Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux ou démolition (immeuble bâti / infrastructures routières - réseaux / équipements) o Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant-vente o Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - liste A et ou B o Assistance à rédaction du Dossier technique amiante, o Assistance à rédactuion du Dossier amiante partie privative (DAPP) o Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante o Contrôle visuel après travaux de traitement des matériaux contenant de l'amiante o Analyse ponctuelle en recherche d'amiante o Mesure d'empoussièrement amiante
PLOMB	o Diagnostic plomb avant travaux ou démolition o Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) o Mesure de la concentration de plomb dans les poussières au sol (avant / après travaux - hors DRIPP) o Analyse ponctuelle en recherche de plomb dans les matériaux
DECHETS	o Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la demolition ou de la renovation significative DPEMD (arrêté du 26/03/2023)
RADON	o Dépistage radon
VENTE - LOCATION	o Etat de l'installation intérieure d'électricité o Etat de l'installation intérieure de gaz o Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment o Etat relatif à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et parasites dans le bâtiment o Etat des risques et pollutions, o Mesurage Loi Carrez, o Mesurage Loi Boutin, o Etats des lieux (loi 89-462) hors réglementation « Logements décents »+B36 o Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie o Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro, o Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
ANALYSES PONCTUELLES	o Analyse ponctuelle caractérisation de la silice cristalline. o Analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 – C40) o Analyse ponctuelle en recherche de zinc o Analyse ponctuelle en recherche de Fibres Céramiques Réfractaires, o Caractérisation des HAP dans les enrobés o Analyse ponctuelle caractérisation de mâchefer
EAU	o Analyse ponctuelle potabilité de l'eau o Analyse d'eau recherche de plomb o Etat relatif à la présence et concentration de légionelles (réseau d'eau) o Diagnostic de conformité de l'installation d'Assainissement non collectif o Vérification du raccordement d'installation au réseau d'assainissement collectif
ENERGIE	o Diagnostic de performance énergétique, o Audit énergétique réglementaire selon le Décret N° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L.126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
PREVENTION DES RISQUES AMIANTE ET PLOMB	o Conseil et assistance à la rédaction de note des procédures à mettre en œuvre, et aide à la gestion et suivi documentaire pour la protection des travailleurs et du publics, lors de la réalisation de travaux sur des ouvrages susceptibles de contenir du plomb et/ou de l'amiante; o Conseil dans le domaine de la prévention des risques amiante et plomb, à l'occasion de la rédaction de pièces écrites ou de réalisation de travaux.

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult IMMOBILIER
Coordonnées de l'agence QUALICONSULT IMMOBILIER
6b, rue Volta - BP 708 - 44470 CARQUEFOU
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros – R.C. VERSAILLES 490 676 293 – SIRET 490 676 293 00023 – APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue de Petit Clamart – Vélizy Plus Bât E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – N° TVA intra-communautaire FR 56 490 676 293

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4649 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ADELIS Gwenaël

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/04/2024 - Date d'expiration : 16/04/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/04/2024 - Date d'expiration : 16/04/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 21/02/2024 - Date d'expiration : 20/02/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-6522 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev19

Amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
