RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Arrêté du 16/07/2019 modifié par l'arrêté du 23/01/2020; L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation; L.4412-2, R.4412-97 à R.4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019.
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. **Norme NF X 46-020 d'août 2017**



Nature du bâtiment	**Bâtiment**
Adresse	François Rabelais52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN
Cat. du bâtiment	Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques
Réf. Cadastrale	CK - 0002
Permis de construire	< 01-07-97
Propriétaire	HOPITAL RENE MURET
Adresse	52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN
Donneur d'ordre	APHP NORD
Adresse	46 rue Huchard 75877 PARIS CEDEX
Téléphone(s)	

Numéro de rapport	**2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2 A**		
Date de la commande	**15/09/2025**	Date du repérage	**08/10/2025 au 08/10/2025**
Date d'émission du rapport de repérage	**27/10/2025**		
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	**APHP HUPSSD - Marché de rénovation de 31 ascenseurs sur les 3 sites de Avicenne, Jean Verdier et René Muret**		

SIGNATAIRE DU RAPPORT

Signature et Visa	Opérateur de repérage :
	CHAN Jacobi COVEANEX - Groupe SODIATEC Le 27/10/2025

Le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il doit adresser à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

Rappel de la conclusion (détails, voir chapitre 4)

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE
SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
SOMMAIRE 2
TERMES ET DÉFINITIONS 3
DESCRIPTION DE LA MISSION 5
OBJET DE LA MISSION 5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES 5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE 5
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE 5
PROGRAMME DE TRAVAUX 5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE 6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) 6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 6
CONCLUSIONS 8
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPERES 8
INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE 8
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 8
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 8
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 8
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 8
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO) 8
RESULTATS DU REPERAGE 15
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE 15
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 16
COMMENTAIRE SUR LA MISSION 18
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 18
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 19
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 30
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE 36
PV_00720251001670346 36
PV_00720251001670411 42
ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS 44
DOCUMENT 1 44
DOCUMENT 2 45
DOCUMENT 3 46
DOCUMENT 4 47
DOCUMENT 5 48
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE 90
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 91

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

TERMES ET DÉFINITIONS

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. **(Source : Norme NF X 46-020)**

Couche d'un produit ou d'un matériau	Élément d'un matériau ou produit pouvant être distingué des autres éléments par l'examen visuel ou par l'analyse
Démolition	Opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment
Donneur d'ordre	Toute personne physique ou morale qui commande une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti. Cette personne peut être le propriétaire, le syndic, un locataire, une entreprise, un maître d'ouvrage, un chef d'établissement, etc.
Échantillon	Partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d'un prélèvement, et ayant vocation à être analysée en laboratoire Partie limitée d'un ouvrage de référence qui est utilisée pour le représenter et le cas échéant, comparer ses propriétés à celles d'autres parties d'ouvrage, en vue de caractériser une zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)
Inspection visuelle	Recherche visuelle en vue d'identifier, parmi les parties d'ouvrages présentes dans l'immeuble, les matériaux ou produits prévus par le programme de repérage de la mission
Investigation approfondie	Action nécessaire à l'inspection visuelle de la composition externe ou interne d'un ouvrage ou d'un volume. Les investigations approfondies sont de deux types : - investigation approfondie destructive qui nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau ou qui fait perdre sa fonction à l'ouvrage
Investigation approfondie non destructive Investigation approfondie complémentaire	Investigation devant être réalisée juste avant ou entre les différentes étapes des travaux y compris démolition. Ce type d'investigation est très exceptionnel et doit être justifié. Dans ce cas l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs dans son rapport
Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante	Matériau ou produit dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée NOTE 1 Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante. NOTE 2 On distingue les matériaux et les produits comme suit : Produit : manufacturé, standardisé, mis en oeuvre en l'état (exemple : dalles de sol, dalles de FP…) ; Matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en oeuvre, suite à une préparation à pied d'œuvre (exemple : flocage, enduits, peintures, revêtements bitumineux…)
Matériau ou produit contenant de l'amiante	Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante NOTE Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit contenant de l'amiante.
Opérateur de repérage	Personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d'une commande
Ouvrage	Résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique dans un immeuble bâti. Un ouvrage peut comporter une ou plusieurs parties NOTE 1 Les ouvrages à considérer sont les composants de la construction, classés en listes. NOTE 2 Au titre du code de la santé publique, un ouvrage est désigné comme un composant
Partie d'ouvrage	Matériau ou produit dont la destination est d'être incorporé à l'immeuble bâti selon des méthodes ou des montages prédéterminés et dont la présence est indispensable pour qualifier la constitution d'un ouvrage NOTE Au titre du code de la santé publique, une partie d'ouvrage est désignée comme une partie de composant.
Périmètre de repérage	Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage
Prélèvement	Acte de prélever une partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Programme de repérage	Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage dépend des exigences de la réglementation, des objectifs du donneur d'ordre et locaux impactés de façon directe ou indirecte (zones de stockage, cheminements, locaux adjacents…)
Programme de travaux	Document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de la zone d'intervention : zone de travaux effectifs
Repérage	Mission visant à rechercher, dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, puis à identifier et localiser ceux qui en contiennent NOTE Selon la mission, le repérage peut comprendre également l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Sondage	Action qui permet de s'assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage NOTE 1 Au moment du sondage, la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux ne sont pas nécessairement connues. NOTE 2 Le sondage n'est pas un prélèvement.
Zone présentant des similitudes d'ouvrage (« ZPSO »)	Partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

1 DESCRIPTION DE LA MISSION

1.1 OBJET DE LA MISSION

Références de l'ordre de mission : **2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2**

1.2 IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES

Propriétaire de l'immeuble	HOPITAL RENE MURET
Demeurant	52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN
Représenté par	
Commanditaire du repérage	APHP NORD
Opérateur ayant réalisé le repérage	Monsieur CHAN Jacobi
Nom et adresse de l'entreprise	COVEANEX - Groupe SODIATEC 28 Avenue des Pépinières 94260 FRESNES
N° de Siret	81437986300032
RCP-compagnie-n° de police	AXA FRANCE IARD -10583931804

1.3 IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE

Dénomination	François Rabelais
Adresse complète	52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN
Référence Cadastrale	CK - 0002

1.4 IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE

Date du PC		Date de construction	
Type et Fonction principale du bien	Bâtiment	Tertiaire	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné	Aucun		
Historique du site	Non communiqué		

2 PROGRAMME DE TRAVAUX

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit

Référence	
Description succincte	Cabine Portes Paliers (sol et mur).

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

3 CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE

3.1 PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION)

Parties d'immeuble concernées

N° local	Parties d'immeuble visitées	Etage	Statut
1	Palier asc.R2 n°1	S01	Concernée
2	Palier asc.R3 n°1	S01	Concernée
3	Palier asc.R4 n°1	S01	Concernée
4	Palier asc.R2 n°2	RDC	Concernée
5	Palier asc.R3 n°2	RDC	Concernée
6	Palier asc.R4 n°2	RDC	Concernée
7	Palier asc.R2 n°3	Etage Courant	Concernée
8	Palier asc.R3 n°3	Etage Courant	Concernée
9	Palier asc.R4 n°3	Etage Courant	Concernée
10	Machinerie Asc.R2	R04	Concernée
11	Machinerie Asc.R3	R04	Concernée
12	Machinerie Asc.R4	R04	Concernée
13	Gaine asc. R2	Etage Courant	Concernée
14	Gaine asc. R3	Etage Courant	Concernée
15	Gaine asc. R4	Etage Courant	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux , conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 et du tableau A.1 de la norme NFX 46-020 de 2017 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Colles non bitumineuses	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques			
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P	
	Panneaux des cloisons palières	P	
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	P	
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P	
	Isolants	P	
	Colles	M	
	Joints	P	
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P	
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P	
	Tresses	P	
	Joints plats	P	

3.2 RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES

Date	Référence	Conclusions
25/08/2025	2025-12785	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

4 CONCLUSIONS

COMMENTAIRE :

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme de travaux transmis par le donneur d'ordre.

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPERES

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Réf ZPSO	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification Estimative	Photo
7	Palier asc.R2 n°3	Etage Courant	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Résidu Colle bitumineuse	Z017	S004	Document consulté	5 m²	
8	Palier asc.R3 n°3	Etage Courant	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Résidu Colle bitumineuse	Z017	S002	Document consulté	5 m²	

INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE

Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles

Aucun

5 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1 DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE

Date	Objet
08/10/2025	Visite du périmètre de diagnostic.

5.2 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020

Aucun

5.3 CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

Néant

5.4 LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO)

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les **Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages** suivantes :

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Zones présentant des similitudes d'ouvrage avec présence d'amiante

Z017 - Sol Résidu Colle bitumineuse - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée :

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification estimative	Photo
7	Palier asc.R2 n°3	Etage Courant	**Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Résidu Colle bitumineuse**		S004	Document consulté		
8	Palier asc.R3 n°3	Etage Courant	**Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Résidu Colle bitumineuse**	X	S002	Document consulté		

Zones présentant des similitudes d'ouvrage sans présence d'amiante

Z001 - Dalle - socle béton Enduit ciment - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
10	Machinerie Asc.R2	R04	Dalle - socle béton - 05 - Planchers et planchers techniques - Enduit ciment	X		P001	
11	Machinerie Asc.R3	R04	Dalle - socle béton - 05 - Planchers et planchers techniques - Enduit ciment			P001(cf.)	
12	Machinerie Asc.R4	R04	Dalle - socle béton - 05 - Planchers et planchers techniques - Enduit ciment			P001(cf.)	

Z002 - Sol Chape ciment - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
10	Machinerie Asc.R2	R04	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment	X		P002	
11	Machinerie Asc.R3	R04	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment			P002(cf.)	
12	Machinerie Asc.R4	R04	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment			P002(cf.)	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Z003 - Mur Enduit de rebouchage - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
10	Machinerie Asc.R2	R04	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage	X		P003	
11	Machinerie Asc.R3	R04	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage			P003(cf.)	
12	Machinerie Asc.R4	R04	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage			P003(cf.)	

Z004 - Mur ext. Enduit - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
10	Machinerie Asc.R2	R04	Dalle de toiture - Rive de toit - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Enduit			P004	
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Enduit	X		P005	
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Enduit			P006	
11	Machinerie Asc.R3	R04	Dalle de toiture - Rive de toit - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Enduit			P005(cf.)	
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Enduit			P005(cf.)	
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Enduit			P005(cf.)	
12	Machinerie Asc.R4	R04	Dalle de toiture - Rive de toit - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Enduit			P005(cf.)	
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Enduit			P005(cf.)	
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Enduit			P005(cf.)	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Z005 - Dalle toiture Etanchéité - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
10	Machinerie Asc.R2	R04	Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Etanchéité	X		P007	
11	Machinerie Asc.R3	R04	Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Etanchéité			P007(cf.)	
12	Machinerie Asc.R4	R04	Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Etanchéité			P007(cf.)	

Z006 - Embrasure porte palières Enduit gris Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Palier asc.R2 n°1	S01	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture	X		P009	
2	Palier asc.R3 n°1	S01	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture			P009(cf.)	
3	Palier asc.R4 n°1	S01	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture			P009(cf.)	
4	Palier asc.R2 n°2	RDC	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture			P009(cf.)	
5	Palier asc.R3 n°2	RDC	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture			P009(cf.)	
6	Palier asc.R4 n°2	RDC	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture			P009(cf.)	
7	Palier asc.R2 n°3	Etage Courant	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture			P009(cf.)	
8	Palier asc.R3 n°3	Etage Courant	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture			P009(cf.)	
9	Palier asc.R4 n°3	Etage Courant	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture			P009(cf.)	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Z007 - Mur Enduit - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
15	Gaine asc. R4	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit	X		P010	

Z008 - Sol - seuil de portes palières Chape ciment blanc - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
13	Gaine asc. R2	Etage Courant	Sol - seuil de portes palières - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment blanc			P011(cf.)	
14	Gaine asc. R3	Etage Courant	Sol - seuil de portes palières - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment blanc			P011(cf.)	
15	Gaine asc. R4	Etage Courant	Sol - seuil de portes palières - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment blanc	X		P011	

Z009 - Mur Enduit de rebouchage - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
13	Gaine asc. R2	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage			P012(cf.)	
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage			P012(cf.)	
14	Gaine asc. R3	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage			P012(cf.)	
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage			P012(cf.)	
15	Gaine asc. R4	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage			P013	
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage	X		P012	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Z010 - Sol - fosse cuvette Chape ciment - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
13	Gaine asc. R2	Etage Courant	Sol - fosse cuvette - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment			P014(cf.)	
14	Gaine asc. R3	Etage Courant	Sol - fosse cuvette - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment			P014(cf.)	
15	Gaine asc. R4	Etage Courant	Sol - fosse cuvette - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment	X		P014	

Z011 - Mur soubassement Enduit ciment taloché - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
15	Gaine asc. R4	Etage Courant	Mur soubassement - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit ciment taloché	X		P015	

Z012 - Bardage - bâti portes palières Colle mortier de scellement - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
13	Gaine asc. R2	Etage Courant	Bardage - bâti portes palières - 03 - Parois verticales intérieures - Colle mortier de scellement			P016(cf.)	
14	Gaine asc. R3	Etage Courant	Bardage - bâti portes palières - 03 - Parois verticales intérieures - Colle mortier de scellement			P016(cf.)	
15	Gaine asc. R4	Etage Courant	Bardage - bâti portes palières - 03 - Parois verticales intérieures - Colle mortier de scellement	X		P016	

Z013 - Lucarne Mastic vitrage - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
10	Machinerie Asc.R2	R04	Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mastic vitrage			P017(cf.)	
11	Machinerie Asc.R3	R04	Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mastic			P017(cf.)	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
			vitrage				
12	Machinerie Asc.R4	R04	Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mastic vitrage	X		P017	

Z014 - Mur Enduit - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
4	Palier asc.R2 n°2	RDC	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit			P018(cf.)	
5	Palier asc.R3 n°2	RDC	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit			P018(cf.)	
6	Palier asc.R4 n°2	RDC	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit			P018(cf.)	
7	Palier asc.R2 n°3	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit			P018(cf.)	
8	Palier asc.R3 n°3	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit	X		P018	
9	Palier asc.R4 n°3	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit			P018(cf.)	

Z015 - Sol Ragréage - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
4	Palier asc.R2 n°2	RDC	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage - Colle ciment			P019(cf.)	
5	Palier asc.R3 n°2	RDC	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage - Colle ciment			P019(cf.)	
6	Palier asc.R4 n°2	RDC	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage - Colle ciment			P019(cf.)	
7	Palier asc.R2 n°3	Etage Courant	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage			P019(cf.)	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
8	Palier asc.R3 n°3	Etage Courant	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage	X		P019	

Z016 - Sol Lino - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
7	Palier asc.R2 n°3	Etage Courant	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Lino		S003		
8	Palier asc.R3 n°3	Etage Courant	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Lino	X	S001		

6 RESULTATS DU REPERAGE

6.1 RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE

Type de document	Statut	Document
Programme de travaux	remis	Programme de travaux

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

6.2 LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
1	Palier asc.R2 n°1	S01	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	Non
2	Palier asc.R3 n°1	S01	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture	Résultat d'analyse (P009(cf.))	Non
3	Palier asc.R4 n°1	S01	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture	Résultat d'analyse (P009(cf.))	Non
4	Palier asc.R2 n°2	RDC	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture	Résultat d'analyse (P009(cf.))	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit	Résultat d'analyse (P018(cf.))	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage - Colle ciment	Résultat d'analyse (P019(cf.))	Non
5	Palier asc.R3 n°2	RDC	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture	Résultat d'analyse (P009(cf.))	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit	Résultat d'analyse (P018(cf.))	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage - Colle ciment	Résultat d'analyse (P019(cf.))	Non
6	Palier asc.R4 n°2	RDC	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture	Résultat d'analyse (P009(cf.))	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit	Résultat d'analyse (P018(cf.))	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage - Colle ciment	Résultat d'analyse (P019(cf.))	Non
7	Palier asc.R2 n°3	Etage Courant	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture	Résultat d'analyse (P009(cf.))	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit	Résultat d'analyse (P018(cf.))	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage	Résultat d'analyse (P019(cf.))	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Lino	Document consulté	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Résidu Colle bitumineuse	Document consulté	Oui
8	Palier asc.R3 n°3	Etage Courant	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture	Résultat d'analyse (P009(cf.))	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Lino	Document consulté	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit	Résultat d'analyse (P018)	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage	Résultat d'analyse (P019)	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Résidu Colle bitumineuse	Document consulté	Oui
9	Palier asc.R4 n°3	Etage Courant	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit gris - Peinture	Résultat d'analyse (P009(cf.))	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit	Résultat d'analyse (P018(cf.))	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Colle carrelage	Résultat d'analyse (P020)	Non
10	Machinerie Asc.R2	R04	Dalle - socle béton - 05 - Planchers et planchers techniques - Enduit ciment	Résultat d'analyse (P001)	Non
			Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mastic vitrage	Résultat d'analyse (P017(cf.))	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment	Résultat d'analyse (P002)	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P003)	Non
			Dalle de toiture - Rive de toit - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Enduit	Résultat d'analyse (P004)	Non
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Enduit	Résultat d'analyse (P005)	Non
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Enduit	Résultat d'analyse (P006)	Non
			Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Etanchéité	Résultat d'analyse (P007)	Non

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			Mur Ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mastic - rustine sur fissures	Résultat d'analyse (P008)	Non
11	Machinerie Asc.R3	R04	Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mastic vitrage	Résultat d'analyse (P017(cf.))	Non
			Dalle de toiture - Rive de toit - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Enduit	Résultat d'analyse (P005(cf.))	Non
			Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Etanchéité	Résultat d'analyse (P007(cf.))	Non
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Enduit	Résultat d'analyse (P005(cf.))	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P003(cf.))	Non
			Dalle - socle béton - 05 - Planchers et planchers techniques - Enduit ciment	Résultat d'analyse (P001(cf.))	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment	Résultat d'analyse (P002(cf.))	Non
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Enduit	Résultat d'analyse (P005(cf.))	Non
12	Machinerie Asc.R4	R04	Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mastic vitrage	Résultat d'analyse (P017)	Non
			Dalle de toiture - Rive de toit - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Enduit	Résultat d'analyse (P005(cf.))	Non
			Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Etanchéité	Résultat d'analyse (P007(cf.))	Non
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Enduit	Résultat d'analyse (P005(cf.))	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P003(cf.))	Non
			Dalle - socle béton - 05 - Planchers et planchers techniques - Enduit ciment	Résultat d'analyse (P001(cf.))	Non
			Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment	Résultat d'analyse (P002(cf.))	Non
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Enduit	Résultat d'analyse (P005(cf.))	Non
13	Gaine asc. R2	Etage Courant	Sol - seuil de portes palières - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment blanc	Résultat d'analyse (P011(cf.))	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P012(cf.))	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P012(cf.))	Non
			Sol - fosse cuvette - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment	Résultat d'analyse (P014(cf.))	Non
			Bardage - bâti portes palières - 03 - Parois verticales intérieures - Colle mortier de scellement	Résultat d'analyse (P016(cf.))	Non
14	Gaine asc. R3	Etage Courant	Sol - seuil de portes palières - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment blanc	Résultat d'analyse (P011(cf.))	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P012(cf.))	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P012(cf.))	Non
			Sol - fosse cuvette - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment	Résultat d'analyse (P014(cf.))	Non
			Bardage - bâti portes palières - 03 - Parois verticales intérieures - Colle mortier de scellement	Résultat d'analyse (P016(cf.))	Non
15	Gaine asc. R4	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit	Résultat d'analyse (P010)	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P013)	Non
			Sol - seuil de portes palières - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment blanc	Résultat d'analyse (P011)	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P012)	Non

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			Sol - fosse cuvette - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment	Résultat d'analyse (P014)	Non
			Mur soubassement - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit ciment taloché	Résultat d'analyse (P015)	Non
			Bardage - bâti portes palières - 03 - Parois verticales intérieures - Colle mortier de scellement	Résultat d'analyse (P016)	Non

6.3 COMMENTAIRE SUR LA MISSION

Néant

6.4 RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire **met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives »** (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire **met à jour le contenu du « dossier technique amiante »** (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. **Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti a**insi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Sol

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	
Pièce ou local	Etage Courant - Palier asc.R2 n°3	Référence du sondage	S003
Matériau	Lino	Localisation	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		
Commentaires	Matériau similaire au P007 du RAT 2025-12785.		

ELEMENT : Sol

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	
Pièce ou local	Etage Courant - Palier asc.R3 n°3	Référence du sondage	S002
Matériau	Résidu Colle bitumineuse	Localisation	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	PRÉSENCE D'AMIANTE		
Commentaires	Matériau similaire au P008 du RAT 2025-12785.		

ELEMENT : Sol

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	
Pièce ou local	Etage Courant - Palier asc.R3 n°3	Référence du sondage	S001
Matériau	Lino	Localisation	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		
Commentaires	Matériau similaire au P007 du RAT 2025-12785.		

ELEMENT : Sol

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	
Pièce ou local	Etage Courant - Palier asc.R2 n°3	Référence du sondage	S004
Matériau	Résidu Colle bitumineuse	Localisation	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	PRÉSENCE D'AMIANTE		
Commentaires	Matériau similaire au P008 du RAT 2025-12785.		

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

ELEMENT : Lucarne

Emplacement


Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc.R2	Référence du sondage	
Matériau	Mastic vitrage	Localisation	Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

PRELEVEMENT : P001

Emplacement


Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc.R2	Référence du sondage	
Matériau	Enduit ciment	Localisation	Dalle - socle béton - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau dur (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc.R2	Référence du sondage	
Matériau	Chape ciment	Localisation	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Chape ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc.R2	Référence du sondage	
Matériau	Enduit de rebouchage	Localisation	Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit de rebouchage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc.R2	Référence du sondage	
Matériau	Enduit	Localisation	Dalle de toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité Rive de toit
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc.R2	Référence du sondage	
Matériau	Enduit	Localisation	Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		
Commentaires	Mur Nord		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc.R2	Référence du sondage	
Matériau	Enduit	Localisation	Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		
Commentaires	Mur Ouest		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc.R2	Référence du sondage	
Matériau	Etanchéité	Localisation	Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Etanchéité		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (granulaire) (noir)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc.R2	Référence du sondage	
Matériau	Mastic - rustine sur fissures	Localisation	Mur Ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Mastic - rustine sur fissures		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	S01 - Palier asc.R2 n°1	Référence du sondage	
Matériau	Enduit gris - Peinture	Localisation	Embrasure porte palières - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit gris / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine asc. R4	Référence du sondage	
Matériau	Enduit	Localisation	Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P011

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine asc. R4	Référence du sondage	
Matériau	Chape ciment blanc	Localisation	Sol - seuil de portes palières - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Chape ciment blanc		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) (beige)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine asc. R4	Référence du sondage	
Matériau	Enduit de rebouchage	Localisation	Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit de rebouchage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau dur (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P013

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine asc. R4	Référence du sondage	
Matériau	Enduit de rebouchage	Localisation	Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit de rebouchage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau dur (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine asc. R4	Référence du sondage	
Matériau	Chape ciment	Localisation	Sol - fosse cuvette - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Chape ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau (gris) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P015

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine asc. R4	Référence du sondage	
Matériau	Enduit ciment taloché	Localisation	Mur soubassement - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit ciment taloché		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau dur (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P016

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine asc. R4	Référence du sondage	
Matériau	Colle mortier de scellement	Localisation	Bardage - bâti portes palières - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle mortier de scellement		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc.R4	Référence du sondage	
Matériau	Mastic vitrage	Localisation	Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Mastic vitrage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau (gris) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P018

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Palier asc.R3 n°3	Référence du sondage	
Matériau	Enduit	Localisation	Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau (gris) (foncé) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (blanc) en traces	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P019

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Palier asc.R3 n°3	Référence du sondage	
Matériau	Ragréage	Localisation	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ragréage / Colle jaune		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122843-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2	Date de prélèvement	08/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Palier asc.R4 n°3	Référence du sondage	
Matériau	Colle carrelage	Localisation	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122842-01	Matériau (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (blanc) en traces	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Croquis N°1 SSOL

Client	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2		
N° planche	1/4	Version	**0**
Date	27/10/2025		
Intervenant	CHAN Jacobi		
Origine du plan	Document réalisé en interne		
Type	Périmètres de diagnostic		
Adresse	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bâtiment	002 Bât. RABELAIS		
Etage	S01	N° lot	Lot n°002
Commentaire			


Légende

Prélèvements négatifs - après analyse




Plan de masse


R2

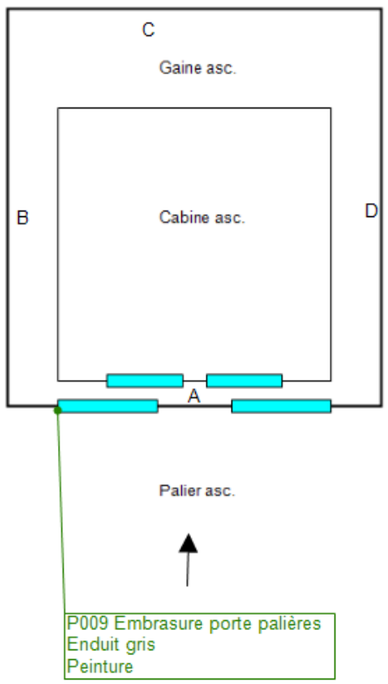

R3

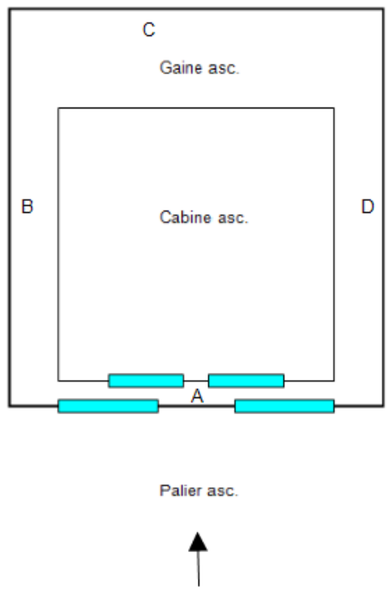

R4

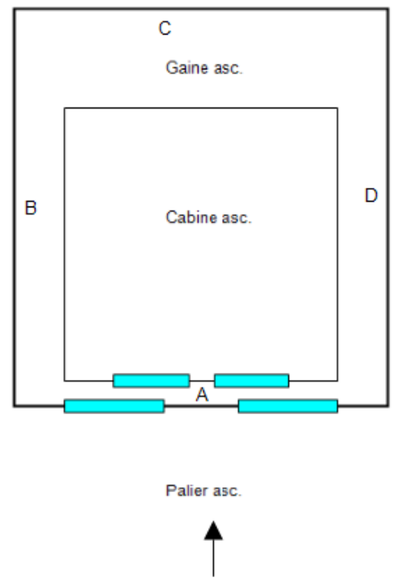

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Croquis N°2 ETAGE COURANT


Client	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2		
N° planche	2/4	Version	**0**
Date	27/10/2025		
Intervenant	CHAN Jacobi		
Origine du plan	Document réalisé en interne		
Type	Périmètres de diagnostic		
Adresse	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bâtiment	002 Bât. RABELAIS		
Etage	Etage Courant	N° lot	Lot n°002
Commentaire			

Légende

Prélèvements négatifs - après analyse



Plan de masse

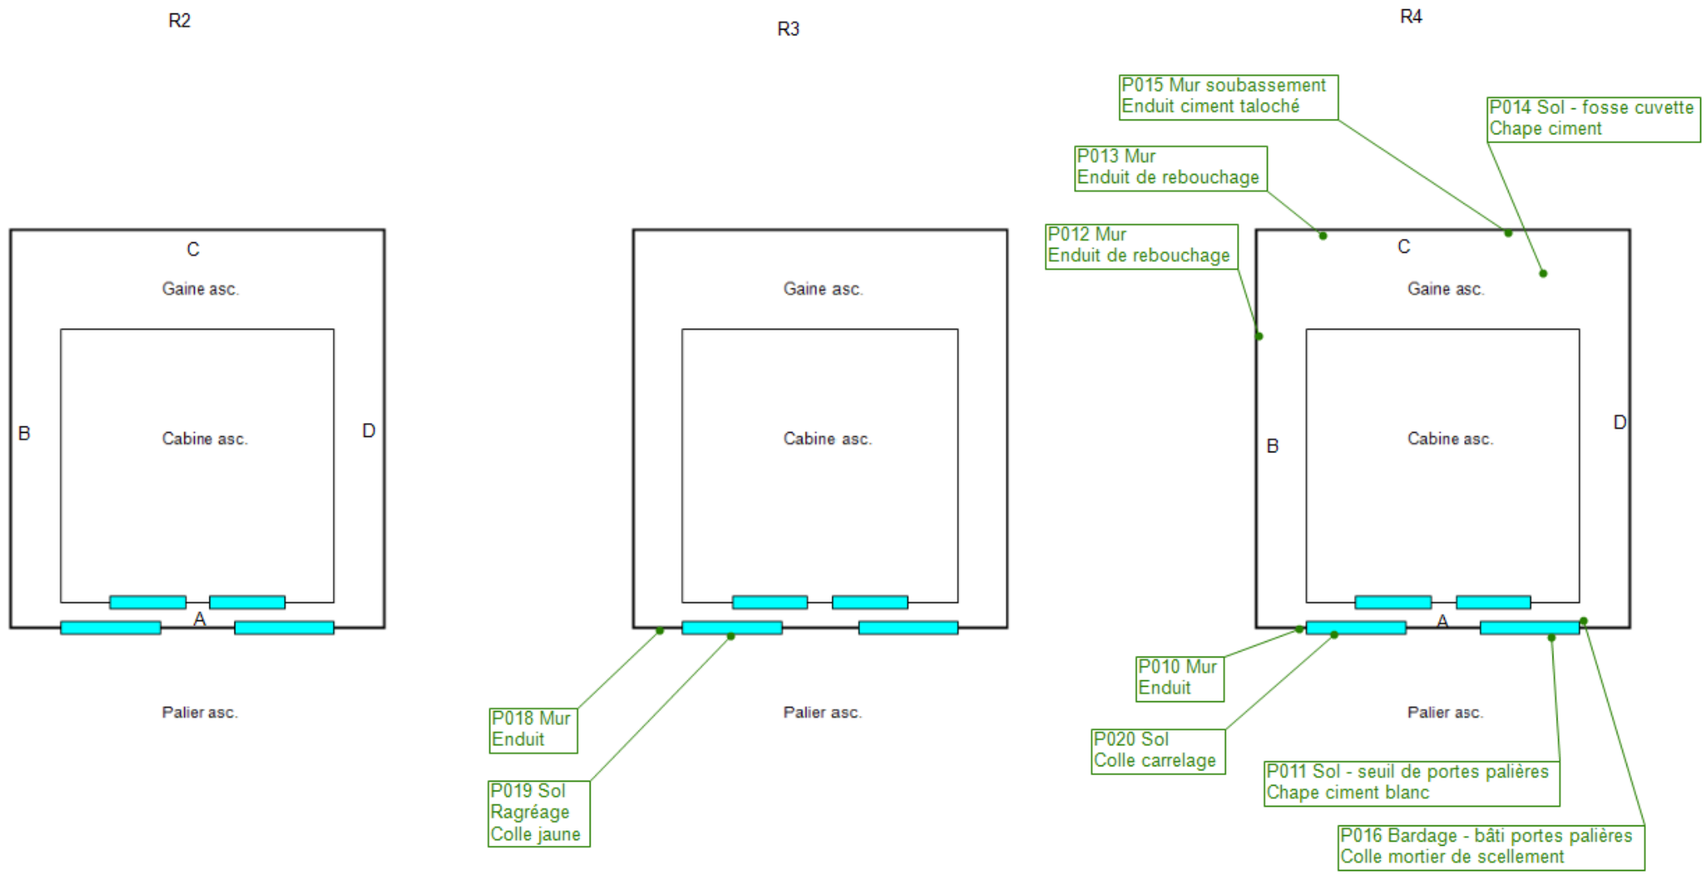

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Croquis N°3 - R4


Client	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2		
N° planche	3/4	Version	0
Date	27/10/2025		
Intervenant	CHAN Jacobi		
Origine du plan	Document réalisé en interne		
Type	Périmètres de diagnostic		
Adresse	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bâtiment	002 Bât. RABELAIS		
Etage	R04	N° lot	Lot n°002
Commentaire			


Légende

Prélèvements négatifs - après analyse



Plan de masse

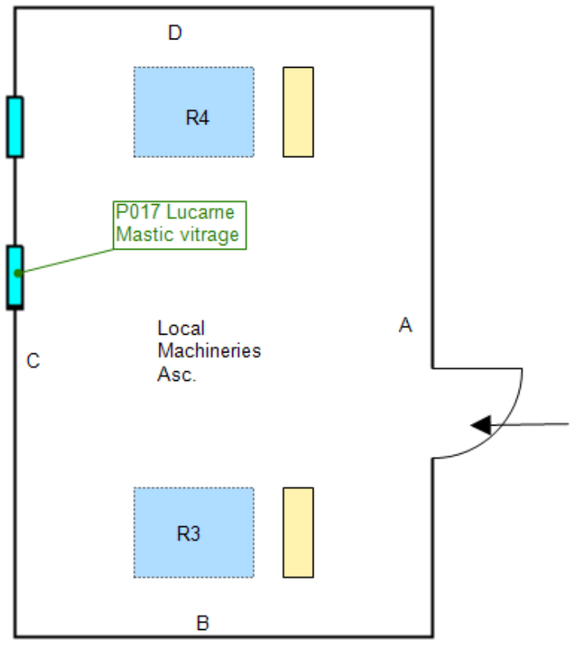

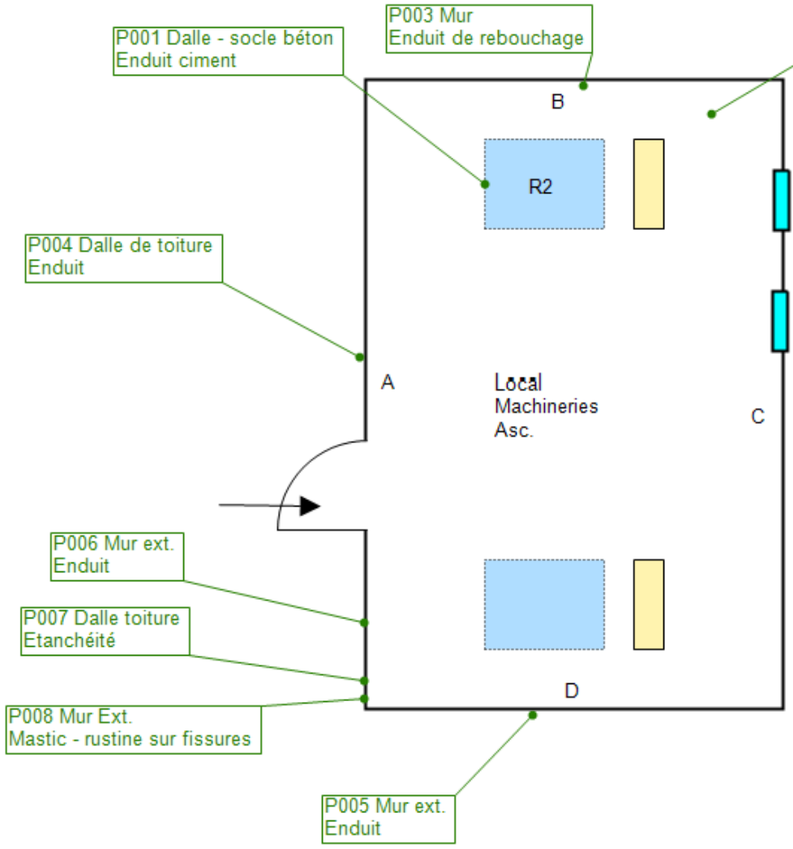

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Croquis N°4


Client	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier	2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2		
N° planche	4/4	Version	**0**
Date	27/10/2025		
Intervenant	CHAN Jacobi		
Origine du plan	Fond de plan fournis par donneur d'ordre		
Type	Cartographie MPCA (Matériaux et/ou produits contenant de l'amiante)		
Adresse	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bâtiment	002 Bât. RABELAIS		
Etage	Etage Courant	N° lot	Lot n°002
Commentaire			

Légende

Prélèvements positifs - après analyse

Colle noire

Plan de masse

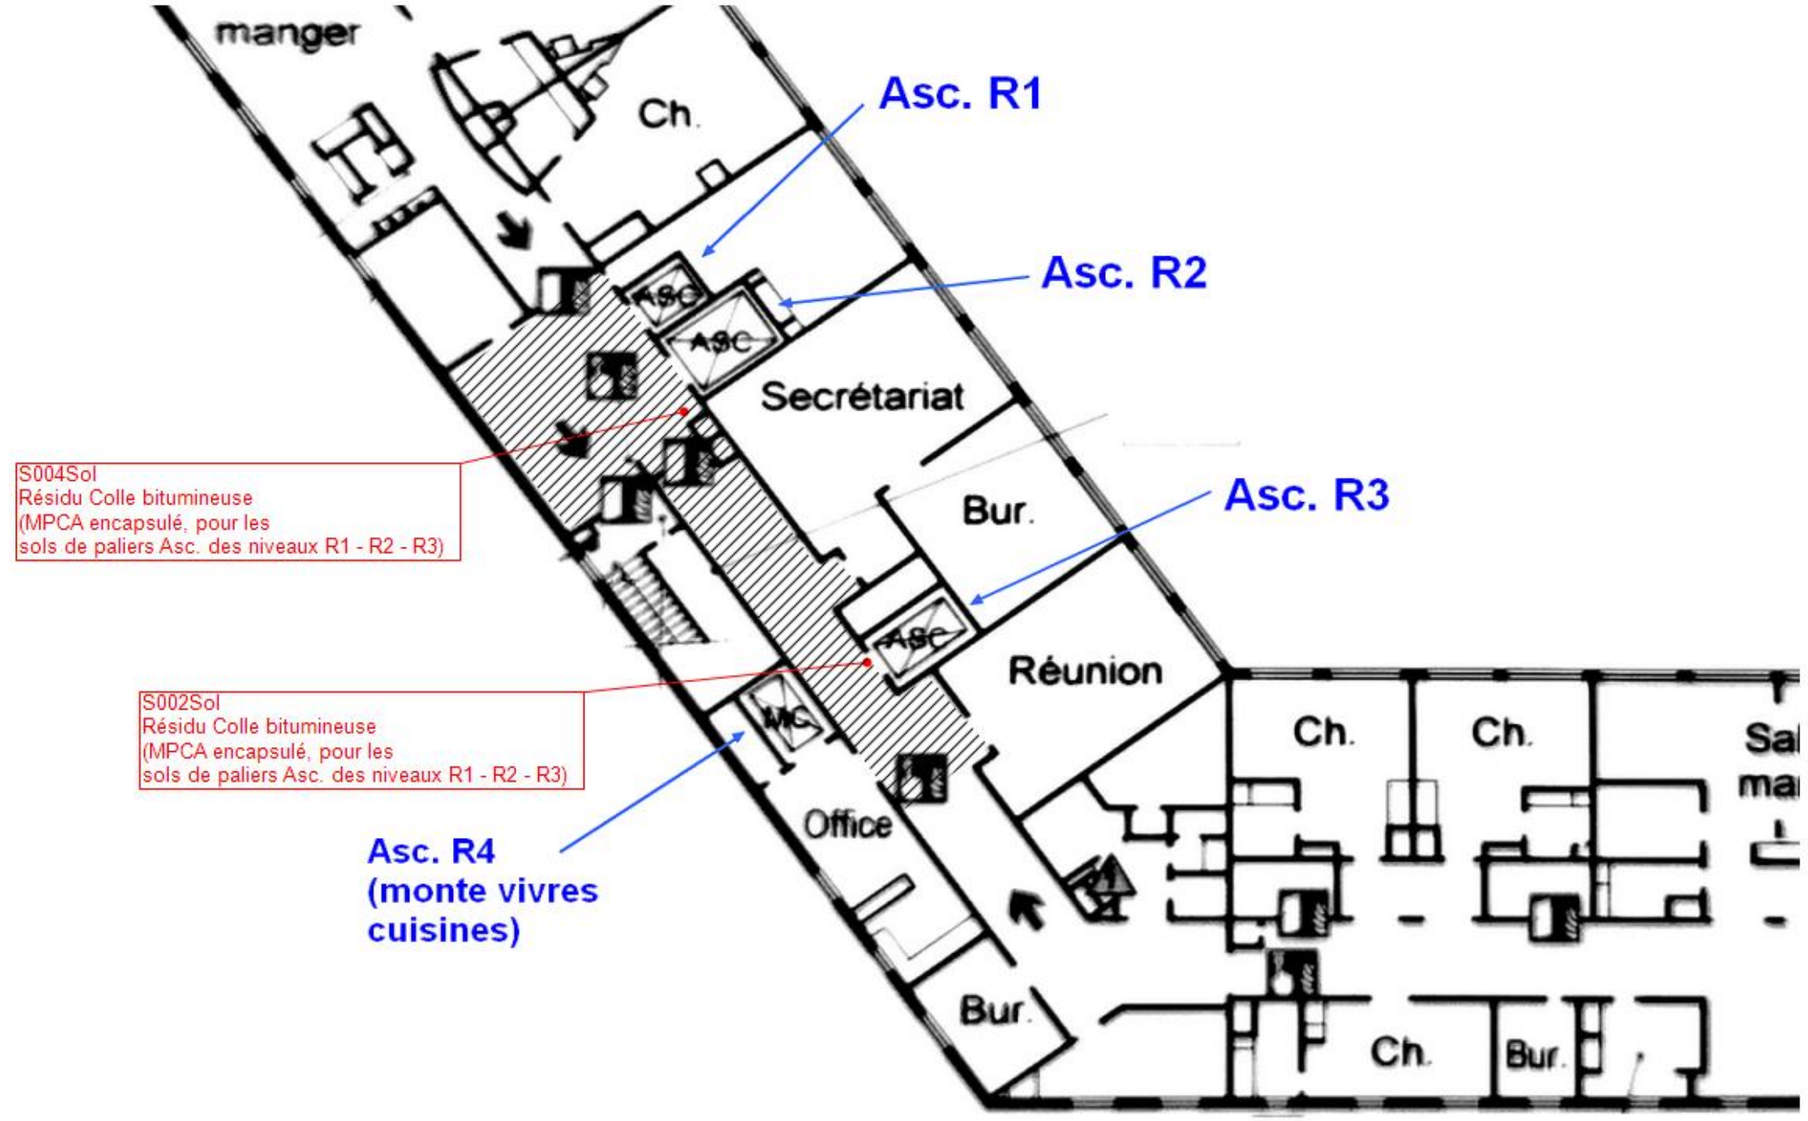

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

SARL COVEANEX
Monsieur Jacobi CHAN
SODIATEC IdF
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122843-01 | Date d'émission de rapport : 16/10/2025 13:19 | Page1/6
Dossier N° : 25A035280 | Date de réception : 13/10/2025 | Date d'analyse : 15/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2 A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P001-R04 - Machinerie Asc.R2 - 05 - Planchers et planchers techniques - Dalle - socle béton - Enduit ciment	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-R04 - Machinerie Asc.R2 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Chape ciment	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-R04 - Machinerie Asc.R2 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit de rebouchage	Matériau (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-R04 - Machinerie Asc.R2 - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Dalle de toiture - Enduit	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122843-01 | Date d'émission de rapport : 16/10/2025 13:19 | Page2/6
Dossier N° : 25A035280 | Date de réception : 13/10/2025 | Date d'analyse : 15/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2 A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	P005-R04 - Machinerie Asc.R2 - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mur ext. - Enduit	Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	P006-R04 - Machinerie Asc.R2 - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mur ext. - Enduit	Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-R04 - Machinerie Asc.R2 - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Dalle toiture - Etanchéité	Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (granulaire) (noir)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	P008-R04 - Machinerie Asc.R2 - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mur Ext. - Mastic - rustine sur fissures	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122843-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 13:19 Page3/6
Dossier N° : 25A035280 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 15/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2 A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	P009-S01 - Palier asc.R2 n°1 - 03 - Parois verticales intérieures - Embrasure porte palières - Enduit gris - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-Etage Courant - Gaine asc. R4 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-Etage Courant - Gaine asc. R4 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - seuil de portes palières - Chape ciment blanc	Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) (beige)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-Etage Courant - Gaine asc. R4 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit de rebouchage	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122843-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 13:19 Page4/6
Dossier N° : 25A035280 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 15/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2 A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P013-Etage Courant - Gaine asc. R4 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit de rebouchage	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-Etage Courant - Gaine asc. R4 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - fosse cuvette - Chape ciment	Matériau (gris) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-Etage Courant - Gaine asc. R4 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur soubassement - Enduit ciment taloché	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-Etage Courant - Gaine asc. R4 - 03 - Parois verticales intérieures - Bardage - bâti portes palières - Colle mortier de scellement	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122843-01 Date d'émission de rapport : 16/10/2025 13:19 Page5/6
Dossier N° : 25A035280 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 15/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2 A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017 (1)	P017-R04 - Machinerie Asc.R4 - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Lucarne - Mastic vitrage	Matériau (gris) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-Etage Courant - Palier asc.R3 n°3 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit	Matériau (gris) (foncé) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (blanc) en traces	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019 (1)	P019-Etage Courant - Palier asc.R3 n°3 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Ragréage - Colle jaune	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122843-01 | Date d'émission de rapport : 16/10/2025 13:19 | Page6/6
Dossier N° : 25A035280 | Date de réception : 13/10/2025 | Date d'analyse : 15/10/2025

Référence dossier Client:
2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2 A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Cindy Barth
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

SARL COVEANEX
Monsieur Jacobi CHAN
SODIATEC IdF
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122842-01 — Date d'émission de rapport : 16/10/2025 13:19 — Page1/2
Dossier N° : 25A035281 — Date de réception : 13/10/2025 — Date d'analyse : 15/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2 A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P020-Etage Courant - Palier asc.R4 n°3 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Colle carrelage	Matériau (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (blanc) en traces	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122842-01 | Date d'émission de rapport : 16/10/2025 13:19 | Page2/2
Dossier N° : 25A035281 | Date de réception : 13/10/2025 | Date d'analyse : 15/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12896-HOPITAL RENE MURET R2 A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET



Cindy Barth
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS

Document 1




Commentaire : *Equipements sans risque amiante; matériels et équipements fabriqués en 2015 (après 1997). Marquage produits sur plaque signalétiques.*

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60



Commentaire : *Cabine R2; équipement sans risque amiante, validé par marquage produit, date de fabrication postérieure à 1997.*

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

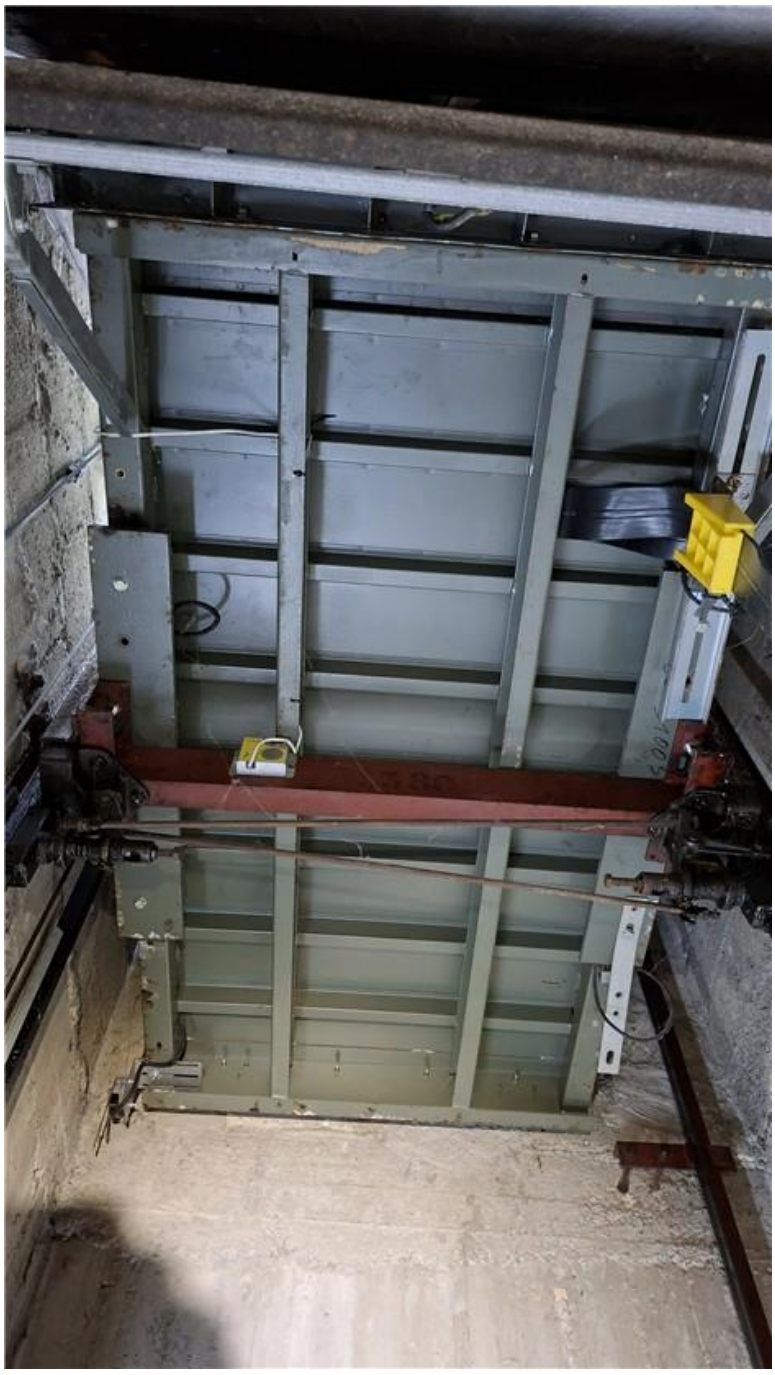

Commentaire : *Sous face cabine examinée, absence de matériaux et produits douteux.*

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60



Commentaire : *Porte cabine et porte ascenseur éxaminées; absence de matériaux et produit douteux.*

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Arrêté du 16/07/2019 modifié par l'arrêté du 23/01/2020; L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation; L.4412-2, R.4412-97 à R.4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019.
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	**2025-12785-HOPITAL RENE MURET A**
Version	**01**
Propriétaire	**HOPITAL RENE MURET**
Donneur d'ordre	**APHP NORD**
Adresse de l'immeuble	**François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN**
Bâtiment ou installation	**Bâtiment 002**
Date de la commande	**05/08/2025**
Date de début d'exécution du repérage	**19/08/2025**
Date d'émission du rapport de repérage	**25/08/2025**
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	**Non communiquée**

Signataire du rapport

Signature et visa :

Opérateur de repérage :

MASSIP Romain
COVEANEX - Groupe SODIATEC
Le **25/08/2025**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

Commentaire sur la mission

Néant

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Etage	Localisation	Elément	Matériaux ou produits	Critères(s) ayant permis de conclure	Référence (ZPSO)
R+1	NVY92 Palier n°2	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire	Résultat d'analyse (P008)	Z005
R+2	NVY92 Palier n°3	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire	Résultat d'analyse (P006(cf.))	Z005
R+3	NVY92 Palier n°4	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire	Résultat d'analyse (P006)	Z005

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Zone	Elément	Matériau / Produit
Tous Niveaux	NVY92 Ascenseur	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum
RDC	NVY92 Palier n°1	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Colle de carrelage
R+1	NVY92 Palier n°2	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum
R+2	NVY92 Palier n°3	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum
R+3	NVY92 Palier n°4	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum
R-1	NVY92 Cuvette	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment
R-1	NVY92 Couloir	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Enduit base ciment lissé
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Peintures de sol

Réserves

Aucune

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
CONCLUSIONS 1
COMMENTAIRE SUR LA MISSION 2
DESCRIPTION DE LA MISSION 5
OBJET DE LA MISSION : 5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE : 5
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE : 5
PROGRAMME DE TRAVAUX 5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE 6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES 6
PROGRAMME DE REPERAGE 6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 6
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 7
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES 7
RESULTATS DU REPERAGE 10
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : 10
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 11
COMMENTAIRE SUR LA MISSION 12
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 13
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 14
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 26
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE 33
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 40

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **4511767895**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**HOPITAL RENE MURET**
Demeurant :	**52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN**
Représenté par :	**Monsieur DIAKITE Boubacar**
Commanditaire du repérage :	**APHP NORD**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur MASSIP Romain**
Nom et adresse de l'entreprise :	**COVEANEX - Groupe SODIATEC** **28 Avenue des Pépinières** **94260 FRESNES**
N° de Siret :	**81437986300032**
RCP-compagnie-n° de police :	**AXA FRANCE IARD -10583931804**
Laboratoire d'analyse :	Raison sociale : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est** Adresse : **20, rue du Kochersberg - BP 50047 67700 Saverne Cedex 1** Numéro de l'accréditation COFRAC : **1-1751**

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	**François Rabelais**
Adresse complète :	**52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN**
Référence Cadastrale :	**CK - 0002**

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire :	Construction :
Type et Fonction principale du bien :	**Bâtiment**	**Tertiaire**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Périmètre d'intevention : Cabines/Portes/Paliers (Sols et Murs)

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
NVY92 Ascenseur	Tous Niveaux	**Concernée**
NVY92 Palier n°1	RDC	**Concernée**
NVY92 Palier n°2	R+1	**Concernée**
NVY92 Palier n°3	R+2	**Concernée**
NVY92 Palier n°4	R+3	**Concernée**
NVY92 Cuvette	R-1	**Concernée**
NVY92 Couloir	R-1	**Concernée**

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques			
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P	
	Panneaux des cloisons palières	P	
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…)	P	
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P	
	Isolants	P	
	Colles	M	
	Joints	P	
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P	
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits…	P	
	Tresses	P	
	Joints plats	P	

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et nature des visites sur site

Date	Objet
19/08/2025	Repérage amiante avant travaux - Ascenseur

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

	prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3	Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4	Liste des Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Portes et cloisons palières Panneaux dans les portes palières - Flocage gris (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P001	S001	Tous Niveaux	NVY92 Ascenseur	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
P001(cf.)	S002	RDC	NVY92 Palier n°1	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
P001(cf.)	S004	R+1	NVY92 Palier n°2	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
P001(cf.)	S005	R+2	NVY92 Palier n°3	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
P001(cf.)	S006	R+3	NVY92 Palier n°4	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
P002	S003	R-1	NVY92 Cuvette	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
P001(cf.)	S023	R-1	NVY92 Couloir	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris

Z002 : Portes et cloisons palières Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P003	S007	R-1	NVY92 Cuvette	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

Z003 : Murs et cloisons maçonnés Mastic sillicone (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P004	S008	RDC	NVY92 Palier n°1	03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
P004(cf.)	S016	R+1	NVY92 Palier n°2	03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
P004(cf.)	S013	R+2	NVY92 Palier n°3	03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
P004(cf.)	S010	R+3	NVY92 Palier n°4	03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone

Z004 : Revêtements de sols Colle de carrelage (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P005	S009	RDC	NVY92 Palier n°1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Colle de carrelage

Z005 : Revêtements de sols Ragréage + Colle noire (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P008	S017	R+1	NVY92 Palier n°2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire
P006(cf.)	S014	R+2	NVY92 Palier n°3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire
P006	S011	R+3	NVY92 Palier n°4	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire

Z006 : Revêtements de sols Linoléum (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P007(cf.)	S018	R+1	NVY92 Palier n°2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum
P007(cf.)	S015	R+2	NVY92 Palier n°3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum
P007	S012	R+3	NVY92 Palier n°4	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

Z007 : Parois des équipements Habillages cabines bois (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
	S020	Tous Niveaux	NVY92 Ascenseur	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Parois des équipements	Habillages cabines bois

Z008 : Parois des équipements Habillages cabines métalliques (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
	S021	Tous Niveaux	NVY92 Ascenseur	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Parois des équipements	Habillages cabines métalliques

Z009 : Parois des équipements Panneaux décoratifs plafond métalliques (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
	S019	Tous Niveaux	NVY92 Ascenseur	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Parois des équipements	Panneaux décoratifs plafond métalliques

Z010 : Revêtements de sols Linoléum (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P009	S022	Tous Niveaux	NVY92 Ascenseur	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum

Z011 : Murs et cloisons maçonnés Enduit base ciment lissé (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P010	S024	R-1	NVY92 Couloir	03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Enduit base ciment lissé

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

Z012 : Revêtements de sols Peintures de sol (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P011	S025	R-1	NVY92 Couloir	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Peintures de sol

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'analyse documentaire :

Titre
Programme de travaux

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
NVY92 Ascenseur	Tous Niveaux	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Résultat d'analyse (P001)	**Non**	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum	Résultat d'analyse (P009)	**Non**	
		07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Parois des équipements	Habillages cabines bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Parois des équipements	Habillages cabines métalliques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Parois des équipements	Panneaux décoratifs plafond métalliques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
NVY92 Palier n°1	RDC	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Résultat d'analyse (P001(cf.))	**Non**	
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone	Résultat d'analyse (P004)	**Non**	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P005)	**Non**	
NVY92 Palier n°2	R+1	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Résultat d'analyse (P001(cf.))	**Non**	
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone	Résultat d'analyse (P004(cf.))	**Non**	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire	Résultat d'analyse (P008)	**Oui**	15 m²
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum	Résultat d'analyse (P007(cf.))	**Non**	
NVY92 Palier n°3	R+2	07 - Ascenseurs,	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières -	Résultat d'analyse (P001(cf.))	**Non**	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		monte-charges escaliers mécanique		Flocage gris			
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone	Résultat d'analyse (P004(cf.))	**Non**	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire	Résultat d'analyse (P006(cf.))	**Oui**	15 m²
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum	Résultat d'analyse (P007(cf.))	**Non**	
NVY92 Palier n°4	R+3	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Résultat d'analyse (P001(cf.))	**Non**	
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone	Résultat d'analyse (P004(cf.))	**Non**	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire	Résultat d'analyse (P006)	**Oui**	15 m²
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum	Résultat d'analyse (P007)	**Non**	
NVY92 Cuvette	R-1	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Résultat d'analyse (P002)	**Non**	
		07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment	Résultat d'analyse (P003)	**Non**	
NVY92 Couloir	R-1	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Résultat d'analyse (P001(cf.))	**Non**	
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Enduit base ciment lissé	Résultat d'analyse (P010)	**Non**	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Peintures de sol	Résultat d'analyse (P011)	**Non**	

5.3	Commentaire sur la mission
Néant	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

5.4	Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Parois des équipements

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	Tous Niveaux - NVY92 Ascenseur Parois des équipements - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain		Habillages cabines bois
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Parois des équipements

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	Tous Niveaux - NVY92 Ascenseur Parois des équipements - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain		Habillages cabines métalliques
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Parois des équipements		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	Tous Niveaux - NVY92 Ascenseur Parois des équipements - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain		Panneaux décoratifs plafond métalliques
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	Tous Niveaux - NVY92 Ascenseur Portes et cloisons palières - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Panneaux dans les portes palières - Flocage gris		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R-1 - NVY92 Cuvette Portes et cloisons palières - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Panneaux dans les portes palières - Flocage gris		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P003		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R-1 - NVY92 Cuvette Portes et cloisons palières - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau semi-dur (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC AMIANTE

PRELEVEMENT : P004		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	RDC - NVY92 Palier n°1 Murs et cloisons maçonnés - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Mastic silicone
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Mastic silicone		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau souple de type mastic (transparent)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC AMIANTE

PRELEVEMENT : P005		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	RDC - NVY92 Palier n°1 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Colle de carrelage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P006		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R+3 - NVY92 Palier n°4 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Ragréage + Colle noire
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

SODIATEC AMIANTE

PRELEVEMENT : P007		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R+3 - NVY92 Palier n°4 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Linoléum
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Linoléum		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P008		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R+1 - NVY92 Palier n°2 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Ragréage + Colle noire
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P009		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	Tous Niveaux - NVY92 Ascenseur Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Linoléum
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Linoléum		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P010		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R-1 - NVY92 Couloir Murs et cloisons maçonnés - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Enduit base ciment lissé
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Enduit base ciment lissé		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC AMIANTE

PRELEVEMENT : P011		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R-1 - NVY92 Couloir Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Peintures de sol
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Peintures de sol		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

AMIANTE

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60




SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	HOPITAL RENE MURET
N° dossier :	2025-12785-HOPITAL RENE MURET
N° planche :	2/6 — Version : 0
Type :	Croquis
Date :	25/08/2025
Intervenant :	MASSIP Romain
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	NVY92
Adresse :	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN
Bât. - Niv. - Lot :	002 — R-1 — Lot n°002
Commentaire :	

Prélèvements négatifs - après analyse

Légende :

Plan de masse :

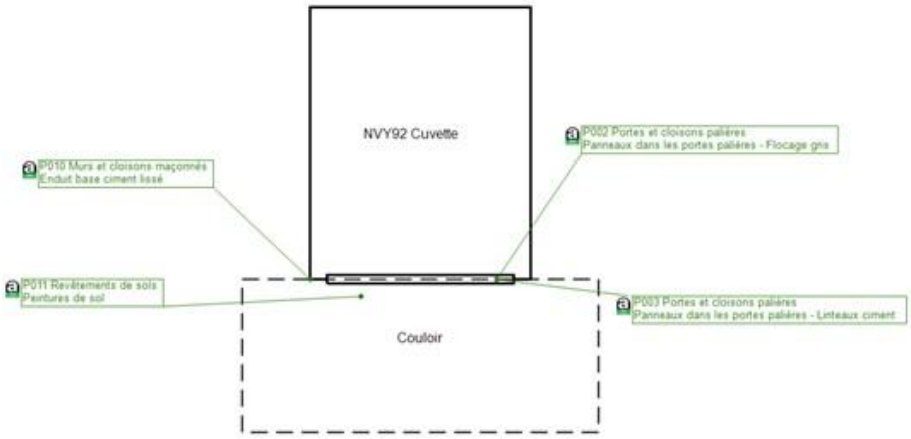

2025-12785-HOPITAL RENE MURET A — SODIATEC Agence Région IDF — 28/42


SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Client :	HOPITAL RENE MURET
N° dossier :	2025-12785-HOPITAL RENE MURET
N° planche :	3/6 — Version : 0
Type :	Croquis
Date :	25/08/2025
Intervenant :	MASSIP Romain
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	NVY92
Adresse :	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN
Bât. - Niv. - Lot :	002 — RDC — Lot n°002
Commentaire :	

Prélèvements négatifs - après analyse

Légende :

Plan de masse :

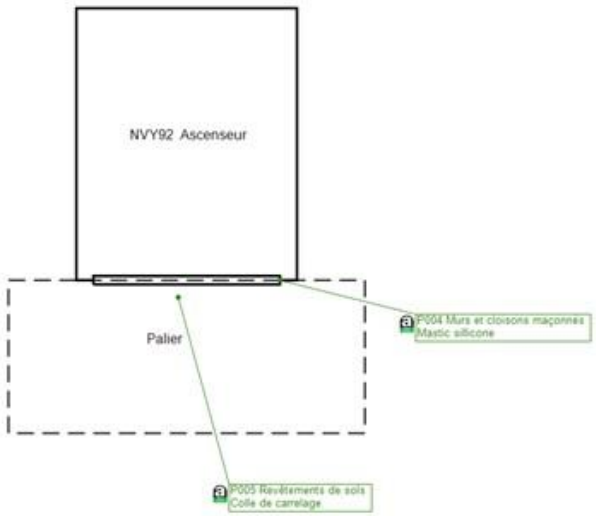


SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Client :	HOPITAL RENE MURET
N° dossier :	2025-12785-HOPITAL RENE MURET
N° planche :	4/6 — Version : 0
Type :	Croquis
Date :	25/08/2025
Intervenant :	MASSIP Romain
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	NVY92
Adresse :	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN
Bât. - Niv. - Lot :	002 — R+1 — Lot n°002
Commentaire :	

Prélèvements positifs - après analyse
Ragréage + Colle noire amiantée

Légende :

Plan de masse :

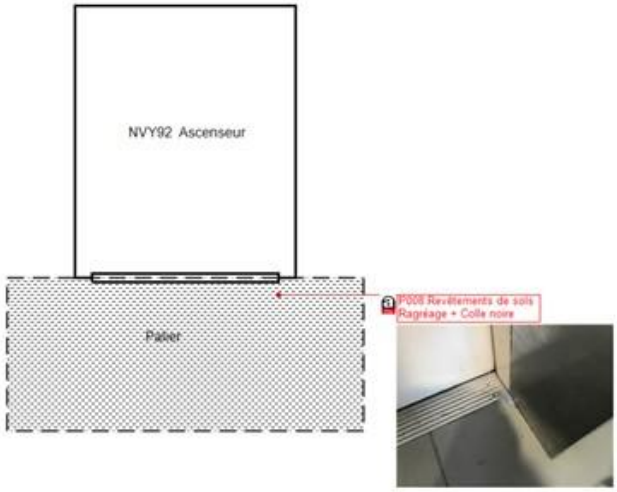


SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier :	2025-12785-HOPITAL RENE MURET		
N° planche :	5/8	Version :	0
Type :	Croquis		
Date :	25/08/2025		
Intervenant :	MASSIP Romain		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		
Titre :	NVY92		
Adresse :	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bât. - Niv. - Lot :	002	R+2	Lot n°002
Commentaire :			

Ragréage + Colle noire amiantée

Légende :

Plan de masse :

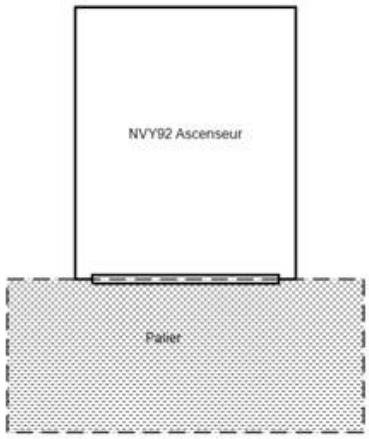


SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	HOPITAL RENE MURET
N° dossier :	2025-12785-HOPITAL RENE MURET
N° planche :	6/6 — Version : 0
Type :	Croquis
Date :	25/08/2025
Intervenant :	MASSIP Romain
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	NVY92
Adresse :	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN
Bât. - Niv. - Lot :	002 — R+3 — Lot n°002
Commentaire :	

Prélèvements positifs - après analyse
Prélèvements négatifs - après analyse
Ragréage + Colle noire amiantée

Légende :

Plan de masse :

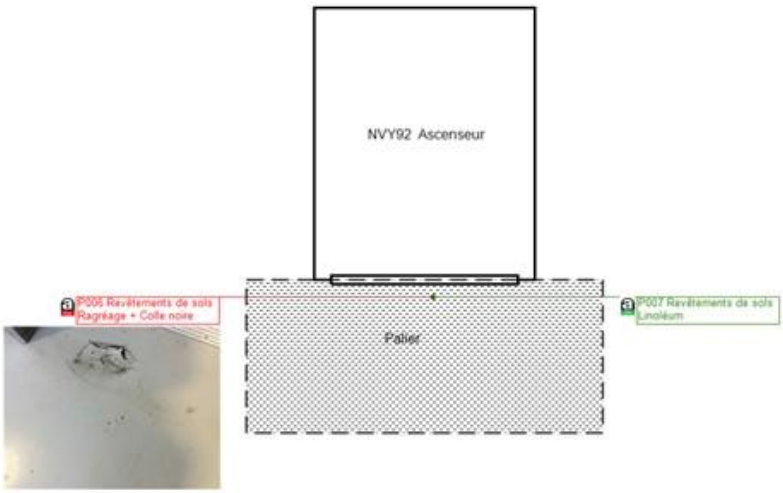

2025-12785-HOPITAL RENE MURET A — 32/42

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720250801637486

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

SARL COVEANEX
Monsieur Romain MASSIP
SODIATEC IdF
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES

Notre référence : AR-25-LE-092634-01

Numéro de dossier : 25A029250
Référence de dossier :
2025-12785-HOPITAL RENE MURET A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A029250-001 - Référence *P001-Tous Niveaux - NVY92 Ascenceur - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières - Flocage gris*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES


- N° 25A029250-002 - Référence *P002-R-1 - NVY92 Cuvette - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières - Flocage gris*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-003 - Référence *P003-R-1 - NVY92 Cuvette - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-004 - Référence *P004-RDC - NVY92 Palier n°1 - 03 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Mastic sillicone*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-005 - Référence *P005-RDC - NVY92 Palier n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

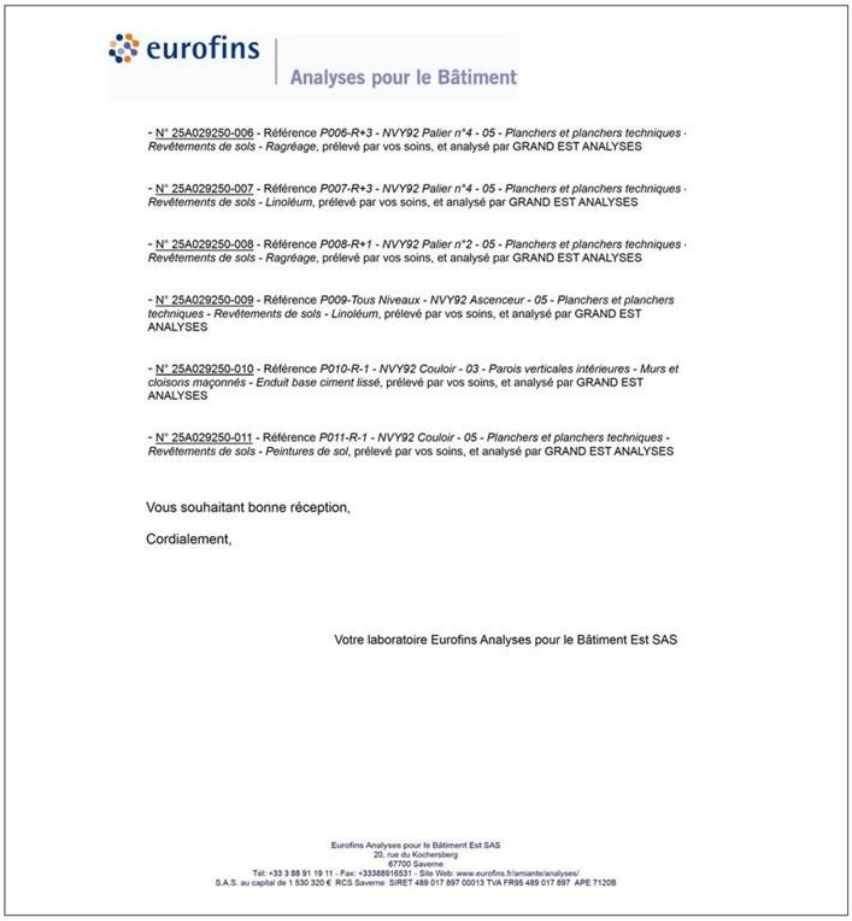

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25A029250-006 - Référence *P006-R+3 - NVY92 Palier n°4 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-007 - Référence *P007-R+3 - NVY92 Palier n°4 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoléum*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-008 - Référence *P008-R+1 - NVY92 Palier n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-009 - Référence *P009-Tous Niveaux - NVY92 Ascenceur - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoléum*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-010 - Référence *P010-R-1 - NVY92 Couloir - 03 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit base ciment lissé*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-011 - Référence *P011-R-1 - NVY92 Couloir - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peintures de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-016319-01 — Date d'émission de rapport : 29/08/2025 17:27 — Page1/5
Dossier N° : 25GE008059 — Date de réception : 28/08/2025 — Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008059 — Référence de suivi du dossier N° : 25A029250
Reçu au laboratoire le : 28/08/2025 — Date de réception : 27/08/2025
Date d'analyse : 28/08/2025
Référence dossier Client:2025-12785-HOPITAL RENE MURET A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A029250-001 - P001-Tous Niveaux - NVY92 Ascenceur - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Matériau semi-dur (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25A029250-002 - P002-R-1 - NVY92 Cuvette - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Matériau semi-dur (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél. : 03 89 77 22 99 - Fax : - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

cofrac ESSAIS
ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-016319-01 — Date d'émission de rapport : 29/08/2025 17:27 — Page2/5
Dossier N° : 25GE008059 — Date de réception : 28/08/2025 — Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008059 — Référence de suivi du dossier N° : 25A029250
Reçu au laboratoire le : 28/08/2025 — Date de réception : 27/08/2025
Date d'analyse : 28/08/2025
Référence dossier Client:2025-12785-HOPITAL RENE MURET A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25A029250-003 - P003-R-1 - NVY92 Cuvette - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment	Matériau semi-dur (orange)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	25A029250-004 - P004-RDC - NVY92 Palier n°1 - 03 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Mastic silicone	Matériau souple de type mastic (transparent)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	25A029250-005 - P005-RDC - NVY92 Palier n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faience (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél. : 03 89 77 22 99 - Fax : - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-016319-01 — Date d'émission de rapport : 29/08/2025 17:27 — Page3/5
Dossier N° : 25GE008059 — Date de réception : 28/08/2025 — Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008059 — Référence de suivi du dossier N° : 25A029250
Reçu au laboratoire le : 28/08/2025 — Date de réception : 27/08/2025
Date d'analyse : 28/08/2025
Référence dossier Client:2025-12785-HOPITAL RENE MURET A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	25A029250-006 - P006-R+3 - NVY92 Palier n°4 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / SY3H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	25A029250-007 - P007-R+3 - NVY92 Palier n°4 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoléum	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	25A029250-008 - P008-R+1 - NVY92 Palier n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / SY3H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél. : 03 89 77 22 99 - Fax : - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-016319-01 — Date d'émission de rapport : 29/08/2025 17:27 — Page4/5
Dossier N° : 25GE008059 — Date de réception : 28/08/2025 — Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008059 — Référence de suivi du dossier N° : 25A029250
Reçu au laboratoire le : 28/08/2025 — Date de réception : 27/08/2025
Date d'analyse : 28/08/2025
Référence dossier Client:2025-12785-HOPITAL RENE MURET A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner
93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25A029250-009 - P009-Tous Niveaux - NVY92 Ascenceur - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoléum	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	25A029250-010 - P010-R-1 - NVY92 Couloir - 03 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit base ciment lissé	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25A029250-011 - P011-R-1 - NVY92 Couloir - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peintures de sol	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél. : 03 89 77 22 99 - Fax : - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-016319-01 — Date d'émission de rapport : 29/08/2025 17:27 — Page5/5
Dossier N° : 25GE008059 — Date de réception : 28/08/2025 — Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008059 — Référence de suivi du dossier N° : 25A029250
Reçu au laboratoire le : 28/08/2025 — Date de réception : 27/08/2025
Date d'analyse : 28/08/2025
Référence dossier Client:2025-12785-HOPITAL RENE MURET A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner
93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Alexandre Conte
Chef(fe) de Groupe Technicien META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél. : 03 89 77 22 99 - Fax : - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

ANNEXE : Attestation d'assurance

Adhésion N°C220

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804

Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

COVEANEX
28 AVENUE DES PEPINIERES
94260 FRESNES

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° **10583931804C220**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées au contrat, ***sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.***

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

1 000 000 € PAR SINISTRE ET 2 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 19 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 306 121 069 - N°ORIAS 07 000 473

GROUPE SODIATEC
AMIANTE

Police N°10583931804C220

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :


- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat » Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cas contraire aucune garantie ne sera accordée
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement » (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

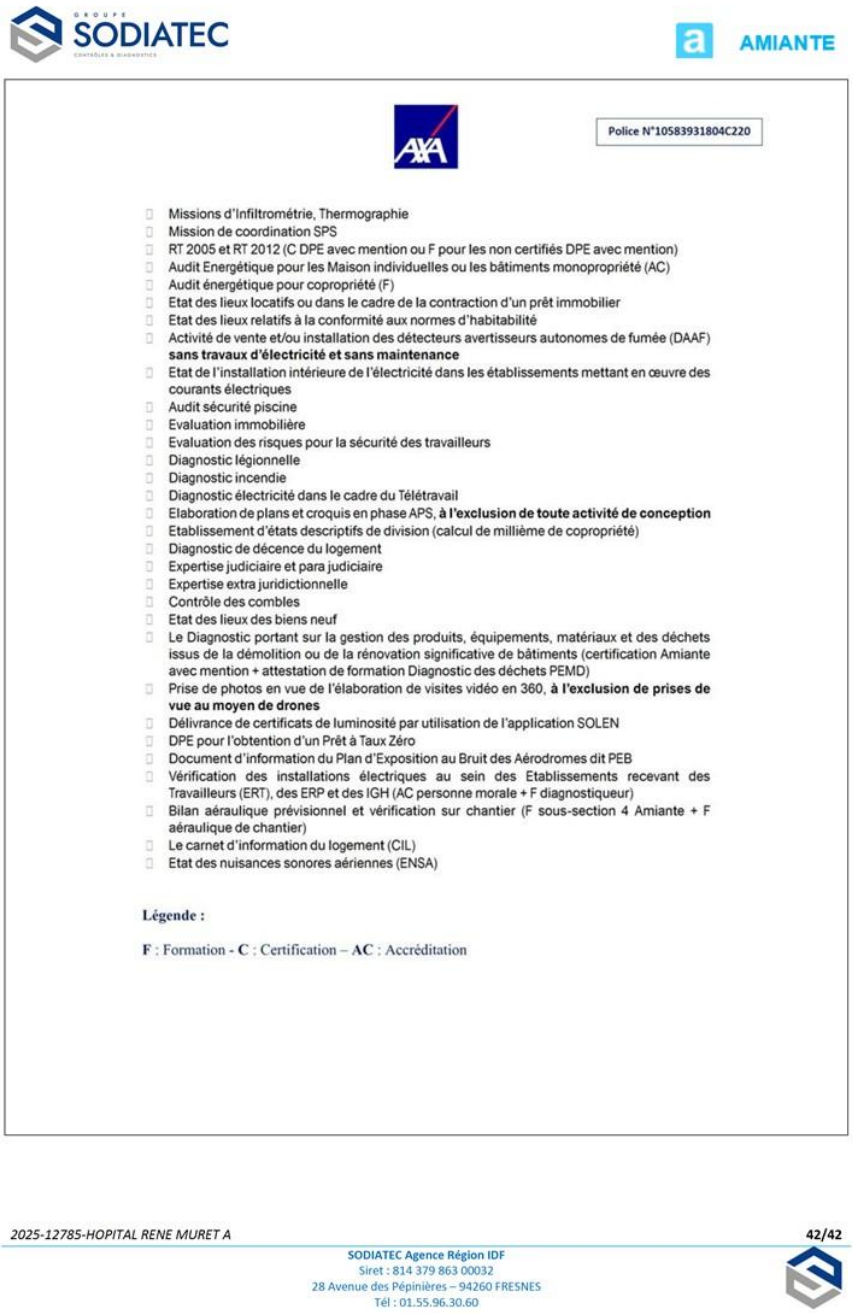

Police N°10583931804C220


- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit Energétique pour les Maison individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- Audit énergétique pour copropriété (F)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neuf
- Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique de chantier)
- Le carnet d'information du logement (CIL)
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Légende :

F : Formation - **C** : Certification – **AC** : Accréditation

Commentaire : *Rapport amiante 12785 portant sur l'ascenseur R1 - août 2025.*
Similitude d'ouvrage au niveau des sols des palliers niveaux 1 - 2 - 3.

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE

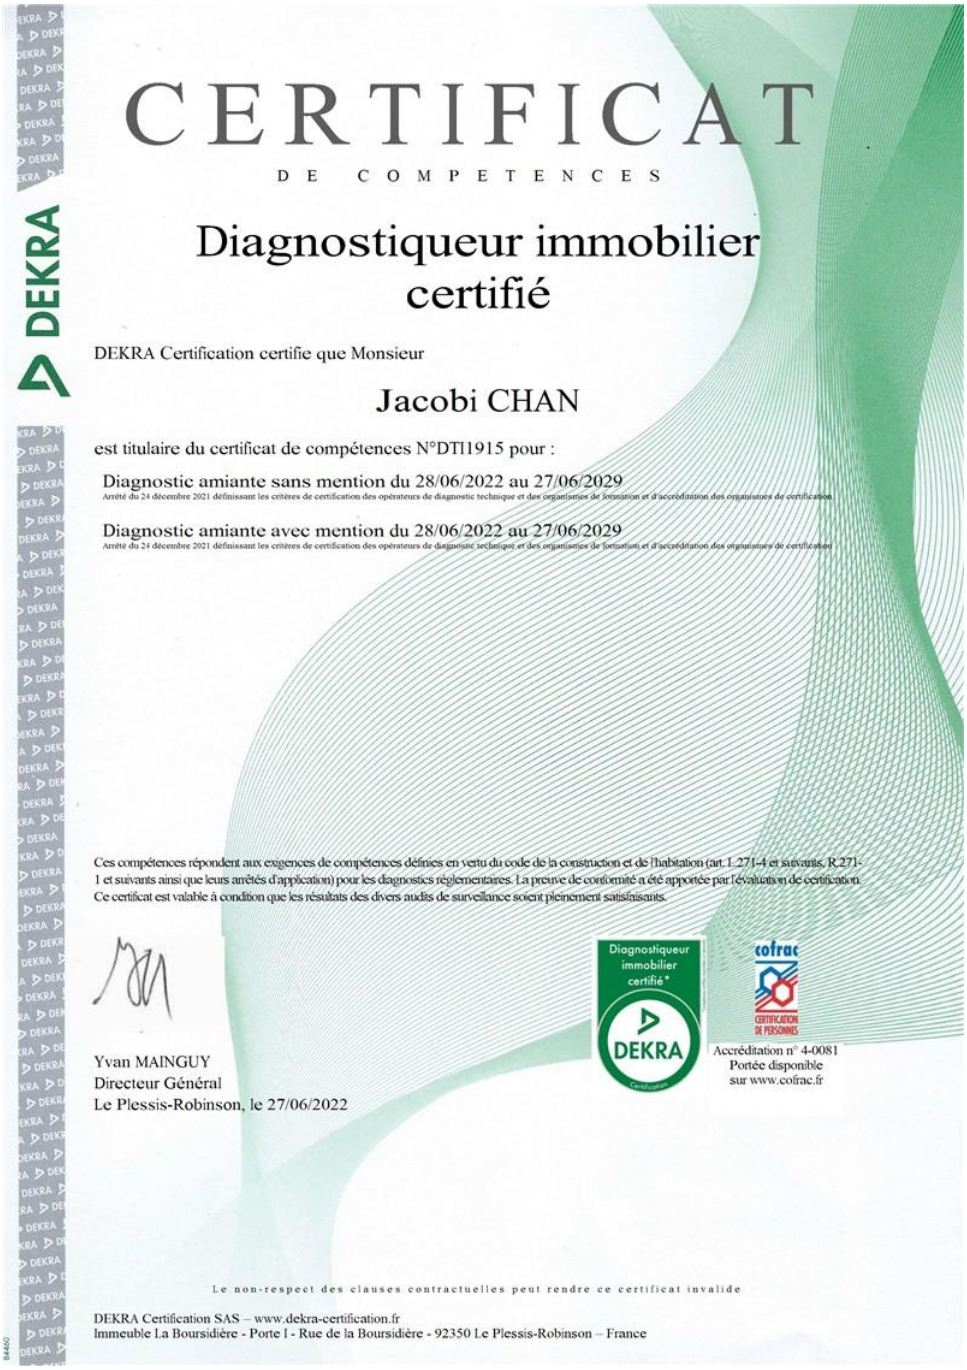

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

DEKRA

Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Jacobi CHAN

est titulaire du certificat de compétences N°DTI1915 pour :

Diagnostic amiante sans mention du 28/06/2022 au 27/06/2029
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic amiante avec mention du 28/06/2022 au 27/06/2029
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification.
Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Diagnostiqueur immobilier certifié
DEKRA

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n° 4-0081
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Yvan MAINGUY
Directeur Général
Le Plessis-Robinson, le 27/06/2022

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte 1 - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

Adhésion N°C220

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804

Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

COVEANEX
28 AVENUE DES PEPINIERES
94260 FRESNES

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° **10583931804C220**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées au contrat, ***sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.***

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

1 000 000 € PAR SINISTRE ET 2 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 19 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 306 121 069 - N° ORIAS 07 000 473

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Police N°10583931804C220

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
  Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cas contraire aucune garantie ne sera accordée
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement » (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Police N°10583931804C220

- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit Energétique pour les Maison individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- Audit énergétique pour copropriété (F)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neuf
- Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique de chantier)
- Le carnet d'information du logement (CIL)
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Légende :

F : Formation - **C** : Certification – **AC** : Accréditation

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60
