Agence de *ILE-DE-FRANCE
16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : Fax :

Coordonnées Destinataire

GROUPE HOSPITALIER HUPSSD

Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad

93009 BOBIGNY CEDEX













Référence : 002ID001473
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 16/06/2017

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



Propriétaire :


GROUPE HOSPITALIER HUPSSD
Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY CEDEX

Désignation du bien :

Ascenseur 40/41/42/43
125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY

Référencé : Avicenne Escoffier Asc









Professionnels, consultez vos rapports sur www.webxpert.fr







Référence : 002ID001473
125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY
Référencé : Avicenne Escoffier Asc

NOTE DE SYNTHESE



AMIANTE AVANT TRAVAUX

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués. Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante: après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.	**Absence**

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	125 rue de Stalingrad
CP - Ville :	93009 BOBIGNY
Référence client :	Avicenne Escoffier Asc
Date du repérage :	16/06/2017
Désignation :	Ascenseur 40/41/42/43



Présence d'amiante	Non
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Propriétaire : GROUPE HOSPITALIER HUPSSD	Donneur d'ordre : GROUPE HOSPITALIER HUPSSD
Référence client :	Avicenne Escoffier Asc	Adresse : Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY CEDEX	Adresse : Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY CEDEX
Désignation :	Ascenseur 40/41/42/43		
Date de construction :			

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	BENIHADDADENE Farid
Accompagnateur :	MOULOUD Lyes (AC Environnement)
Date de repérage	16/06/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3484 V3
Délivré le : 24/05/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 04/07/2017
A Riorges, le 04/07/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Sous sol -1 Ascenseur 40 - Vol 1 (palier)	Sous sol -1 Ascenseur 41 - Vol 2 (palier)
Sous sol -2 Ascenseur 40 - Vol 3 (palier)	Sous sol -2 Ascenseur 41 - Vol 4 (palier)
Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	Rez de chaussée Ascenseur 40 - Vol 6 (palier)
Rez de chaussée Ascenseur 42 - Vol 7 (palier)	Sous sol Ascenseur 42 - Vol 8 (palier)
Rez de chaussée Ascenseur 43 - Vol 9 (palier)	Sous sol Ascendeur 43 - Vol 10 (palier)
Machinerie Asc.40 - Vol 11 (local)	Machinerie Asc.41 - Vol 12 (local)
Gaine Asc.41 - Vol 13 (trémie)	Gaine Asc.40 - Vol 14 (trémie)
Gaine Asc. 43 - Vol 15 (trémie)	Gaine Asc.42 - Vol 16 (trémie)
Machinerie Asc.42 - Vol 17 (local)	Machinerie Asc.43 - Vol 18 (local)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Travaux de rénovation des ascenseurs impactant les portes pallières, les gaines, les machineries.

G Périmètre du bâtiment concerné

Le présent diagnostic concerne les ascenseurs:
- Batiment Larrey B: Asc 15/16/20/25
- Batiment M.BRES: Asc 44/45/48/49
- Batiment Charcot : Asc 1/2
- Batiment Escoffier : Asc 40/41/42/43

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Plan de localisation des Ascenseurs -
Localisation_Ascenseur-A3 - APHP - 23/05/2017

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol -1 Ascenseur 40	Vol 1 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol -1 Ascenseur 40	Vol 1 (palier)	
Revêtement de mur	Sous sol -1 Ascenseur 40	Vol 1 (palier)	
Revêtement de sol	Sous sol -1 Ascenseur 40	Vol 1 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol -1 Ascenseur 41	Vol 2 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol -1 Ascenseur 41	Vol 2 (palier)	
Revêtement de mur	Sous sol -1 Ascenseur 41	Vol 2 (palier)	
Revêtement de sol	Sous sol -1 Ascenseur 41	Vol 2 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol -2 Ascenseur 40	Vol 3 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol -2 Ascenseur 40	Vol 3 (palier)	
Revêtement de mur	Sous sol -2 Ascenseur 40	Vol 3 (palier)	
Revêtement de sol	Sous sol -2 Ascenseur 40	Vol 3 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol -2 Ascenseur 41	Vol 4 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol -2 Ascenseur 41	Vol 4 (palier)	
Revêtement de sol	Sous sol -2 Ascenseur 41	Vol 4 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Rez de chaussée Ascenseur 41	Vol 5 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Rez de chaussée Ascenseur 41	Vol 5 (palier)	
Revêtement de mur	Rez de chaussée Ascenseur 41	Vol 5 (palier)	

Revêtement de sol	Rez de chaussée Ascenseur 41	Vol 5 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Rez de chaussée Ascenseur 40	Vol 6 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Rez de chaussée Ascenseur 40	Vol 6 (palier)	
Revêtement de mur	Rez de chaussée Ascenseur 40	Vol 6 (palier)	
Revêtement de sol	Rez de chaussée Ascenseur 40	Vol 6 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Rez de chaussée Ascenseur 42	Vol 7 (palier)	
Revêtement de mur	Rez de chaussée Ascenseur 42	Vol 7 (palier)	
Revêtement de sol	Rez de chaussée Ascenseur 42	Vol 7 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol Ascenseur 42	Vol 8 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol Ascenseur 42	Vol 8 (palier)	
Revêtement de mur	Sous sol Ascenseur 42	Vol 8 (palier)	
Revêtement de sol	Sous sol Ascenseur 42	Vol 8 (palier)	
Revêtement de mur	Rez de chaussée Ascenseur 43	Vol 9 (palier)	
Revêtement de sol	Rez de chaussée Ascenseur 43	Vol 9 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol Ascendeur 43	Vol 10 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol Ascendeur 43	Vol 10 (palier)	
Revêtement de mur	Sous sol Ascendeur 43	Vol 10 (palier)	
Revêtement de sol	Sous sol Ascendeur 43	Vol 10 (palier)	
Ascenceurs et monte charges	Machinerie Asc.40	Vol 11 (local)	
Parois verticales intérieures et enduits	Machinerie Asc.40	Vol 11 (local)	
Revêtement de sol	Machinerie Asc.40	Vol 11 (local)	
Ascenceurs et monte charges	Machinerie Asc.41	Vol 12 (local)	
Parois verticales intérieures et enduits	Machinerie Asc.41	Vol 12 (local)	
Revêtement de sol	Machinerie Asc.41	Vol 12 (local)	
Ascenceurs et monte charges	Gaine Asc.41	Vol 13 (trémie)	
Ascenceurs et monte charges	Gaine Asc.40	Vol 14 (trémie)	
Ascenceurs et monte charges	Gaine Asc. 43	Vol 15 (trémie)	
Ascenceurs et monte charges	Gaine Asc.42	Vol 16 (trémie)	
Ascenceurs et monte charges	Machinerie Asc.42	Vol 17 (local)	
Parois verticales intérieures et enduits	Machinerie Asc.42	Vol 17 (local)	
Revêtement de sol	Machinerie Asc.42	Vol 17 (local)	
Ascenceurs et monte charges	Machinerie Asc.43	Vol 18 (local)	

Parois verticales intérieures et enduits	Machinerie Asc.43	Vol 18 (local)	
Revêtement de sol	Machinerie Asc.43	Vol 18 (local)	

K — Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L — Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M — Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 14 (trémie)	ciment	Fond de fosse inondé.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Sans objet

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 14 (trémie) - Gaine Asc.40	Moyen investigation non mis a disposition	Gaine non visitable dans son intégralité, ascenseur en panne.ss au rdc)
Vol 13 (trémie) - Gaine Asc.41	Risque sanitaire ou physique avéré	Fond de fosse. Présence de rats morts.
Vol 9 (palier) - Rez de chaussée Ascenseur 43	Inaccessible sans sondage destructif	Mûrs, plafond.

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Ascenceurs et monte charges

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Ascenceurs et monte charges

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Machinerie Asc.40	Vol 11 (local)	Machinerie	Frein	P32	Réalisation d'un prélevement		002ID0014 73 n°32 - 1	P32	Matériau Dur Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.41	Vol 12 (local)	Machinerie	Frein	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32		002ID0014 73 n°32 - 1	P32	Matériau Dur Noir Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Asc.41	Vol 13 (trémie)	Trémie	joint entre éléments	P33	Réalisation d'un prélevement	Mûr, rdc.	002ID0014 73 n°33 - 1	P33	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Asc. 43	Vol 15 (trémie)	Trémie	joint entre éléments	S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	Mûr, rdc.	002ID0014 73 n°33 - 1	P33	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Asc.42	Vol 16 (trémie)	Trémie	joint entre éléments	S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	Mûr, rdc.	002ID0014 73 n°33 - 1	P33	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Asc.41	Vol 13 (trémie)	Trémie	plâtre	P34	Réalisation d'un prélevement	Mur, rdc.	002ID0014 73 n°34 - 1	P34	Plâtre Effritable Bleu Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Asc.41	Vol 13 (trémie)	Trémie	plâtre	P35	Réalisation d'un prélevement	Mûr,rdc.	002ID0014 73 n°35 - 1	P35	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Asc.40	Vol 14 (trémie)	Trémie	ciment.	S27	Réalisation d'un prélevement	mûr, sous sol.	002ID0014 73 n°36 - 1	P36	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Asc.40	Vol 14 (trémie)	Trémie	ciment	I1			I1 - 1				Fond de fosse inondé.
Gaine Asc.41	Vol 13 (trémie)	Trémie	ciment	P37	Réalisation d'un prélevement	Mûrs, sous sol	002ID0014 73 n°37 - 1	P37	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Asc. 43	Vol 15 (trémie)	Trémie	ciment	P38	Réalisation d'un prélevement	Fond de fosse.	002ID0014 73 n°38 - 1	P38	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Asc.42	Vol 16 (trémie)	Trémie	ciment	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38	Fond de fosse.	002ID0014 73 n°38 - 1	P38	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Asc. 43	Vol 15 (trémie)	Trémie	ciment	P39	Réalisation d'un prélevement	Mûr, sous sol.	002ID0014 73 n°39 - 1	P39	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Asc.42	Vol 16 (trémie)	Trémie	ciment	S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	Mûr, sous sol.	002ID0014 73 n°39 - 1	P39	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Asc. 43	Vol 15 (trémie)	Portes palières	isolation	P40	Réalisation d'un prélevement		002ID0014 73 n°40 - 1	P40	Laine Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Ascenceurs et monte charges

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Gaine Asc. 43	Vol 15 (trémie)	Portes palières	isolation	P40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P40		002ID001473 n°40 - 1	P40	Laine Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.42	Vol 17 (local)	Machinerie	Frein	P44	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°44 - 1	P44	Matériau Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.43	Vol 18 (local)	Machinerie	Frein	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P44		002ID001473 n°44 - 1	P44	Matériau Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol -1 Ascenseur 40	Vol 1 (palier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°4 - 1	P4	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -1 Ascenseur 41	Vol 2 (palier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002ID001473 n°4 - 1	P4	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -2 Ascenseur 40	Vol 3 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°8 - 1	P8	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -2 Ascenseur 40	Vol 3 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002ID001473 n°8 - 1	P8	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -2 Ascenseur 41	Vol 4 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°11 - 1	P11	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 41	Vol 5 (palier)	Murs et cloisons	joint entre éléments	P14	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°14 - 1	P14	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 40	Vol 6 (palier)	Murs et cloisons	joint entre éléments	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002ID001473 n°14 - 1	P14	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rez de chaussée Ascenseur 41	Vol 5 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P15	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°15 - 1	P15	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 40	Vol 6 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002ID001473 n°15 - 1	P15	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 42	Vol 7 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P21	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°21 - 1	P21	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseur 42	Vol 8 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P25	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°25 - 1	P25	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascendeur 43	Vol 10 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25		002ID001473 n°25 - 1	P25	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.40	Vol 11 (local)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P29	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°29 - 1	P29	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.40	Vol 11 (local)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002ID001473 n°29 - 1	P29	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.41	Vol 12 (local)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002ID001473 n°29 - 1	P29	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.40	Vol 11 (local)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	P30	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°30 - 1	P30	Plâtre Effritable Bleu Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.42	Vol 17 (local)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P41	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°41 - 1	P41	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.42	Vol 17 (local)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P41		002ID001473 n°41 - 1	P41	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.43	Vol 18 (local)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P41		002ID001473 n°41 - 1	P41	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.42	Vol 17 (local)	Murs et cloisons	joint entre éléments	P42	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°42 - 1	P42	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Machinerie Asc.42	Vol 17 (local)	Murs et cloisons	joint entre éléments	P42 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P42		002ID001473 n°42 - 1	P42	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.43	Vol 18 (local)	Murs et cloisons	joint entre éléments	S35 - S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P42		002ID001473 n°42 - 1	P42	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol -1 Ascenseur 40	Vol 1 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°3 - 1	P3	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -1 Ascenseur 41	Vol 2 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002ID001473 n°3 - 1	P3	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -1 Ascenseur 40	Vol 1 (palier)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1			S1 - 1				Négatif sur document Après 2000
Sous sol -1 Ascenseur 41	Vol 2 (palier)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1			S1 - 1				Négatif sur document Après 2000
Sous sol -2 Ascenseur 40	Vol 3 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°9 - 1	P9	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -2 Ascenseur 41	Vol 4 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002ID001473 n°9 - 1	P9	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 41	Vol 5 (palier)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P16	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°16 - 1	P16	Faux plafond Fibreux Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 40	Vol 6 (palier)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002ID001473 n°16 - 1	P16	Faux plafond Fibreux Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rez de chaussée Ascenseur 41	Vol 5 (palier)	Plafonds	Flocages	P17	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°17 - 1	P17	Flocage Fibreux Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 40	Vol 6 (palier)	Plafonds	Flocages	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002ID001473 n°17 - 1	P17	Flocage Fibreux Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseur 42	Vol 8 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	P24	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°24 - 1 - 002ID001473 n°24 - 2	P24	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascendeur 43	Vol 10 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002ID001473 n°24 - 1 - 002ID001473 n°24 - 2	P24	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseur 42	Vol 8 (palier)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12			S12 - 1				Négatif sur marquageAprès 2000
Sous sol Ascendeur 43	Vol 10 (palier)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12			S12 - 1				Négatif sur marquageAprès 2000

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol -1 Ascenseur 40	Vol 1 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P2	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°2 - 1	P2 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -1 Ascenseur 40	Vol 1 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002ID001473 n°2 - 1	P2 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -1 Ascenseur 40	Vol 1 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P2	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°2 - 1	P2 Phase 2	Joint Dur Blanc Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol -1 Ascenseur 40	Vol 1 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002ID0014 73 n°2 - 1	P2 Phase 2	Joint Dur Blanc Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -1 Ascenseur 41	Vol 2 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Réalisation d'un prélevement		002ID0014 73 n°5 - 1	P5	Colle Dur Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -1 Ascenseur 41	Vol 2 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002ID0014 73 n°5 - 1	P5	Colle Dur Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -2 Ascenseur 40	Vol 3 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P7	Réalisation d'un prélevement		002ID0014 73 n°7 - 1	P7	Colle Dur Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -2 Ascenseur 40	Vol 3 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002ID0014 73 n°7 - 1	P7	Colle Dur Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 41	Vol 5 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélevement		002ID0014 73 n°13 - 1	P13	Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 41	Vol 5 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002ID0014 73 n°13 - 1	P13	Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 40	Vol 6 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002ID0014 73 n°13 - 1	P13	Colle Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 42	Vol 7 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Réalisation d'un prélevement		002ID0014 73 n°19 - 1	P19 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 42	Vol 7 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002ID0014 73 n°19 - 1	P19 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 42	Vol 7 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Réalisation d'un prélevement		002ID0014 73 n°19 - 1	P19 Phase 2	Joint Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 42	Vol 7 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002ID0014 73 n°19 - 1	P19 Phase 2	Joint Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rez de chaussée Ascenseur 42	Vol 7 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P20	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°20 - 1	P20	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 42	Vol 7 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002ID001473 n°20 - 1	P20	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseur 42	Vol 8 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Réalisation d'un prélevement			P23	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascendeur 43	Vol 10 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23			P23	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 43	Vol 9 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°26 - 1	P26 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 43	Vol 9 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002ID001473 n°26 - 1	P26 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 43	Vol 9 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°26 - 1	P26 Phase 2	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 43	Vol 9 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002ID001473 n°26 - 1	P26 Phase 2	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 43	Vol 9 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°27 - 1	P27	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 43	Vol 9 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27		002ID001473 n°27 - 1	P27	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascendeur 43	Vol 10 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P28	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°28 - 1	P28	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascendeur 43	Vol 10 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28		002ID001473 n°28 - 1	P28	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseur 42	Vol 8 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28		002ID001473 n°28 - 1	P28	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol -1 Ascenseur 40	Vol 1 (palier)	Revêtement de sol	Ragréage	P1	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°1 - 1	P1	Ragréage Dur Gris Matériau Dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -1 Ascenseur 41	Vol 2 (palier)	Revêtement de sol	Ragréage	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002ID001473 n°1 - 1	P1	Ragréage Dur Gris Matériau Dur Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -2 Ascenseur 40	Vol 3 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P6	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°6 - 1	P6	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol -2 Ascenseur 41	Vol 4 (palier)	Revêtement de sol	Ragréage	P10	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°10 - 1	P10	Matériau Souple Vert Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 41	Vol 5 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°12 - 1	P12	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 40	Vol 6 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002ID001473 n°12 - 1	P12	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 42	Vol 7 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P18	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°18 - 1	P18	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseur 43	Vol 9 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002ID001473 n°18 - 1	P18	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseur 42	Vol 8 (palier)	Revêtement de sol	Ragréage	P22	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°22 - 1	P22	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascendeur 43	Vol 10 (palier)	Revêtement de sol	Ragréage	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002ID001473 n°22 - 1	P22	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol


				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Machinerie Asc.40	Vol 11 (local)	Revêtement de sol	Ragréage	P31	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°31 - 1	P31	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.41	Vol 12 (local)	Revêtement de sol	Ragréage	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31		002ID001473 n°31 - 1	P31	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.42	Vol 17 (local)	Revêtement de sol	Ragréage	P43	Réalisation d'un prélevement		002ID001473 n°43 - 1	P43	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Asc.43	Vol 18 (local)	Revêtement de sol	Ragréage	S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P43		002ID001473 n°43 - 1	P43	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	Sous sol -1 Ascenseur 40	Sous sol -1 Ascenseur 40 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Sous sol -1 Ascenseur 41	Sous sol -1 Ascenseur 41 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Sous sol -2 Ascenseur 40	Sous sol -2 Ascenseur 40 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Sous sol -2 Ascenseur 41	Sous sol -2 Ascenseur 41 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Rez de chaussée Ascenseur 41	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Rez de chaussée Ascenseur 40	Rez de chaussée Ascenseur 40 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Rez de chaussée Ascenseur 42	Rez de chaussée Ascenseur 42 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Sous sol Ascenseur 42	Sous sol Ascenseur 42 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Rez de chaussée Ascenseur 43	Rez de chaussée Ascenseur 43 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Sous sol Ascendeur 43	Sous sol Ascendeur 43 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Machinerie Asc.40	Machinerie Asc.40 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Machinerie Asc.41	Machinerie Asc.41 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Gaine Asc.41	Gaine Asc.41 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Gaine Asc.40	Gaine Asc.40 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Gaine Asc. 43	Gaine Asc. 43 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Gaine Asc.42	Gaine Asc.42 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Machinerie Asc.42	Machinerie Asc.42 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Machinerie Asc.43	Machinerie Asc.43 - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL -1 ASCENSEUR 40 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473

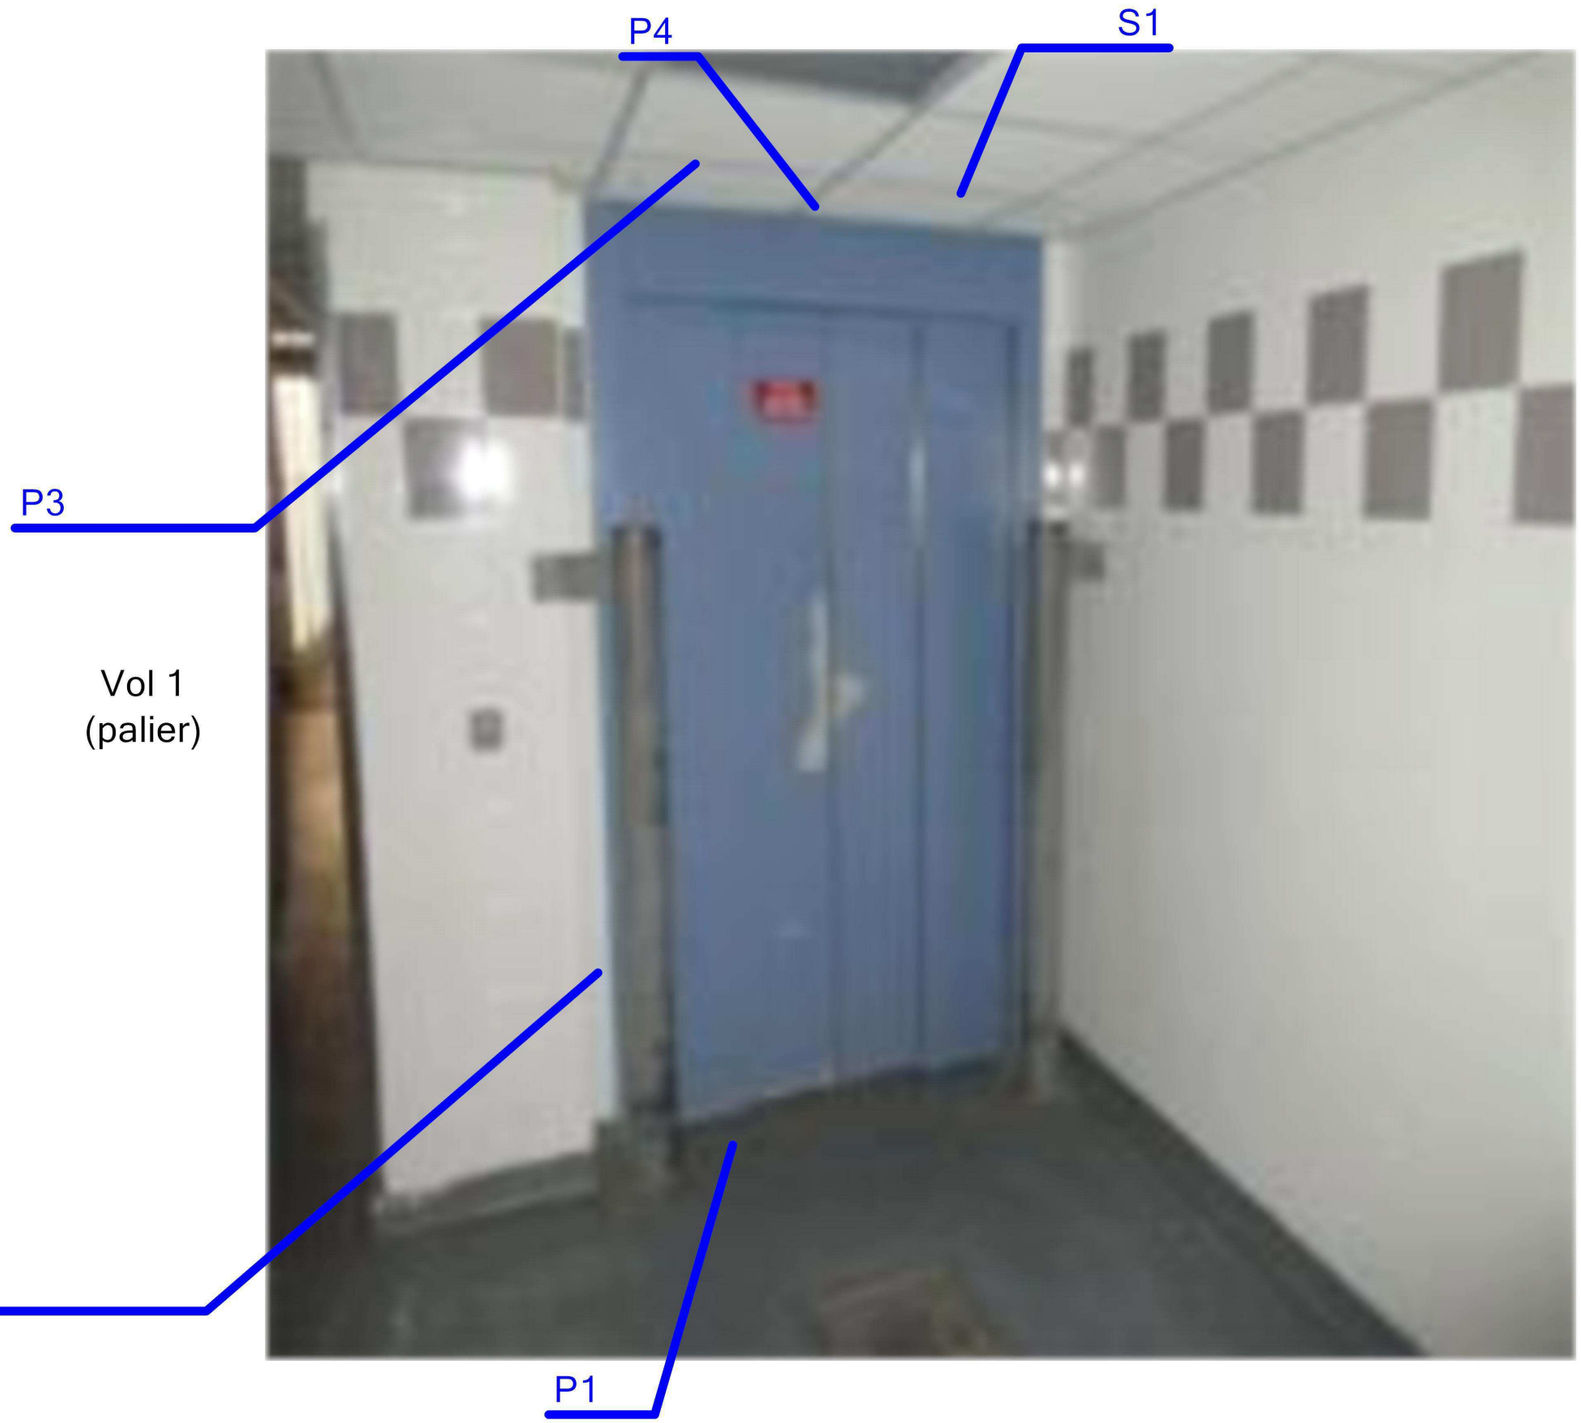

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

SOUS SOL -1 ASCENSEUR 41 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473



Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

SOUS SOL -2 ASCENSEUR 40 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473



Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

SOUS SOL -2 ASCENSEUR 41 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473

Vol 4
(palier)



Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

REZ DE CHAUSSÉE ASCENSEUR 41 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473



Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

REZ DE CHAUSSÉE ASCENSEUR 40 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473



Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

REZ DE CHAUSSÉE ASCENSEUR 42 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473



Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

SOUS SOL ASCENSEUR 42 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473



Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

REZ DE CHAUSSÉE ASCENSEUR 43 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473

Vol 9
(palier)



Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

SOUS SOL ASCENDEUR 43 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473




Vol 10
(palier)

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

MACHINERIE ASC.40 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001473

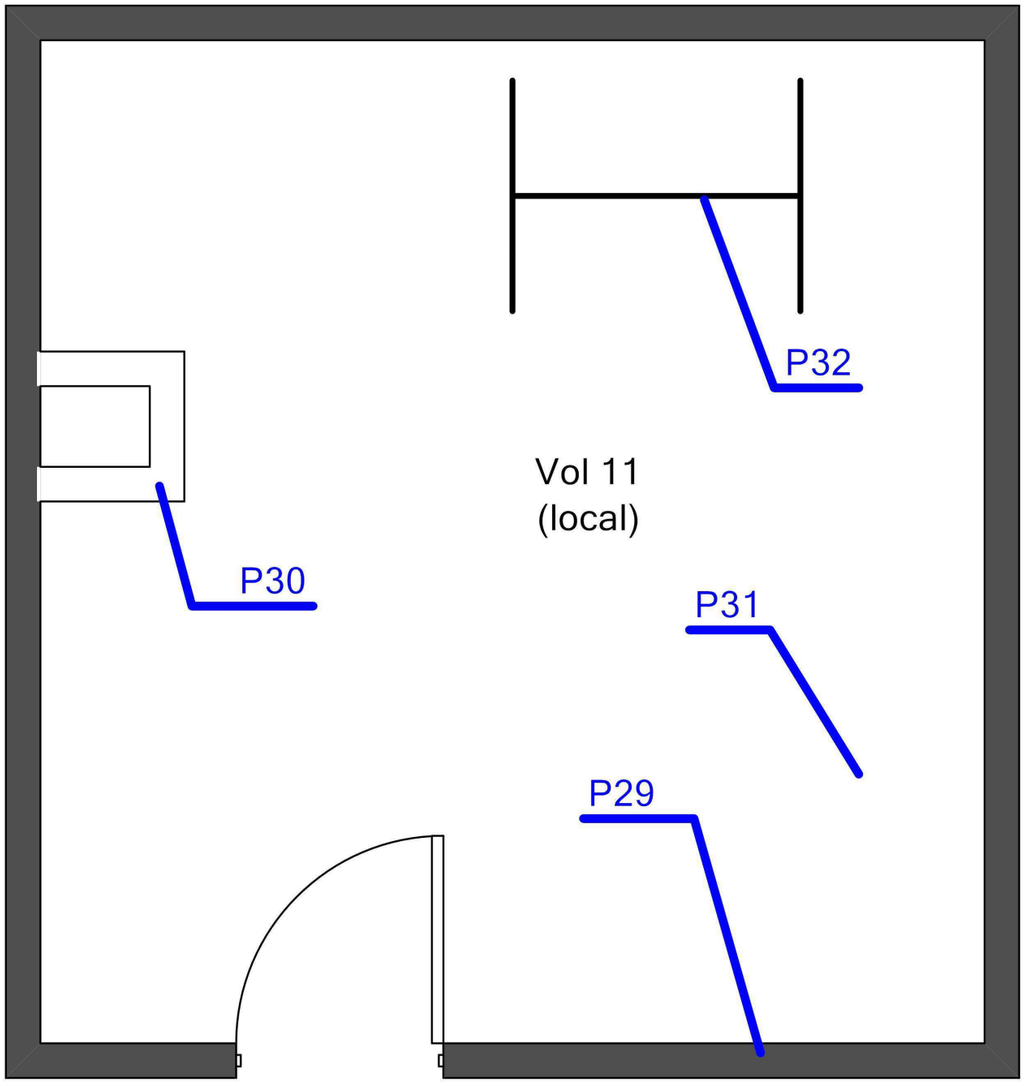


Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

MACHINERIE ASC.41 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473

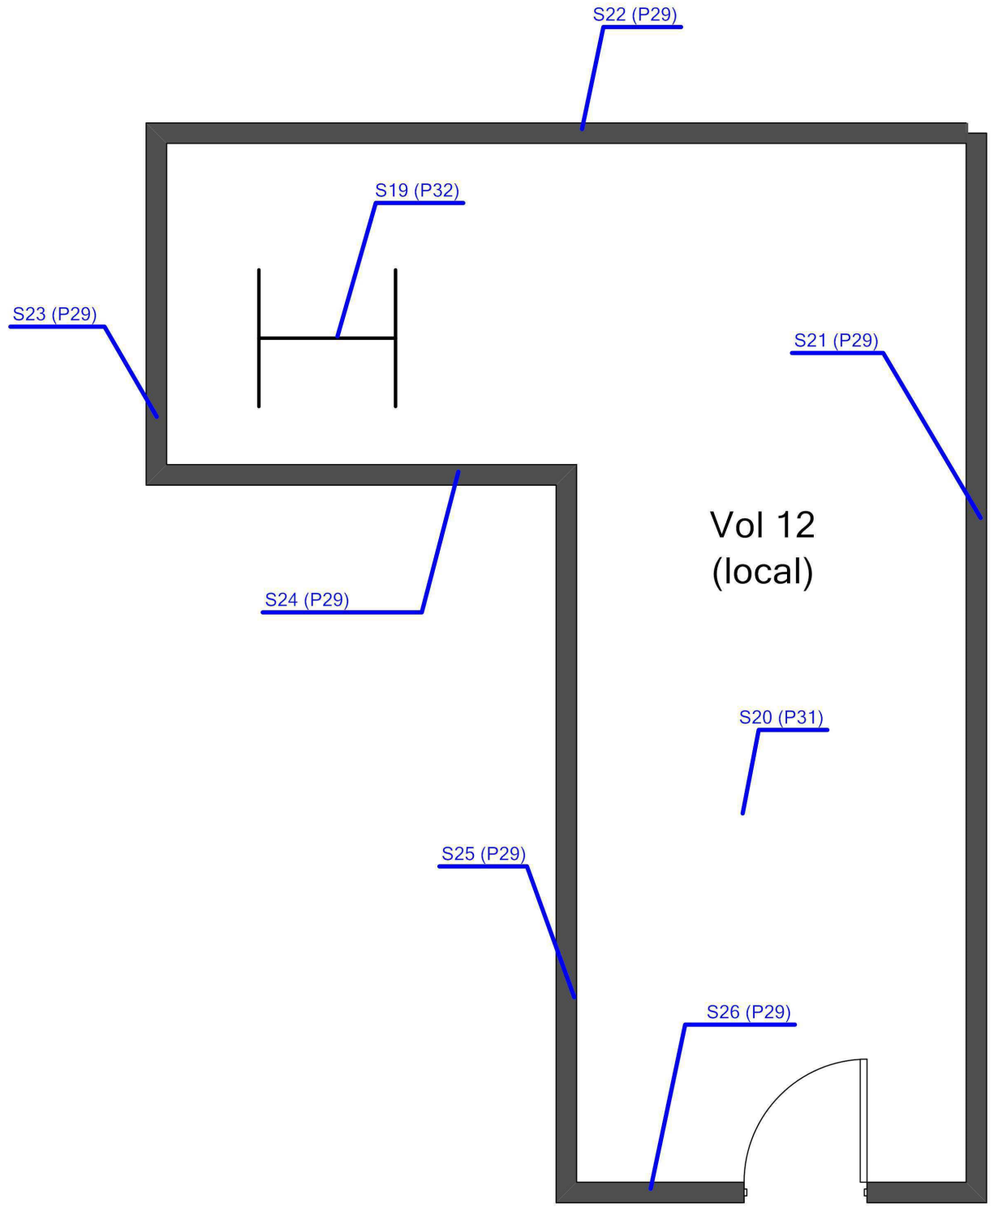


Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

GAINE ASC.41 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001473

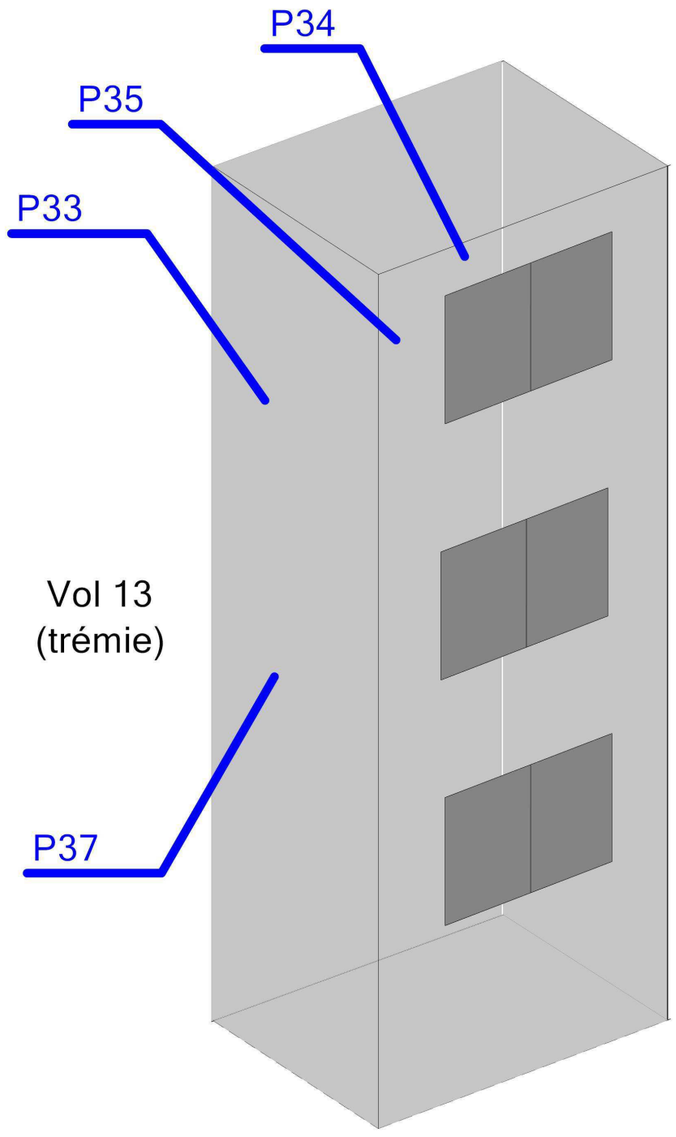

Légende


P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

GAINE ASC.40 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473

Vol 14
(trémie)

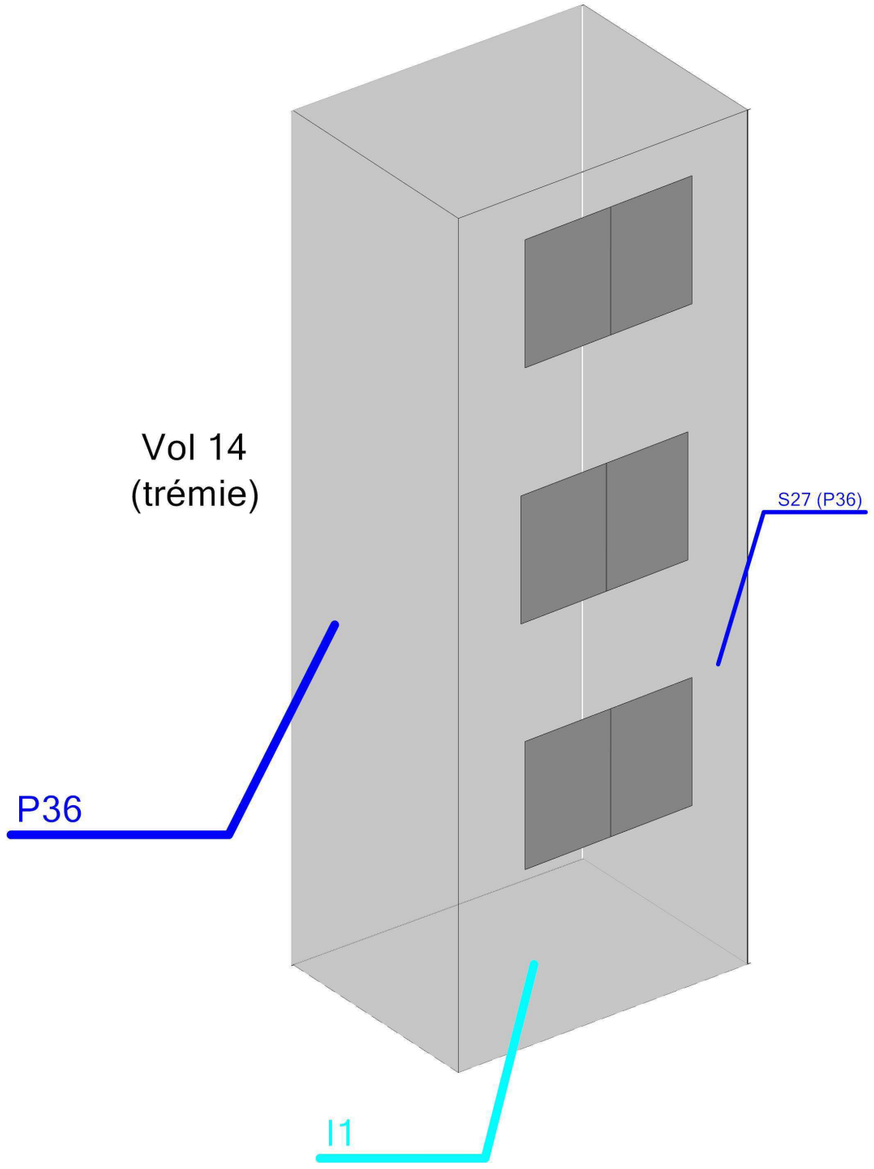


Légende	
P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

GAINE ASC. 43 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001473

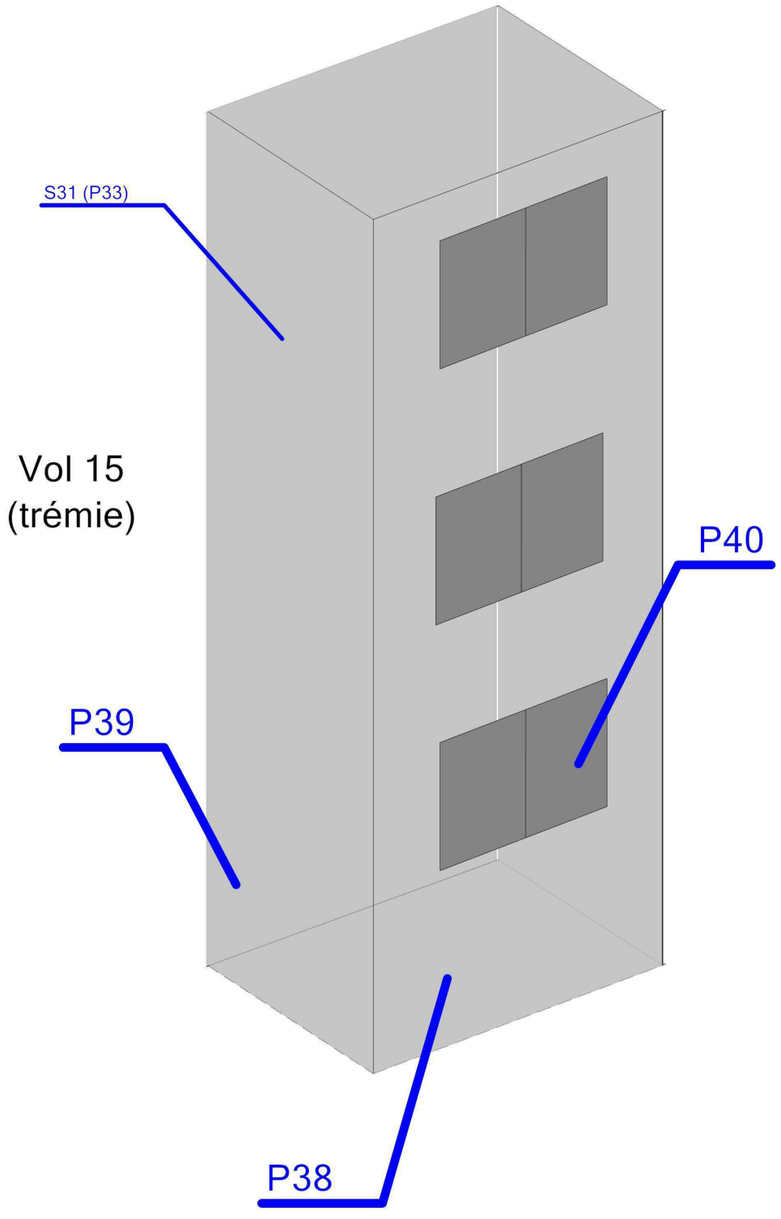

Légende


P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

GAINE ASC.42 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001473

Vol 16
(trémie)

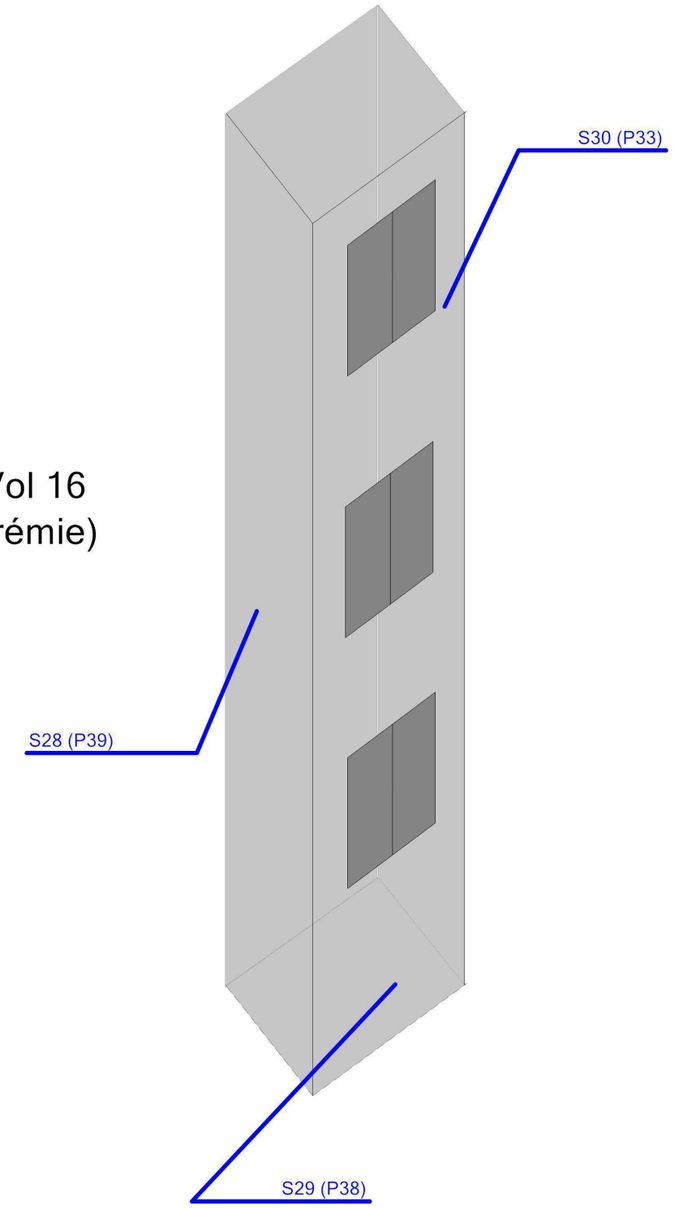


Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

MACHINERIE ASC.42 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001473

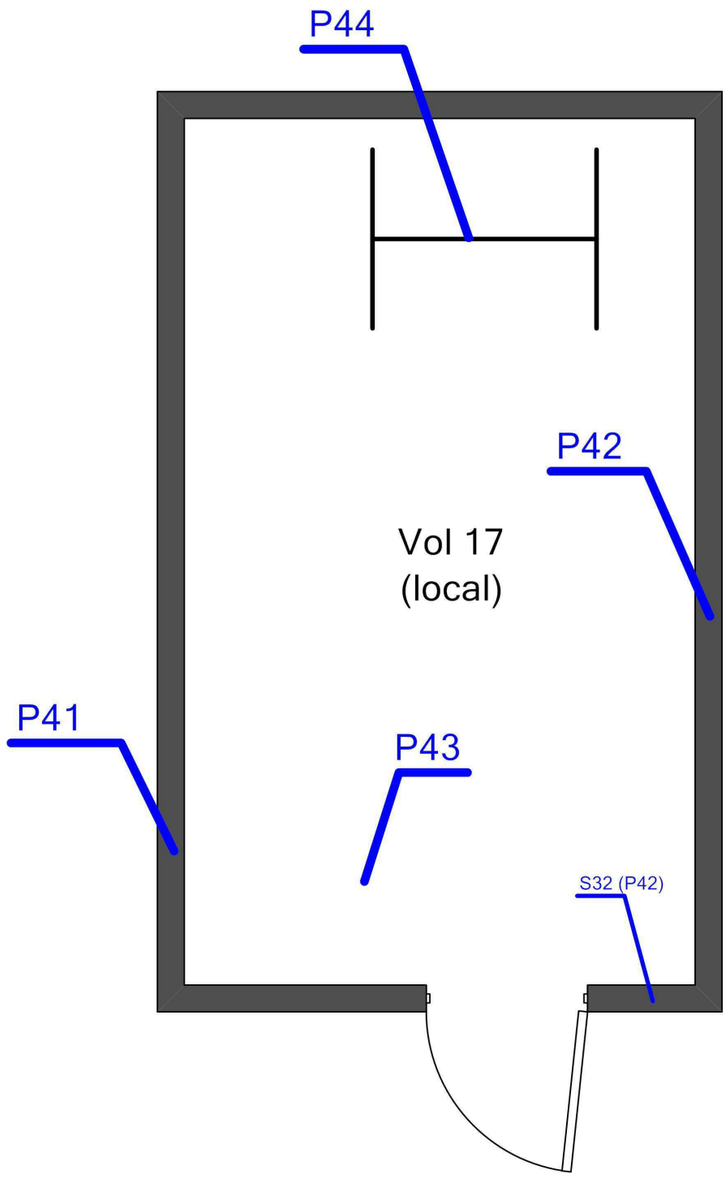


Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

MACHINERIE ASC.43 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001473

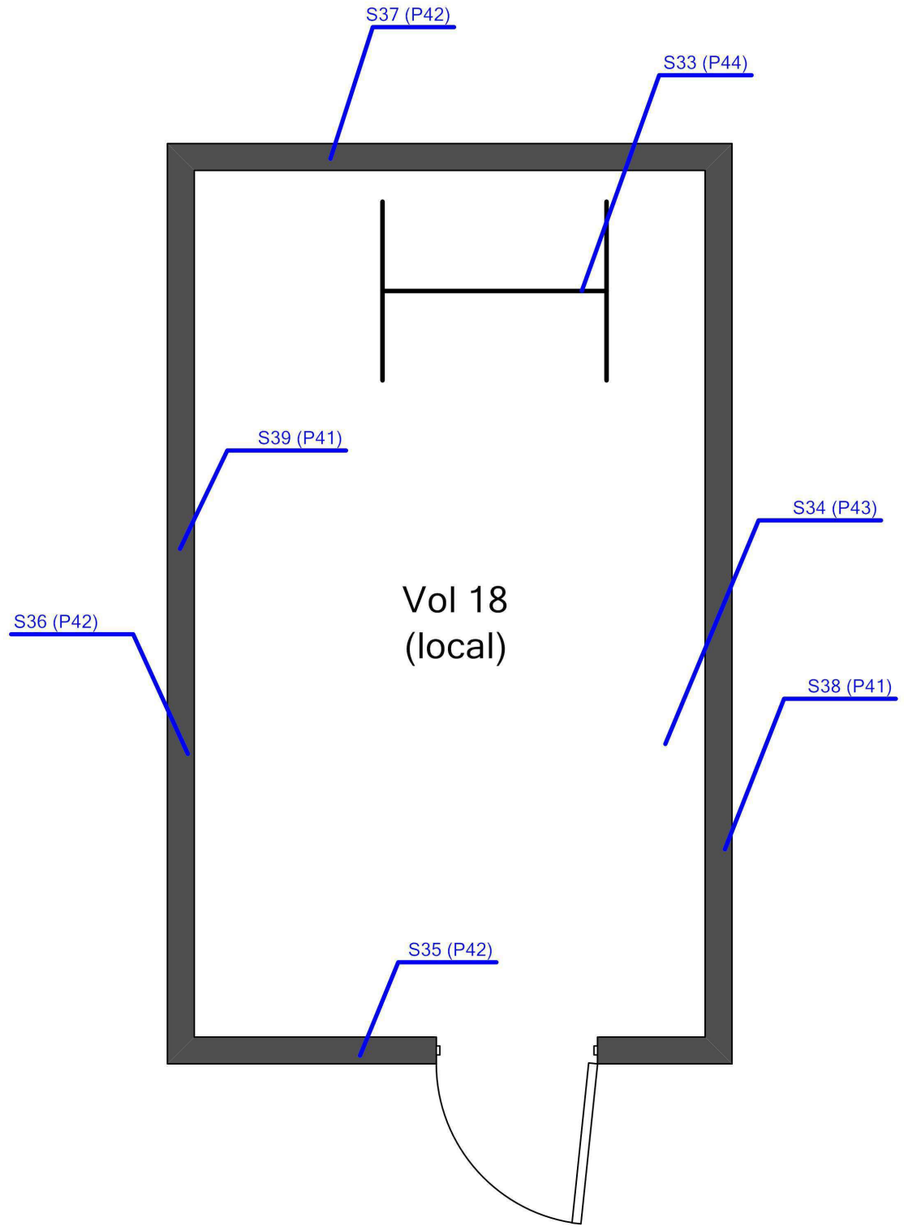

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 40/41/42/43	16/06/2017	BENIHADDADENE Farid

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°38 - 1 (P38)	Gaine Asc. 43 - Vol 15 (trémie)	Prélevement
002ID001473 n°39 - 1 (P39)	Gaine Asc. 43 - Vol 15 (trémie)	Prélevement
002ID001473 n°40 - 1 (P40)	Gaine Asc. 43 - Vol 15 (trémie)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°36 - 1 (P36)	Gaine Asc.40 - Vol 14 (trémie)	Prélevement
	Gaine Asc.40 - Vol 14 (trémie)	I1

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°33 - 1 (P33)	Gaine Asc.41 - Vol 13 (trémie)	Prélevement
002ID001473 n°34 - 1 (P34)	Gaine Asc.41 - Vol 13 (trémie)	Prélevement
002ID001473 n°35 - 1 (P35)	Gaine Asc.41 - Vol 13 (trémie)	Prélevement
002ID001473 n°37 - 1 (P37)	Gaine Asc.41 - Vol 13 (trémie)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°29 - 1 (P29)	Machinerie Asc.40 - Vol 11 (local)	Prélevement
002ID001473 n°30 - 1 (P30)	Machinerie Asc.40 - Vol 11 (local)	Prélevement
002ID001473 n°31 - 1 (P31)	Machinerie Asc.40 - Vol 11 (local)	Prélevement
002ID001473 n°32 - 1 (P32)	Machinerie Asc.40 - Vol 11 (local)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°41 - 1 (P41)	Machinerie Asc.42 - Vol 17 (local)	Prélevement
002ID001473 n°42 - 1 (P42)	Machinerie Asc.42 - Vol 17 (local)	Prélevement
002ID001473 n°43 - 1 (P43)	Machinerie Asc.42 - Vol 17 (local)	Prélevement
002ID001473 n°44 - 1 (P44)	Machinerie Asc.42 - Vol 17 (local)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°12 - 1 (P12)	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°13 - 1 (P13)	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°14 - 1 (P14)	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°15 - 1 (P15)	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°16 - 1 (P16)	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°17 - 1 (P17)	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°18 - 1 (P18)	Rez de chaussée Ascenseur 42 - Vol 7 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°19 - 1 (P19)	Rez de chaussée Ascenseur 42 - Vol 7 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°20 - 1 (P20)	Rez de chaussée Ascenseur 42 - Vol 7 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°21 - 1 (P21)	Rez de chaussée Ascenseur 42 - Vol 7 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°26 - 1 (P26)	Rez de chaussée Ascenseur 43 - Vol 9 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°27 - 1 (P27)	Rez de chaussée Ascenseur 43 - Vol 9 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°1 - 1 (P1)	Sous sol -1 Ascenseur 40 - Vol 1 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°2 - 1 (P2)	Sous sol -1 Ascenseur 40 - Vol 1 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°3 - 1 (P3)	Sous sol -1 Ascenseur 40 - Vol 1 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°4 - 1 (P4)	Sous sol -1 Ascenseur 40 - Vol 1 (palier)	Prélevement
S1 - 1 (A1)	Sous sol -1 Ascenseur 40 - Vol 1 (palier)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°5 - 1 (P5)	Sous sol -1 Ascenseur 41 - Vol 2 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°6 - 1 (P6)	Sous sol -2 Ascenseur 40 - Vol 3 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°7 - 1 (P7)	Sous sol -2 Ascenseur 40 - Vol 3 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°8 - 1 (P8)	Sous sol -2 Ascenseur 40 - Vol 3 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°9 - 1 (P9)	Sous sol -2 Ascenseur 40 - Vol 3 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°10 - 1 (P10)	Sous sol -2 Ascenseur 41 - Vol 4 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°11 - 1 (P11)	Sous sol -2 Ascenseur 41 - Vol 4 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°28 - 1 (P28)	Sous sol Ascendeur 43 - Vol 10 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001473 n°22 - 1 (P22)	Sous sol Ascenseur 42 - Vol 8 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°24 - 1 (P24)	Sous sol Ascenseur 42 - Vol 8 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°24 - 2 (P24)	Sous sol Ascenseur 42 - Vol 8 (palier)	Prélevement
002ID001473 n°25 - 1 (P25)	Sous sol Ascenseur 42 - Vol 8 (palier)	Prélevement
S12 - 1 (A12)	Sous sol Ascenseur 42 - Vol 8 (palier)	Absence sur marquage du materiau

002ID001473 n°1 - 1 (P1)



002ID001473 n°2 - 1 (P2)



002ID001473 n°3 - 1 (P3)



002ID001473 n°4 - 1 (P4)



002ID001473 n°5 - 1 (P5)



002ID001473 n°6 - 1 (P6)



002ID001473 n°7 - 1 (P7)



002ID001473 n°8 - 1 (P8)



002ID001473 n°9 - 1 (P9)



002ID001473 n°10 - 1 (P10)



002ID001473 n°11 - 1 (P11)



002ID001473 n°12 - 1 (P12)



002ID001473 n°13 - 1 (P13)



002ID001473 n°14 - 1 (P14)



002ID001473 n°15 - 1 (P15)



002ID001473 n°16 - 1 (P16)



002ID001473 n°17 - 1 (P17)



002ID001473 n°18 - 1 (P18)



002ID001473 n°19 - 1 (P19)



002ID001473 n°20 - 1 (P20)



002ID001473 n°21 - 1 (P21)



002ID001473 n°22 - 1 (P22)



002ID001473 n°24 - 1 (P24)



002ID001473 n°24 - 2 (P24)



002ID001473 n°25 - 1 (P25)



002ID001473 n°26 - 1 (P26)



002ID001473 n°27 - 1 (P27)



002ID001473 n°28 - 1 (P28)



S1 - 1 (A1)



S12 - 1 (A12)



002ID001473 n°29 - 1 (P29)




002ID001473 n°30 - 1 (P30)



002ID001473 n°31 - 1 (P31)



002ID001473 n°32 - 1 (P32)

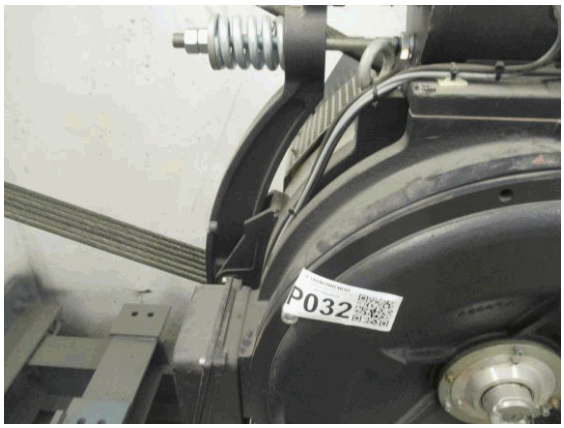

002ID001473 n°33 - 1 (P33)



002ID001473 n°34 - 1 (P34)



002ID001473 n°35 - 1 (P35)



002ID001473 n°36 - 1 (P36)



I1 - 1



002ID001473 n°37 - 1 (P37)



002ID001473 n°38 - 1 (P38)



002ID001473 n°39 - 1 (P39)



002ID001473 n°40 - 1 (P40)



002ID001473 n°41 - 1 (P41)




002ID001473 n°42 - 1 (P42)



002ID001473 n°43 - 1 (P43)



002ID001473 n°44 - 1 (P44)

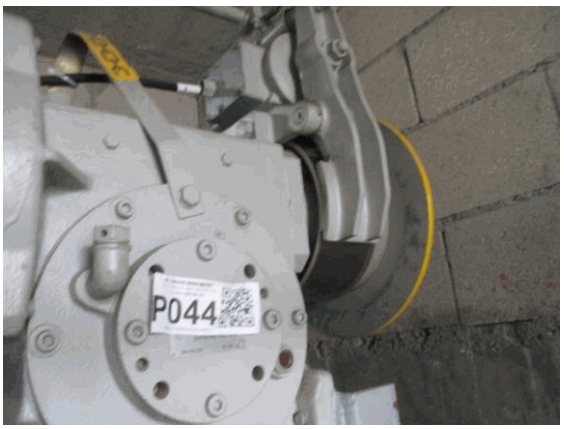

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Dur Gris Matériau Dur Bleu - -	Sous sol -1 Ascenseur 40 - Vol 1 (palier)	
P2 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Sous sol -1 Ascenseur 40 - Vol 1 (palier)	
P2 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc Matériau Effritable Bleu - -	Sous sol -1 Ascenseur 40 - Vol 1 (palier)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris - -	Sous sol -1 Ascenseur 40 - Vol 1 (palier)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Sous sol -1 Ascenseur 40 - Vol 1 (palier)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Ciment Effritable Gris - -	Sous sol -1 Ascenseur 41 - Vol 2 (palier)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Beige - -	Sous sol -2 Ascenseur 40 - Vol 3 (palier)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Blanc - -	Sous sol -2 Ascenseur 40 - Vol 3 (palier)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Sous sol -2 Ascenseur 40 - Vol 3 (palier)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Sous sol -2 Ascenseur 40 - Vol 3 (palier)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Souple Vert Ciment Dur Gris - -	Sous sol -2 Ascenseur 41 - Vol 4 (palier)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Sous sol -2 Ascenseur 41 - Vol 4 (palier)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Beige - -	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	
P16	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Fibreux Effritable Blanc Beige - -	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Fibreux Effritable Gris - -	Rez de chaussée Ascenseur 41 - Vol 5 (palier)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Rez de chaussée Ascenseur 42 - Vol 7 (palier)	
P19 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseur 42 - Vol 7 (palier)	
P19 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseur 42 - Vol 7 (palier)	

P20	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseur 42 - Vol 7 (palier)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseur 42 - Vol 7 (palier)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Bleu - -	Sous sol Ascenseur 42 - Vol 8 (palier)	
P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Sous sol Ascenseur 42 - Vol 8 (palier)	
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris - -	Sous sol Ascenseur 42 - Vol 8 (palier)	
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Sous sol Ascenseur 42 - Vol 8 (palier)	
P26 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	Rez de chaussée Ascenseur 43 - Vol 9 (palier)	
P26 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseur 43 - Vol 9 (palier)	
P27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseur 43 - Vol 9 (palier)	
P28	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	Sous sol Ascendeur 43 - Vol 10 (palier)	
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	Machinerie Asc.40 - Vol 11 (local)	
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Plâtre Effritable Bleu Enduit Effritable Blanc - -	Machinerie Asc.40 - Vol 11 (local)	
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Jaune - -	Machinerie Asc.40 - Vol 11 (local)	
P32	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau Dur Noir Matériau Effritable Blanc - -	Machinerie Asc.40 - Vol 11 (local)	
P33	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris - -	Gaine Asc.41 - Vol 13 (trémie)	
P34	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Plâtre Effritable Bleu Enduit Effritable Blanc - -	Gaine Asc.41 - Vol 13 (trémie)	
P35	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Gaine Asc.41 - Vol 13 (trémie)	
P36	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris - -	Gaine Asc.40 - Vol 14 (trémie)	
P37	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Effritable Gris - -	Gaine Asc.41 - Vol 13 (trémie)	
P38	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris - -	Gaine Asc. 43 - Vol 15 (trémie)	
P39	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Beige - -	Gaine Asc. 43 - Vol 15 (trémie)	
P40	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Laine Fibreux Jaune - -	Gaine Asc. 43 - Vol 15 (trémie)	
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Machinerie Asc.42 - Vol 17 (local)	
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Machinerie Asc.42 - Vol 17 (local)	
P43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Gris - -	Machinerie Asc.42 - Vol 17 (local)	
P44	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau Dur Noir - -	Machinerie Asc.42 - Vol 17 (local)	

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Référence chantier : **C012017220324**
Adresse chantier : Commande : 002ID001473
Affaire : Avicenne Escoffier Asc
125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 04/07/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017220324 (44 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01458463

Date de réception : 27/06/2017 **Date de préparation : 28/06/2017** **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_001 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1 (palier)	1 2	Ragréage Matériau	Dur Dur	Gris Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458464

Date de réception : 27/06/2017 **Date de préparation : 28/06/2017** **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_002 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 1 (palier)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2 3	Joint Matériau	Dur Effritable	Blanc Bleu	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01458465

Date de réception : 27/06/2017 **Date de préparation : 28/06/2017** **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_003 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 1 (palier)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458466

Date de réception : 27/06/2017 **Date de préparation : 28/06/2017** **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_004 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 1 (palier)	1 2	Plâtre Peinture	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458467

Date de réception : 27/06/2017 **Date de préparation : 28/06/2017** **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_005 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 2 (palier)	1 2	Colle Ciment	Dur Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458468

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_006 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 3 (palier)	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458469

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_007 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 3 (palier)	1	Colle	Dur	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458470

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_008 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 3 (palier)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Dur Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458471

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_009 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 3 (palier)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458472

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_010 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 4 (palier)	1 2	Matériau Ciment	Souple Dur	Vert Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458473

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_011 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 4 (palier)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Dur Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458474

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_012 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 5 (palier)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458475

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_013 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 5 (palier)	1	Colle	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458476

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_014 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / joint entre éléments Vol 5 (palier)	1 2	Ciment Enduit	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458477

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_015 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 5 (palier)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458478

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_016 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 5 (palier)	1	Faux plafond	Fibreux Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458479

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_017 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 5 (palier)	1	Flocage	Fibreux Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458480

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_018 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 7 (palier)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458481

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 28/06/2017** | **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_019 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 7 (palier)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2 3	Joint Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01458482

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 28/06/2017** | **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_020 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 7 (palier)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458483

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 28/06/2017** | **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_021 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 7 (palier)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458484

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 28/06/2017** | **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_022 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 8 (palier)	1 2	Ragréage Matériau	Effritable Effritable	Gris Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458485

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 03/07/2017** | **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_023 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 8 (palier)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458486

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 28/06/2017** | **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_024 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 8 (palier)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458487

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 28/06/2017** | **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_025 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 8 (palier)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458488

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 28/06/2017** | **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_026 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 9 (palier)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458489

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 28/06/2017** | **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_027 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 9 (palier)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458490

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 28/06/2017** | **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_028 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 10 (palier)	1 2	Colle Enduit	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458491

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 28/06/2017** | **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_029 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 11 (local)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458492

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 28/06/2017** | **Date d'analyse : 03/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001473_030 Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Panneaux Vol 11 (local)	1 2	Plâtre Enduit	Effritable Effritable	Bleu Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458493

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_031 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 11 (local)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Jaune	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458494

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_032 Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Frein Vol 11 (local)	1 2	Matériau Matériau	Dur Effritable	Noir Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458495

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_033 Ascenceurs et monte charges / Trémie / joint entre éléments Vol 13 (trémie)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458496

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_034 Ascenceurs et monte charges / Trémie / plâtre Vol 13 (trémie)	1 2	Plâtre Enduit	Effritable Effritable	Bleu Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458497

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 04/07/2017				Date d'analyse : 04/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_035 Ascenceurs et monte charges / Trémie / plâtre Vol 13 (trémie)	1 2	Plâtre Ciment	Effritable Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	3	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458498

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_036 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment. Vol 14 (trémie)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458499

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_037 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 13 (trémie)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458500

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 03/07/2017				Date d'analyse : 04/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_038 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 15 (trémie)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458501

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_039 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 15 (trémie)	1 2	Ciment Matériau	Dur Effritable	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458502

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_040 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / isolation Vol 15 (trémie)	1	Laine	Fibreux	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458503

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_041 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 17 (local)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458504

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 03/07/2017				Date d'analyse : 04/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_042 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / joint entre éléments Vol 17 (local)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458505

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 28/06/2017				Date d'analyse : 03/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_043 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 17 (local)	1 2	Ciment Matériau	Effritable Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.


Référence échantillon laboratoire : PM01458506

Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 03/07/2017				Date d'analyse : 04/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001473_044 Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Frein Vol 17 (local)	1	Matériau	Dur	Noir	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance
Sabbah Abdelslame



Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Annexe : Documents

QBE

GARANTIES ACCORDEES POUR LE MARCHE RATP A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

CES MONTANTS DE GARANTIES SONT INCLUS DANS LA LIMITE DES 6.000.000 EUROS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNEE D'ASSURANCE FIXEE §5 CI-AVANT.

INTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION / RC PROFESSIONNELLE CONFONDUS	
Tous dommages confondus	3,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	3,000,000 € par *Sinistre*
2. *Dommages immatériels non consécutifs*	1,000,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15,000 € par Sinistre

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 17 Mars 2017

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Direction Régionale "Tour Suisse"
1, Boulevard Vivier Merle
69423 LYON CEDEX 03
Tél. : 33 (0)4 26 29 85 46
Fax : 33 (0)4 26 29 85 47
RCS Lyon 414 108 001

Page 3 / 3

Assurance 3/3

QBE

Marché RATP – Diagnostic Amiante avant travaux dans le cadre des projets « dispositif de protection contre les infiltrations » et « renouvellement des escaliers mécaniques et des ascenseurs.

Consignation des rails selon les Instructions de la direction de la RATP ID53-1 et ID53-4

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

Ces garanties ne s'appliquent pas au marché RATP

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

INTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages corporels*	6,000,000 € par *Sinistre*
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par *Année d'assurance*
2. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	750,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15 000 € par *Sinistre*
4. *Dommages immatériels non consécutifs*	150,000 € par *Sinistre*
5. *Atteintes à l'environnement*	400,000 € par *Année d'assurance*
RC PROFESSIONNELLE	
Tous dommages confondus	1,500.000 € par *Année d'assurance*

Page 2 / 3

Assurance 2/3



QBE

QBE Insurance (Europe) Limited

Cœur Défense – Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex

Tél. : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90

www.qbeurope.com/france

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Coeur Défense – Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3BD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
64 Rue CLEMENT ADER
42 153 RIORGES

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° 031 0004725
- à effet du 01/12/2014
- période de validité de la présente attestation : **du 01/01/2017 au 31/12/2017**

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostics immobiliers règlementés ou non règlementés:


  - Plomb y compris avant travaux ou démolition
  - Amiante y compris avant travaux ou démolition
  - Parasitaires
  - Installation de gaz
  - Installation intérieur électricité
  - Risques naturels et technologiques (ERNT)
  - Performances énergétiques DPE
  - Contrôle des installations d'assainissement non col
  - Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
  - Etat des lieux et états de division des lots en copropriété
  - Mesurage loi « Carrez »
  - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan métré
  - Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
  - Mesure du radon dans les bâtiments
  - Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
  - **Diagnostique de dossier Technique Global (DTG) pour les copropriétés**
  - Investissement locatif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
  - Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments
  - Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
  - Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat

QBE

Entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France – RCS Nanterre B 414 108 001
Siège social : QBE Insurance (Europe) Limited – Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD – Royaume-Uni
Société de droit anglais – Capital de GBP 500 000 000
QBE Insurance (Europe) Limited est membre de QBE European Operations, division de QBE Insurance Group
QBE est une entreprise régie par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority du Royaume Uni.
Immatriculée en Angleterre sous le N° 1761561

Page 1 / 3

Assurance 1/3

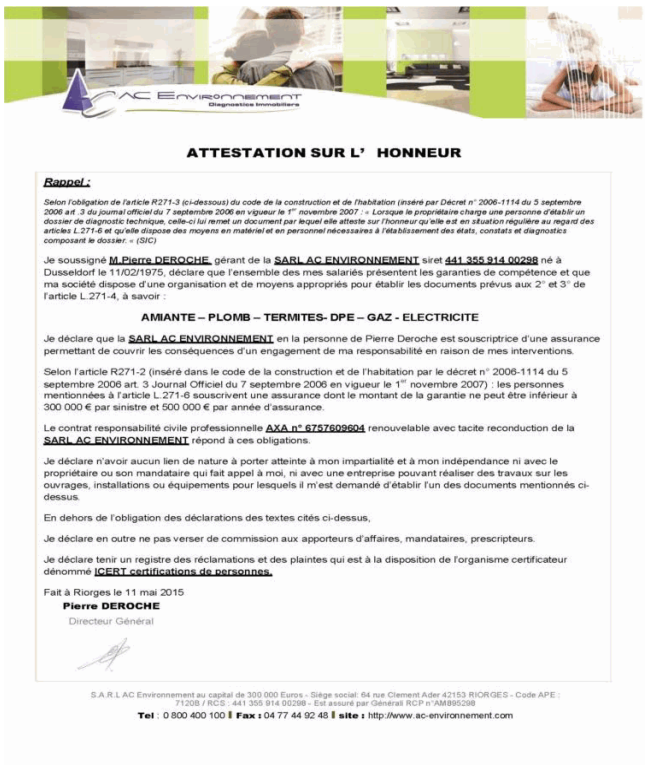

AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

ATTESTATION SUR L' HONNEUR

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007 : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » (SIC)

Je soussigné M.Pierre DEROCHE, gérant de la SARL AC ENVIRONNEMENT siret 441 355 914 00298 né à Dusseldorf le 11/02/1975, déclare que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus aux 2° et 3° de l'article L.271-4, à savoir :

AMIANTE – PLOMB – TERMITES- DPE – GAZ - ELECTRICITE

Je déclare que la SARL AC ENVIRONNEMENT en la personne de Pierre Deroche est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Selon l'article R271-2 (inséré dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : les personnes mentionnées à l'article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Le contrat responsabilité civile professionnelle AXA n° 6757609604 renouvelable avec tacite reconduction de la SARL AC ENVIRONNEMENT répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,

Je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition de l'organisme certificateur dénommé ICERT certifications de personnes.

Fait à Riorges le 11 mai 2015

Pierre DEROCHE
Directeur Général

S.A.R.L AC Environnement au capital de 300 000 Euros - Siège social: 64 rue Clement Ader 42153 RIORGES - Code APE : 7120B / RCS : 441 355 914 00298 - Est assuré par Générali RCP n°AM895298

Tel : 0 800 400 100 ‖ **Fax :** 04 77 44 92 48 ‖ **site :** http://www.ac-environnement.com



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3484 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BENIHADDADENE Farid

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante — Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
Date d'effet : 24/05/2016 - Date d'expiration : 23/05/2021

Plomb — Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 23/06/2015 - Date d'expiration : 22/06/2020

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/06/2016.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR11 rév 11

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI3484 V3
