
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Arrêté du 16/07/2019 modifié par l'arrêté du 23/01/2020; L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation; L.4412-2, R.4412-97 à R.4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019.
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. Norme NF X 46-020 d'août 2017

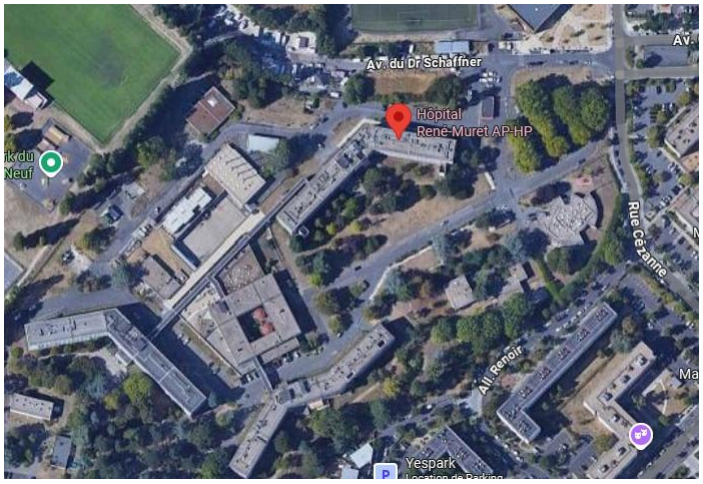

Numéro de rapport	**2025-12785-HOPITAL RENE MURET A**
Version	**01**
Propriétaire	**HOPITAL RENE MURET**
Donneur d'ordre	**APHP NORD**
Adresse de l'immeuble	**François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN**
Bâtiment ou installation	**Bâtiment 002**
Date de la commande	**05/08/2025**
Date de début d'exécution du repérage	**19/08/2025**
Date d'émission du rapport de repérage	**25/08/2025**
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	**Non communiquée**

Signataire du rapport

Signature et visa :

Opérateur de repérage :

MASSIP Romain
COVEANEX - Groupe SODIATEC
Le **25/08/2025**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Attention amiante!

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Commentaire sur la mission

Néant

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Etage	Localisation	Elément	Matériaux ou produits	Critères(s) ayant permis de conclure	Référence (ZPSO)
R+1	NVY92 Palier n°2	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire	Résultat d'analyse (P008)	Z005
R+2	NVY92 Palier n°3	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire	Résultat d'analyse (P006(cf.))	Z005
R+3	NVY92 Palier n°4	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire	Résultat d'analyse (P006)	Z005

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Zone	Elément	Matériau / Produit
Tous Niveaux	NVY92 Ascenseur	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum
RDC	NVY92 Palier n°1	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Colle de carrelage
R+1	NVY92 Palier n°2	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum
R+2	NVY92 Palier n°3	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum
R+3	NVY92 Palier n°4	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum
R-1	NVY92 Cuvette	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment
R-1	NVY92 Couloir	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Enduit base ciment lissé
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Peintures de sol

Réserves

Aucune

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
CONCLUSIONS 1
COMMENTAIRE SUR LA MISSION 2
DESCRIPTION DE LA MISSION 5
OBJET DE LA MISSION : 5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE : 5
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE : 5
PROGRAMME DE TRAVAUX 5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE 6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES 6
PROGRAMME DE REPERAGE 6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 6
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 7
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES 7
RESULTATS DU REPERAGE 10
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : 10
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 11
COMMENTAIRE SUR LA MISSION 12
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 13
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 14
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 26
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE 33
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 40

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **4511767895**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**HOPITAL RENE MURET**
Demeurant :	**52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN**
Représenté par :	**Monsieur DIAKITE Boubacar**
Commanditaire du repérage :	**APHP NORD**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur MASSIP Romain**
Nom et adresse de l'entreprise :	**COVEANEX - Groupe SODIATEC** **28 Avenue des Pépinières** **94260 FRESNES**
N° de Siret :	**81437986300032**
RCP-compagnie-n° de police :	**AXA FRANCE IARD -10583931804**
Laboratoire d'analyse :	Raison sociale : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est** Adresse : **20, rue du Kochersberg - BP 50047 67700 Saverne Cedex 1** Numéro de l'accréditation COFRAC : **1-1751**

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	**François Rabelais**
Adresse complète :	**52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN**
Référence Cadastrale :	**CK - 0002**

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire :	Construction :
Type et Fonction principale du bien :	**Bâtiment**	**Tertiaire**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Périmètre d'intevention : Cabines/Portes/Paliers (Sols et Murs)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
NVY92 Ascenseur	Tous Niveaux	**Concernée**
NVY92 Palier n°1	RDC	**Concernée**
NVY92 Palier n°2	R+1	**Concernée**
NVY92 Palier n°3	R+2	**Concernée**
NVY92 Palier n°4	R+3	**Concernée**
NVY92 Cuvette	R-1	**Concernée**
NVY92 Couloir	R-1	**Concernée**

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques			
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P	
	Panneaux des cloisons palières	P	
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…)	P	
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P	
	Isolants	P	
	Colles	M	
	Joints	P	
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P	
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits…	P	
	Tresses	P	
	Joints plats	P	

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et nature des visites sur site

Date	Objet
19/08/2025	Repérage amiante avant travaux - Ascenseur

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

	prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Portes et cloisons palières Panneaux dans les portes palières - Flocage gris (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P001	S001	Tous Niveaux	NVY92 Ascenseur	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
P001(cf.)	S002	RDC	NVY92 Palier n°1	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
P001(cf.)	S004	R+1	NVY92 Palier n°2	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
P001(cf.)	S005	R+2	NVY92 Palier n°3	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
P001(cf.)	S006	R+3	NVY92 Palier n°4	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
P002	S003	R-1	NVY92 Cuvette	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris
P001(cf.)	S023	R-1	NVY92 Couloir	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris

Z002 : Portes et cloisons palières Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P003	S007	R-1	NVY92 Cuvette	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Z003 : Murs et cloisons maçonnés Mastic sillicone (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P004	S008	RDC	NVY92 Palier n°1	03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
P004(cf.)	S016	R+1	NVY92 Palier n°2	03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
P004(cf.)	S013	R+2	NVY92 Palier n°3	03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone
P004(cf.)	S010	R+3	NVY92 Palier n°4	03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone

Z004 : Revêtements de sols Colle de carrelage (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P005	S009	RDC	NVY92 Palier n°1	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Colle de carrelage

Z005 : Revêtements de sols Ragréage + Colle noire (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P008	S017	R+1	NVY92 Palier n°2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire
P006(cf.)	S014	R+2	NVY92 Palier n°3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire
P006	S011	R+3	NVY92 Palier n°4	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire

Z006 : Revêtements de sols Linoléum (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P007(cf.)	S018	R+1	NVY92 Palier n°2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum
P007(cf.)	S015	R+2	NVY92 Palier n°3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum
P007	S012	R+3	NVY92 Palier n°4	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Z007 : Parois des équipements Habillages cabines bois (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
	S020	Tous Niveaux	NVY92 Ascenseur	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Parois des équipements	Habillages cabines bois

Z008 : Parois des équipements Habillages cabines métalliques (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
	S021	Tous Niveaux	NVY92 Ascenseur	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Parois des équipements	Habillages cabines métalliques

Z009 : Parois des équipements Panneaux décoratifs plafond métalliques (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
	S019	Tous Niveaux	NVY92 Ascenseur	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Parois des équipements	Panneaux décoratifs plafond métalliques

Z010 : Revêtements de sols Linoléum (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P009	S022	Tous Niveaux	NVY92 Ascenseur	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum

Z011 : Murs et cloisons maçonnés Enduit base ciment lissé (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P010	S024	R-1	NVY92 Couloir	03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Enduit base ciment lissé

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Z012 : Revêtements de sols Peintures de sol (continue : NON)

Référence prélèvement	Sondage Référence	Étage	Local/partie d'immeuble	Zone	Désignation	Matériau / Produit identifié
P011	S025	R-1	NVY92 Couloir	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Peintures de sol

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'analyse documentaire :

Titre
Programme de travaux

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
NVY92 Ascenseur	Tous Niveaux	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Résultat d'analyse (P001)	**Non**	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum	Résultat d'analyse (P009)	**Non**	
		07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Parois des équipements	Habillages cabines bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Parois des équipements	Habillages cabines métalliques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
		07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Parois des équipements	Panneaux décoratifs plafond métalliques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	**Non**	
NVY92 Palier n°1	RDC	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Résultat d'analyse (P001(cf.))	**Non**	
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone	Résultat d'analyse (P004)	**Non**	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P005)	**Non**	
NVY92 Palier n°2	R+1	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Résultat d'analyse (P001(cf.))	**Non**	
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone	Résultat d'analyse (P004(cf.))	**Non**	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire	Résultat d'analyse (P008)	**Oui**	15 m²
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum	Résultat d'analyse (P007(cf.))	**Non**	
NVY92 Palier n°3	R+2	07 - Ascenseurs,	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières -	Résultat d'analyse (P001(cf.))	**Non**	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
		monte-charges escaliers mécanique		Flocage gris			
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone	Résultat d'analyse (P004(cf.))	**Non**	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire	Résultat d'analyse (P006(cf.))	**Oui**	15 m²
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum	Résultat d'analyse (P007(cf.))	**Non**	
NVY92 Palier n°4	R+3	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Résultat d'analyse (P001(cf.))	**Non**	
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Mastic silicone	Résultat d'analyse (P004(cf.))	**Non**	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Ragréage + Colle noire	Résultat d'analyse (P006)	**Oui**	15 m²
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Linoléum	Résultat d'analyse (P007)	**Non**	
NVY92 Cuvette	R-1	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Résultat d'analyse (P002)	**Non**	
		07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment	Résultat d'analyse (P003)	**Non**	
NVY92 Couloir	R-1	07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique	Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Résultat d'analyse (P001(cf.))	**Non**	
		03 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés	Enduit base ciment lissé	Résultat d'analyse (P010)	**Non**	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	Peintures de sol	Résultat d'analyse (P011)	**Non**	

5.3 Commentaire sur la mission

Néant

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Parois des équipements

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	Tous Niveaux - NVY92 Ascenseur Parois des équipements - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain		Habillages cabines bois

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Parois des équipements

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	Tous Niveaux - NVY92 Ascenseur Parois des équipements - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain		Habillages cabines métalliques

Résultat amiante

absence d'amiante

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

ELEMENT : Parois des équipements

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	Tous Niveaux - NVY92 Ascenseur Parois des équipements - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain		Panneaux décoratifs plafond métalliques

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P001

Emplacement

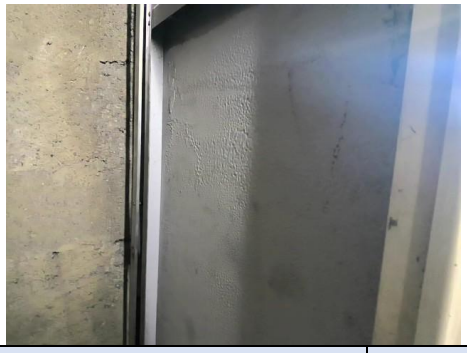

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	Tous Niveaux - NVY92 Ascenseur Portes et cloisons palières - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Panneaux dans les portes palières - Flocage gris		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R-1 - NVY92 Cuvette Portes et cloisons palières - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Panneaux dans les portes palières - Flocage gris

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Panneaux dans les portes palières - Flocage gris		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R-1 - NVY92 Cuvette Portes et cloisons palières - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau semi-dur (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P004

Emplacement

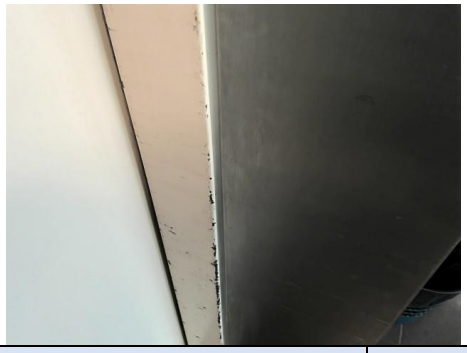

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	RDC - NVY92 Palier n°1 Murs et cloisons maçonnés - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Mastic silicone

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Mastic silicone		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau souple de type mastic (transparent)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	RDC - NVY92 Palier n°1 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R+3 - NVY92 Palier n°4 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Ragréage + Colle noire

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R+3 - NVY92 Palier n°4 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Linoléum

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Linoléum		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R+1 - NVY92 Palier n°2 Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Ragréage + Colle noire

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	Tous Niveaux - NVY92 Ascenseur Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Linoléum

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Linoléum		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R-1 - NVY92 Couloir Murs et cloisons maçonnés - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Enduit base ciment lissé

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit base ciment lissé		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL RENE MURET	2025-12785-HOPITAL RENE MURET	R-1 - NVY92 Couloir Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
MASSIP Romain	19/08/2025	Peintures de sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Peintures de sol		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-LE-092634-01	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60


ANNEXE : Plans et/ou Croquis

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier :	2025-12785-HOPITAL RENE MURET		
N° planche :	1/6	Version : 0	
Type :	Croquis		
Date :	25/08/2025		
Intervenant :	MASSIP Romain		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		
Titre :	NVY92 - Ascenceur		
Adresse :	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bât.- Niv. - Lot :	002	Tous	Lot n°002
Commentaire :			

☐ *Prélèvements négatifs - après analyse*

Légende :

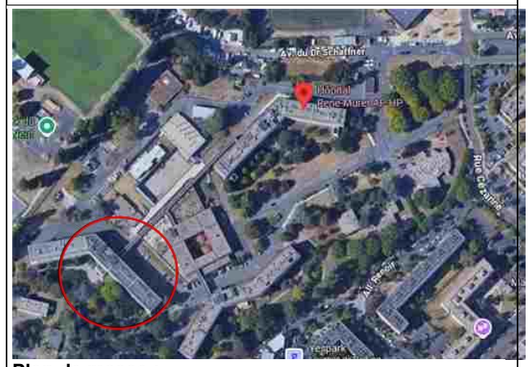

Plan de masse :

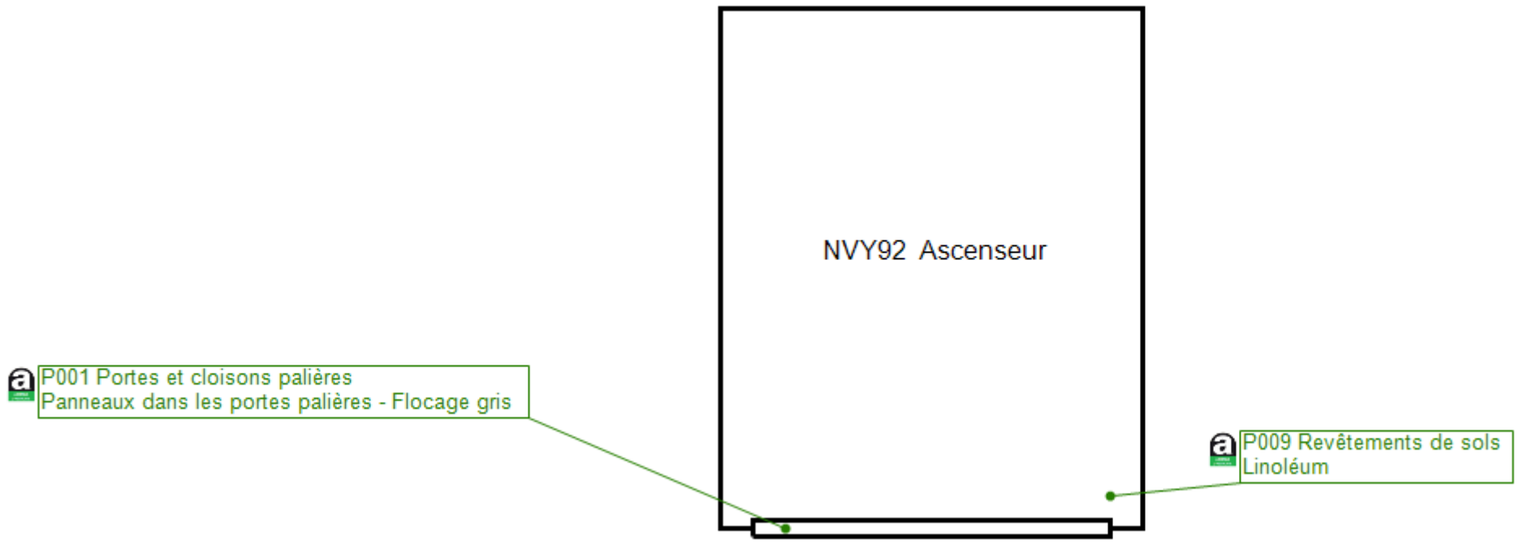


SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier :	2025-12785-HOPITAL RENE MURET		
N° planche :	2/6	Version : 0	
Type :	Croquis		
Date :	25/08/2025		
Intervenant :	MASSIP Romain		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		
Titre :	NVY92		
Adresse :	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bât.- Niv. - Lot :	002	R-1	Lot n°002
Commentaire :			

☐ *Prélèvements négatifs - après analyse*

Légende :

Plan de masse :

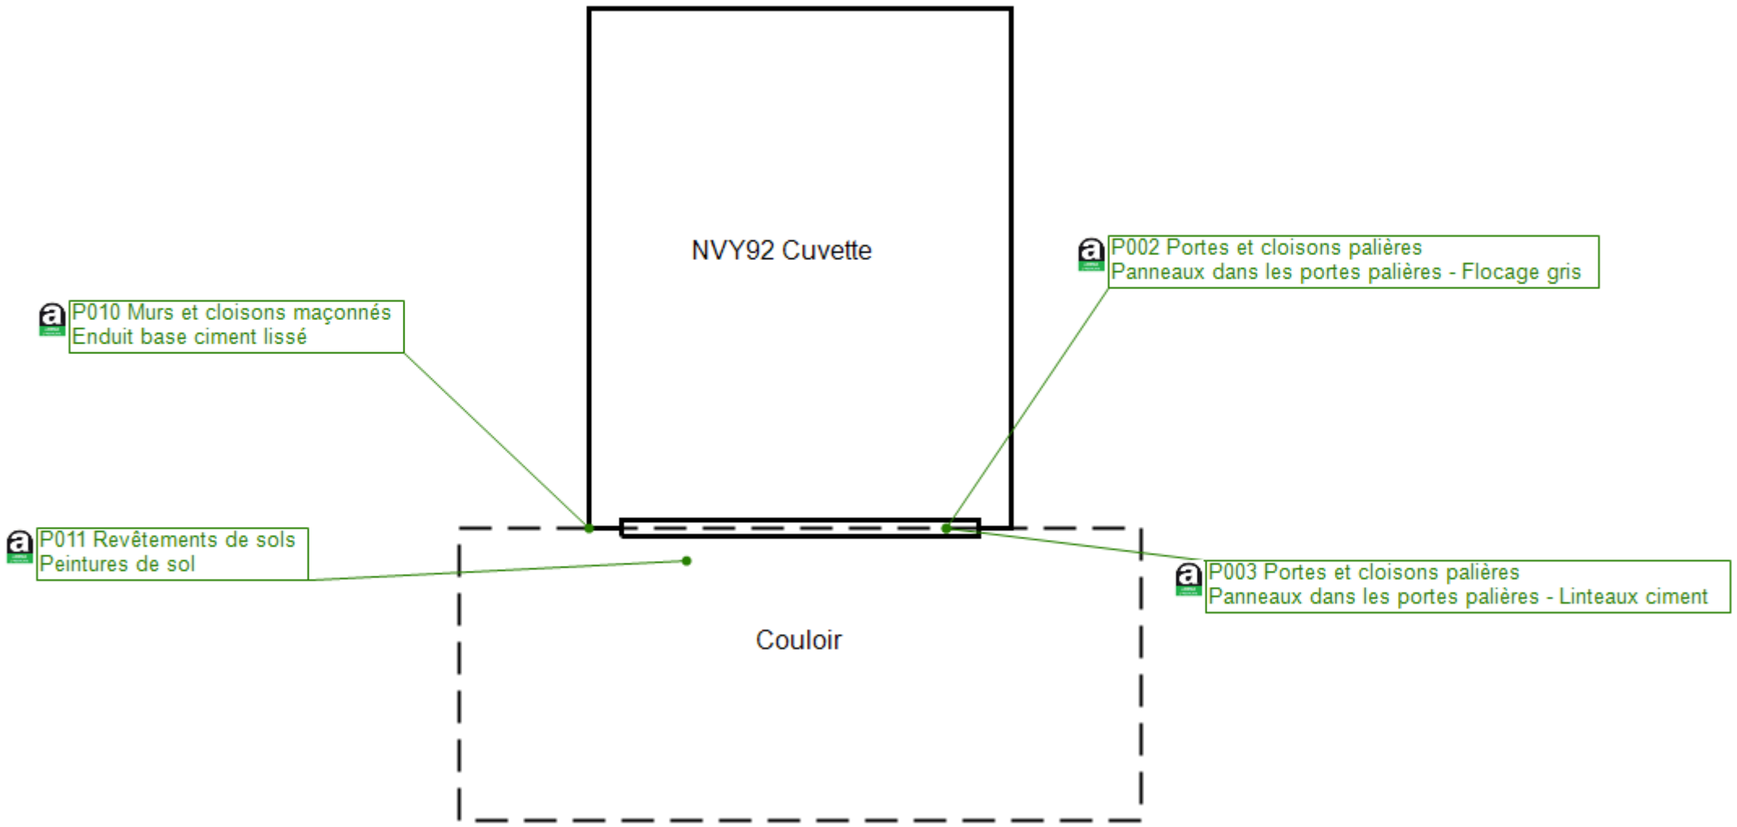


SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier :	2025-12785-HOPITAL RENE MURET		
N° planche :	3/6	Version : 0	
Type :	Croquis		
Date :	25/08/2025		
Intervenant :	MASSIP Romain		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		
Titre :	NVY92		
Adresse :	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bât.- Niv. - Lot :	002	RDC	Lot n°002
Commentaire :			

☐ *Prélèvements négatifs - après analyse*

Légende :

Plan de masse :

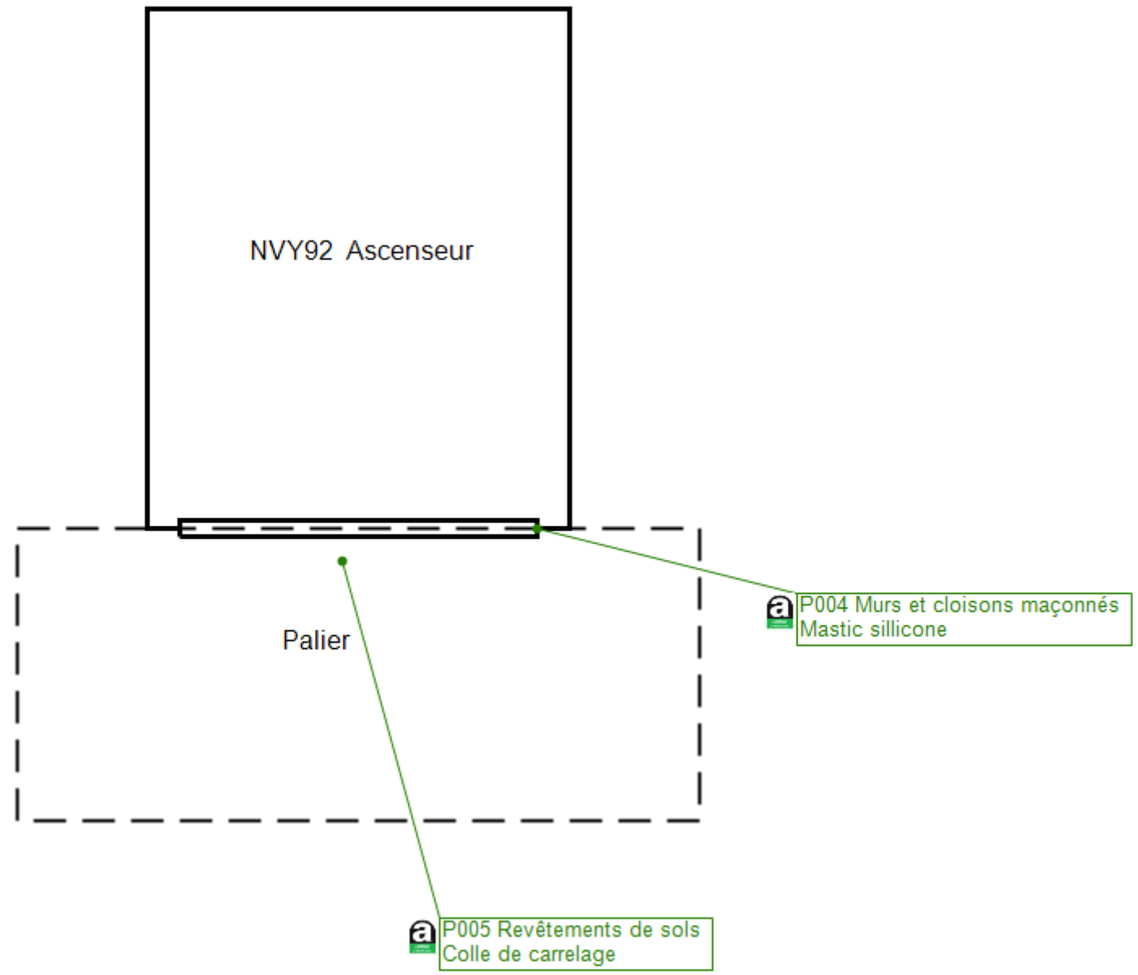

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier :	2025-12785-HOPITAL RENE MURET		
N° planche :	4/6	Version : 0	
Type :	Croquis		
Date :	25/08/2025		
Intervenant :	MASSIP Romain		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		
Titre :	NVY92		
Adresse :	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bât.- Niv. - Lot :	002	R+1	Lot n°002
Commentaire :			

Prélèvements positifs - après analyse

Ragréage + Colle noire amiantée

Légende :

Plan de masse :

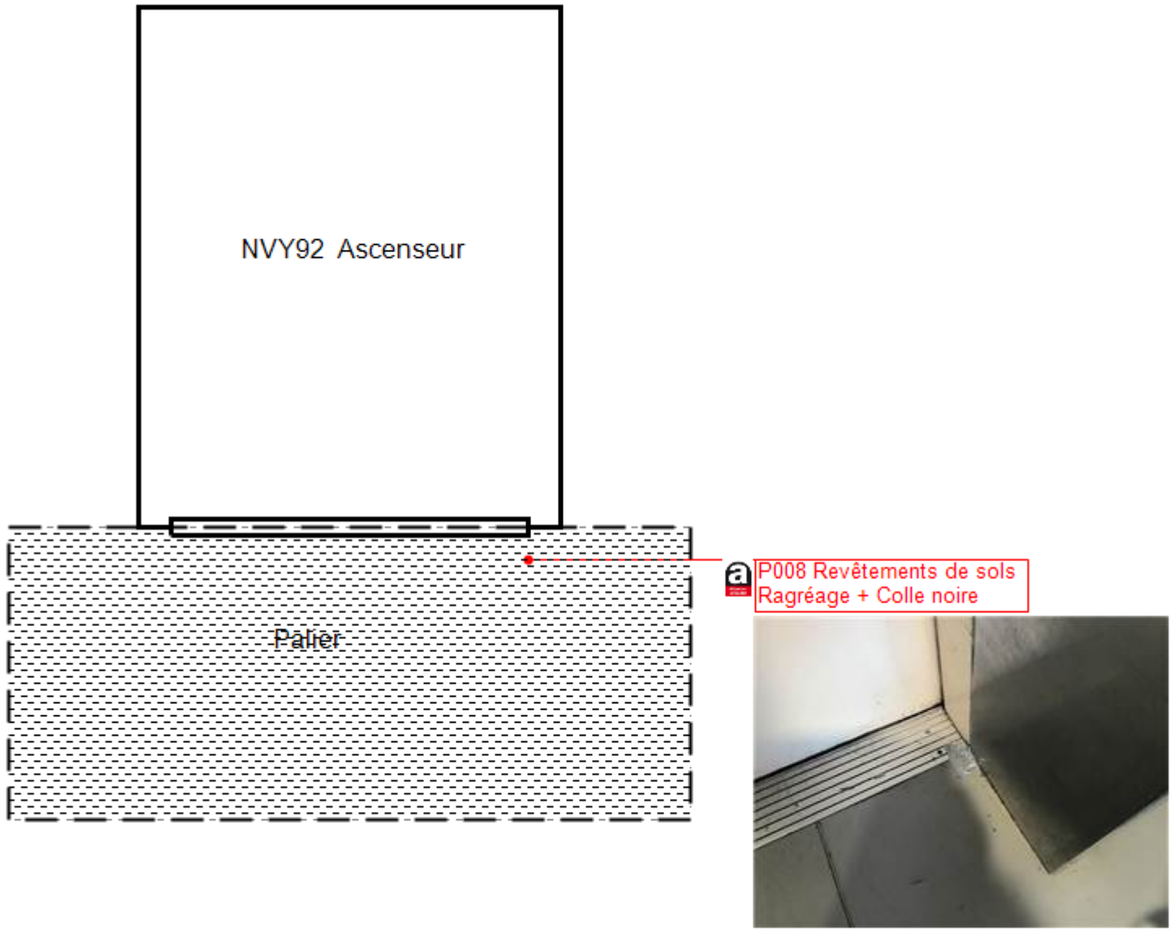


SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier :	2025-12785-HOPITAL RENE MURET		
N° planche :	5/6	Version : 0	
Type :	Croquis		
Date :	25/08/2025		
Intervenant :	MASSIP Romain		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		
Titre :	NVY92		
Adresse :	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bât.- Niv. - Lot :	002	R+2	Lot n°002
Commentaire :			

Ragréage + Colle noire amiantée

Légende :

Plan de masse :

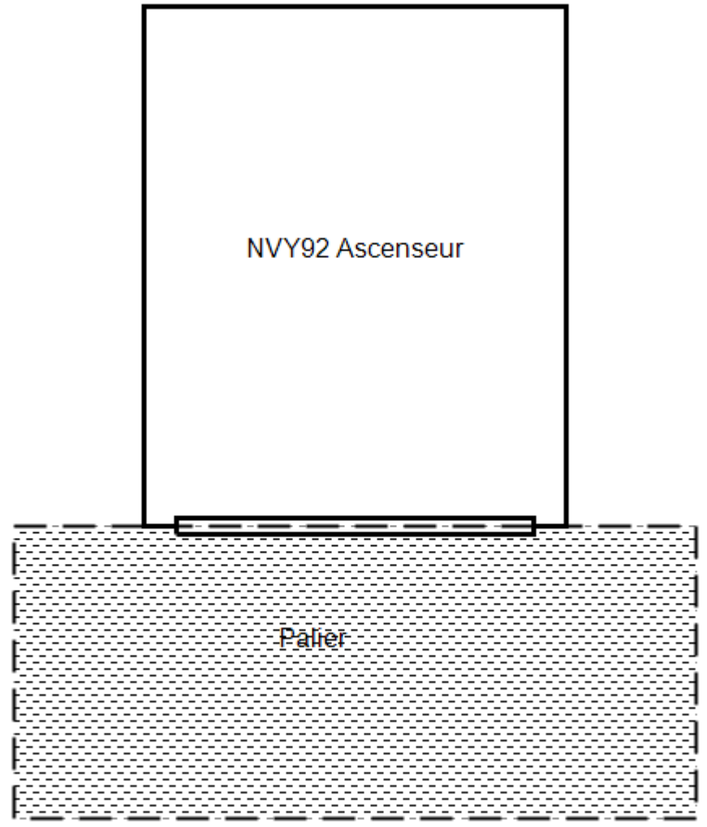


SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier :	2025-12785-HOPITAL RENE MURET		
N° planche :	6/6	Version : 0	
Type :	Croquis		
Date :	25/08/2025		
Intervenant :	MASSIP Romain		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		
Titre :	NVY92		
Adresse :	François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bât.- Niv. - Lot :	002	R+3	Lot n°002
Commentaire :			

Prélèvements positifs - après analyse
Prélèvements négatifs - après analyse
Ragréage + Colle noire amiantée

Légende :

Plan de masse :

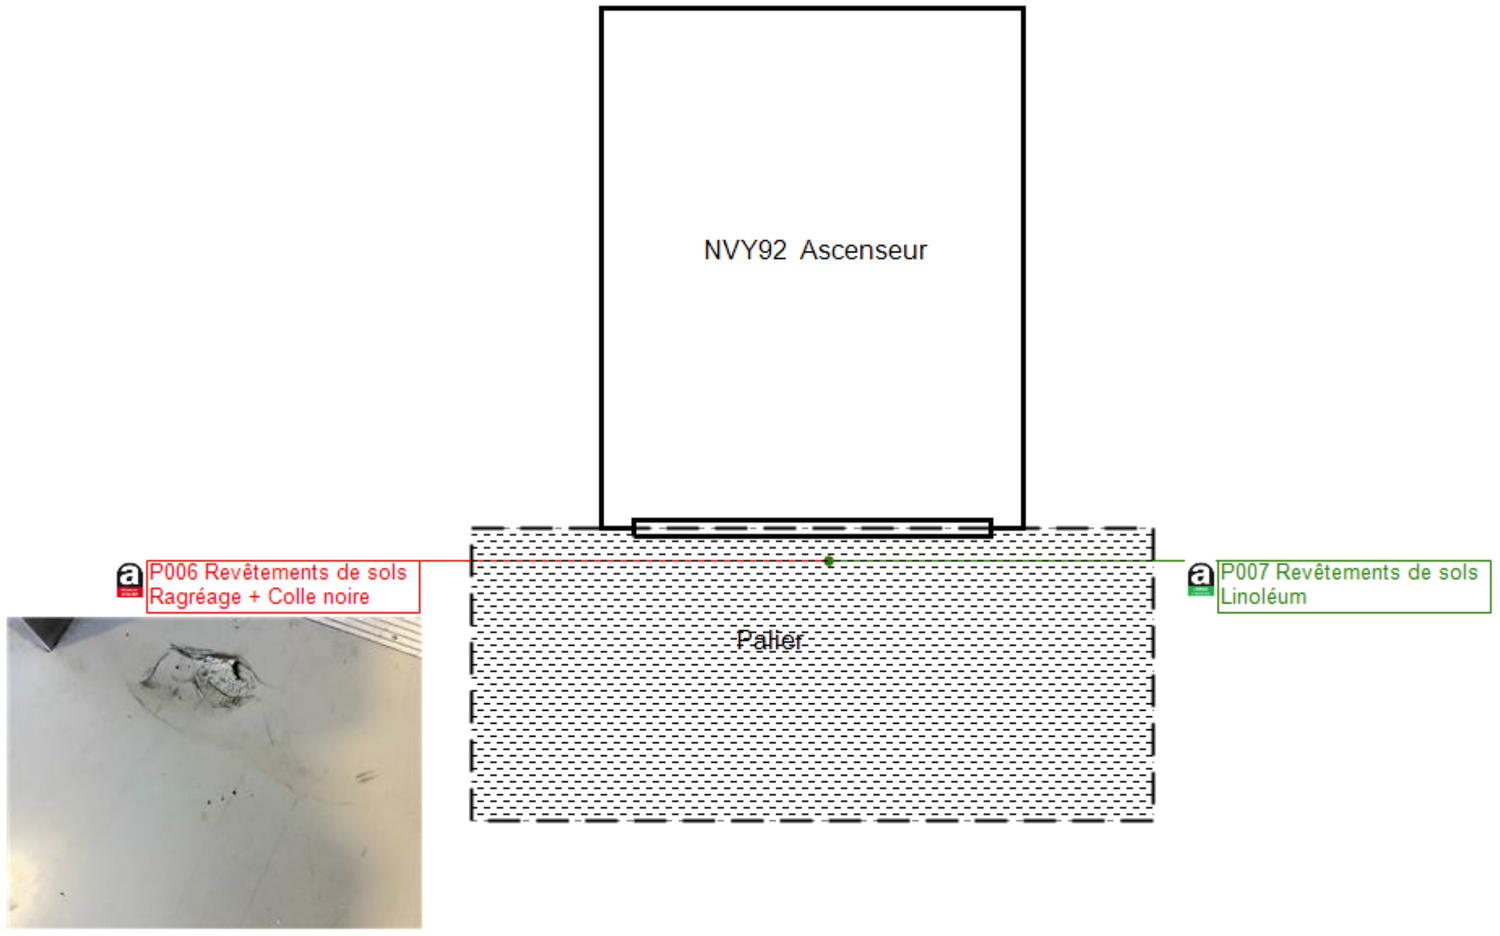

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720250801637486

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

SARL COVEANEX
Monsieur Romain MASSIP
SODIATEC IdF
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES

Notre référence : AR-25-LE-092634-01

Numéro de dossier : 25A029250
Référence de dossier :
2025-12785-HOPITAL RENE MURET A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A029250-001 - Référence *P001-Tous Niveaux - NVY92 Ascenceur - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières - Flocage gris*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-002 - Référence *P002-R-1 - NVY92 Cuvette - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières - Flocage gris*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-003 - Référence *P003-R-1 - NVY92 Cuvette - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-004 - Référence *P004-RDC - NVY92 Palier n°1 - 03 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Mastic sillicone*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-005 - Référence *P005-RDC - NVY92 Palier n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25A029250-006 - Référence *P006-R+3 - NVY92 Palier n°4 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-007 - Référence *P007-R+3 - NVY92 Palier n°4 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoléum*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-008 - Référence *P008-R+1 - NVY92 Palier n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-009 - Référence *P009-Tous Niveaux - NVY92 Ascenceur - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoléum*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-010 - Référence *P010-R-1 - NVY92 Couloir - 03 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit base ciment lissé*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A029250-011 - Référence *P011-R-1 - NVY92 Couloir - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peintures de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-016319-01 — Date d'émission de rapport : 29/08/2025 17:27 — Page1/5
Dossier N° : 25GE008059 — Date de réception : 28/08/2025 — Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008059 — Référence de suivi du dossier N° : 25A029250
Reçu au laboratoire le : 28/08/2025 — Date de réception : 27/08/2025
Date d'analyse : 28/08/2025
Référence dossier Client:2025-12785-HOPITAL RENE MURET A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A029250-001 - P001-Tous Niveaux - NVY92 Ascenceur - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Matériau semi-dur (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	25A029250-002 - P002-R-1 - NVY92 Cuvette - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières - Flocage gris	Matériau semi-dur (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-016319-01 — Date d'émission de rapport : 29/08/2025 17:27 — Page2/5
Dossier N° : 25GE008059 — Date de réception : 28/08/2025 — Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008059 — Référence de suivi du dossier N° : 25A029250
Reçu au laboratoire le : 28/08/2025 — Date de réception : 27/08/2025
Date d'analyse : 28/08/2025
Référence dossier Client:2025-12785-HOPITAL RENE MURET A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25A029250-003 - P003-R-1 - NVY92 Cuvette - 07 - Ascenseurs, monte-charges escaliers mécanique - Portes et cloisons palières - Panneaux dans les portes palières - Linteaux ciment	Matériau semi-dur (orange)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	25A029250-004 - P004-RDC - NVY92 Palier n°1 - 03 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Mastic sillicone	Matériau souple de type mastic (transparent)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	25A029250-005 - P005-RDC - NVY92 Palier n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-016319-01 — Date d'émission de rapport : 29/08/2025 17:27 — Page3/5
Dossier N° : 25GE008059 — Date de réception : 28/08/2025 — Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008059 — Référence de suivi du dossier N° : 25A029250
Reçu au laboratoire le : 28/08/2025 — Date de réception : 27/08/2025
Date d'analyse : 28/08/2025
Référence dossier Client:2025-12785-HOPITAL RENE MURET A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	25A029250-006 - P006-R+3 - NVY92 Palier n°4 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / SY3H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	25A029250-007 - P007-R+3 - NVY92 Palier n°4 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoléum	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	25A029250-008 - P008-R+1 - NVY92 Palier n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / SY3H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-016319-01 — Date d'émission de rapport : 29/08/2025 17:27 — Page4/5
Dossier N° : 25GE008059 — Date de réception : 28/08/2025 — Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008059 — Référence de suivi du dossier N° : 25A029250
Reçu au laboratoire le : 28/08/2025 — Date de réception : 27/08/2025
Date d'analyse : 28/08/2025
Référence dossier Client:2025-12785-HOPITAL RENE MURET A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25A029250-009 - P009-Tous Niveaux - NVY92 Ascenceur - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoléum	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	25A029250-010 - P010-R-1 - NVY92 Couloir - 03 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit base ciment lissé	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / W7WX	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	25A029250-011 - P011-R-1 - NVY92 Couloir - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peintures de sol	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

eurofins

GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-016319-01 | Date d'émission de rapport : 29/08/2025 17:27 | Page5/5
Dossier N° : 25GE008059 | Date de réception : 28/08/2025 | Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE008059 | Référence de suivi du dossier N° : 25A029250
Reçu au laboratoire le : 28/08/2025 | Date de réception : 27/08/2025
Date d'analyse : 28/08/2025
Référence dossier Client:2025-12785-HOPITAL RENE MURET A - François Rabelais 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Alexandre Conte
Chef(fe) de Groupe Technicien META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

ANNEXE : Attestation d'assurance

Adhésion N°C220

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804

Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

COVEANEX
28 AVENUE DES PEPINIERES
94260 FRESNES

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° **10583931804C220**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées au contrat, ***sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.***

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

1 000 000 € PAR SINISTRE ET 2 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 19 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 388 123 069 - N° ORIAS 07 000 473

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Police N°10583931804C220

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat » Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cas contraire aucune garantie ne sera accordée
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement » (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Police N°10583931804C220

- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit Energétique pour les Maison individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- Audit énergétique pour copropriété (F)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neuf
- Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique de chantier)
- Le carnet d'information du logement (CIL)
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Légende :

F : Formation - **C** : Certification – **AC** : Accréditation

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60
