RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Arrêté du 16/07/2019 modifié par l'arrêté du 23/01/2020; L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation; L.4412-2, R.4412-97 à R.4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019.
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. **Norme NF X 46-020 d'août 2017**



Nature du bâtiment	**Bâtiment**
Adresse	Claude Galien52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN
Cat. du bâtiment	Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques
Réf. Cadastrale	CK - 0002
Permis de construire	Antérieur au 1 juillet 1997
Propriétaire	HOPITAL RENE MURET
Adresse	52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN
Donneur d'ordre	APHP NORD
Adresse	46 rue Huchard 75877 PARIS CEDEX
Téléphone(s)	

Numéro de rapport	**2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2 A**		
Date de la commande	**15/09/2025**	Date du repérage	**07/10/2025 au 07/10/2025**
Date d'émission du rapport de repérage	**27/10/2025**		
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	**Cabine - Portes - Paliers (sol et mur)**		

SIGNATAIRE DU RAPPORT

Signature et Visa	Opérateur de repérage :
	CHAN Jacobi COVEANEX - Groupe SODIATEC Le 27/10/2025

Le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il doit adresser à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

Rappel de la conclusion (détails, voir chapitre 4)

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE
SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
SOMMAIRE 2
TERMES ET DÉFINITIONS 3
DESCRIPTION DE LA MISSION 5
OBJET DE LA MISSION 5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES 5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE 5
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE 5
PROGRAMME DE TRAVAUX 5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE 6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) 6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 6
CONCLUSIONS 7
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPERES 7
INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE 7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 7
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 7
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 7
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO) 7
RESULTATS DU REPERAGE 12
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE 12
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 13
COMMENTAIRE SUR LA MISSION 14
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 14
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 15
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 23
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE 28
PV_00720251001670212 28
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE 32
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 33

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

TERMES ET DÉFINITIONS

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. **(Source : Norme NF X 46-020)**

Couche d'un produit ou d'un matériau	Élément d'un matériau ou produit pouvant être distingué des autres éléments par l'examen visuel ou par l'analyse
Démolition	Opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment
Donneur d'ordre	Toute personne physique ou morale qui commande une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti. Cette personne peut être le propriétaire, le syndic, un locataire, une entreprise, un maître d'ouvrage, un chef d'établissement, etc.
Échantillon	Partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d'un prélèvement, et ayant vocation à être analysée en laboratoire Partie limitée d'un ouvrage de référence qui est utilisée pour le représenter et le cas échéant, comparer ses propriétés à celles d'autres parties d'ouvrage, en vue de caractériser une zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)
Inspection visuelle	Recherche visuelle en vue d'identifier, parmi les parties d'ouvrages présentes dans l'immeuble, les matériaux ou produits prévus par le programme de repérage de la mission
Investigation approfondie	Action nécessaire à l'inspection visuelle de la composition externe ou interne d'un ouvrage ou d'un volume. Les investigations approfondies sont de deux types : - investigation approfondie destructive qui nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau ou qui fait perdre sa fonction à l'ouvrage
Investigation approfondie non destructive Investigation approfondie complémentaire	Investigation devant être réalisée juste avant ou entre les différentes étapes des travaux y compris démolition. Ce type d'investigation est très exceptionnel et doit être justifié. Dans ce cas l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs dans son rapport
Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante	Matériau ou produit dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée NOTE 1 Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante. NOTE 2 On distingue les matériaux et les produits comme suit : Produit : manufacturé, standardisé, mis en oeuvre en l'état (exemple : dalles de sol, dalles de FP…) ; Matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en oeuvre, suite à une préparation à pied d'œuvre (exemple : flocage, enduits, peintures, revêtements bitumineux…)
Matériau ou produit contenant de l'amiante	Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante NOTE Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit contenant de l'amiante.
Opérateur de repérage	Personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d'une commande
Ouvrage	Résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique dans un immeuble bâti. Un ouvrage peut comporter une ou plusieurs parties NOTE 1 Les ouvrages à considérer sont les composants de la construction, classés en listes. NOTE 2 Au titre du code de la santé publique, un ouvrage est désigné comme un composant
Partie d'ouvrage	Matériau ou produit dont la destination est d'être incorporé à l'immeuble bâti selon des méthodes ou des montages prédéterminés et dont la présence est indispensable pour qualifier la constitution d'un ouvrage NOTE Au titre du code de la santé publique, une partie d'ouvrage est désignée comme une partie de composant.
Périmètre de repérage	Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage
Prélèvement	Acte de prélever une partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Programme de repérage	Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage dépend des exigences de la réglementation, des objectifs du donneur d'ordre et locaux impactés de façon directe ou indirecte (zones de stockage, cheminements, locaux adjacents…)
Programme de travaux	Document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de la zone d'intervention : zone de travaux effectifs
Repérage	Mission visant à rechercher, dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, puis à identifier et localiser ceux qui en contiennent NOTE Selon la mission, le repérage peut comprendre également l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Sondage	Action qui permet de s'assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage NOTE 1 Au moment du sondage, la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux ne sont pas nécessairement connues. NOTE 2 Le sondage n'est pas un prélèvement.
Zone présentant des similitudes d'ouvrage (« ZPSO »)	Partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

1 DESCRIPTION DE LA MISSION

1.1 OBJET DE LA MISSION

Références de l'ordre de mission : **2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2**

1.2 IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES

Propriétaire de l'immeuble	HOPITAL RENE MURET
Demeurant	52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN
Représenté par	/
Commanditaire du repérage	APHP NORD
Opérateur ayant réalisé le repérage	Monsieur CHAN Jacobi
Nom et adresse de l'entreprise	COVEANEX - Groupe SODIATEC 28 Avenue des Pépinières 94260 FRESNES
N° de Siret	81437986300032
RCP-compagnie-n° de police	AXA FRANCE IARD -10583931804

1.3 IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE

Dénomination	Claude Galien
Adresse complète	52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN
Référence Cadastrale	CK - 0002

1.4 IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE

Date du PC	Antérieur au 1 juillet 1997	Date de construction	Antérieur au 1 juillet 1997
Type et Fonction principale du bien	Bâtiment	Tertiaire	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné	Aucun		
Historique du site	Non communiqué		

2 PROGRAMME DE TRAVAUX

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit

Référence	APHP HUPSSD - Marché de rénovation de 31 ascenseurs sur les 3 sites de Avicenne, Jean Verdier et René Muret
Description succincte	**Cabine – Portes - Paliers (sol et mur)**

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

3 CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE

3.1 PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION)

Parties d'immeuble concernées

N° local	Parties d'immeuble visitées	Etage	Statut
1	Palier G2 n°1	S01	Concernée
2	Palier G3 n°1	S01	Concernée
3	Palier G4 n°1	S01	Concernée
4	Palier G2 n°2	RDC	Concernée
5	Palier G3 n°2	RDC	Concernée
6	Palier G4 n°2	RDC	Concernée
7	Palier G2 n°3	Etage Courant	Concernée
8	Palier G3 n°3	Etage Courant	Concernée
9	Palier G4 n°3	Etage Courant	Concernée
10	Gaine Asc. G2 n°1	Etage Courant	Concernée
11	Gaine Asc. G3 n°2	Etage Courant	Concernée
12	Gaine Asc. G4 n°3	Etage Courant	Concernée
13	Cabine G2	Etage Courant	Concernée
14	Cabine G3	Etage Courant	Concernée
15	Cabine G4	Etage Courant	Concernée
16	Machinerie Asc. G2	R04	Concernée
17	Machinerie Asc. G3	R04	Concernée
18	Machinerie Asc. G4	R04	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux , conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 et du tableau A.1 de la norme NFX 46-020 de 2017 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Colles non bitumineuses	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques			
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P	
	Panneaux des cloisons palières	P	
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…)	P	
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P	
	Isolants	P	
	Colles	M	
	Joints	P	
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P	
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits…	P	
	Tresses	P	
	Joints plats	P	

3.2 RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES

Néant

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

4 CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

COMMENTAIRE :

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme de travaux transmis par le donneur d'ordre.

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPERES

Aucun

INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE

Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles

Aucun

5 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1 DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE

Date	Objet
07/10/2025	Vsite des périmètres de diagnistics.

5.2 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020

Aucun

5.3 CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

Néant

5.4 LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO)

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les **Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages** suivantes :


SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Zones présentant des similitudes d'ouvrage sans présence d'amiante

Z001 - Sol Ragréage Chape ciment - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
7	Palier G2 n°3	Etage Courant	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage - Chape ciment	X		P001	

Z002 - Mur Enduit Colle scellement bâti - (Zone continue : NON)

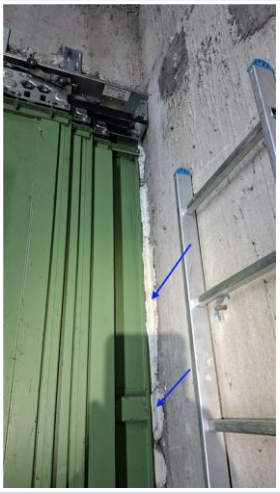N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
10	Gaine Asc. G2 n°1	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit - Colle scellement bâti	X		P002	
12	Gaine Asc. G4 n°3	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit - Colle scellement bâti			P005	
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit - Colle scellement bâti			P006	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Z003 - Mur Enduit de rebouchage Colle ciment - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
10	Gaine Asc. G2 n°1	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage - Colle ciment	X		P003	

Z004 - Dalle toiture Étanchéité - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
16	Machinerie Asc. G2	R04	Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Étanchéité			P007(cf.)	
17	Machinerie Asc. G3	R04	Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Étanchéité	X		P007	
18	Machinerie Asc. G4	R04	Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Étanchéité			P007(cf.)	

Z005 - Lucarne Mastic de vitrage - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
16	Machinerie Asc. G2	R04	Lucarne - 03 - Parois verticales intérieures - Mastic de vitrage			P008(cf.)	
17	Machinerie Asc. G3	R04	Lucarne - 03 - Parois verticales intérieures - Mastic de vitrage	X		P008	
18	Machinerie Asc. G4	R04	Lucarne - 03 - Parois verticales intérieures - Mastic de vitrage			P008(cf.)	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Z006 - Mur ext. Relevé paxalu - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
16	Machinerie Asc. G2	R04	Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Relevé paxalu			P010(cf.)	
17	Machinerie Asc. G3	R04	Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Relevé paxalu	X		P010	
18	Machinerie Asc. G4	R04	Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Relevé paxalu			P010(cf.)	

Z007 - Mur Enduit plâtre Colle scellement bardage asc - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
11	Gaine Asc. G3 n°2	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre - Colle scellement bardage asc	X		P011	

Z008 - Mur embrasure Enduit plâtre - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Palier G2 n°1	S01	Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre			P012(cf.)	
2	Palier G3 n°1	S01	Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre	X		P012	
4	Palier G2 n°2	RDC	Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre			P012(cf.)	
5	Palier G3 n°2	RDC	Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre			P012(cf.)	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
7	Palier G2 n°3	Etage Courant	Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre			P012(cf.)	
8	Palier G3 n°3	Etage Courant	Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre			P012(cf.)	

Z009 - Mur Enduit ciment - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
10	Gaine Asc. G2 n°1	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit ciment			P013(cf.)	
11	Gaine Asc. G3 n°2	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit ciment	X		P013	
12	Gaine Asc. G4 n°3	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit ciment			P013(cf.)	

Z010 - Sol Colle de carrelage - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
6	Palier G4 n°2	RDC	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Colle de carrelage			P014(cf.)	
9	Palier G4 n°3	Etage Courant	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Colle de carrelage	X		P014	

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Z011 - Dalle - socle machine Plaque antivibratile - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
16	Machinerie Asc. G2	R04	Dalle - socle machine - 05 - Planchers et planchers techniques - Plaque antivibratile			P009(cf.)	
17	Machinerie Asc. G3	R04	Dalle - socle machine - 05 - Planchers et planchers techniques - Plaque antivibratile	X		P009	
18	Machinerie Asc. G4	R04	Dalle - socle machine - 05 - Planchers et planchers techniques - Plaque antivibratile			P009(cf.)	

Z012 - Matériels et machinerie Machinires - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
16	Machinerie Asc. G2	R04	Matériels et machinerie - 08 - Équipements divers et accessoires - Machinires	X	S001		
17	Machinerie Asc. G3	R04	Matériels et machinerie - 08 - Équipements divers et accessoires - Machinires		S002		
18	Machinerie Asc. G4	R04	Matériels et machinerie - 08 - Équipements divers et accessoires - Machinires		S003		

6 RESULTATS DU REPERAGE

6.1 RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE

Type de document	Statut	Document
Programme de travaux	remis	Programme de travaux

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

6.2 LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
1	Palier G2 n°1	S01	Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P012(cf.))	Non
2	Palier G3 n°1	S01	Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P012)	Non
4	Palier G2 n°2	RDC	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage ciment	Résultat d'analyse (P004)	Non
			Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P012(cf.))	Non
5	Palier G3 n°2	RDC	Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P012(cf.))	Non
6	Palier G4 n°2	RDC	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P014(cf.))	Non
7	Palier G2 n°3	Etage Courant	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage - Chape ciment	Résultat d'analyse (P001)	Non
			Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P012(cf.))	Non
8	Palier G3 n°3	Etage Courant	Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P012(cf.))	Non
9	Palier G4 n°3	Etage Courant	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P014)	Non
10	Gaine Asc. G2 n°1	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit - Colle scellement bâti	Résultat d'analyse (P002)	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit ciment	Résultat d'analyse (P013(cf.))	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit de rebouchage - Colle ciment	Résultat d'analyse (P003)	Non
11	Gaine Asc. G3 n°2	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit plâtre - Colle scellement bardage asc	Résultat d'analyse (P011)	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit ciment	Résultat d'analyse (P013)	Non
12	Gaine Asc. G4 n°3	Etage Courant	Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit - Colle scellement bâti	Résultat d'analyse (P005)	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit - Colle scellement bâti	Résultat d'analyse (P006)	Non
			Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit ciment	Résultat d'analyse (P013(cf.))	Non
16	Machinerie Asc. G2	R04	Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Relevé paxalu	Résultat d'analyse (P010(cf.))	Non
			Lucarne - 03 - Parois verticales intérieures - Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P008(cf.))	Non
			Dalle - socle machine - 05 - Planchers et planchers techniques - Plaque antivibratile	Résultat d'analyse (P009(cf.))	Non
			Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Étanchéité	Résultat d'analyse (P007(cf.))	Non
			Matériels et machinerie - 08 - Équipements divers et accessoires - Machinires	Marquage du matériau	Non
17	Machinerie Asc. G3	R04	Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Étanchéité	Résultat d'analyse (P007)	Non
			Matériels et machinerie - 08 - Équipements divers et accessoires - Machinires	Marquage du matériau	Non
			Lucarne - 03 - Parois verticales intérieures - Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P008)	Non
			Dalle - socle machine - 05 - Planchers et planchers techniques - Plaque antivibratile	Résultat d'analyse (P009)	Non
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Relevé paxalu	Résultat d'analyse (P010)	Non
18	Machinerie Asc. G4	R04	Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Étanchéité	Résultat d'analyse (P007(cf.))	Non
			Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Relevé paxalu	Résultat d'analyse (P010(cf.))	Non
			Lucarne - 03 - Parois verticales intérieures - Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P008(cf.))	Non
			Dalle - socle machine - 05 - Planchers et planchers techniques - Plaque antivibratile	Résultat d'analyse (P009(cf.))	Non
			Matériels et machinerie - 08 - Équipements divers et accessoires - Machinires	Marquage du matériau	Non

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

6.3 COMMENTAIRE SUR LA MISSION

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme de travaux transmis par le donneur d'ordre.

6.4 RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire **met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives »** (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire **met à jour le contenu du « dossier technique amiante »** (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. **Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti a**insi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Mur embrasure

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	
Pièce ou local	Etage Courant - Palier G2 n°3	Référence du sondage	
Matériau	Enduit plâtre	Localisation	Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

ELEMENT : Matériels et machinerie

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc. G2	Référence du sondage	S001
Matériau	Machinires	Localisation	Matériels et machinerie - 08 - Équipements divers et accessoires
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		
Commentaires	Date de fabrication 2015.		

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Palier G2 n°3	Référence du sondage	
Matériau	Ragréage - Chape ciment	Localisation	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ragréage / Chape ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine Asc. G2 n°1	Référence du sondage	
Matériau	Enduit - Colle scellement bâti	Localisation	Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit / Colle scellement bâti		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau dur (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine Asc. G2 n°1	Référence du sondage	
Matériau	Enduit de rebouchage - Colle ciment	Localisation	Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit de rebouchage / Colle ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau dur (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P004

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	RDC - Palier G2 n°2	Référence du sondage	
Matériau	Ragréage ciment	Localisation	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ragréage ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P005

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine Asc. G4 n°3	Référence du sondage	
Matériau	Enduit - Colle scellement bâti	Localisation	Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit / Colle scellement bâti		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau dur (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P006

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine Asc. G4 n°3	Référence du sondage	
Matériau	Enduit - Colle scellement bâti	Localisation	Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit / Colle scellement bâti		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau dur (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc. G3	Référence du sondage	
Matériau	Étanchéité	Localisation	Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Étanchéité		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau souple de type plaque (fibreux) (bitumineux) (granulaire) (noir) + (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc. G3	Référence du sondage	
Matériau	Mastic de vitrage	Localisation	Lucarne - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Mastic de vitrage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (beige)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc. G3	Référence du sondage	
Matériau	Plaque antivibratile	Localisation	Dalle - socle machine - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plaque antivibratile		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau de type liège (marron) (foncé)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	R04 - Machinerie Asc. G3	Référence du sondage	
Matériau	Relevé paxalu	Localisation	Mur ext. - 02 - Parois verticales extérieures et Façades
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		
Commentaires	seuil de porte		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Relevé paxalu		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine Asc. G3 n°2	Référence du sondage	
Matériau	Enduit plâtre - Colle scellement bardage asc	Localisation	Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre / Colle scellement bardage asc		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau (gris) (beige) en traces ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	S01 - Palier G3 n°1	Référence du sondage	
Matériau	Enduit plâtre	Localisation	Mur embrasure - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Gaine Asc. G3 n°2	Référence du sondage	
Matériau	Enduit ciment	Localisation	Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

PRELEVEMENT : P014

Nom du client	HOPITAL RENE MURET	Nom de l'opérateur	CHAN Jacobi
Numéro de dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2	Date de prélèvement	07/10/2025
Pièce ou local	Etage Courant - Palier G4 n°3	Référence du sondage	
Matériau	Colle de carrelage	Localisation	Sol - 05 - Planchers et planchers techniques
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-122574-01	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Croquis N°1 SSOL


Client	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2		
N° planche	1/3	Version	**0**
Date	27/10/2025		
Intervenant	CHAN Jacobi		
Origine du plan	Document réalisé en interne		
Type	Périmètres de diagnostic		
Adresse	Claude Galien 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bâtiment	005		
Etage	S01	N° lot	Lot n°005
Commentaire			

Légende

Prélèvements négatifs - après analyse



Plan de masse

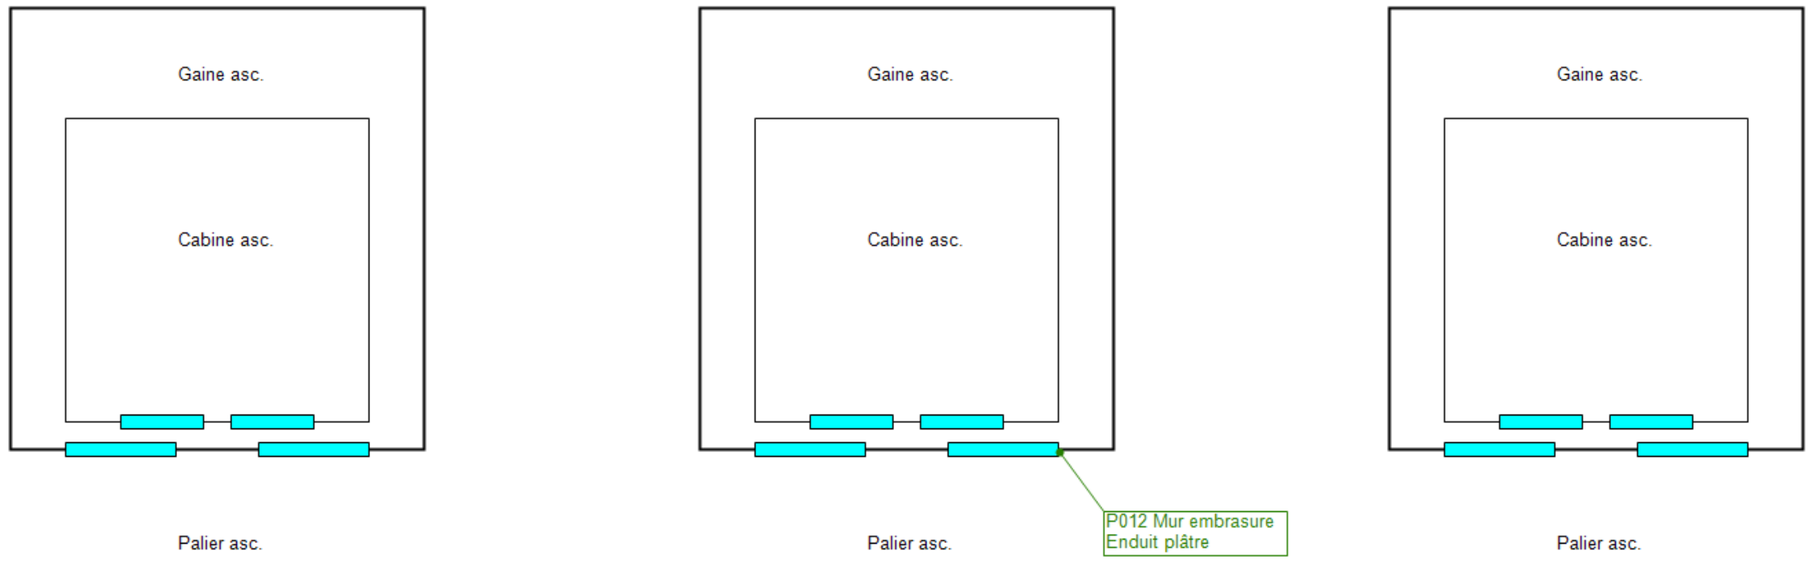

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Croquis N°2 ETAGE COURANT


Client	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2		
N° planche	2/3	Version	**0**
Date	27/10/2025		
Intervenant	CHAN Jacobi		
Origine du plan	Document réalisé en interne		
Type	Périmètres de diagnostic		
Adresse	Claude Galien 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bâtiment	005		
Etage	Etage Courant	N° lot	Lot n°005
Commentaire			

Légende

Prélèvements négatifs - après analyse



Plan de masse

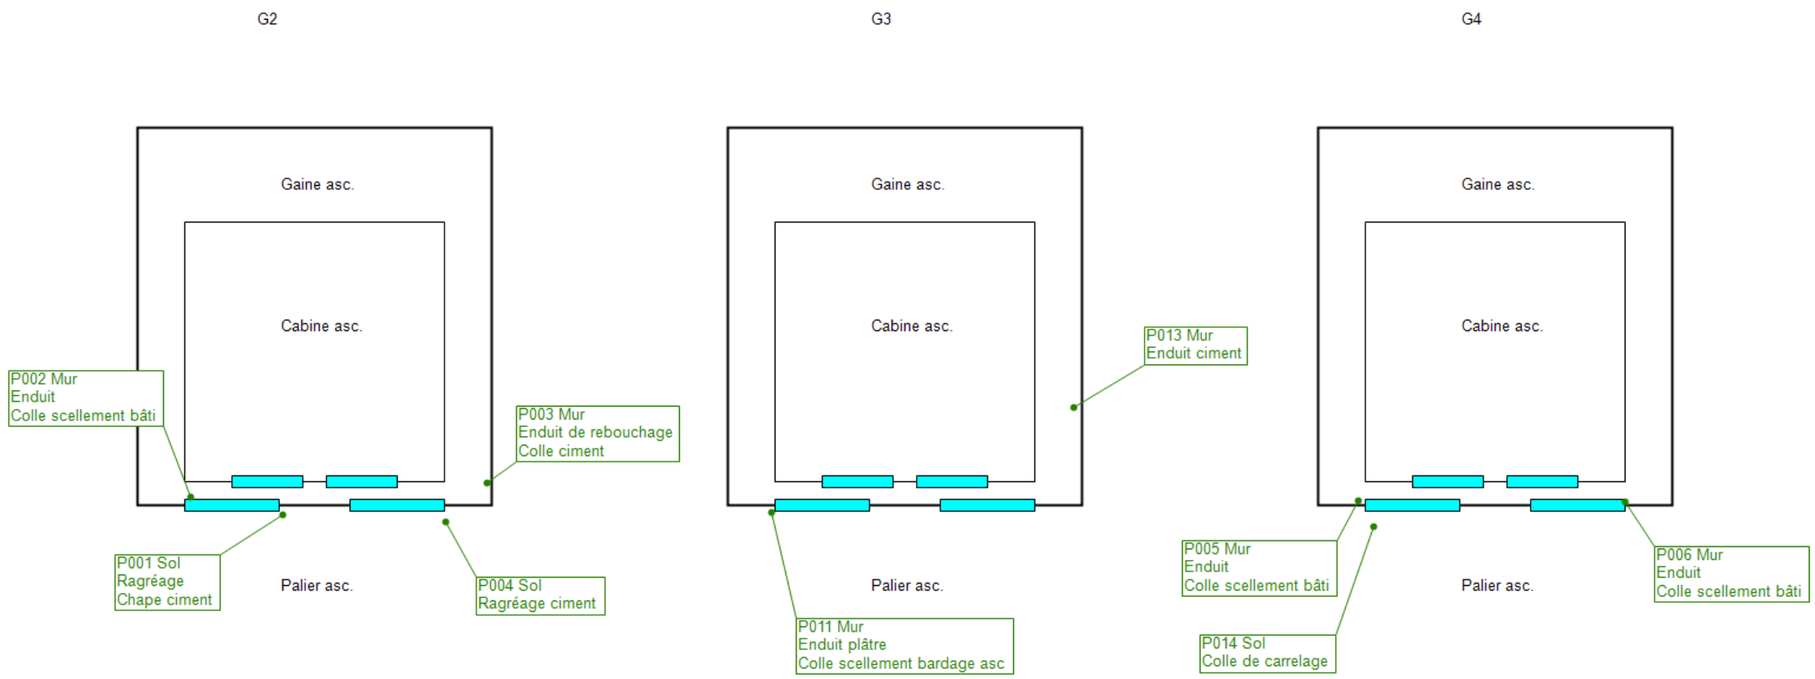

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Croquis N°3 R4


Client	HOPITAL RENE MURET		
N° dossier	2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2		
N° planche	3/3	Version	**0**
Date	27/10/2025		
Intervenant	CHAN Jacobi		
Origine du plan	Document réalisé en interne		
Type	Périmètres de diagnostic		
Adresse	Claude Galien 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN		
Bâtiment	005		
Etage	R04	N° lot	Lot n°005
Commentaire			

Légende

Prélèvements négatifs - après analyse



Plan de masse

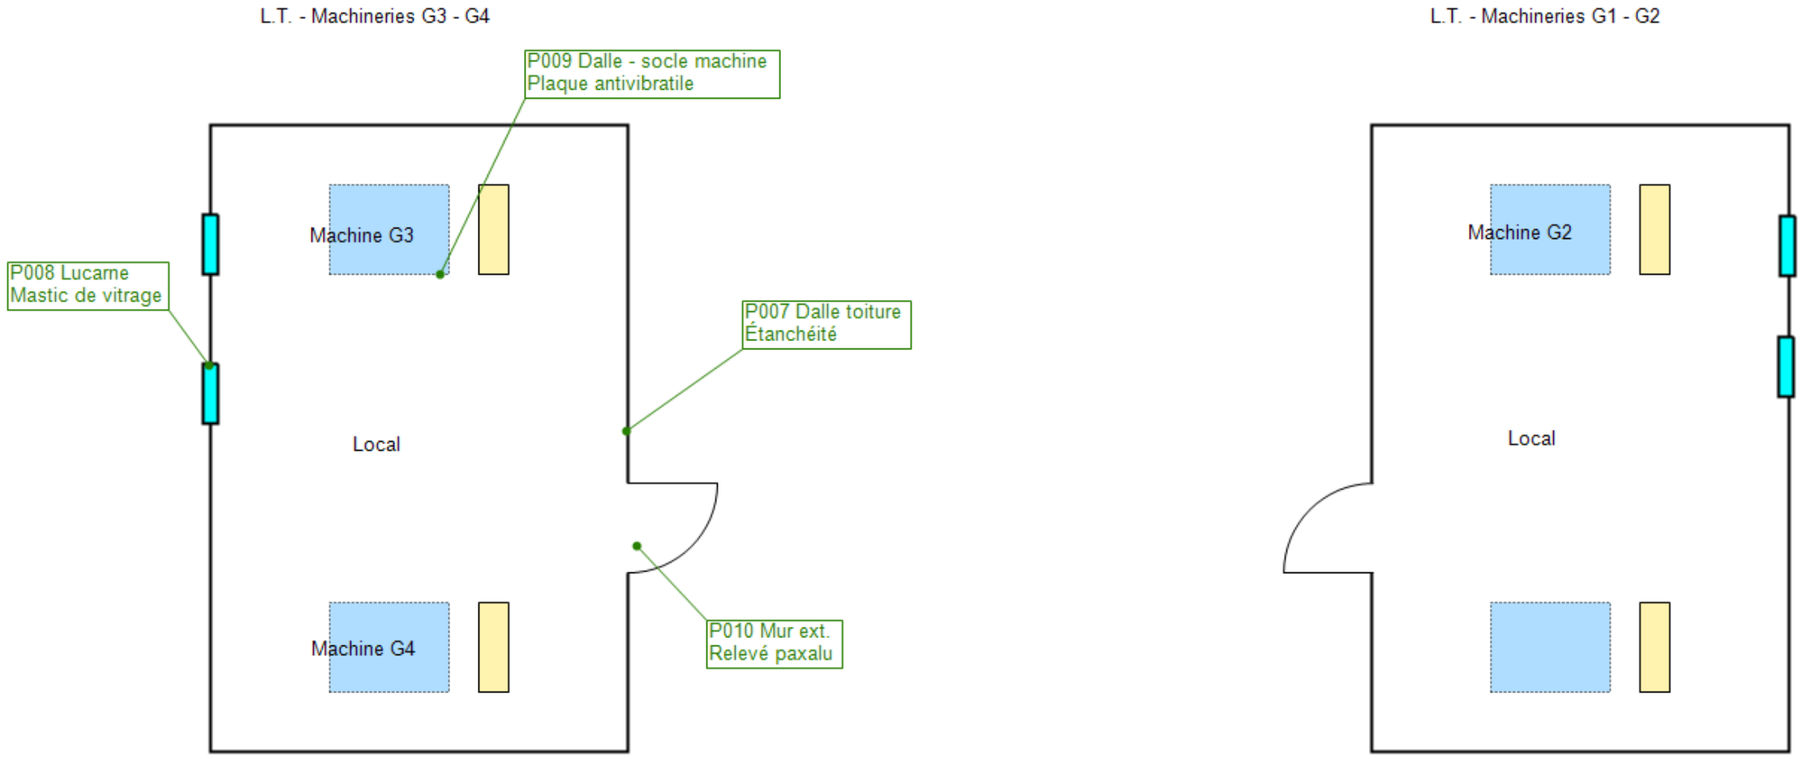

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

SARL COVEANEX
Monsieur Jacobi CHAN
SODIATEC IdF
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122574-01 | Date d'émission de rapport : 15/10/2025 11:01 | Page1/4
Dossier N° : 25A035283 | Date de réception : 13/10/2025 | Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2 A - Claude Galien 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P001-Etage Courant - Palier G2 n°3 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Ragréage - Chape ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-Etage Courant - Gaine Asc. G2 n°1 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit - Colle scellement bâti	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-Etage Courant - Gaine Asc. G2 n°1 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit de rebouchage - Colle ciment	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-RDC - Palier G2 n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Ragréage ciment	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122574-01 Date d'émission de rapport : 15/10/2025 11:01 Page2/4
Dossier N° : 25A035283 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2 A - Claude Galien 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P005-Etage Courant - Gaine Asc. G4 n°3 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit - Colle scellement bâti	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-Etage Courant - Gaine Asc. G4 n°3 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit - Colle scellement bâti	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-R04 - Machinerie Asc. G3 - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Dalle toiture - Étanchéité	Matériau souple de type plaque (fibreux) (bitumineux) (granulaire) (noir) + (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	P008-R04 - Machinerie Asc. G3 - 03 - Parois verticales intérieures - Lucarne - Mastic de vitrage	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) (beige)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-R04 - Machinerie Asc. G3 - 05 - Planchers et planchers techniques - Dalle - socle machine - Plaque antivibratile	Matériau de type liège (marron) (foncé)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122574-01 Date d'émission de rapport : 15/10/2025 11:01 Page3/4
Dossier N° : 25A035283 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2 A - Claude Galien 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P010-R04 - Machinerie Asc. G3 - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mur ext. - Relevé paxalu	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-Etage Courant - Gaine Asc. G3 n°2 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit plâtre - Colle scellement bardage asc	Matériau (gris) (beige) en traces ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-S01 - Palier G3 n°1 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur embrasure - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-Etage Courant - Gaine Asc. G3 n°2 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit ciment	Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-Etage Courant - Palier G4 n°3 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Colle de carrelage	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET * / JX4B	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122574-01 | Date d'émission de rapport : 15/10/2025 11:01 | Page4/4
Dossier N° : 25A035283 | Date de réception : 13/10/2025 | Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12891-HOPITAL RENE MURET G2 A - Claude Galien 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Cindy Barth
Technicien(ne) Analyste Microscopie


Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE

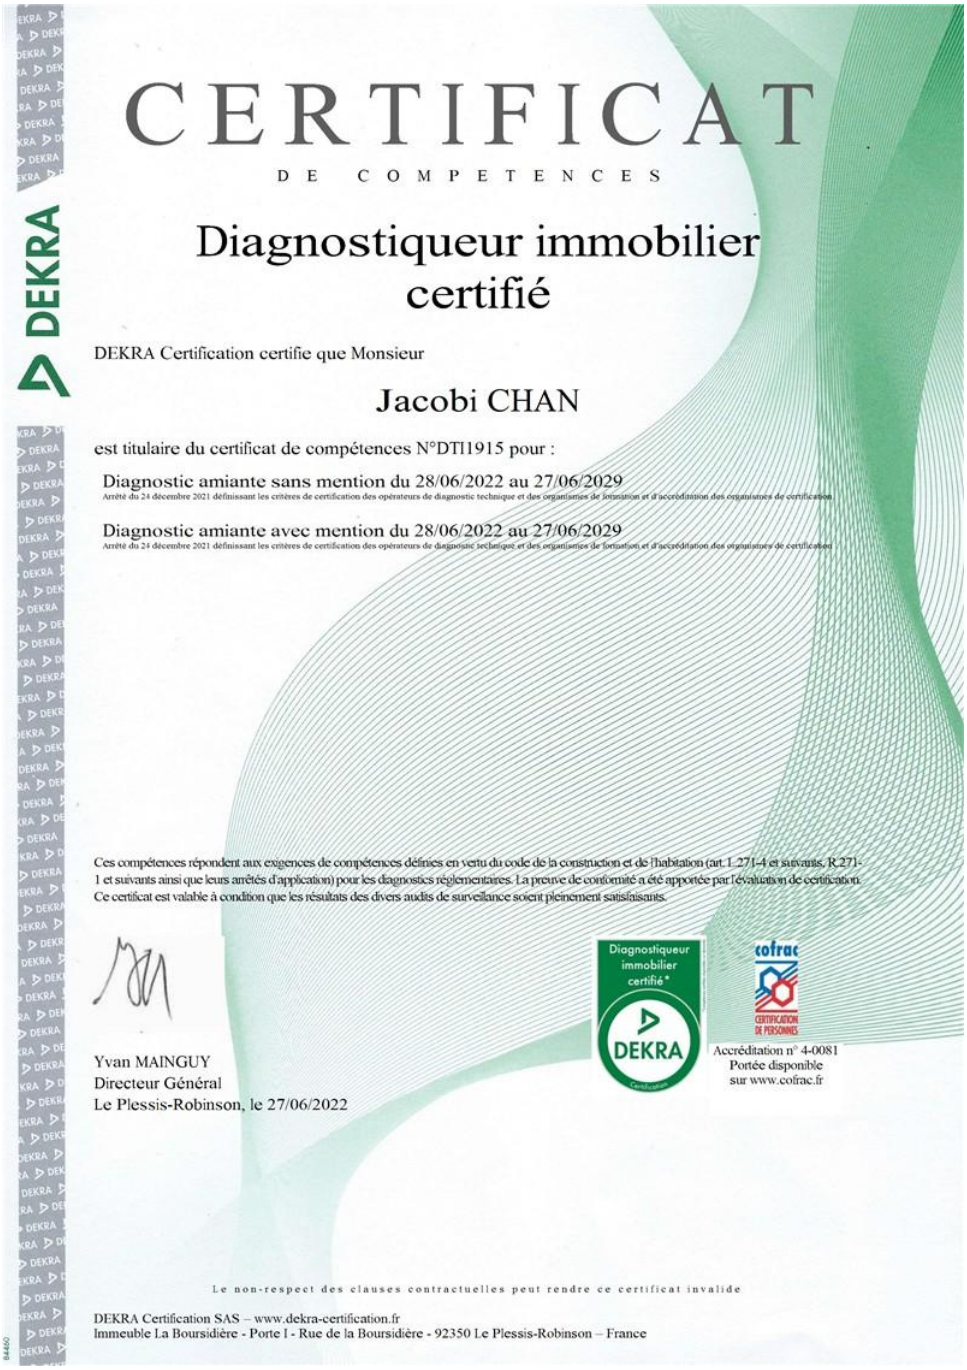

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

DEKRA

Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Jacobi CHAN

est titulaire du certificat de compétences N°DTI1915 pour :

Diagnostic amiante sans mention du 28/06/2022 au 27/06/2029
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic amiante avec mention du 28/06/2022 au 27/06/2029
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification.
Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Diagnostiqueur immobilier certifié DEKRA

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n° 4-0081
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Yvan MAINGUY
Directeur Général
Le Plessis-Robinson, le 27/06/2022

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte 1 - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

Adhésion N°C220

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804

Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

COVEANEX
28 AVENUE DES PEPINIERES
94260 FRESNES

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° **10583931804C220**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées au contrat, ***sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.***

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

1 000 000 € PAR SINISTRE ET 2 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 19 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 306 121 069 - N° ORIAS 07 000 473

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Police N°10583931804C220

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
  Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cas contraire aucune garantie ne sera accordée
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement » (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Police N°10583931804C220

- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit Energétique pour les Maison individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- Audit énergétique pour copropriété (F)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neuf
- Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique de chantier)
- Le carnet d'information du logement (CIL)
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Légende :

F : Formation - **C** : Certification – **AC** : Accréditation

SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60
