INAXE
ENERGIE & ENVIRONNEMENT


PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Déconstruction d'un bâtiment CLOS COURTEL

11 rue du Clos Courtel RENNES – Maître d'ouvrage : CCI ILLE ET VILAINE

Affaire : H1413-MO
Indice A
Établi le 06/11/2026
Planning à la semaine (S1 : travaux)

N°	Tâche	Durée	Sem. début	Sem. fin
Période de préparation		**5 sem.**	**S-5**	**S-1**
1	Période de préparation	5 sem.	S-5	S-1
2	Études d'exécution, plan de retrait, PPSPS	2 sem.	S-5	S-4
3	Plan de retrait transmis : délai d'un mois avant le retrait	3 sem.	S-3	S-1
4	**Fin de la période de préparation, démarrage des travaux**	**jalon**	**S1**	
Tranche ferme				
5	Installation de chantier	0,6 sem.	S1	S1
6	Curage préalable au désamiantage	1,4 sem.	S1	S2
7	Désamiantage	2,5 sem.	S3	S5
8	Curage préalable après désamiantage	1 sem.	S5	S6
9	Évacuation des déchets	6,4 sem.	S5	S11
10	Démolition de la superstructure	1,8 sem.	S7	S8
11	Dépose de l'infrastructure (fondations, dallages, réseaux enterrés…)	3,4 sem.	S8	S12
12	Concassage des inertes	1,2 sem.	S12	S13
13	Remise en état du site	0,6 sem.	S13	S13
14	Repli de chantier	1 sem.	S14	S14
15	**Réception des travaux de la tranche ferme**	**jalon**	**S14**	
Tranche optionnelle n°1 : Retrait de conduits amiante-ciment enterrés		**1 sem.**	**S14**	**S14**
Tranche optionnelle n°2 : Evacuation des inertes concassés		**1 sem.**	**S14**	**S14**

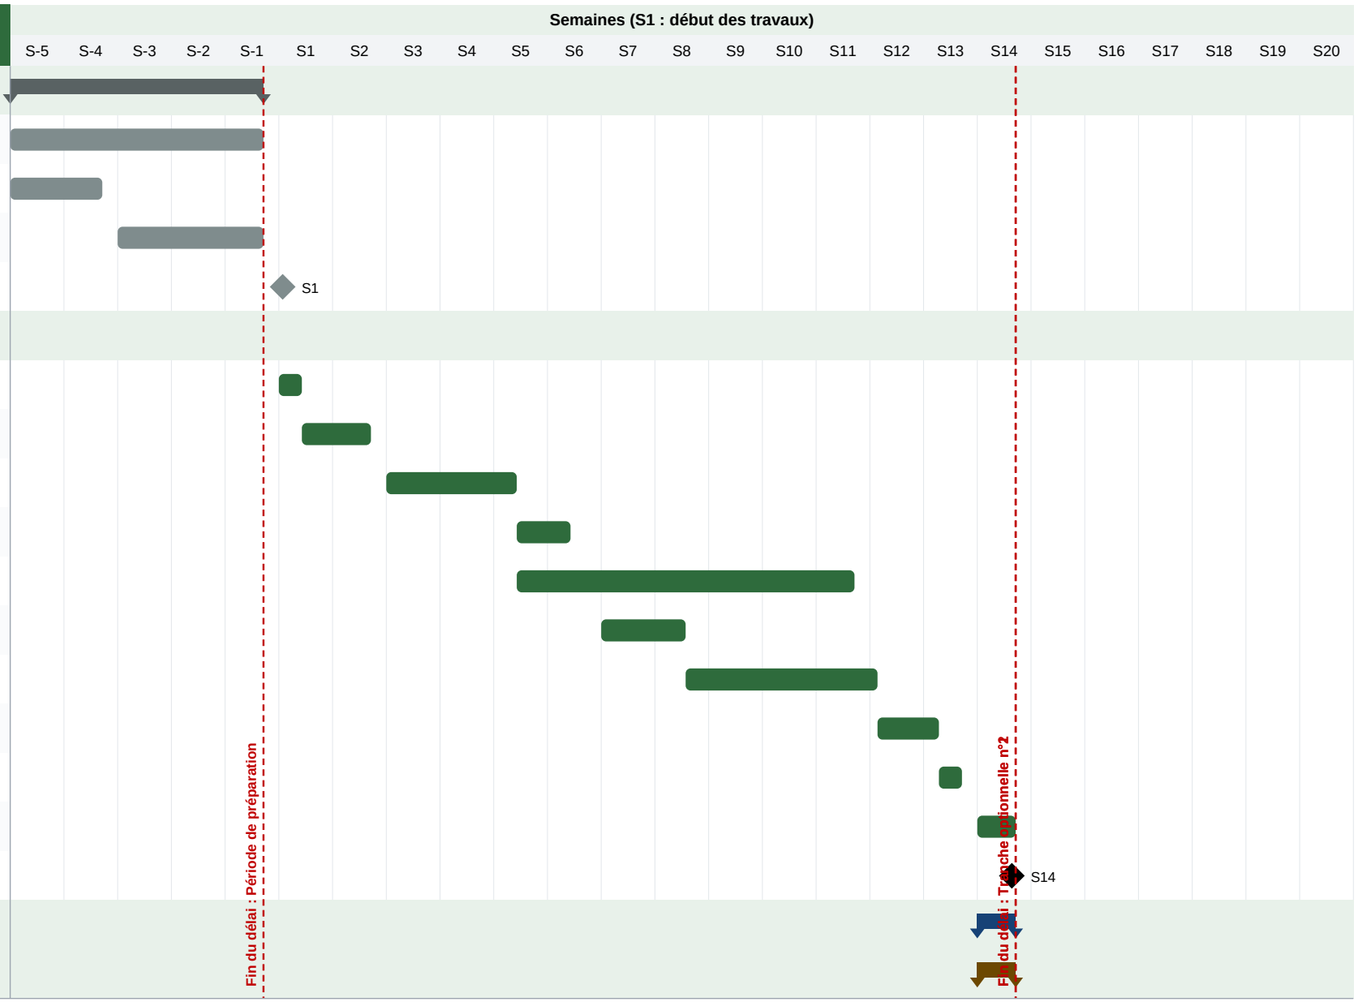

Période de préparation · Tranche ferme · Tranche optionnelle n°1 · Tranche optionnelle n°2 · Tranche optionnelle n°3 · Fin du délai d'exécution · Barre récapitulative de ses tâches

Planning prévisionnel indicatif, établi par la maîtrise d'œuvre d'après le CCTP et l'estimation : l'entreprise remet son planning d'exécution en période de préparation, dans les délais de son marché.
