
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**CHUVAC - TRAVAUX: 22 mois + 2 mois prepa**	**479 jours?**	**Mar 01/09/26**	**Mer 06/09/28**
2		OS Demarrage	0 jour	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26
3		Période de préparation	2 mois	Lun 28/09/26	Lun 23/11/26
4		**Jalon doc études "principales"**	**22 jours**	**Lun 12/10/26**	**Mar 10/11/26**
5		Plans EXE réseaux et dévoiements	3 jours	Lun 12/10/26	Mer 14/10/26
6		Diffusion réseaux sous dallages, réservations et descentes de charges	2 jours	Lun 19/10/26	Mar 20/10/26
7		Diffusion fiches techniques, prototypes, échnatillons et calepinages	2 jours	Lun 09/11/26	Mar 10/11/26
8		Planning EXE : délais approvisionnement, fabrications et interventions	2 jours	Lun 12/10/26	Mar 13/10/26
9		**Prototypes et témoins - TCE**	**134 jours**	**Jeu 26/11/26**	**Ven 18/06/27**
10		Présentations des prototypes structuraux	4 semaines	Jeu 26/11/26	Mer 06/01/27
11		Présentations des prototypes de finitions: appareillages, profils intérieurs, peintures, sols et revêtements	2 semaines	Jeu 07/01/27	Mer 20/01/27
12		Salles témoins	2 mois	Jeu 22/04/27	Ven 18/06/27
13		**Lot 17 - Voiries réseaux Divers - Am. Ext**	**443 jours**	**Lun 12/10/26**	**Lun 28/08/28**
14		Signalisation campus	3 jours	Lun 12/10/26	Mer 14/10/26
15		Décroutage / démolition	7 jours	Lun 26/10/26	Mar 03/11/26
16		Dépose et déplacement des éléments pour accès parking visiteurs	4 jours	Jeu 15/10/26	Mar 20/10/26
17		Réseaux voie provisoire + poste	14 jours	Mer 04/11/26	Mar 24/11/26
18		Terrassement voie provisoire - carrossable PL	10 jours	Mer 25/11/26	Mar 08/12/26
19		Pose plot béton et clôtures	2 jours	Mer 09/12/26	Jeu 10/12/26
20		Réseaux /raccordement bâtiment	2 semaines	Mer 25/11/26	Mar 08/12/26
21		Aménagement ext emprise bâtiment	7 semaines	Ven 02/06/28	Lun 24/07/28
22		Amenagement ext: PARKING	4 semaines	Mar 25/07/28	Lun 28/08/28
23		**Poste de garde provisoire**	**15 jours**	**Mer 18/11/26**	**Mar 08/12/26**
24		Réseaux voie provisoire et poste provisoire + impact définitif	5 jours	Mer 18/11/26	Mar 24/11/26
25		Pose algeco + raccordement	2 semaines	Mer 25/11/26	Mar 08/12/26
26		**Lot 01 - IC - Terrasseent - Fondations - Structure**	**146 jours**	**Lun 05/10/26**	**Jeu 13/05/27**
27		Constat huissier + état des lieux	1 jour	Lun 12/10/26	Lun 12/10/26
28		Installation de chantier: base vie et clôtures	1 semaine	Mar 17/11/26	Lun 23/11/26
29		Démolition	10 jours	Lun 05/10/26	Ven 16/10/26
30		Terrassement	3 semaines	Lun 19/10/26	Ven 06/11/26
31		Fondation	4 semaines	Mar 24/11/26	Lun 04/01/27
32		Réseaux sous dallage	2 semaines	Ven 11/12/26	Jeu 07/01/27
33		Zone A - Dalle basse	2 semaines	Jeu 03/12/26	Mer 16/12/26
34		Zone B - Dalle basse	2 semaines	Jeu 17/12/26	Mer 13/01/27
35		Zone C - Dalle basse	2 semaines	Jeu 14/01/27	Mer 27/01/27
36		Zone A - Elevation	2 semaines	Jeu 17/12/26	Mer 13/01/27
37		Zone B - Elevation	2 semaines	Jeu 14/01/27	Mer 27/01/27
38		Zone C - Elevation	2 semaines	Jeu 28/01/27	Mer 10/02/27
39		Zone A - Dalle haute RDC + BLC	2 semaines	Jeu 14/01/27	Mer 27/01/27
40		Zone B - Dalle haute RDC + BLC	2 semaines	Jeu 28/01/27	Mer 10/02/27
41		Zone C - Dalle haute RDC + BLC	2 semaines	Jeu 11/02/27	Mer 24/02/27
42		Zone A - Escaliers RDC- R+1	3 jours	Lun 25/01/27	Mer 27/01/27
43		Zone C - Escaliers RDC- R+1	3 jours	Lun 22/02/27	Mer 24/02/27
44		Zone A - Elevation R+1 BA + brique	8 jours	Jeu 28/01/27	Lun 08/02/27
45		Zone B - Elevation R+1 BA + brique	2 semaines	Jeu 11/02/27	Mer 24/02/27
46		Zone C - Elevation R+1 BA + brique	2 semaines	Jeu 25/02/27	Mer 10/03/27
47		Zone A -PHR+1 BA	2 semaines	Mar 09/02/27	Lun 22/02/27
48		Zone C - PHR+1 BA	2 semaines	Jeu 11/03/27	Mer 24/03/27
49		Zone B (elargie) -PHR+1BLC + OSB	3 semaines	Jeu 25/02/27	Mer 17/03/27
50		Zone A - Escaliers R+1- R+2	4 jours	Mer 17/02/27	Lun 22/02/27
51		Zone C - Escaliers R+1- R+2	3 jours	Lun 22/03/27	Mer 24/03/27
52		Zone A - Elevation R+2	7 jours	Mar 23/02/27	Mer 03/03/27
53		Zone C - Elevation R+2	7 jours	Jeu 25/03/27	Lun 05/04/27
54		Zone A - PHR+2 bac acier	1 semaine	Jeu 04/03/27	Mer 10/03/27
55		Zone C - PHR+2 bac acier	1 semaine	Mar 06/04/27	Lun 12/04/27
56		Zone A: chape RDC	1 semaine	Jeu 22/04/27	Mer 28/04/27
57		Zone B: chape RDC	1 semaine	Jeu 29/04/27	Mer 05/05/27
58		Zone C: chape RDC	1 semaine	Ven 07/05/27	Jeu 13/05/27
59		Ossatures métalliques	3 semaines	Mar 13/04/27	Lun 03/05/27
60		**Poste de garde**	**83 jours**	**Ven 08/01/27**	**Mer 05/05/27**
61		Fondations, réseaux sous dallage et dallage	6 jours	Ven 08/01/27	Ven 15/01/27
62		Superstructure : élévation et charpente y compris consoles métalliques	6 jours	Mar 13/04/27	Mar 20/04/27
63		Isolant et chape	2 jours	Mar 04/05/27	Mer 05/05/27
64		**Lot 02 - Revêtements de façades**	**143 jours**	**Jeu 11/02/27**	**Ven 17/09/27**
65		Montage échafaudage ext	4 jours	Jeu 11/02/27	Mar 16/02/27
66		Montage échafaudage patio	3 jours	Jeu 18/03/27	Lun 22/03/27
67		Démontage échafaudage	5 jours	Ven 10/09/27	Jeu 16/09/27
68		Appro bardage	6 semaines	Mer 14/04/27	Ven 28/05/27
69		Bardage compris complexe isolé	3 mois	Ven 28/05/27	Ven 03/09/27
70		Couvertines	15 jours	Ven 06/08/27	Jeu 09/09/27
71		Structures supports casquettes et auvents	4 semaines	Lun 23/08/27	Ven 17/09/27
72		**Lot 03 - Etanchéité**	**148 jours**	**Mer 03/03/27**	**Jeu 14/10/27**
73		PHRDC - Etancheité sur support béton	10 jours	Mer 03/03/27	Mar 16/03/27
74		PHRDC - Végetalisation sur étanchéité - support béton	5 jours	Lun 06/09/27	Ven 10/09/27
75		PHRDC - Platelage sur étanchéité - support béton	14 jours	Lun 13/09/27	Jeu 30/09/27
76		PHR+1 - Etancheité autoprotégée	7 jours	Jeu 18/03/27	Ven 26/03/27
77		PHR+2 - Etancheité avec vegetalisation sur support métallique	10 jours	Mar 30/03/27	Lun 12/04/27
78		Edicules (souches, crosses,...)	6 jours	Ven 01/10/27	Jeu 14/10/27
79		TP et DEP	7 jours	Jeu 26/08/27	Ven 03/09/27
80		Pose dalle sur plot	4 jours	Ven 10/09/27	Mer 15/09/27
81		**Lot 04 - Couverture Auvents**	**297 jours**	**Mer 17/02/27**	**Mar 16/05/28**
82		PHRDC - Couverture isole bac acier	10 jours	Mer 17/02/27	Mar 02/03/27
83		PHR+1 - Couverture isole bac acier	10 jours	Jeu 18/03/27	Jeu 01/04/27
84		PHR+2 - Couverture isole bac acier	6 jours	Mar 04/05/27	Mer 12/05/27
85		Casquettes metalliques y compris support	6 semaines	Lun 20/09/27	Ven 29/10/27
86		Pose Cheneaux	7 jours	Mer 01/09/27	Jeu 09/09/27
87		Auvents métalliques y compris support	4 semaines	Mar 02/11/27	Mar 30/11/27
88		Pose des lanterneaux	10 jours	Mer 28/04/27	Mer 12/05/27
89		Raccordement lanterneaux	5 jours	Mer 10/05/28	Mar 16/05/28
90		**Poste de garde**	**5 jours**	**Mer 21/04/27**	**Mar 27/04/27**
91		Couverture	3 jours	Mer 21/04/27	Ven 23/04/27
92		Cheneaux + EP	2 jours	Lun 26/04/27	Mar 27/04/27
93		**Lot 05 - Menuiseries extérieures - Occultations**	**322 jours**	**Mer 03/02/27**	**Ven 09/06/28**
94		Appro	6 semaines	Mer 03/02/27	Mer 17/03/27
95		RDC - Pose menuiseries ext	5 semaines	Mer 17/03/27	Mer 21/04/27
96		R+1 - Pose menuiseries ext	4 semaines	Ven 02/04/27	Jeu 29/04/27
97		R+2 - Pose menuiseries ext	2 semaines	Jeu 13/05/27	Jeu 27/05/27
98		Pose stores motorisés y compris raccordements et essais	6 semaines	Lun 10/04/28	Mer 24/05/28
99		Quincaillerie et réglages	2 semaines	Ven 26/05/28	Ven 09/06/28
100		**Poste de garde**	**3 jours**	**Lun 26/04/27**	**Mer 28/04/27**
101		Pose menuiseries	2 jours	Lun 26/04/27	Mar 27/04/27
102		Pose quincaillerie	1 jour	Mer 28/04/27	Mer 28/04/27
103		**Lot 06 - Cloisons Doublages**	**56 jours**	**Mar 16/03/27**	**Ven 04/06/27**
104		Careraux de plâtre gaine technique	5 jours	Mar 25/05/27	Ven 04/06/27
105		RDC - Cloison	4 semaines	Lun 05/04/27	Ven 30/04/27
106		R+1 - Cloison	3 semaines	Ven 07/05/27	Ven 28/05/27
107		R+2 - Cloison	1 semaine	Lun 31/05/27	Ven 04/06/27
108		RDC - Doublage	18 jours	Ven 26/03/27	Mer 21/04/27
109		R+1 - Doublage	10 jours	Jeu 22/04/27	Mer 05/05/27
110		R+2 - Doublage	5 jours	Ven 07/05/27	Jeu 13/05/27
111		Enduit étancheité à l'air	21 jours	Mar 16/03/27	Mer 14/04/27
112		**Poste de garde**	**4 jours**	**Mer 28/04/27**	**Lun 03/05/27**
113		Doublages et cloisons; y compris bande à joint	4 jours	Mer 28/04/27	Lun 03/05/27
114		**Lot 07 - Faux-plafond**	**264 jours**	**Mar 04/05/27**	**Ven 16/06/28**
115		Faux-plafond hygiénique	4 semaines	Jeu 18/05/28	Ven 16/06/28
116		RDC - Faux plafond en plaque de plâtre	6 semaines	Jeu 29/07/27	Mer 22/09/27
117		R+1 - Faux plafond en plaque de plâtre	4 semaines	Jeu 07/10/27	Jeu 04/11/27
118		R+2 - Faux plafond en plaque de plâtre	2 semaines	Ven 05/11/27	Ven 19/11/27
119		**Poste de garde**	**3 jours**	**Mar 04/05/27**	**Ven 07/05/27**
120		Plafond	3 jours	Mar 04/05/27	Ven 07/05/27
121		**Lot 08 - Menuiseries intétieures**	**467 jours?**	**Mar 01/09/26**	**Lun 21/08/28**
122		Appro bloc porte	5 semaines	Ven 26/02/27	Lun 05/04/27



N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
123		Bloc portes	3 semaines	Lun 13/03/28	Ven 31/03/28
124		Gaines techniques	2 semaines	Lun 10/05/27	Mar 25/05/27
125		Trappes de visites	2 semaines	Lun 15/11/27	Ven 26/11/27
126		Cloisons vitrés	3 semaines	Ven 14/05/27	Ven 04/06/27
127		Châssis vitrés int	1 semaine	Lun 31/05/27	Ven 04/06/27
128		Divers	1 semaine	Ven 02/06/28	Ven 09/06/28
129		Mobiliers	1 jour?	Mar 01/09/26	Mar 01/09/26
130		**Banque accueil**	**30 jours**	**Lun 03/07/28**	**Lun 21/08/28**
131		Bureau de caisse	2 semaines	Lun 03/07/28	Lun 17/07/28
132		Guichets admission, zone tech, pharmacie	3 semaines	Mar 18/07/28	Lun 07/08/28
133		Ilot de connexions	1 semaine	Mar 08/08/28	Lun 21/08/28
134		Réglages, quincaillerie et mise en service	2 semaines	Jeu 18/05/28	Ven 02/06/28
135		**Poste de garde**	**13 jours**	**Mer 28/04/27**	**Mar 18/05/27**
136		Appro bloc	1 jour	Mer 28/04/27	Mer 28/04/27
137		Pose porte et quincailleries	1 jour	Mar 18/05/27	Mar 18/05/27
138		**Lot 09 - Serrurerie Métallerie**	**273 jours**	**Ven 28/05/27**	**Lun 24/07/28**
139		**Intérieur**	**226 jours**	**Ven 28/05/27**	**Ven 12/05/28**
140		Portes	3 semaines	Ven 28/05/27	Jeu 17/06/27
141		Main-courante	2 semaines	Lun 20/03/28	Ven 31/03/28
142		GC	7 jours	Jeu 09/03/28	Lun 20/03/28
143		Grilles ventilation	4 jours	Ven 18/06/27	Mer 23/06/27
144		Lisses int protection circulation	25 jours	Lun 03/04/28	Mar 09/05/28
145		Echelles accès toit	3 jours	Mer 10/05/28	Ven 12/05/28
146		**Exterieur**	**224 jours**	**Ven 06/08/27**	**Lun 24/07/28**
147		Portillons et portails	2 semaines	Lun 19/06/28	Lun 03/07/28
148		GC terrasses	6 jours	Ven 06/08/27	Ven 27/08/27
149		Grilles ventilation	4 jours	Mar 31/08/27	Ven 03/09/27
150		Clôtures ext	3 semaines	Lun 03/07/28	Lun 24/07/28
151		Rack vélos et divers	7 jours	Jeu 22/06/28	Lun 03/07/28
152		**Lot 10 - Revetements de Sols Souples et Durs**	**220 jours**	**Lun 03/05/27**	**Ven 07/04/28**
153		RDC -Ragréage + sous couche imperméable	3 semaines	Lun 03/05/27	Mar 25/05/27
154		RDC - Chape acoustique béton quartzé y compris traitement quartz et polissage	7 jours	Ven 26/11/27	Lun 06/12/27
155		RDC - sol souple y compris remontées en plinthes	7 semaines	Lun 15/11/27	Ven 14/01/28
156		R+1 - Ragréage	2 semaines	Lun 29/11/27	Lun 13/12/27
157		R+1- Taradouche	2 semaines	Lun 13/12/27	Ven 07/01/28
158		R+1 - sol souple y compris remontées en plinthes	5 semaines	Lun 17/01/28	Ven 18/02/28
159		R+2 - Ragréage	2 semaines	Lun 21/02/28	Ven 03/03/28
160		R+2 - Carrelages	2 semaines	Lun 06/03/28	Ven 17/03/28
161		Sol antistatique bloc opératoire	3 semaines	Lun 20/03/28	Ven 07/04/28
162		Faiences	9 jours	Lun 15/11/27	Jeu 25/11/27
163		Taradouche en revêtement mural	10 jours	Lun 21/02/28	Ven 03/03/28
164		Revêtement mural, crédence, miroir	2 semaines	Lun 06/03/28	Ven 17/03/28
165		**Poste de garde**	**4 jours**	**Mer 19/05/27**	**Lun 24/05/27**
166		Sol souple y compris ragréage	3 jours	Mer 19/05/27	Ven 21/05/27
167		Crédence	1 jour	Lun 24/05/27	Lun 24/05/27
168		**Lot 11 - Peinture Signalétique**	**302 jours**	**Mar 11/05/27**	**Mer 23/08/28**
169		Peinture RDC	7 semaines	Jeu 23/09/27	Ven 12/11/27
170		Peinture R+1	4 semaines	Lun 15/11/27	Ven 10/12/27
171		Peinture R+2	2 semaines	Lun 20/03/28	Ven 31/03/28
172		Retouches peintures après appareillages	3 semaines	Mer 10/05/28	Jeu 01/06/28
173		Nettoyage OPR	4 semaines	Ven 02/06/28	Ven 30/06/28
174		Nettoyage réception	2 semaines	Jeu 03/08/28	Mer 23/08/28
175		**Poste de garde**	**18 jours**	**Mar 11/05/27**	**Ven 04/06/27**
176		Mise en peinture	4 jours	Mar 11/05/27	Ven 14/05/27
177		Nettoyage OPR	2 jours	Mer 26/05/27	Jeu 27/05/27
178		Nettoyage réception	2 jours	Jeu 03/06/27	Ven 04/06/27
179		**Lot 12 - Chauffage Ventilation Rafraichissement - Installations et Equipements sanitaires**	**335 jours**	**Ven 11/12/26**	**Mar 16/05/28**
180		**CVC**	**210 jours**	**Ven 11/12/26**	**Jeu 04/11/27**
181		RDC - Gaines + clapet CF	3 mois	Lun 03/05/27	Mer 28/07/27
182		R+1 - Gaines + clapet CF	2 mois	Jeu 29/07/27	Mer 06/10/27
183		R+2 - Groupe et locaux techni	1 mois	Jeu 07/10/27	Jeu 04/11/27
184		**Plomberie**	**210 jours**	**Ven 11/12/26**	**Jeu 04/11/27**
185		RDC - Réseaux et incorpos	3 mois	Lun 03/05/27	Mer 28/07/27
186		R+1 -Réseaux et incorpos	2 mois	Jeu 29/07/27	Mer 06/10/27
187		R+2 - Réseaux et incorpos	1 mois	Jeu 07/10/27	Jeu 04/11/27
188		Réseaux sous dallage effluent	3 jours	Ven 11/12/26	Mar 15/12/26
189		Pose et raccordement réseau effluents des servcices sur le RDC du bâtiment	1 semaine	Mer 16/12/26	Mar 05/01/27
190		Raccordements	3 semaines	Lun 03/04/28	Lun 24/04/28
191		RDC- Terminaux + appareillages	5 semaines	Lun 15/11/27	Ven 17/12/27
192		R+1- Terminaux + appareillages	5 semaines	Lun 13/12/27	Ven 28/01/28
193		R+2- Terminaux + appareillages	5 semaines	Lun 03/04/28	Mar 09/05/28
194		Essais et mises en service	3 semaines	Lun 24/04/28	Mar 16/05/28
195		**Poste de garde**	**17 jours**	**Jeu 29/04/27**	**Mar 25/05/27**
196		Incorpo placo + gaines y compris isolant	3 jours	Jeu 29/04/27	Lun 03/05/27
197		Appareillages	3 jours	Mar 18/05/27	Jeu 20/05/27
198		Mise en service	3 jours	Ven 21/05/27	Mar 25/05/27
199		**Lot 13 - Fluides spéciaux**	**35 jours**	**Jeu 29/07/27**	**Mer 29/09/27**
200		Réseau O2 air comprimé	3 semaines	Jeu 29/07/27	Mer 01/09/27
201		Réseau O2 Evacuation gaz anesthésie	4 semaines	Jeu 02/09/27	Mer 29/09/27
202		**Lot 14 - Electricité CFO/CFA**	**270 jours**	**Lun 12/04/27**	**Jeu 01/06/28**
203		RDC - Chemin de câbles + distribution	3 mois	Lun 03/05/27	Mer 28/07/27
204		R+1 - Chemin de câbles + distribution	2 mois	Jeu 29/07/27	Mer 06/10/27
205		RDC- incorp	25 jours	Lun 12/04/27	Mar 18/05/27
206		R+1 : Incorpo	20 jours	Ven 14/05/27	Ven 11/06/27
207		R+2 - Incorpo	10 jours	Lun 07/06/27	Ven 18/06/27
208		TD + TGBT	60 jours	Jeu 07/10/27	Ven 14/01/28
209		RDC - Appareillages	4 semaines	Lun 15/11/27	Ven 10/12/27
210		R+1- Appareillages	4 semaines	Lun 13/12/27	Ven 21/01/28
211		R+2 - Appareillages	4 semaines	Lun 03/04/28	Ven 28/04/28
212		Local VDI	2 semaines	Jeu 28/10/27	Lun 15/11/27
213		GTB	4 semaines	Lun 03/04/28	Ven 28/04/28
214		Essais et mises en service	6 semaines	Lun 17/04/28	Jeu 01/06/28
215		**Poste de garde**	**17 jours**	**Jeu 29/04/27**	**Mar 25/05/27**
216		Incorpo placo + chemins de câbles	3 jours	Jeu 29/04/27	Lun 03/05/27
217		Appareillages	2 jours	Mar 18/05/27	Mer 19/05/27
218		Mise en service	4 jours	Jeu 20/05/27	Mar 25/05/27
219		**Lot 15 - Ascenseurs Monte-charge**	**298 jours**	**Mar 16/03/27**	**Ven 16/06/28**
220		Appro	8 semaines	Mar 16/03/27	Jeu 13/05/27
221		Ascenseur	1 semaine	Jeu 13/05/27	Jeu 20/05/27
222		Monte-charge	2 semaines	Ven 21/05/27	Jeu 03/06/27
223		Monte plateaux	2 semaines	Ven 04/06/27	Jeu 17/06/27
224		Essais et mise en servcie	10 jours	Ven 02/06/28	Ven 16/06/28
225		**Lot 16 - Mobilier Hospitalier**	**75 jours**	**Lun 28/02/28**	**Ven 16/06/28**
226		Appro / fabrication	8 semaines	Lun 28/02/28	Lun 24/04/28
227		Pose	4 semaines	Lun 24/04/28	Ven 26/05/28
228		Finitions	1 semaine	Ven 26/05/28	Ven 02/06/28
229		Essais et mise en service	2 semaines	Ven 02/06/28	Ven 16/06/28
230		**Lot 18 - Espace vert**	**428 jours**	**Lun 28/09/26**	**Lun 17/07/28**
231		Mise en place protections arbres	1 semaine	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
232		Terrassement pour plantation + mise en place des TV	3 semaines	Ven 02/06/28	Ven 23/06/28
233		Plantations: arbres, engazonnement et végétaux	2 semaines	Lun 26/06/28	Ven 07/07/28
234		Basssin et aménagement sur emprise chantier + PARKING	4 semaines	Lun 12/06/28	Ven 07/07/28
235		Fintions	1 semaine	Lun 10/07/28	Lun 17/07/28
236		**Réception**	**300 jours**	**Ven 28/05/27**	**Mer 06/09/28**
237		OPR (archi + techniques)	5 semaines	Mer 28/06/28	Jeu 03/08/28
238		Levée de réserves	4 semaines	Jeu 03/08/28	Mer 06/09/28
239		DOE	2 semaines	Jeu 20/07/28	Jeu 03/08/28
240		Réception	0 jour	Mer 06/09/28	Mer 06/09/28
241		**Poste de garde**	**10 jours**	**Ven 28/05/27**	**Jeu 10/06/27**
242		OPR	4 jours	Ven 28/05/27	Mer 02/06/27
243		Réception	4 jours	Lun 07/06/27	Jeu 10/06/27

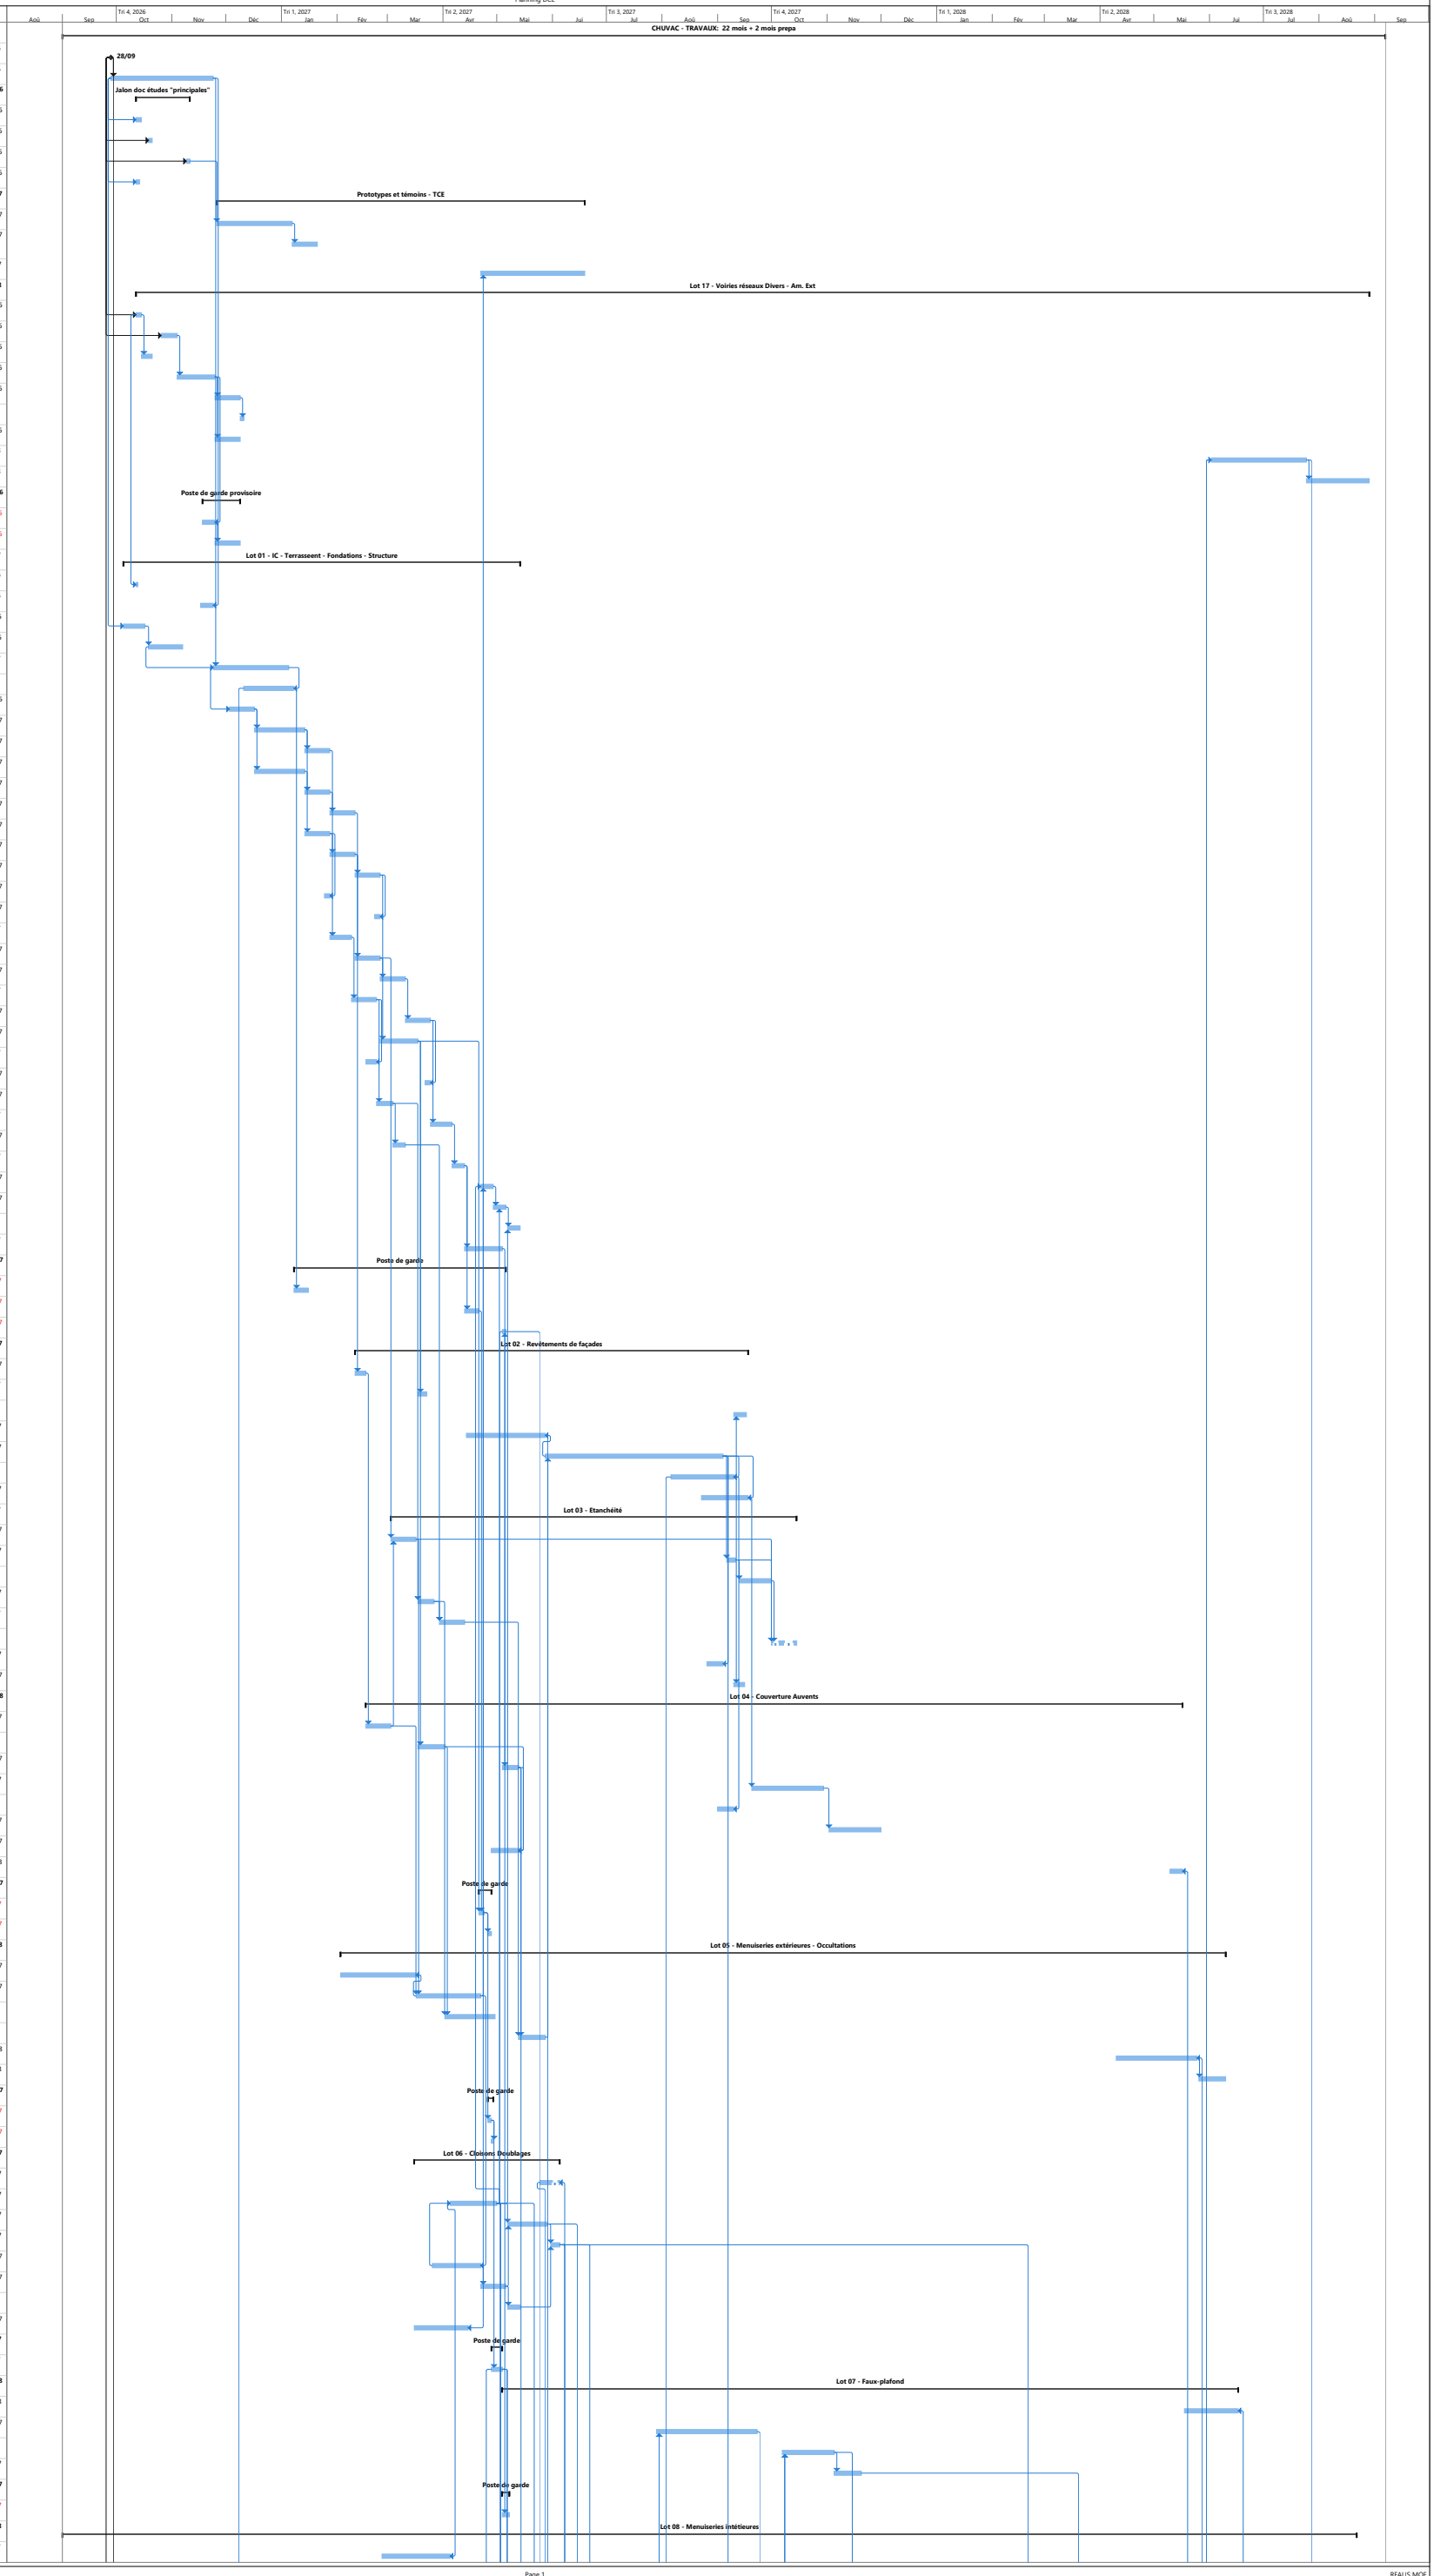
