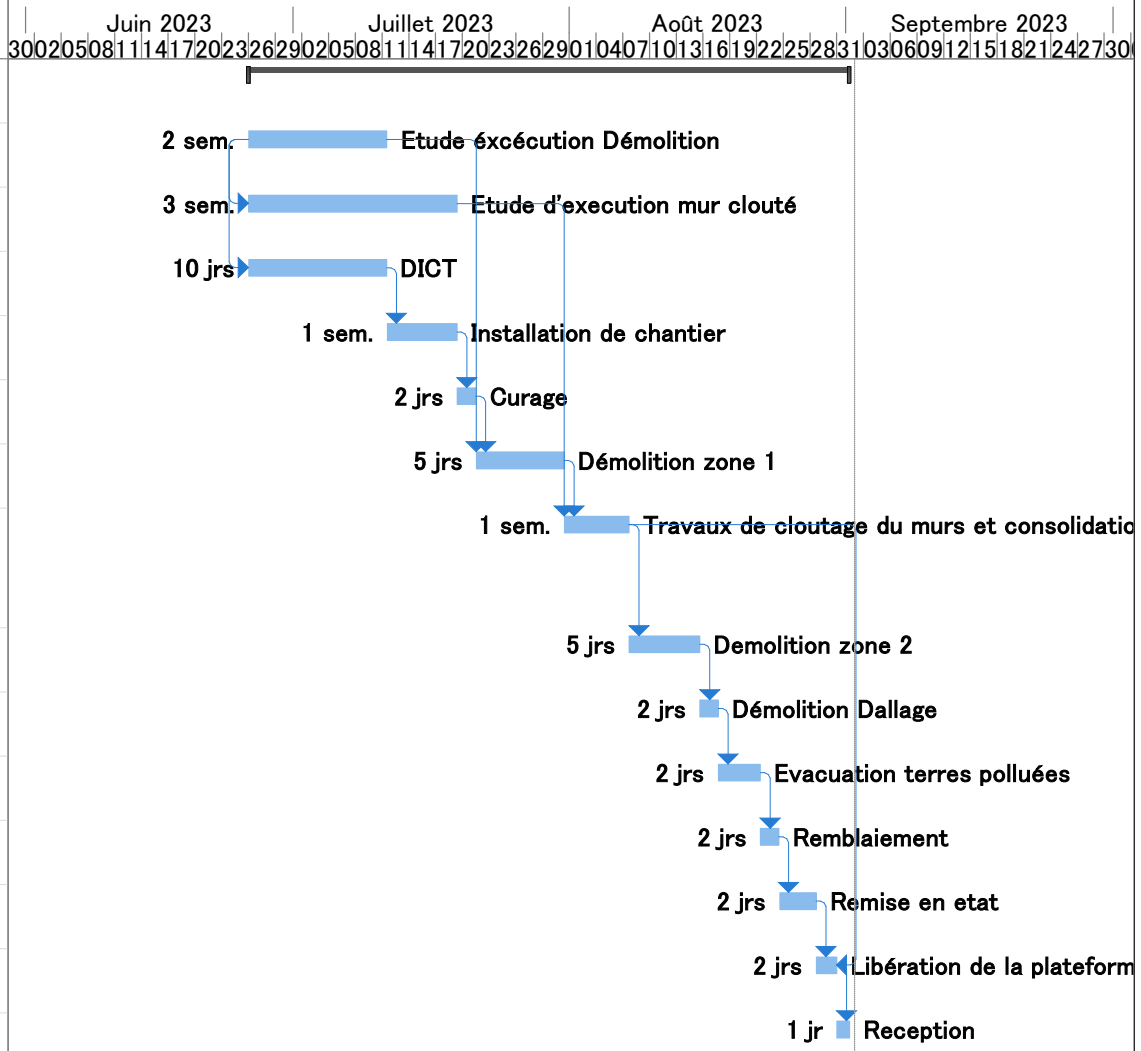N°	MT	Nom de la tâche	Durée	Début
1		**Démolition**	**43 jrs**	**Lun 26/06/23**
2		Etude éxécution Démolition	2 sem.	Lun 26/06/23
3		Etude d'execution mur clouté	3 sem.	Lun 26/06/23
4		DICT	10 jrs	Lun 26/06/23
5		Installation de chantier	1 sem.	Mar 11/07/23
6		Curage	2 jrs	Mer 19/07/23
7		Démolition zone 1	5 jrs	Ven 21/07/23
8		Travaux de cloutage du murs et consolidation	1 sem.	Lun 31/07/23
9		Demolition zone 2	5 jrs	Lun 07/08/23
10		Démolition Dallage	2 jrs	Mar 15/08/23
11		Evacuation terres polluées	2 jrs	Jeu 17/08/23
12		Remblaiement	2 jrs	Mar 22/08/23
13		Remise en etat	2 jrs	Jeu 24/08/23
14		Libération de la plateforme	2 jrs	Lun 28/08/23
15		Reception	1 jr	Jeu 31/08/23
