MAITRE D'OUVRAGE: CCI D'ARLES
MAITRISE D'OEUVRE: ODA - K2C BET - CCE - DUPLAN

PEPINIERES ENTREPRISE - RENEVATION DE BUREAUX

Calendrier DCE décembre 2024
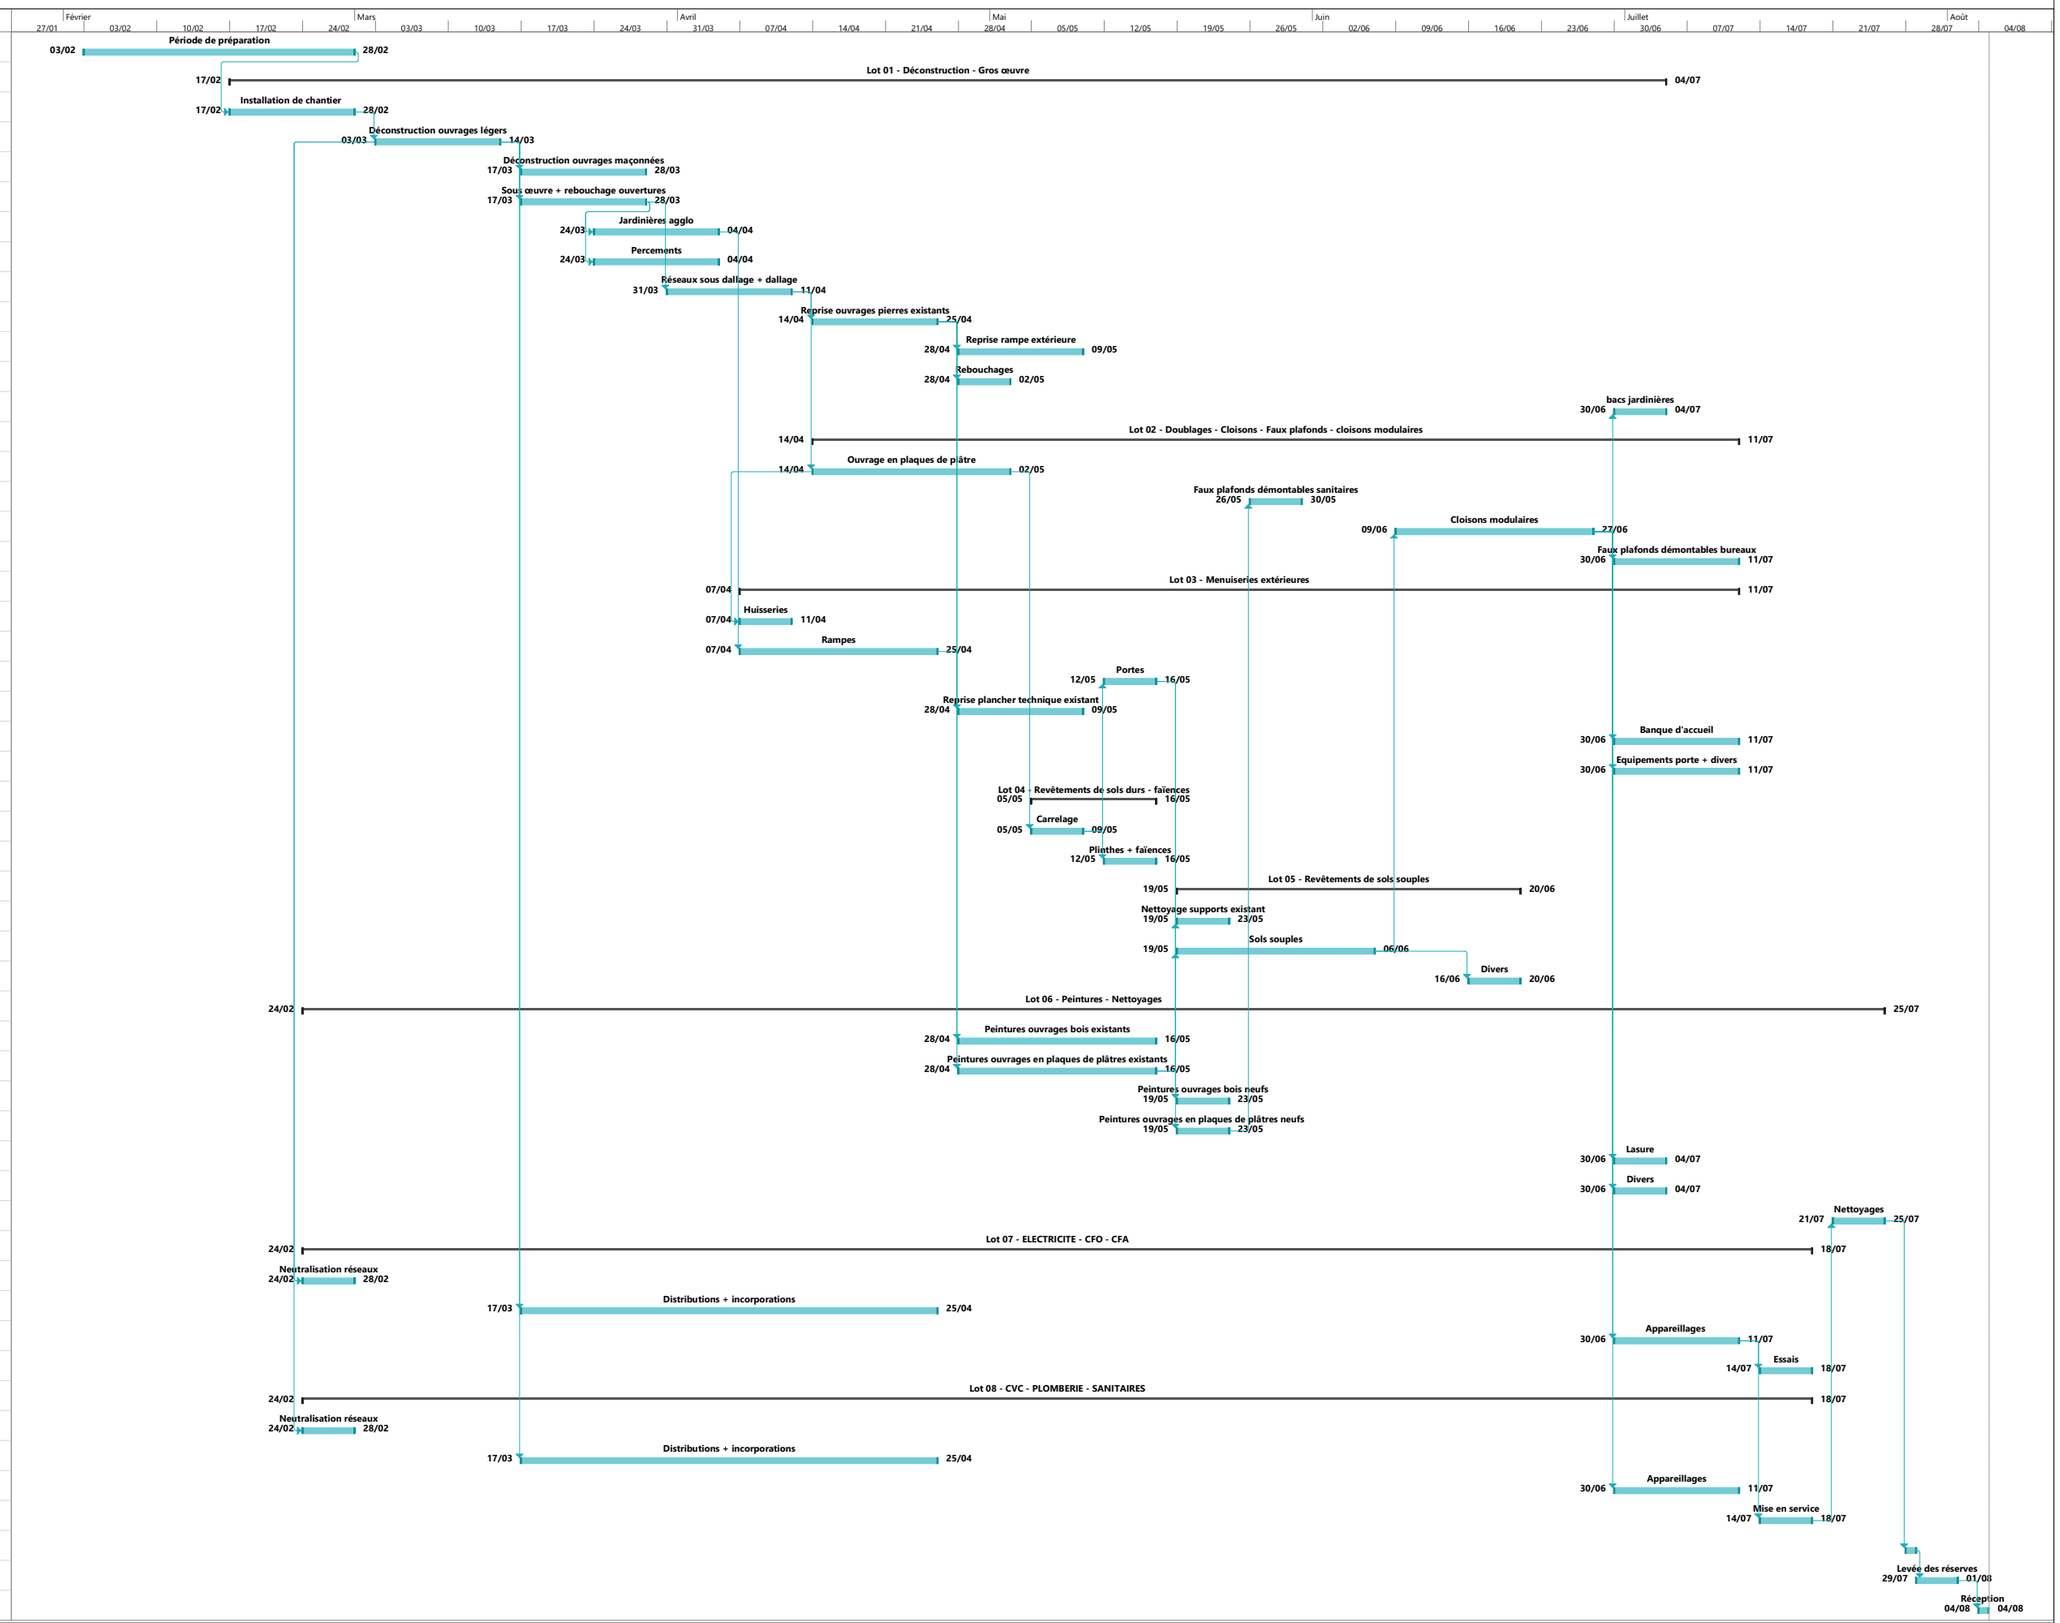
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		Période de préparation	20 jours	Lun 03/02/25	Ven 28/02/25
2		**Lot 01 - Déconstruction - Gros œuvre**	**100 jours**	**Lun 17/02/25**	**Ven 04/07/25**
3		Installation de chantier	10 jours	Lun 17/02/25	Ven 28/02/25
4		Déconstruction ouvrages légers	10 jours	Lun 03/03/25	Ven 14/03/25
5		Déconstruction ouvrages maçonnées	10 jours	Lun 17/03/25	Ven 28/03/25
6		Sous œuvre + rebouchage ouvertures	10 jours	Lun 17/03/25	Ven 28/03/25
7		Jardinières agglo	10 jours	Lun 24/03/25	Ven 04/04/25
8		Percements	10 jours	Lun 24/03/25	Ven 04/04/25
9		Réseaux sous dallage + dallage	10 jours	Lun 31/03/25	Ven 11/04/25
10		Reprise ouvrages pierres existants	10 jours	Lun 14/04/25	Ven 25/04/25
11		Reprise rampe extérieure	10 jours	Lun 28/04/25	Ven 09/05/25
12		Rebouchages	5 jours	Lun 28/04/25	Ven 02/05/25
13		bacs jardinières	5 jours	Lun 30/06/25	Ven 04/07/25
14		**Lot 02 - Doublages - Cloisons - Faux plafonds - cloisons modulaires**	**65 jours**	**Lun 14/04/25**	**Ven 11/07/25**
15		Ouvrage en plaques de plâtre	15 jours	Lun 14/04/25	Ven 02/05/25
16		Faux plafonds démontables sanitaires	5 jours	Lun 26/05/25	Ven 30/05/25
17		Cloisons modulaires	15 jours	Lun 09/06/25	Ven 27/06/25
18		Faux plafonds démontables bureaux	10 jours	Lun 30/06/25	Ven 11/07/25
19		**Lot 03 - Menuiseries extérieures**	**70 jours**	**Lun 07/04/25**	**Ven 11/07/25**
20		Huisseries	5 jours	Lun 07/04/25	Ven 11/04/25
21		Rampes	15 jours	Lun 07/04/25	Ven 25/04/25
22		Portes	5 jours	Lun 12/05/25	Ven 16/05/25
23		Reprise plancher technique existant	10 jours	Lun 28/04/25	Ven 09/05/25
24		Banque d'accueil	10 jours	Lun 30/06/25	Ven 11/07/25
25		Equipements porte + divers	10 jours	Lun 30/06/25	Ven 11/07/25
26		**Lot 04 - Revêtements de sols durs - faïences**	**10 jours**	**Lun 05/05/25**	**Ven 16/05/25**
27		Carrelage	5 jours	Lun 05/05/25	Ven 09/05/25
28		Plinthes + faïences	5 jours	Lun 12/05/25	Ven 16/05/25
29		**Lot 05 - Revêtements de sols souples**	**25 jours**	**Lun 19/05/25**	**Ven 20/06/25**
30		Nettoyage supports existant	5 jours	Lun 19/05/25	Ven 23/05/25
31		Sols souples	15 jours	Lun 19/05/25	Ven 06/06/25
32		Divers	5 jours	Lun 16/06/25	Ven 20/06/25
33		**Lot 06 - Peintures - Nettoyages**	**110 jours**	**Lun 24/02/25**	**Ven 25/07/25**
34		Peintures ouvrages bois existants	15 jours	Lun 28/04/25	Ven 16/05/25
35		Peintures ouvrages en plaques de plâtres existants	15 jours	Lun 28/04/25	Ven 16/05/25
36		Peintures ouvrages bois neufs	5 jours	Lun 19/05/25	Ven 23/05/25
37		Peintures ouvrages en plaques de plâtres neufs	5 jours	Lun 19/05/25	Ven 23/05/25
38		Lasure	5 jours	Lun 30/06/25	Ven 04/07/25
39		Divers	5 jours	Lun 30/06/25	Ven 04/07/25
40		Nettoyages	5 jours	Lun 21/07/25	Ven 25/07/25
41		**Lot 07 - ELECTRICITE - CFO - CFA**	**105 jours**	**Lun 24/02/25**	**Ven 18/07/25**
42		Neutralisation réseaux	5 jours	Lun 24/02/25	Ven 28/02/25
43		Distributions + incorporations	30 jours	Lun 17/03/25	Ven 25/04/25
44		Appareillages	10 jours	Lun 30/06/25	Ven 11/07/25
45		Essais	5 jours	Lun 14/07/25	Ven 18/07/25
46		**Lot 08 - CVC - PLOMBERIE - SANITAIRES**	**105 jours**	**Lun 24/02/25**	**Ven 18/07/25**
47		Neutralisation réseaux	5 jours	Lun 24/02/25	Ven 28/02/25
48		Distributions + incorporations	30 jours	Lun 17/03/25	Ven 25/04/25
49		Appareillages	10 jours	Lun 30/06/25	Ven 11/07/25
50		Mise en service	5 jours	Lun 14/07/25	Ven 18/07/25
51		OPR	1 jour	Lun 28/07/25	Lun 28/07/25
52		Levée des réserves	4 jours	Mar 29/07/25	Ven 01/08/25
53		Réception	1 jour	Lun 04/08/25	Lun 04/08/25
