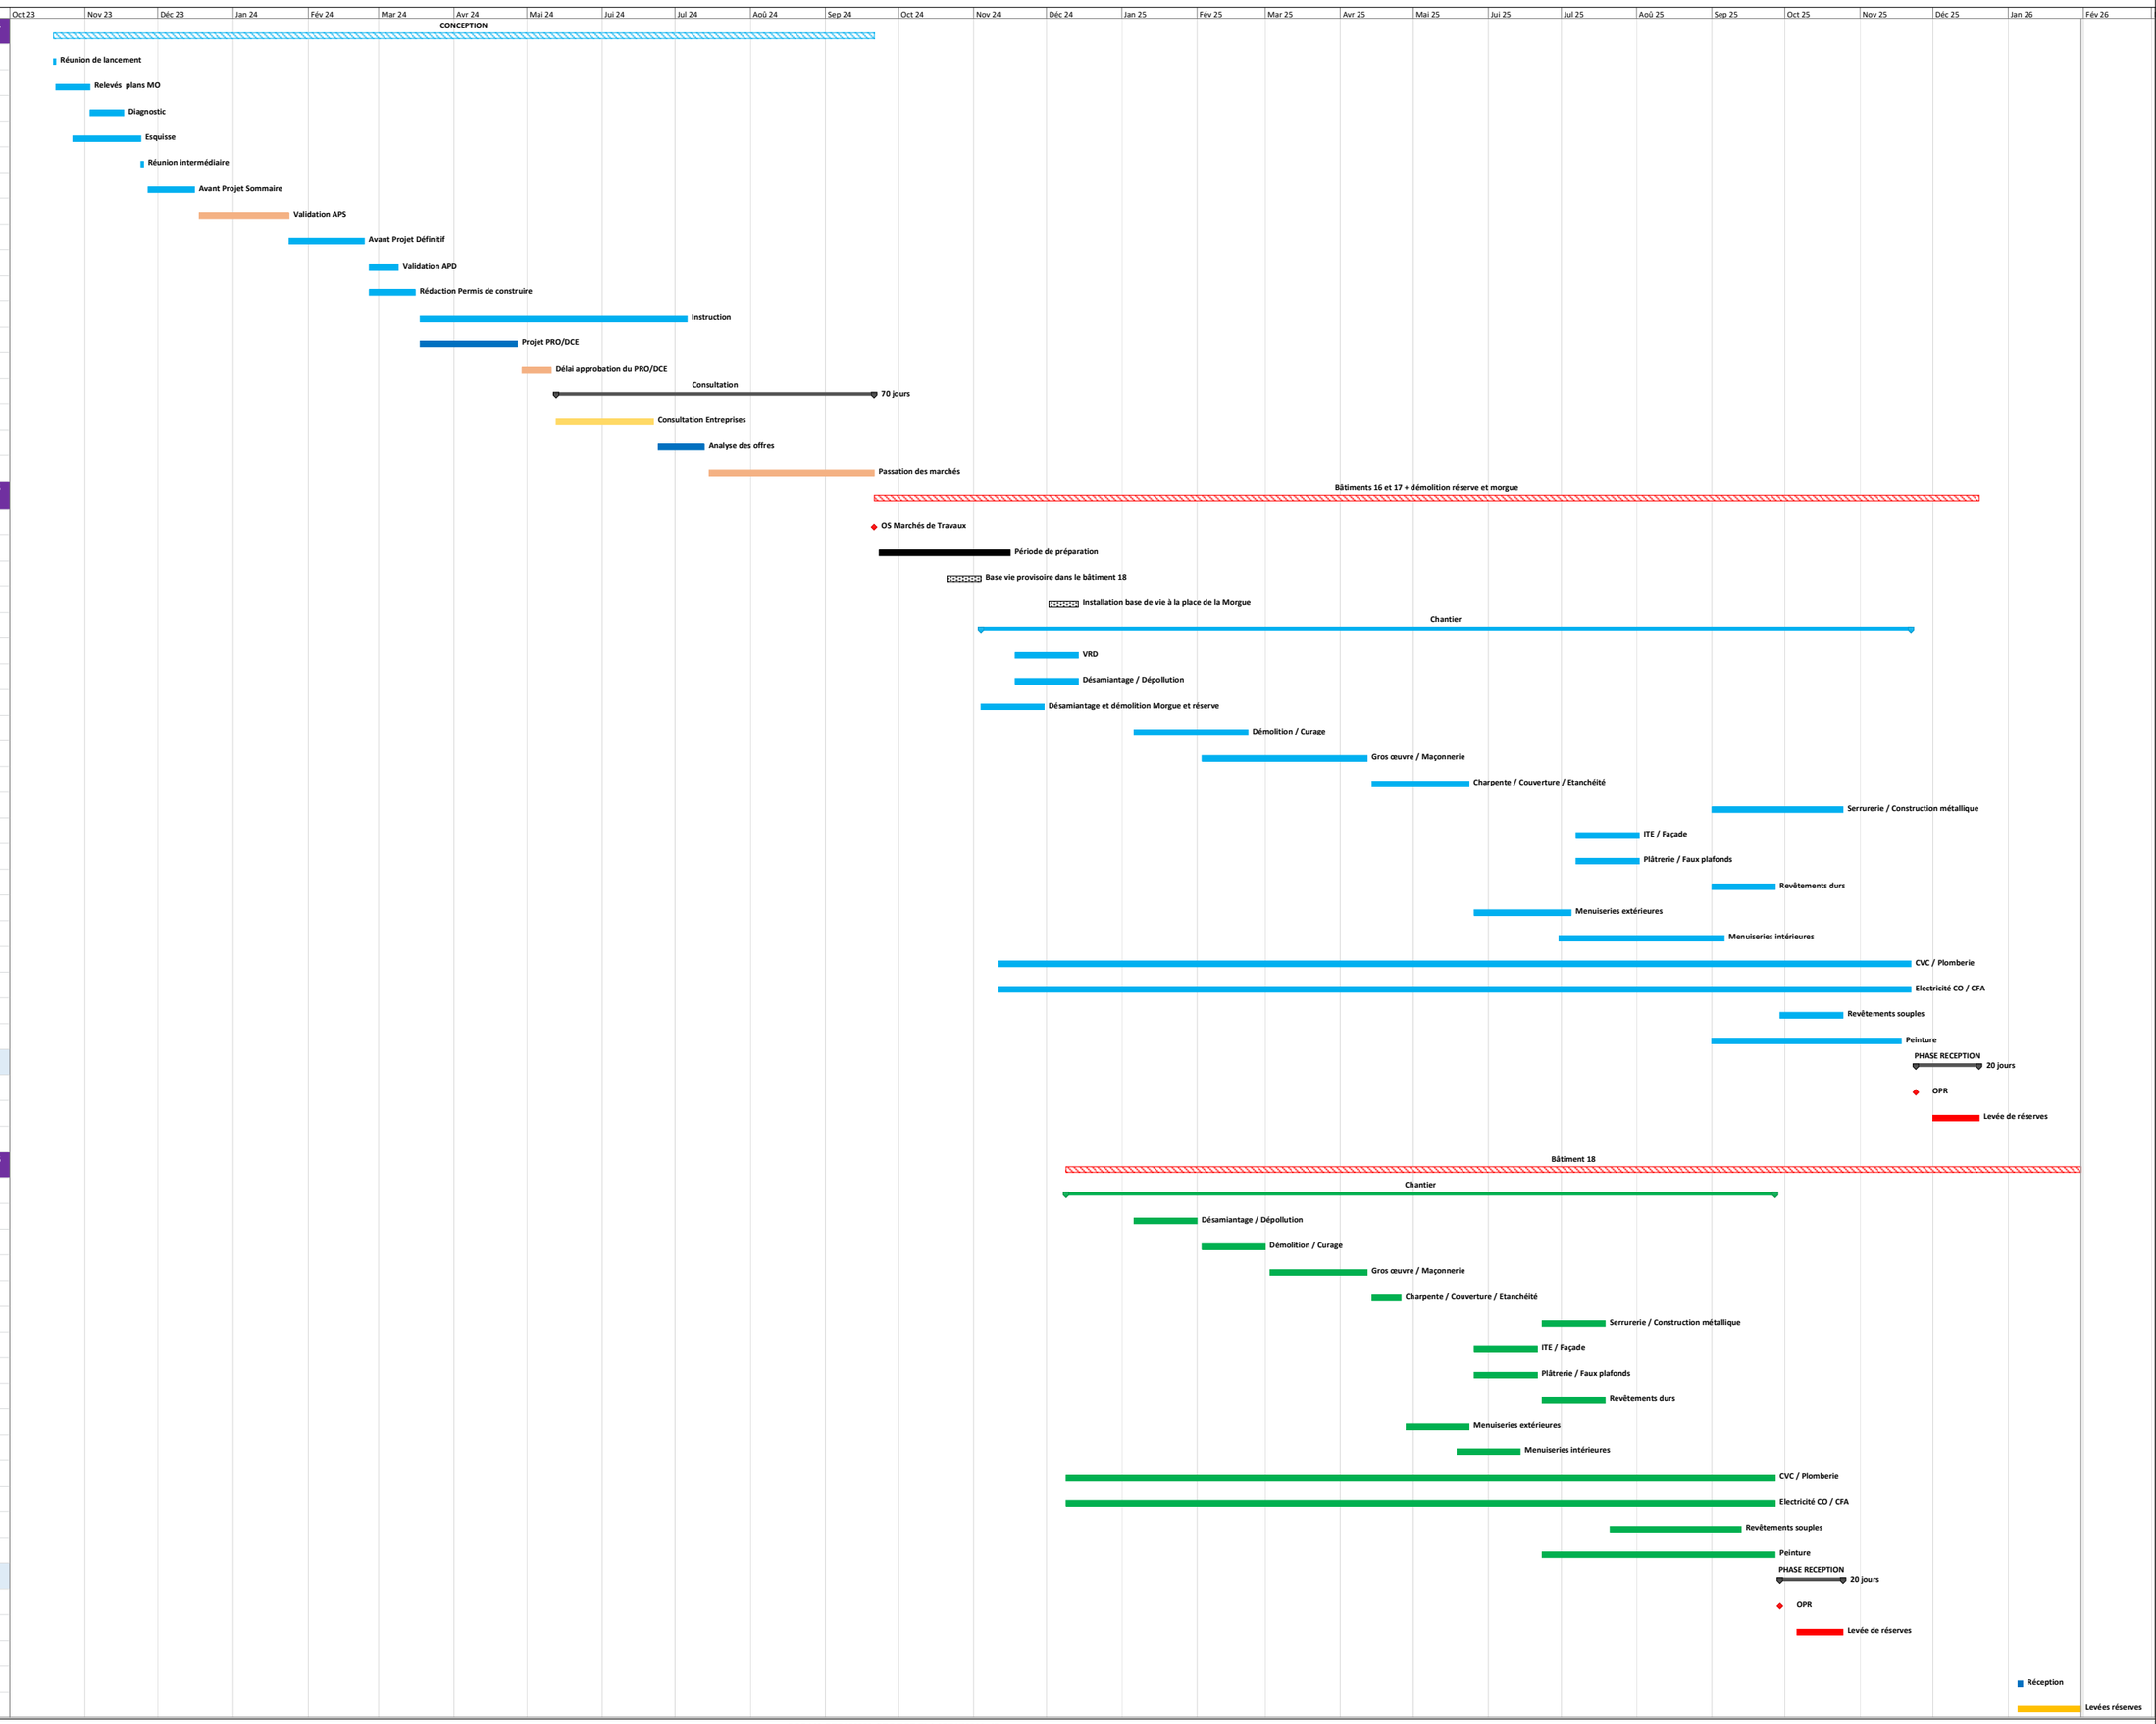N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**CONCEPTION**	**211 jours**	**Jeu 19/10/23**	**Ven 20/09/24**
2	Réunion de lancement	1 jour	Jeu 19/10/23	Jeu 19/10/23
3	Relevés plans MO	2 sm	Ven 20/10/23	Jeu 02/11/23
4	Diagnostic	2 sm	Ven 03/11/23	Jeu 16/11/23
5	Esquisse	4 sm	Ven 27/10/23	Jeu 23/11/23
6	Réunion intermédiaire	1 jour	Ven 24/11/23	Ven 24/11/23
7	Avant Projet Sommaire	3 sm	Lun 27/11/23	Ven 15/12/23
8	Validation APS	21 jours	Lun 18/12/23	Mar 23/01/24
9	Avant Projet Définitif	23 jours	Mer 24/01/24	Ven 23/02/24
10	Validation APD	2 sm	Lun 26/02/24	Ven 08/03/24
11	Rédaction Permis de construire	3 sm	Lun 26/02/24	Ven 15/03/24
12	Instruction	4 mois	Lun 18/03/24	Ven 05/07/24
13	Projet PRO/DCE	6 sm	Lun 18/03/24	Ven 26/04/24
14	Délai approbation du PRO/DCE	2 sm	Lun 29/04/24	Ven 10/05/24
15	**Consultation**	**70 jours**	**Lun 13/05/24**	**Ven 20/09/24**
16	Consultation Entreprises	6 sm	Lun 13/05/24	Ven 21/06/24
17	Analyse des offres	3 sm	Lun 24/06/24	Ven 12/07/24
18	Passation des marchés	5 sm	Lun 15/07/24	Ven 20/09/24
19	**Bâtiments 16 et 17 + démolition réserve et morgue**	**290 jours**	**Ven 20/09/24**	**Ven 19/12/25**
20	OS Marchés de Travaux	0 jour	Ven 20/09/24	Ven 20/09/24
21	Période de préparation	2 mois	Lun 23/09/24	Ven 15/11/24
22	Base vie provisoire dans le bâtiment 18	2 sm	Lun 21/10/24	Lun 04/11/24
23	Installation base de vie à la place de la Morgue	2 sm	Lun 02/12/24	Ven 13/12/24
24	**Chantier**	**240 jours**	**Lun 04/11/24**	**Ven 21/11/25**
25	VRD	20 jours	Lun 18/11/24	Ven 13/12/24
26	Désamiantage / Dépollution	20 jours	Lun 18/11/24	Ven 13/12/24
27	Désamiantage et démolition Morgue et réserve	20 jours	Lun 04/11/24	Ven 29/11/24
28	Démolition / Curage	35 jours	Lun 06/01/25	Ven 21/02/25
29	Gros œuvre / Maçonnerie	50 jours	Lun 03/02/25	Ven 11/04/25
30	Charpente / Couverture / Etanchéité	30 jours	Lun 14/04/25	Ven 23/05/25
31	Serrurerie / Construction métallique	40 jours	Lun 01/09/25	Ven 24/10/25
32	ITE / Façade	20 jours	Lun 07/07/25	Ven 01/08/25
33	Plâtrerie / Faux plafonds	20 jours	Lun 07/07/25	Ven 01/08/25
34	Revêtements durs	20 jours	Lun 01/09/25	Ven 26/09/25
35	Menuiseries extérieures	30 jours	Lun 26/05/25	Ven 04/07/25
36	Menuiseries intérieures	30 jours	Lun 30/06/25	Ven 05/09/25
37	CVC / Plomberie	235 jours	Lun 11/11/24	Ven 21/11/25
38	Electricité CO / CFA	235 jours	Lun 11/11/24	Ven 21/11/25
39	Revêtements souples	20 jours	Lun 29/09/25	Ven 24/10/25
40	Peinture	56 jours	Lun 01/09/25	Lun 17/11/25
41	**PHASE RECEPTION**	**20 jours**	**Lun 24/11/25**	**Ven 19/12/25**
42	OPR	1 sm	Lun 24/11/25	Ven 28/11/25
43	Levée de réserves	15 jours	Lun 01/12/25	Ven 19/12/25
44				
45	**Bâtiment 18**	**255 jours**	**Lun 09/12/24**	**Ven 30/01/26**
46	**Chantier**	**175 jours**	**Lun 09/12/24**	**Ven 26/09/25**
47	Désamiantage / Dépollution	20 jours	Lun 06/01/25	Ven 31/01/25
48	Démolition / Curage	20 jours	Lun 03/02/25	Ven 28/02/25
49	Gros œuvre / Maçonnerie	30 jours	Lun 03/03/25	Ven 11/04/25
50	Charpente / Couverture / Etanchéité	10 jours	Lun 14/04/25	Ven 25/04/25
51	Serrurerie / Construction métallique	20 jours	Lun 23/06/25	Ven 18/07/25
52	ITE / Façade	20 jours	Lun 26/05/25	Ven 20/06/25
53	Plâtrerie / Faux plafonds	20 jours	Lun 26/05/25	Ven 20/06/25
54	Revêtements durs	20 jours	Lun 23/06/25	Ven 18/07/25
55	Menuiseries extérieures	20 jours	Lun 28/04/25	Ven 23/05/25
56	Menuiseries intérieures	20 jours	Lun 19/05/25	Ven 13/06/25
57	CVC / Plomberie	175 jours	Lun 09/12/24	Ven 26/09/25
58	Electricité CO / CFA	175 jours	Lun 09/12/24	Ven 26/09/25
59	Revêtements souples	20 jours	Lun 21/07/25	Ven 12/09/25
60	Peinture	50 jours	Lun 23/06/25	Ven 26/09/25
61	**PHASE RECEPTION**	**20 jours**	**Lun 29/09/25**	**Ven 24/10/25**
62	OPR	1 sm	Lun 29/09/25	Ven 03/10/25
63	Levée de réserves	15 jours	Lun 06/10/25	Ven 24/10/25
64				
65	**Réception**	**2 jours**	**Lun 05/01/26**	**Mar 06/01/26**
66	**Levées réserves**	**4 sm**	**Lun 05/01/26**	**Ven 30/01/26**
