N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**MESSE QUARTIER VALMY OLIVET 45**	437 jours	Mar 03/02/26	Mer 17/11/27
2					
3		**Période de préparation**	43 jours	Mar 03/02/26	Jeu 02/04/26
4					
5		**Lot 01 – Structure / VRD / Enveloppe**	383 jours	Ven 03/04/26	Mar 02/11/27
6					
7		VRD / Terrassements généraux	57 jours	Lun 16/08/27	Mar 02/11/27
8		Désamiantage / Démolition / Curage	44 jours	Ven 03/04/26	Mer 03/06/26
9		Gros-oeuvre	100 jours	Mer 03/06/26	Mar 03/11/26
10		Superstructure	100 jours	Mer 03/06/26	Mar 03/11/26
11		Charpente	50 jours	Lun 12/10/26	Ven 18/12/26
12		Clos et Couvert - Façades	108 jours	Lun 23/11/26	Mer 05/05/27
13		Couverture - Etanchéité	60 jours	Lun 23/11/26	Ven 26/02/27
14		Menuiseries extérieures aluminium	45 jours	Lun 25/01/27	Ven 26/03/27
15		Façades	43 jours	Lun 08/03/27	Mer 05/05/27
16		Serrurerie	25 jours	Lun 08/03/27	Ven 09/04/27
17					
18		**Lot 02 Aménagement intérieur Parachèvement**	168 jours	Lun 01/03/27	Mer 20/10/27
19		Cloisons/Doublages	45 jours	Lun 01/03/27	Ven 30/04/27
20		Menuiseries intérieures bois	45 jours	Lun 12/04/27	Ven 11/06/27
21		Revêtements de sols coulés	45 jours	Lun 19/04/27	Ven 18/06/27
22		Revêtements de sols souples - Faïence	45 jours	Lun 19/04/27	Ven 18/06/27
23		Plafonds suspendus	45 jours	Lun 07/06/27	Ven 06/08/27
24		Peinture - Nettoyage	45 jours	Lun 31/05/27	Ven 30/07/27
25					
26		**Lot 03 - Equipements techniques**	238 jours	Lun 23/11/26	Mer 17/11/27
27		Electricité CFO/CFA	238 jours	Lun 23/11/26	Mer 17/11/27
28		Photovoltaïque	238 jours	Lun 23/11/26	Mer 17/11/27
29		Chauffage Ventilation	238 jours	Lun 23/11/26	Mer 17/11/27
30		Plomberie sanitaires	238 jours	Lun 23/11/26	Mer 17/11/27
31					
32		**Lot 04 - Equipements de cuisine et production**	120 jours	Lun 08/02/27	Ven 23/07/27
33		Froid alimentaire	40 jours	Lun 31/05/27	Ven 23/07/27
34		Cloisons isothermes	40 jours	Lun 05/04/27	Ven 28/05/27
35		Equipements de restauration (Caniveaux et siphons de sol)	40 jours	Lun 08/02/27	Ven 02/04/27
36					
37		**Essais**	10 jours	Mer 20/10/27	Mar 02/11/27
38					
39		**Opérations de réception**	10 jours	Mer 03/11/27	Mar 16/11/27
40					
41		**Réception / Livraison**	1 jour	Mer 17/11/27	Mer 17/11/27
42					
43		**Levées des réserves**	30 jours	Jeu 18/11/27	Mer 29/12/27

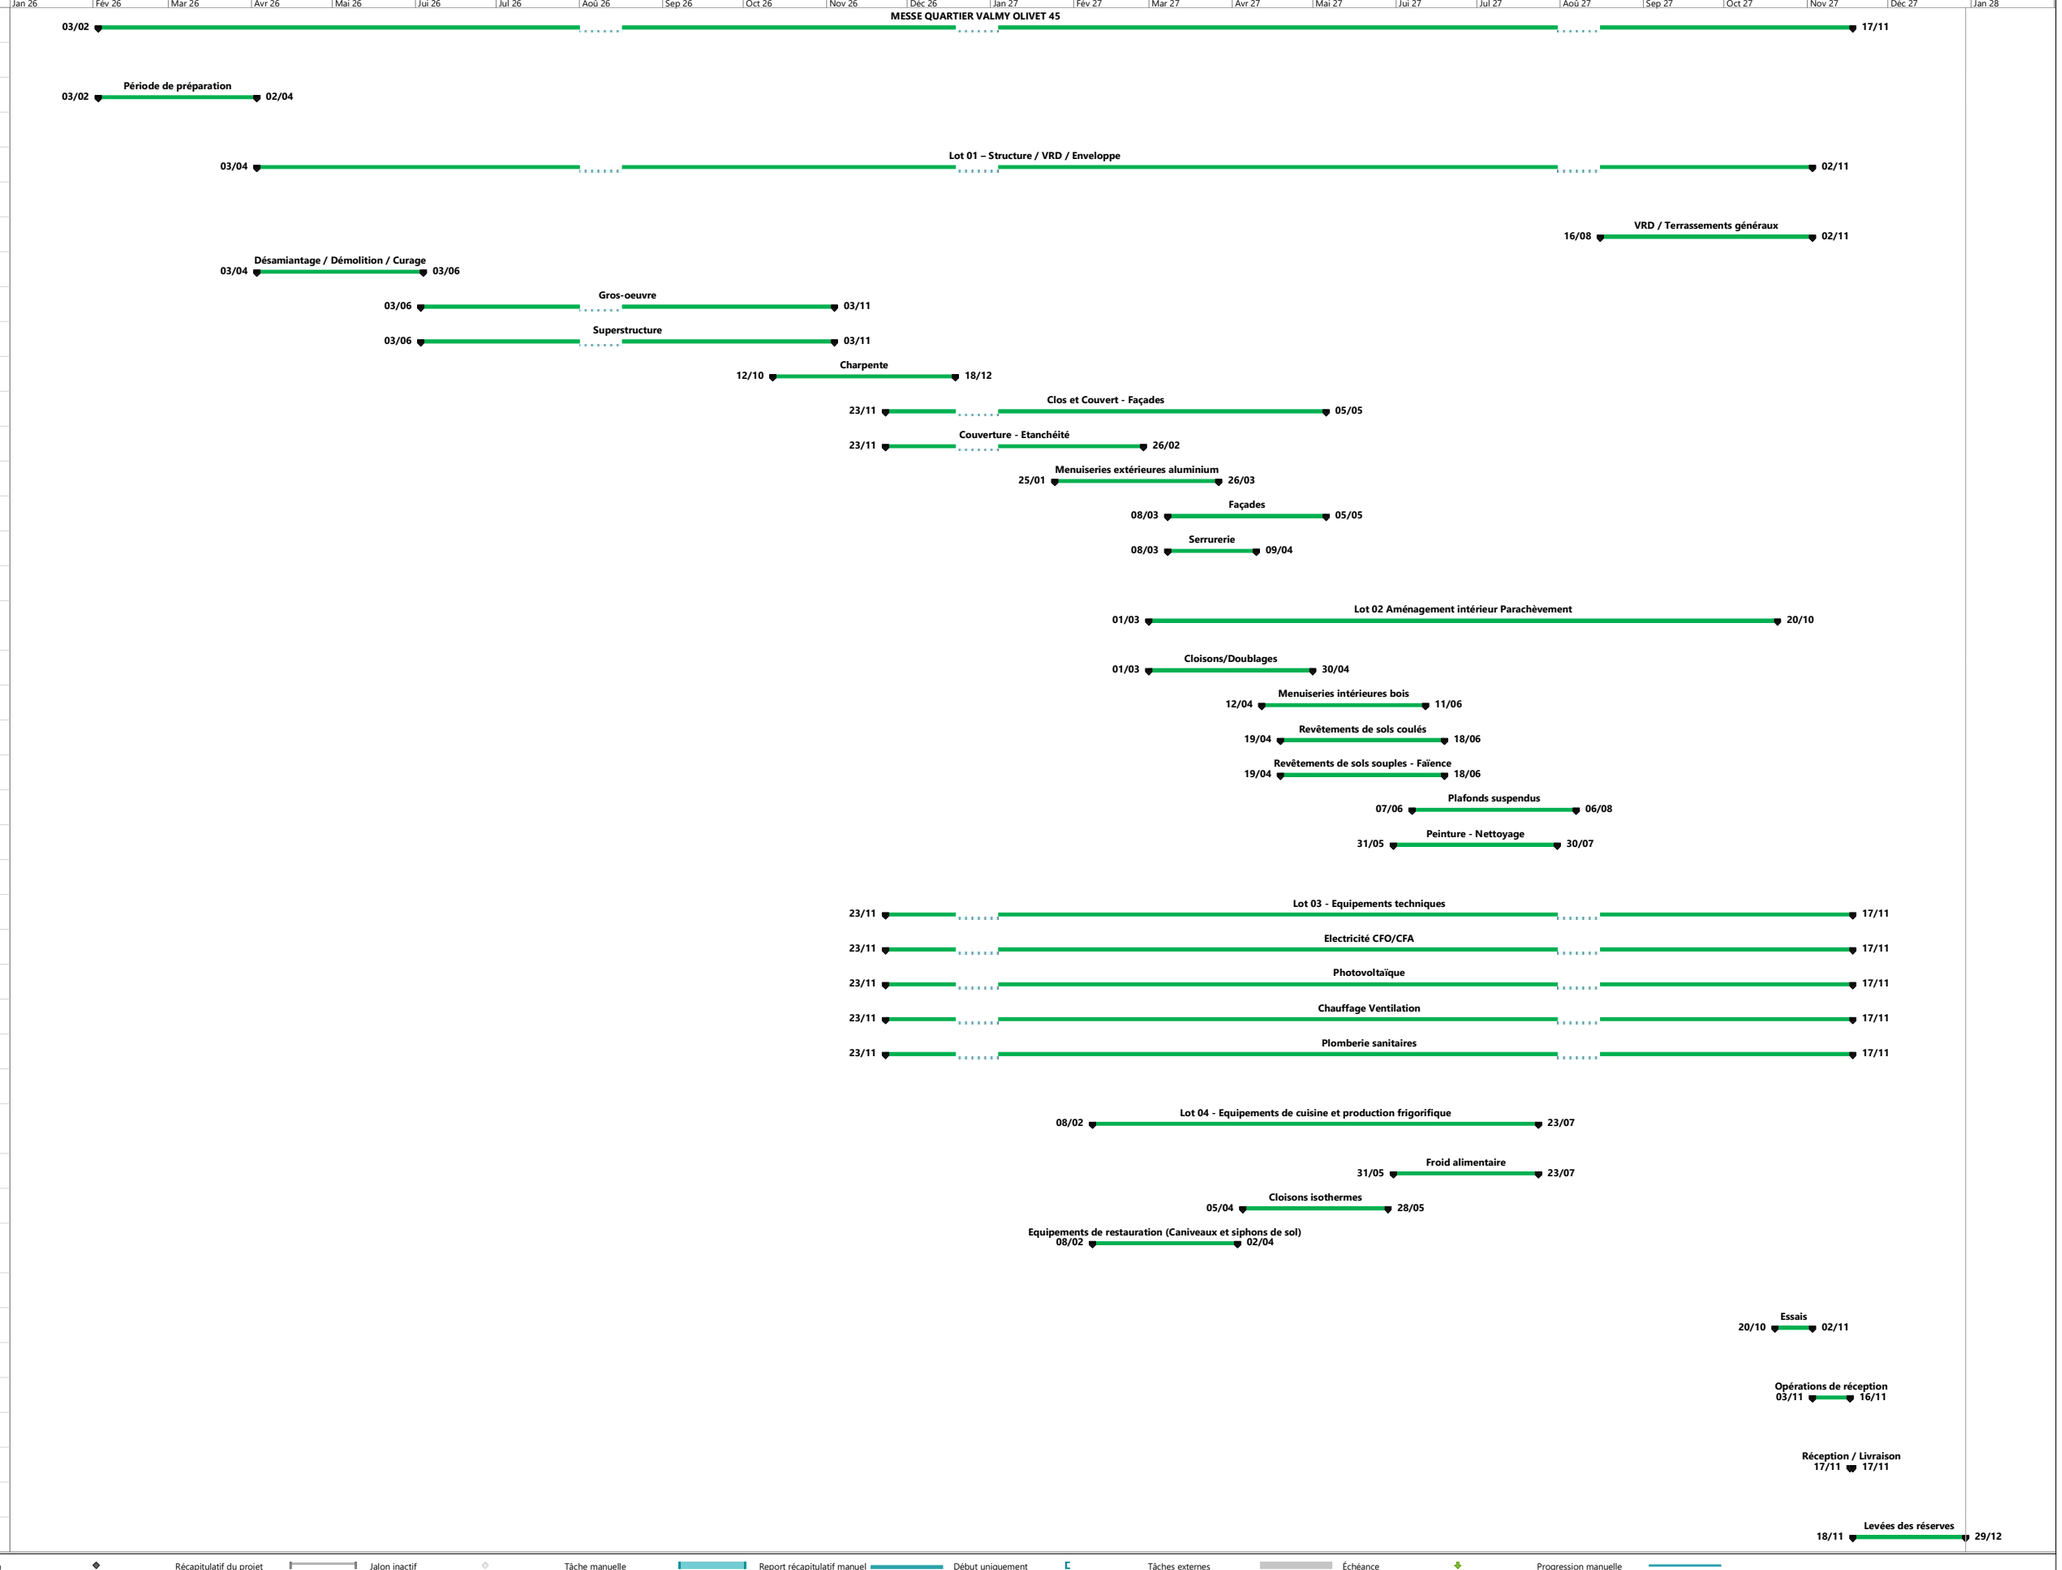

Projet : PLANNING DCE
Date : Mar 06/05/25
Indice 0

Tâche | Jalon | Récapitulatif du projet | Jalon inactif | Tâche manuelle | Report récapitulatif manuel | Début uniquement | Tâches externes | Échéance | Progression manuelle
Fractionnement | Récapitulative | Tâche inactive | Récapitulatif inactif | Durée uniquement | Récapitulatif manuel | Fin uniquement | Jalons externes | Avancement
