l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun
Cantal

TRAVAUX DE RENOVATION POUR LE RAPATRIEMENT DU SERVICE PFSE DE LA CPAM DU CANTAL

Calendrier prévisionel d'exécution
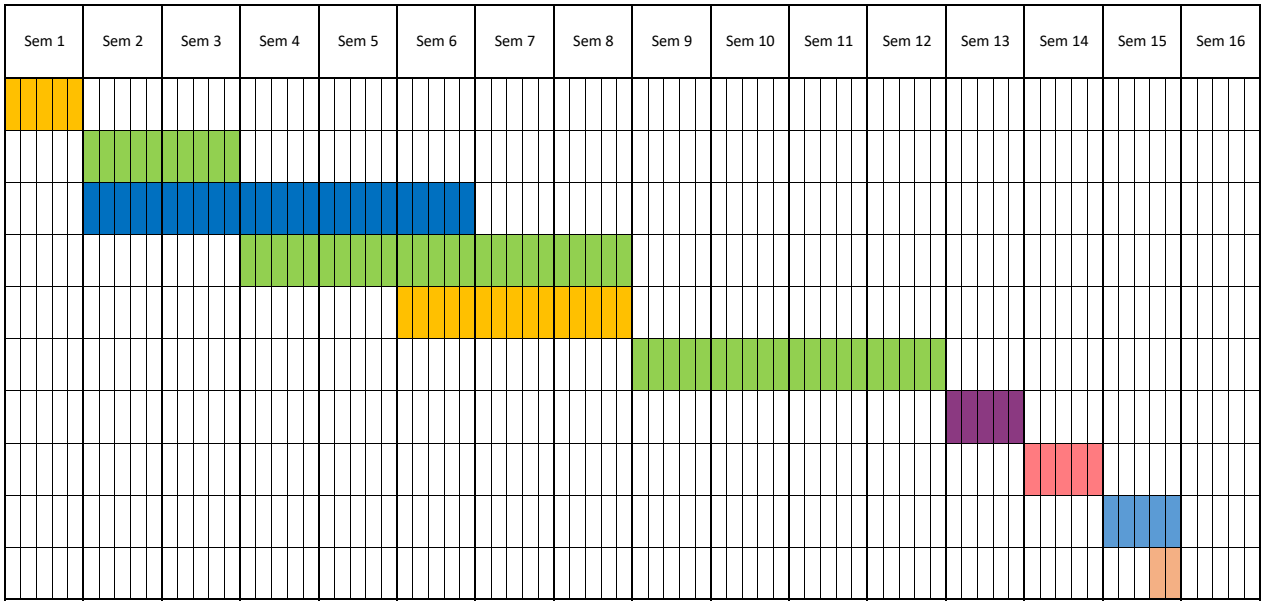
	DOMAINE	Prestation	DUREE ESTIMATIVE DES TRAVAUX
LOT 1	ELECTRICITE / INFORMATIQUE / EQUIPEMENTS RESEAU	Phase 1 : dépose du réseau courant fort et courant faible + luminaire	5 jours
LOT 2	TRAVAUX MUR et SOL	Phase 1 : dépose, démolition du sol et des murs + création de cloisons et portes	10 jours
LOT 3	CLIMATISATION	Mise en place de cassettes de climatisation dans les loacaux désignés	25 jours
LOT 2	TRAVAUX MUR et SOL	Phase 2 : préparation murs et peinture	50 jours
LOT 1	ELECTRICITE / INFORMATIQUE / EQUIPEMENTS RESEAU	Phase 2 : fourniture et pose des nouveaux réseaux courant fort et courat faibles + équipements réseau + luminaires	15 jours
LOT 2	TRAVAUX MUR et SOL	Phase 3 : fourniture et pose des sols + remplacement du faux-plafond	20 jours
LOT 5	STORE	Fourniture et pose de 23 + 8 stores intérieurs + 8 stores extérieurs + réfection des fenêtres	5 jours
LOT 4	ACCOUSTIQUE	Fourniture et pose des équipements accoustiques	2 jours
LOT 6	SANITAIRES	Fourniture et pose de nouveaux équipements sanitaires	5 jours
LOT 7	VITROPHANIE	Fourniture et pose d'une nouvelle vitrophanie vitrophanie	2 jours
