PLANNING PREVISIONNEL
déposes + poses chambres froides PAUI Djibouti
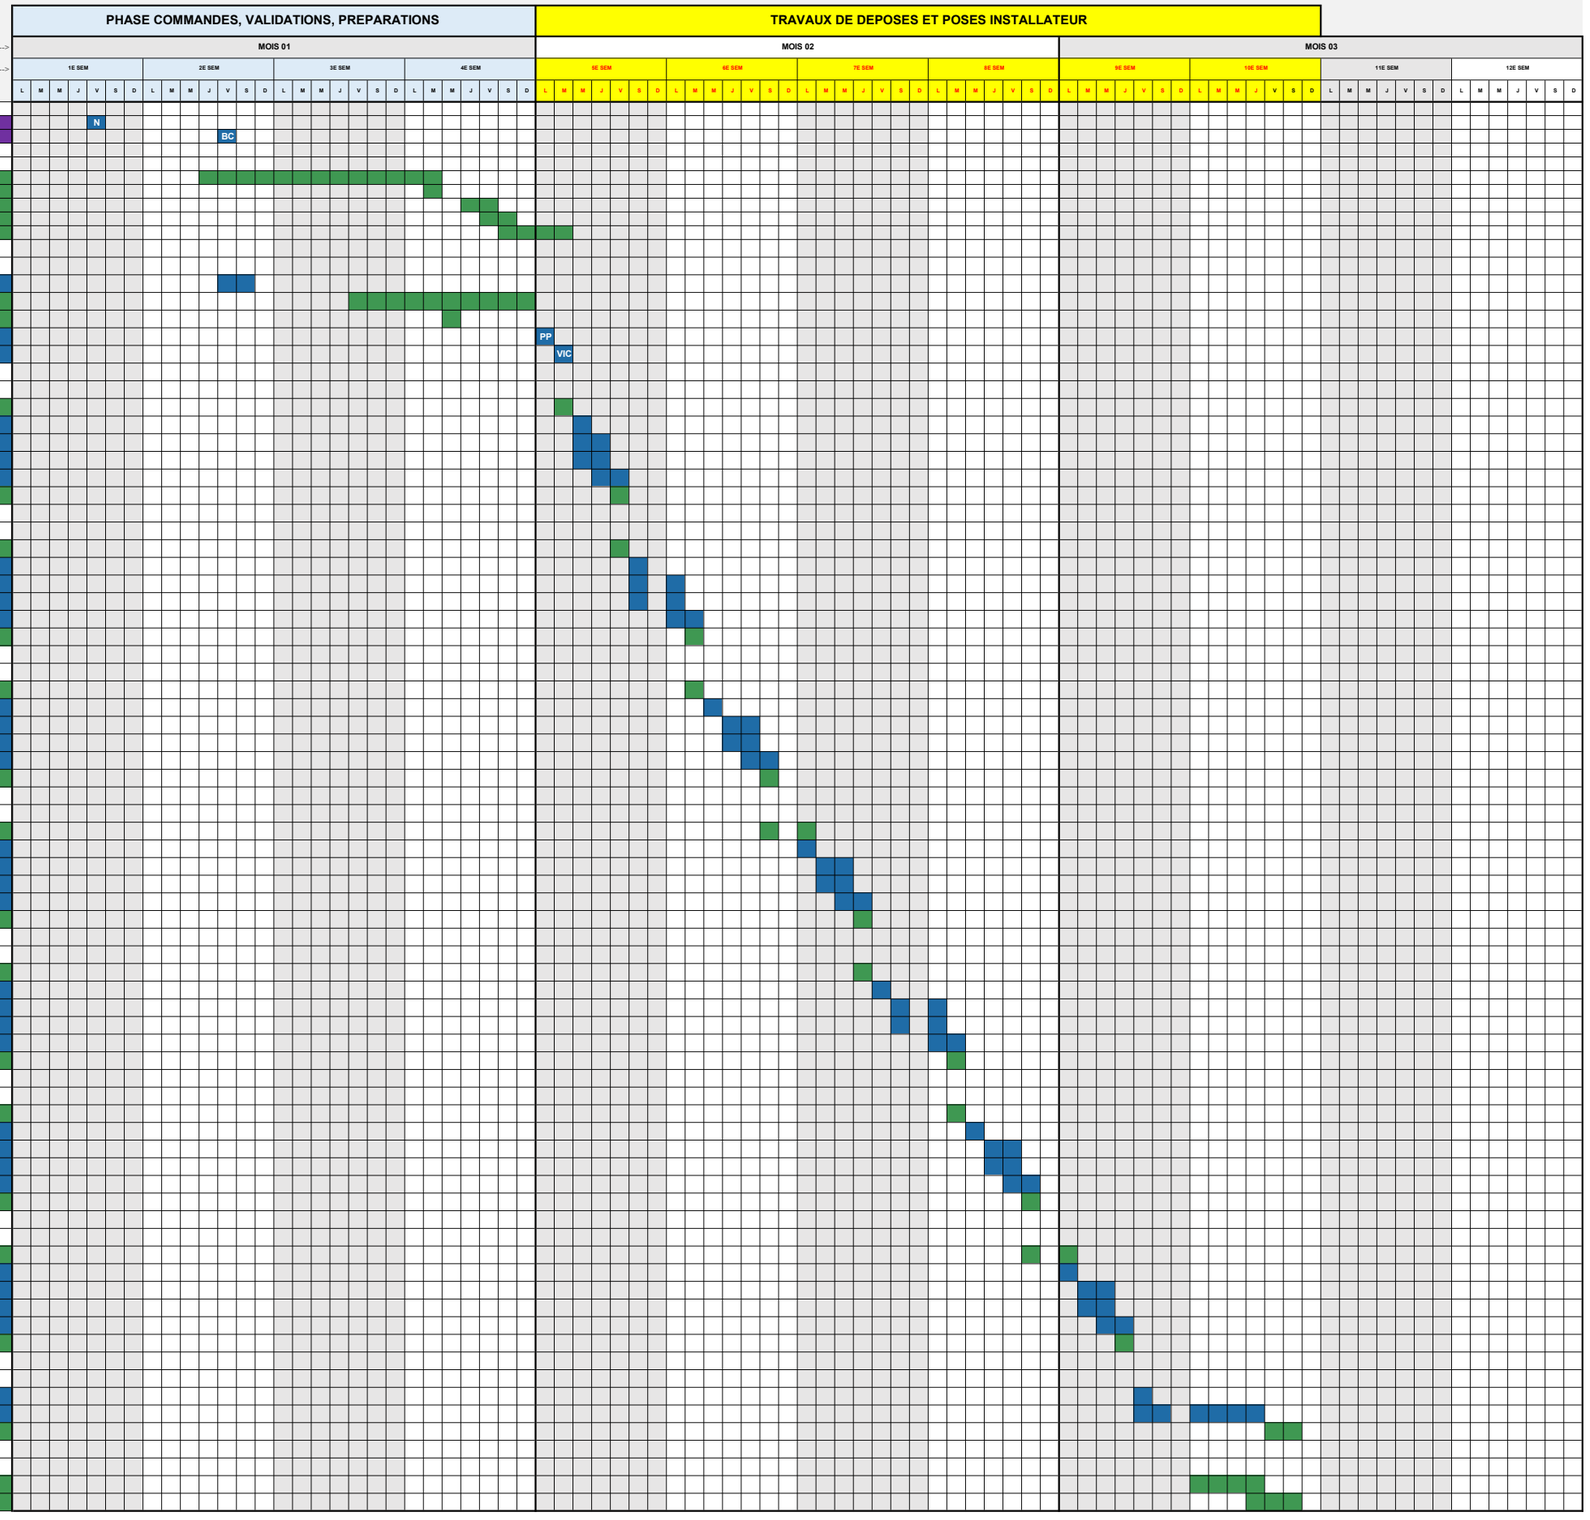
	Tâche	Acteur
1	**Notification/Commandes**	
1.1	Notification du marché	EdA/DA
1.2	Bon de commande EdA / TITULAIRE	EdA/ADV
2	**Travaux préparatoires - Transferts**	Réception des matériels
2.1	Dédouannement et livraison du matériel sur la BA 188	FFDJ
2.2	PV de réception de la commande par les FFDJ	FFDJ
2.3	Créations et ouvertures des accès vers les combles pour appros	FFDJ
2.4	Approvisionnement à pied d'œuvre des nouveaux groupes	FFDJ
2.5	Carottages des nouveaux passages de liaisons éventuels	FFDJ
3	**Autorisations d'accès er sécurités**	Accès et Prévention
3.1	Envois des listes du personnel de l'installateur	TITULAIRE
3.2	Création des autorisations d'accès pour les installateurs	FFDJ
3.3	Remise du plan de prévention FFDJ	FFDJ
3.4	Rédaction PPSPS installateur	TITULAIRE
3.5	VIC visite d'inspection commune FFDJ / Entreprise	FFDJ / TITULAIRE
4	**Déposes, reposes, installation des groupes frigorifique N°1**	Travaux chambre froide 1
4.1	Vidage de la chambre froide N°1	FFDJ
4.2	Dépose groupe froid et évaporateur chambre froide N°1	TITULAIRE
4.3	Pose du nouveau groupe et nouvel évaporateur chambre froide N°1	TITULAIRE
4.4	Réglages, contrôles, remise en service chambre froide N°1	TITULAIRE
4.5	Descente en température chambre froide N°1	TITULAIRE
4.6	Remise en service et remplissage chambre froide N°1	FFDJ
5	**Déposes, reposes, installation des groupes frigorifique N°2**	Travaux chambre froide 2
5.1	Vidage de la chambre froide N°2	FFDJ
5.2	Dépose groupe froid et évaporateur chambre froide N°2	TITULAIRE
5.3	Pose du nouveau groupe et nouvel évaporateur chambre froide N°2	TITULAIRE
5.4	Réglages, contrôles, remise en service chambre froide N°2	TITULAIRE
5.5	Descente en température chambre froide N°2	TITULAIRE
5.6	Remise en service et remplissage chambre froide N°2	FFDJ
6	**Déposes, reposes, installation des groupes frigorifique N°3**	Travaux chambre froide 3
6.1	Vidage de la chambre froide N°3	FFDJ
6.2	Dépose groupe froid et évaporateur chambre froide N°3	TITULAIRE
6.3	Pose du nouveau groupe et nouvel évaporateur chambre froide N°3	TITULAIRE
6.4	Réglages, contrôles, remise en service chambre froide N°3	TITULAIRE
6.5	Descente en température chambre froide N°3	TITULAIRE
6.6	Remise en service et remplissage chambre froide N°3	FFDJ
7	**Déposes, reposes, installation des groupes frigorifique N°4**	Travaux chambre froide 4
7.1	Vidage de la chambre froide N°4	FFDJ
7.2	Dépose groupe froid et évaporateur chambre froide N°4	TITULAIRE
7.3	Pose du nouveau groupe et nouvel évaporateur chambre froide N°4	TITULAIRE
7.4	Réglages, contrôles, remise en service chambre froide N°4	TITULAIRE
7.5	Descente en température chambre froide N°4	TITULAIRE
7.6	Remise en service et remplissage chambre froide N°4	FFDJ
8	**Déposes, reposes, installation des groupes frigorifique N°5**	Travaux chambre froide 5
8.1	Vidage de la chambre froide N°5	FFDJ
8.2	Dépose groupe froid et évaporateur chambre froide N°5	TITULAIRE
8.3	Pose du nouveau groupe et nouvel évaporateur chambre froide N°5	TITULAIRE
8.4	Réglages, contrôles, remise en service chambre froide N°5	TITULAIRE
8.5	Descente en température chambre froide N°5	TITULAIRE
8.6	Remise en service et remplissage chambre froide N°5	FFDJ
9	**Déposes, reposes, installation des groupes frigorifique N°6**	Travaux chambre froide 6
9.1	Vidage de la chambre froide N°6	FFDJ
9.2	Dépose groupe froid et évaporateur chambre froide N°6	TITULAIRE
9.3	Pose du nouveau groupe et nouvel évaporateur chambre froide N°6	TITULAIRE
9.4	Réglages, contrôles, remise en service chambre froide N°6	TITULAIRE
9.5	Descente en température chambre froide N°6	TITULAIRE
9.6	Remise en service et remplissage chambre froide N°6	FFDJ
10	**Déposes, reposes, installation des groupes frigorifique N°7**	Travaux chambre froide 7
10.1	Vidage de la chambre froide N°7	FFDJ
10.2	Dépose groupe froid et évaporateur chambre froide N°7	TITULAIRE
10.3	Pose du nouveau groupe et nouvel évaporateur chambre froide N°7	TITULAIRE
10.4	Réglages, contrôles, remise en service chambre froide N°7	TITULAIRE
10.5	Descente en température chambre froide N°7	TITULAIRE
10.6	Remise en service et remplissage chambre froide N°7	FFDJ
11	**OPR / OPL / RECEPTION / LIVRAISON**	Vérification/admission des prestations
11.1	OPR / Opérations préalables à la réception	TITULAIRE
11.2	Levée des réserves et corrections, réglages, autocontrôles	TITULAIRE
11.3	OPL / Opération préalable à la livraison	FFDJ
12	**EVACUATION / RECONDITIONNEMENT**	Evacuation des matériels déposés
12.1	Manœuvres de levages et enlèvements anciennes installations	FFDJ
12.2	Reconditionnement ou mise au rebut	FFDJ
