PLANNING D'ETUDES N°1 : Travaux TCE (CFP CERET)

AFFAIRE N°1009

CFP CERET
Tel : 04 68 35 81 6 - 06.14.41.09.60
Mail : david.halfort@dgfip.finances.gouv.fr

Créé en date du: 15/09/2025
Edité au : 17/09/2025
Rédacteur : BETFERRER, FERRER Michel, 05 34 51 48 48 - 06 07 71 15 25 - michel.ferrer@betferrer.fr

Légende : *"J" = en jours ouvrés / "Je" = en jours écoulés)*
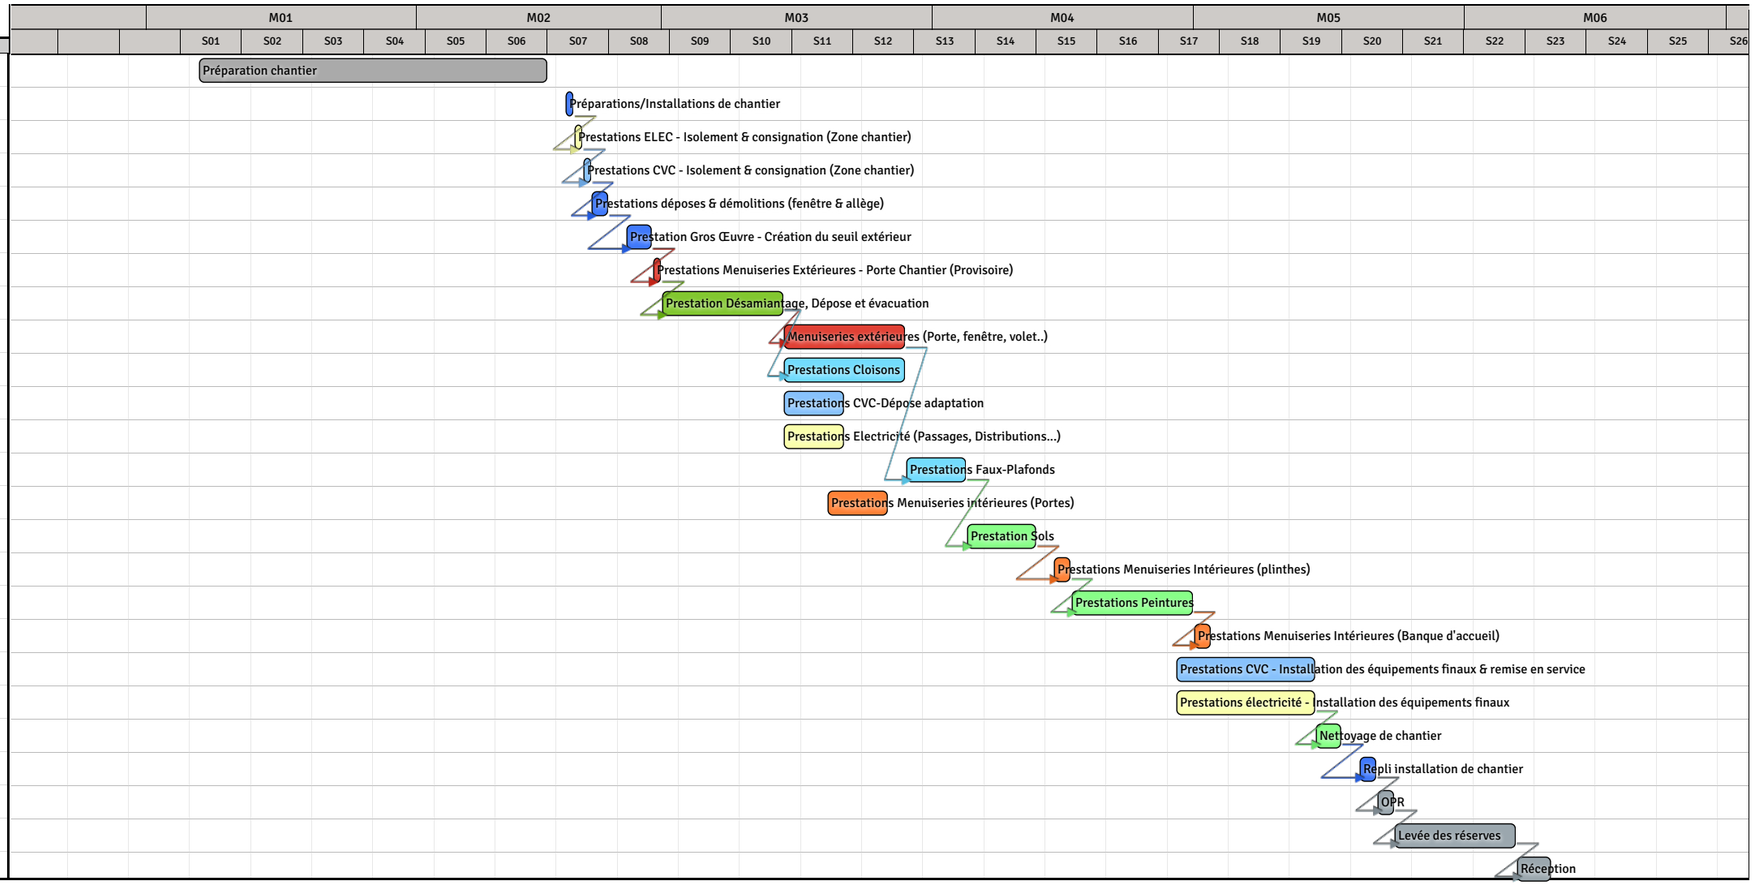
		Début	Fin	Durée	Av.
1	Préparation chantier	+8j	+38j	30J	0%
2	Préparations/Installations de chantier	+38j	+39j	1J	0%
3	Prestations ELEC - Isolement & consignation (Zone chantier)	+39j	+40j	1J	0%
4	Prestations CVC - Isolement & consignation (Zone chantier)	+40j	+41j	1J	0%
5	Prestations déposes & démolitions (fenêtre & allège)	+41j	+43j	2J	0%
6	Prestation Gros Œuvre - Création du seuil extérieur	+43j	+46j	3J	0%
7	Prestations Menuiseries Extérieures - Porte Chantier (Provisoire)	+46j	+47j	1J	0%
8	Prestation Désamiantage, Dépose et évacuation	+47j	+57j	10J	0%
9	Menuiseries extérieures (Porte, fenêtre, volet..)	+57j	+67j	10J	0%
10	Prestations Cloisons	+57j	+67j	10J	0%
11	Prestations CVC-Dépose adaptation	+57j	+62j	5J	0%
12	Prestations Electricité (Passages, Distributions...)	+57j	+62j	5J	0%
13	Prestations Faux-Plafonds	+67j	+72j	5J	0%
14	Prestations Menuiseries intérieures (Portes)	+60j	+65j	5J	0%
15	Prestation Sols	+72j	+77j	5J	0%
16	Prestations Menuiseries Intérieures (plinthes)	+77j	+79j	2J	0%
17	Prestations Peintures	+79j	+89j	10J	0%
18	Prestations Menuiseries Intérieures (Banque d'accueil)	+89j	+91j	2J	0%
19	Prestations CVC - Installation des équipements finaux & remise en service	+87j	+97j	10J	0%
20	Prestations électricité - Installation des équipements finaux	+87j	+97j	10J	0%
21	Nettoyage de chantier	+97j	+99j	2J	0%
22	Repli installation de chantier	+99j	+101j	2J	0%
23	OPR	+101j	+103j	2J	0%
24	Levée des réserves	+103j	+113j	10J	0%
25	Réception	+113j	+115j	2J	0%
