54 - NANCY COUR D'APPEL

HOTEL DES PAGES

Tranche 2

Date de début : 01/03/26
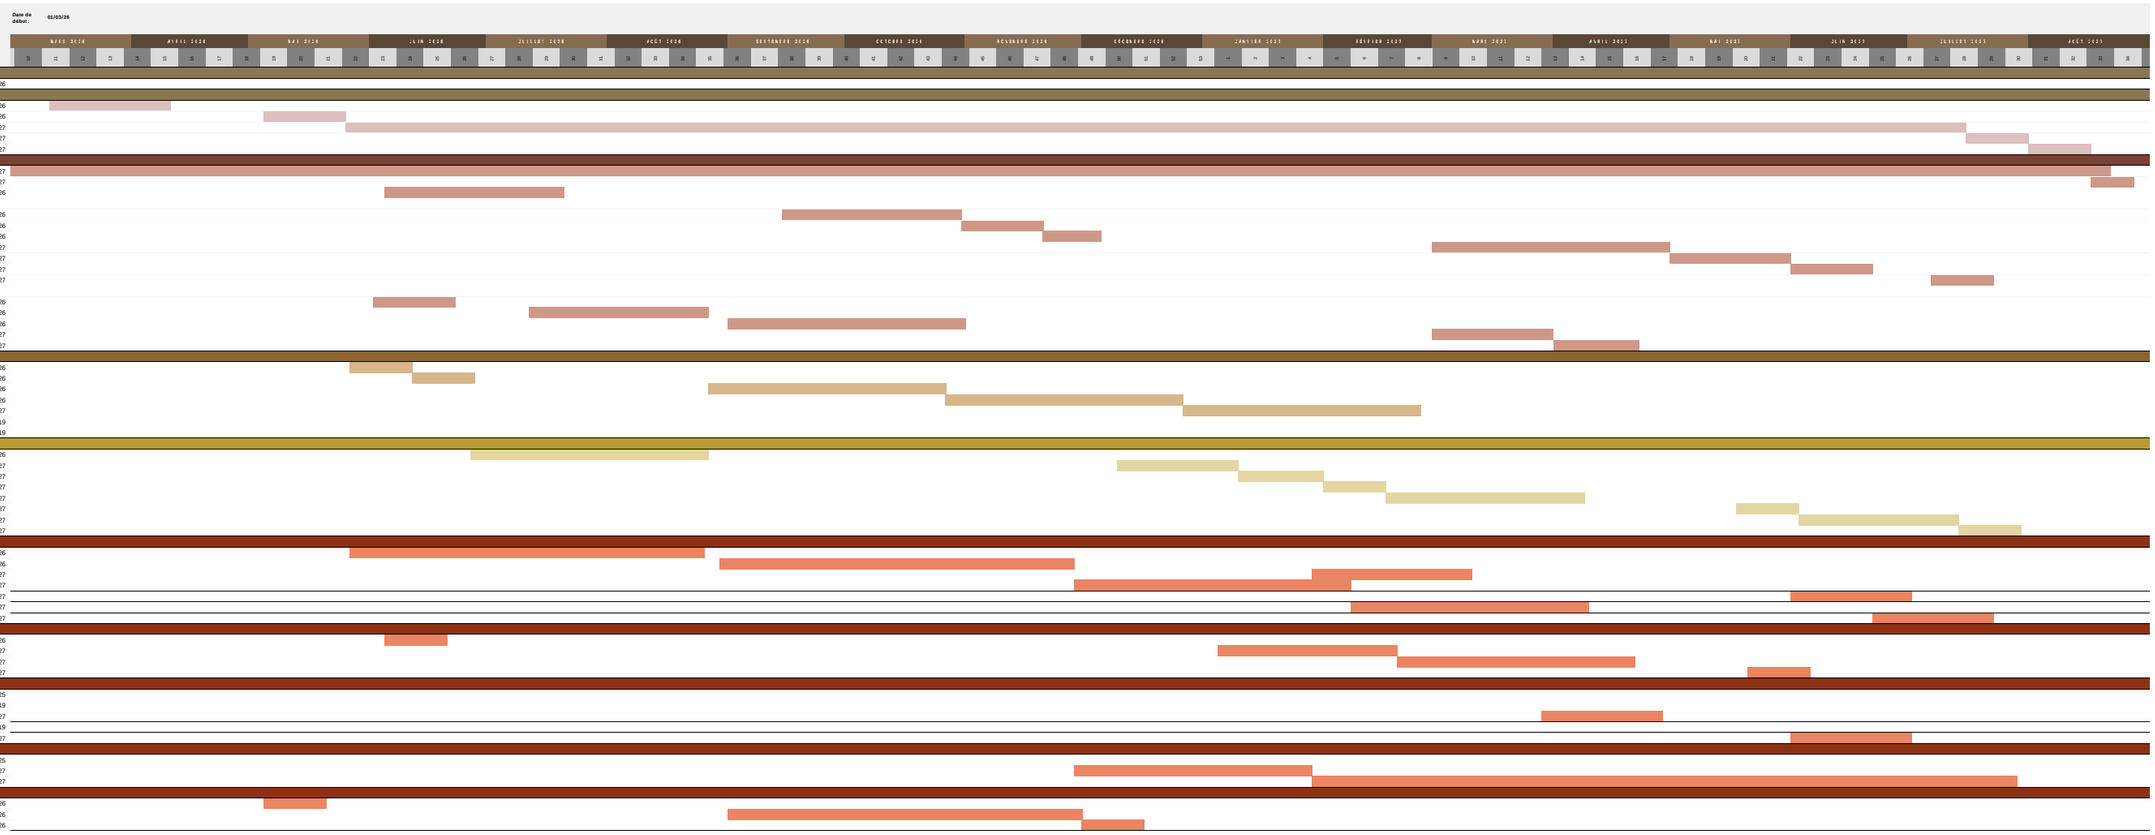
	Début	Fin
PERIODE DE PREPARATION		
Préparation	01/02/2026	28/02/2026
LOT 01 : ECHAFAUDAGE		
Pose échafaudages	11/03/2026	10/04/2026
Pose parapluie	05/05/2026	25/05/2026
Location	26/05/2026	15/07/2027
Dépose prapluie	16/07/2027	31/07/2027
Dépose échafaudage	01/08/2027	16/08/2027
LOT 02 : MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE		
Installation de chantier	01/03/2026	21/08/2027
Remise en état	17/08/2027	27/08/2027
Travaux préparatoires	05/06/2026	20/07/2026
MACONNERIE		
Enduits cour 1 ss couche	15/09/2026	30/10/2026
Enduits cour 2 ss couche	31/10/2026	20/11/2026
Porche	21/11/2026	05/12/2026
Enduits Pépinière	01/03/2027	30/04/2027
Enduit cour 1 finition	01/05/2027	31/05/2027
Enduit cour 2 finition	01/06/2027	21/06/2027
Calfeutrements extérieurs	07/07/2027	22/07/2027
PIERRE DE TAILLE		
Traitement biocide	02/06/2026	22/06/2026
Décapage pierre	12/07/2026	26/08/2026
Purge et pose	01/09/2026	31/10/2026
Rejointoiement	01/03/2027	31/03/2027
Ragréages	01/04/2027	22/04/2027
LOT 03 : CHARPENTE		
Nettoyage comble	27/05/2026	11/06/2026
Traitement	12/06/2026	27/06/2026
Restauration bat D	27/08/2026	26/10/2026
Restauration bat E	27/10/2026	26/12/2026
Restauration bat F	27/12/2026	25/02/2027
Tache 3	17/07/2019	01/08/2019
Tache 3	17/07/2019	01/08/2019
LOT 04 : COUVERTURE		
Découverture	27/06/2026	26/08/2026
Egout bat D	10/12/2026	09/01/2027
Egout bat E	10/01/2027	31/01/2027
Egout bat F	01/02/2027	16/02/2027
Couverture D	17/02/2027	08/04/2027
Couverture E	18/05/2027	02/06/2027
Couverture F	03/06/2027	13/07/2027
DEP	14/07/2027	29/07/2027
LOT 05 : MENUISERIE		
Relevés - études	27/05/2026	25/08/2026
Fabrication Pépinière	30/08/2026	28/11/2026
Pose Pépinière	29/01/2027	10/03/2027
Fabrication cour 1	29/11/2026	07/02/2027
Pose cour 1	01/06/2027	01/07/2027
Fabrication cour 2	08/02/2027	09/04/2027
Pose cour 2	22/06/2027	22/07/2027
LOT 06 : FERRONNERIE		
Dépose	05/06/2026	20/06/2026
Restauration	05/01/2027	19/02/2027
Fabrication	20/02/2027	21/04/2027
Repose	21/05/2027	05/06/2027
LOT 07 : PEINTURE		
Peinture ferronnerie	15/03/2025	30/03/2025
Peinture menuiseries Pep	11/07/2019	26/07/2019
Peinture menuiseries cour1	29/03/2027	28/04/2027
Peinture menuiserie cour 2	17/07/2019	01/08/2019
Tablettes	01/06/2027	01/07/2027
LOT 08 : ELECTRICITE		
Installation de chantier	15/03/2025	30/03/2025
Dépose et consignation	29/11/2026	28/01/2027
installation définitive	29/01/2027	28/07/2027
LOT 09 : CVC		
Dépose	05/05/2026	20/05/2026
Installation	01/09/2026	30/11/2026
Remise en chauffe	01/12/2026	16/12/2026
