007 - VALENCE

SEO

IM2S
Bâtiment Intelligent
1bis Avenue François Adam
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

N°	Mode de Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**Projet SEO VALENCE**	**41 jrs**	**Lun 24/08/26**	**Lun 26/10/26**	
2		**Installation de chantier**	**2 jrs**	**Lun 24/08/26**	**Mar 25/08/26**	
3		Installation de la base vie	1 jr	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	
4		Mise en place des barrières HERAS et protections du chantier	1 jr	Mar 25/08/26	Mar 25/08/26	3
5		**Phase 1**	**35 jrs**	**Mer 26/08/26**	**Mar 20/10/26**	**4**
6		**Démolition**	**4 jrs**	**Mer 26/08/26**	**Lun 31/08/26**	
7		Mise en sécurité électrique de la station	1 jr	Mer 26/08/26	Mer 26/08/26	
8		Nettoyage / Dégazage des cuves et tuyauteries existantes (Mise en sécurité de la station)	3 jrs	Mer 26/08/26	Ven 28/08/26	4
9		Démolition d'îlot	1 jr	Lun 31/08/26	Lun 31/08/26	8
10		**Réservoir**	**18 jrs**	**Lun 31/08/26**	**Mer 23/09/26**	
11		Adéquation de stockage	1 jr	Lun 31/08/26	Lun 31/08/26	8
12		Inspection interne des cuves	5 jrs	Mar 01/09/26	Lun 07/09/26	11
13		Réhaussement des regards de trous d'homme	7 jrs	Mar 08/09/26	Mer 16/09/26	12
14		Reprise peinture et étanchéité des trous d'homme	5 jrs	Jeu 17/09/26	Mer 23/09/26	13
15		Mise en place des équipements des plateaux de trous d'homme	1 jr	Mar 01/09/26	Mar 01/09/26	11
16		**Réseaux**	**6 jrs**	**Jeu 24/09/26**	**Jeu 01/10/26**	
17		Remplacement des SHY	3 jrs	Jeu 24/09/26	Lun 28/09/26	14
18		Mise en place des fourreaux électrique et AEP	2 jrs	Mar 29/09/26	Mer 30/09/26	17
19		Mise en place de la tuyauteries (distributeurs)	1 jr	Jeu 01/10/26	Jeu 01/10/26	18
20		**Distribution et local technique**	**7 jrs**	**Ven 02/10/26**	**Lun 19/10/26**	
21		Pose chaises des distributeur et remontées de tuyauteries	2 jrs	Ven 02/10/26	Lun 05/10/26	19
22		Pose des appareils de distribution et du bulk AdBlue	2 jrs	Mar 06/10/26	Mer 07/10/26	21
23		Déplacement des unités de détection de fuite de l'aire de lavage et tirage des différents câbles	2 jrs	Jeu 08/10/26	Ven 09/10/26	22
24		Réfection d'îlot	1 jr	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26	23
25		**Auvent**	**4 jrs**	**Mar 01/09/26**	**Ven 04/09/26**	
26		Remplacement de l'éclairage	3 jrs	Mar 01/09/26	Jeu 03/09/26	9
27		Mis en place de la signalétique SEO	1 jr	Ven 04/09/26	Ven 04/09/26	26
28		**Travaux voirie**	**1 jr**	**Mar 20/10/26**	**Mar 20/10/26**	
29		Mise en place de la signalisation horizontale et verticale	1 jr	Mar 20/10/26	Mar 20/10/26	24
30		**Tests et essais**	**1 jr**	**Jeu 08/10/26**	**Jeu 08/10/26**	
31		Tests et essais de bon fonctionnement des tuyauteries	1 jr	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26	22
32		Tests et essais de bon fonctionnement électrique	1 jr	Jeu 08/10/26	Jeu 08/10/26	22
33		**Préparation à la réception du chantier**	**1 jr**	**Ven 09/10/26**	**Ven 09/10/26**	
34		Déplacement des clôtures de chantier phase 1 vers phase 2	1 jr	Ven 09/10/26	Ven 09/10/26	32
35		**Phase 2**	**6 jrs**	**Lun 19/10/26**	**Lun 26/10/26**	**4**
36		**Démolition**	**1 jr**	**Lun 19/10/26**	**Lun 19/10/26**	
37		Mise en sécurité électrique de la station	1 jr	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26	34
38		Nettoyage / Dégazage des cuves et tuyauteries existantes (Mise en sécurité de la station)	1 jr	Lun 19/10/26	Lun 19/10/26	34
39		**Réseaux**	**2 jrs**	**Mar 20/10/26**	**Mer 21/10/26**	
40		Ajout dispositif de sécurité sur Satelitte	2 jrs	Mar 20/10/26	Mer 21/10/26	38
41		**Auvent**	**1 jr**	**Jeu 22/10/26**	**Jeu 22/10/26**	
42		Mis en place de la signalétique SEO	1 jr	Jeu 22/10/26	Jeu 22/10/26	40
43		**Travaux voirie**	**1 jr**	**Jeu 22/10/26**	**Jeu 22/10/26**	
44		Mise en place de la signalisation horizontale et verticale	1 jr	Jeu 22/10/26	Jeu 22/10/26	40
45		**Tests et essais**	**1 jr**	**Jeu 22/10/26**	**Jeu 22/10/26**	
46		Tests et essais de bon fonctionnement des tuyauteries	1 jr	Jeu 22/10/26	Jeu 22/10/26	40
47		Tests et essais de bon fonctionnement électrique	1 jr	Jeu 22/10/26	Jeu 22/10/26	40
48		**Préparation à la réception du chantier**	**2 jrs**	**Ven 23/10/26**	**Lun 26/10/26**	
49		Retrait des clôtures de chantier phase 2 et base vie	1 jr	Ven 23/10/26	Ven 23/10/26	47
50		Nettoyage général	1 jr	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26	49

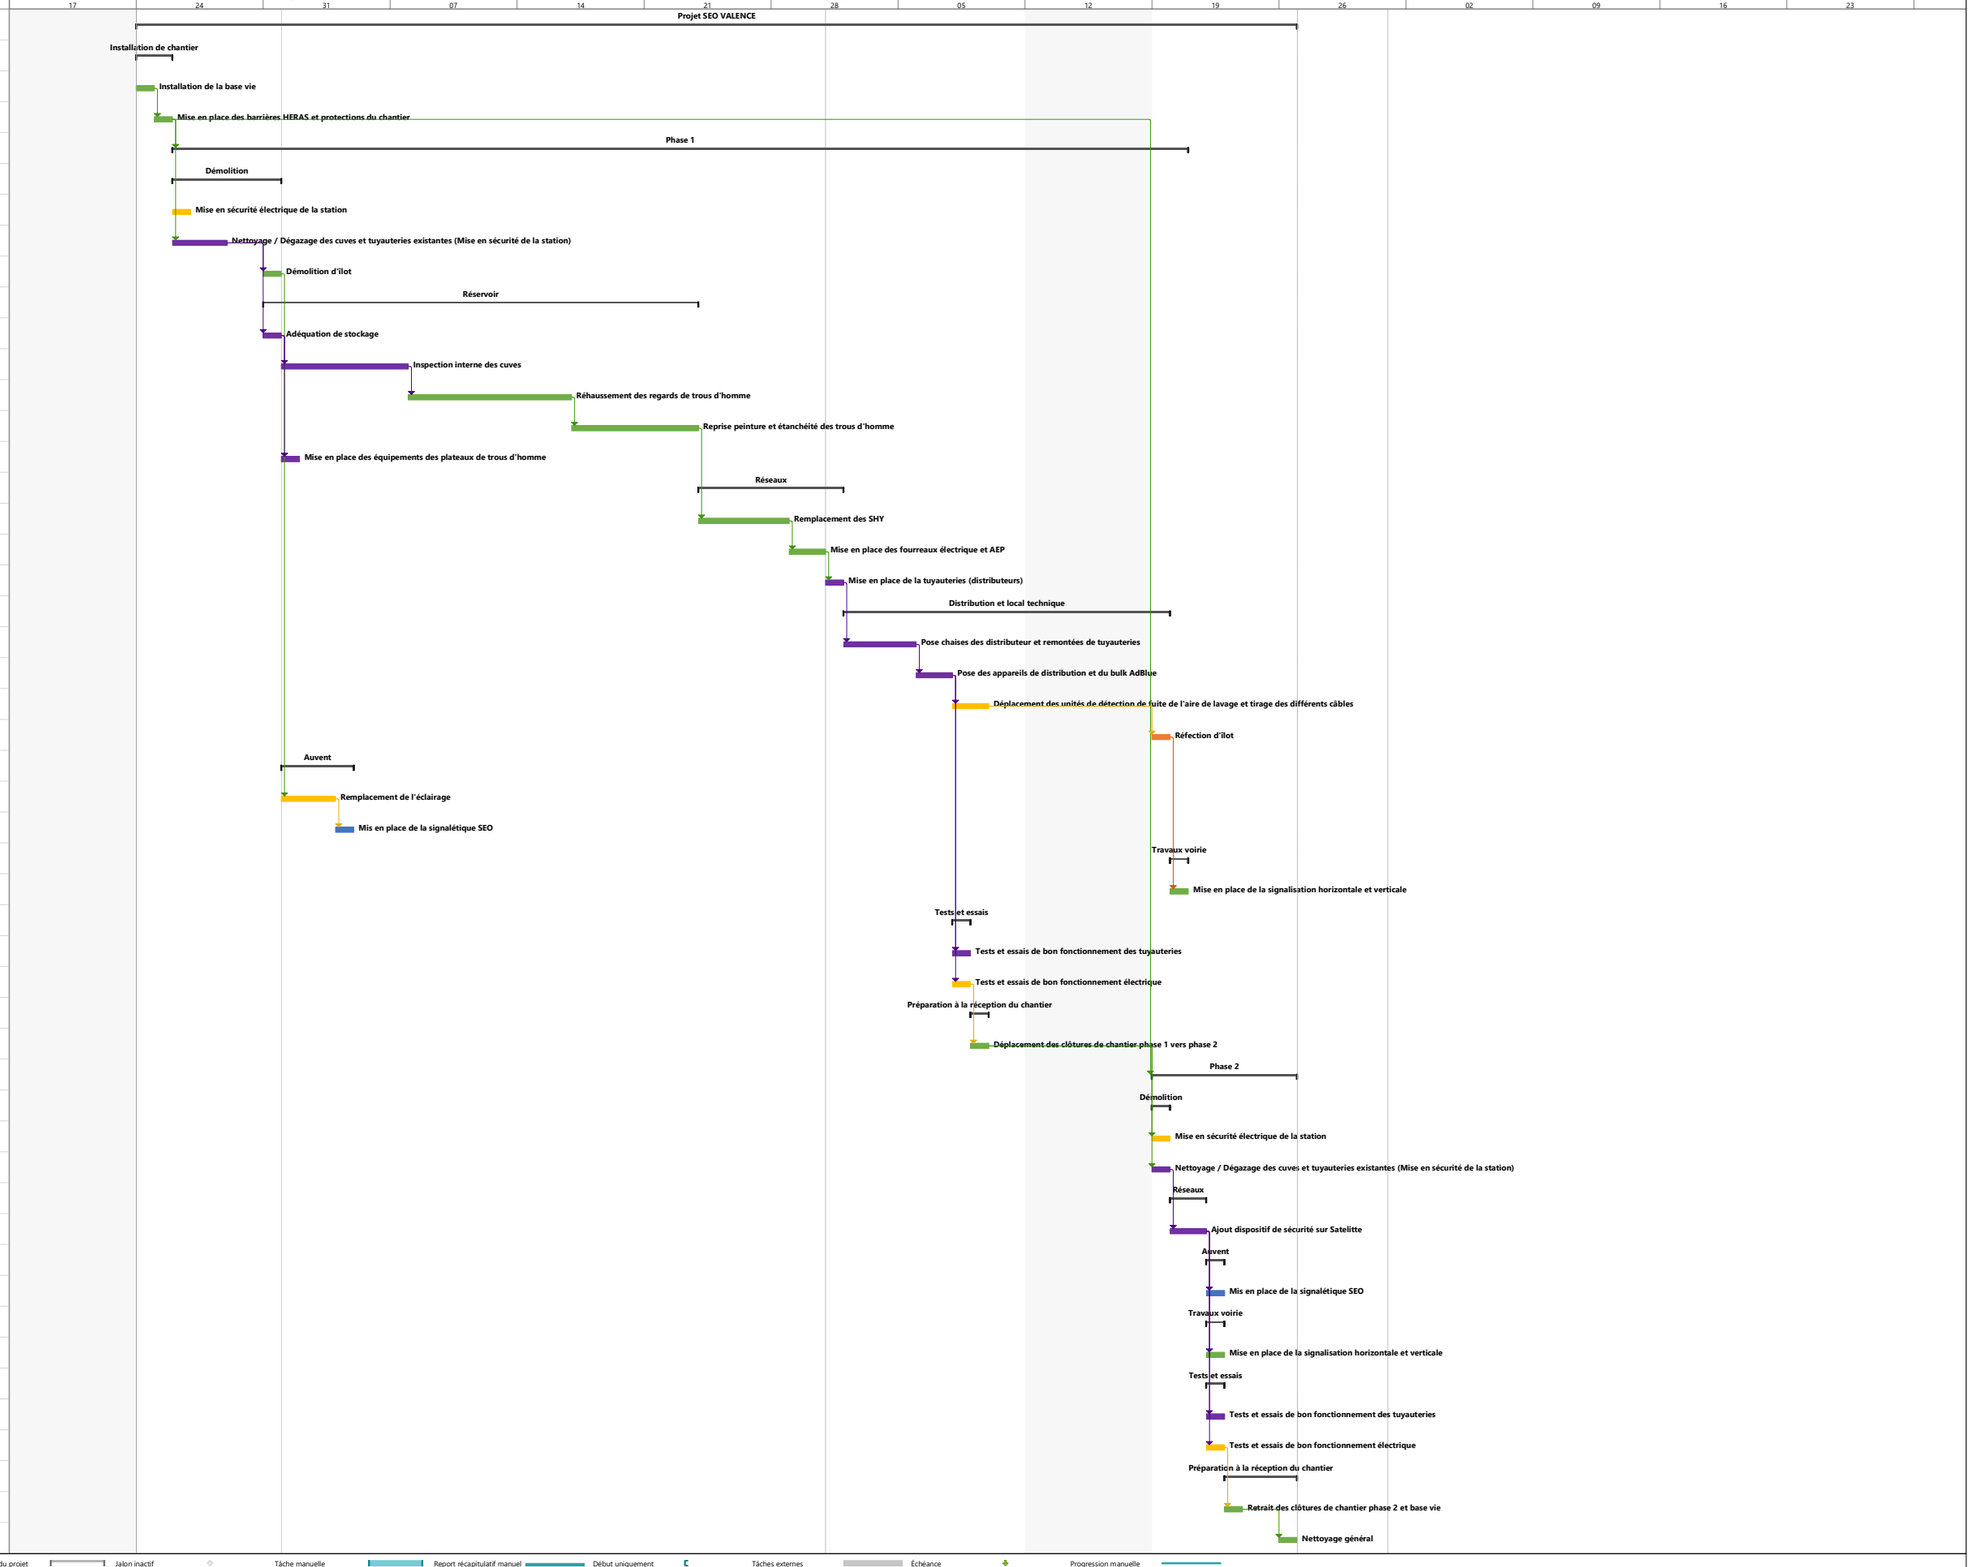

Projet : MsProject - Base
Date : Mer 29/10/25

Tâche · Jalon · Récapitulatif du projet · Jalon inactif · Tâche manuelle · Report récapitulatif manuel · Début uniquement · Tâches externes · Échéance · Progression manuelle
Fractionnement · Récapitulative · Tâche inactive · Récapitulatif inactif · Durée uniquement · Récapitulatif manuel · Fin uniquement · Jalons externes · Avancement
