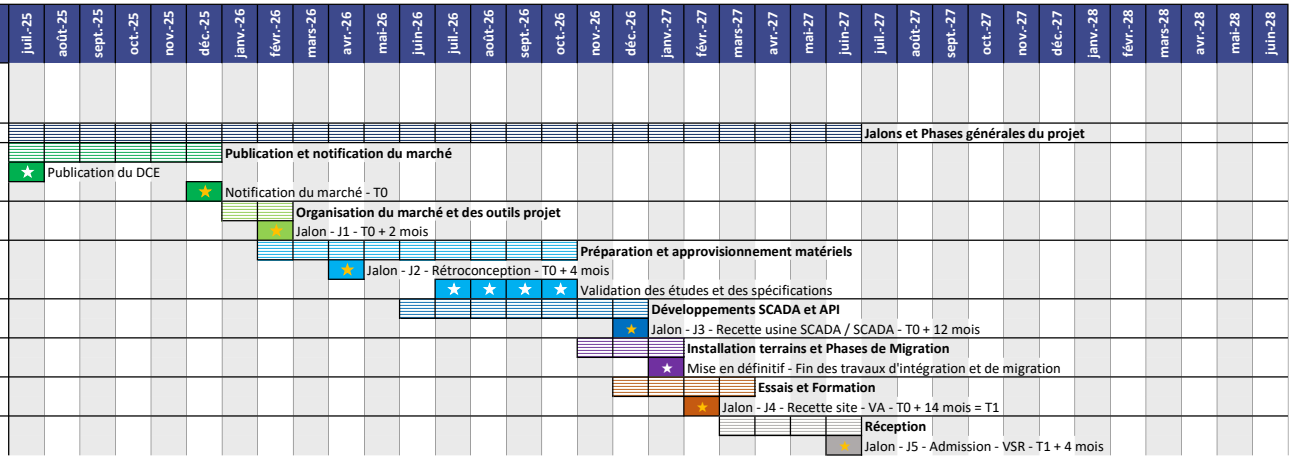Tâches	Début	Délai (mois)	Fin
Planning général RÉNOVATION GTC - CISGT VAUBAN - DIR Est			
Jalons et Phases générales du projet	**01/07/2025**	**24**	**30/06/2027**
Publication et notification du marché	**01/07/2025**	**6**	**31/12/2025**
Publication du DCE	01/07/2025	1	31/07/2025
Notification du marché - T0	01/12/2025	1	31/12/2025
Organisation du marché et des outils projet	**01/01/2026**	**2**	**28/02/2026**
Jalon - J1 - T0 + 2 mois	01/02/2026	1	28/02/2026
Préparation et approvisionnement matériels	**01/02/2026**	**9**	**31/10/2026**
Jalon - J2 - Rétroconception - T0 + 4 mois	01/04/2026	1	30/04/2026
Validation des études et des spécifications	01/07/2026	4	31/10/2026
Développements SCADA et API	**01/06/2026**	**7**	**31/12/2026**
Jalon - J3 - Recette usine SCADA / SCADA - T0 + 12 mois	01/12/2026	1	31/12/2026
Installation terrains et Phases de Migration	**01/11/2026**	**3**	**31/01/2027**
Mise en définitif - Fin des travaux d'intégration et de migration	01/01/2027	1	31/01/2027
Essais et Formation	**01/12/2026**	**4**	**31/03/2027**
Jalon - J4 - Recette site - VA - T0 + 14 mois = T1	01/02/2027	1	28/02/2027
Réception	**01/03/2027**	**4**	**30/06/2027**
Jalon - J5 - Admission - VSR - T1 + 4 mois	01/06/2027	1	30/06/2027
