INSEE TOULOUSE ETANCHEITE - PLANNING PREVISIONNEL DCE
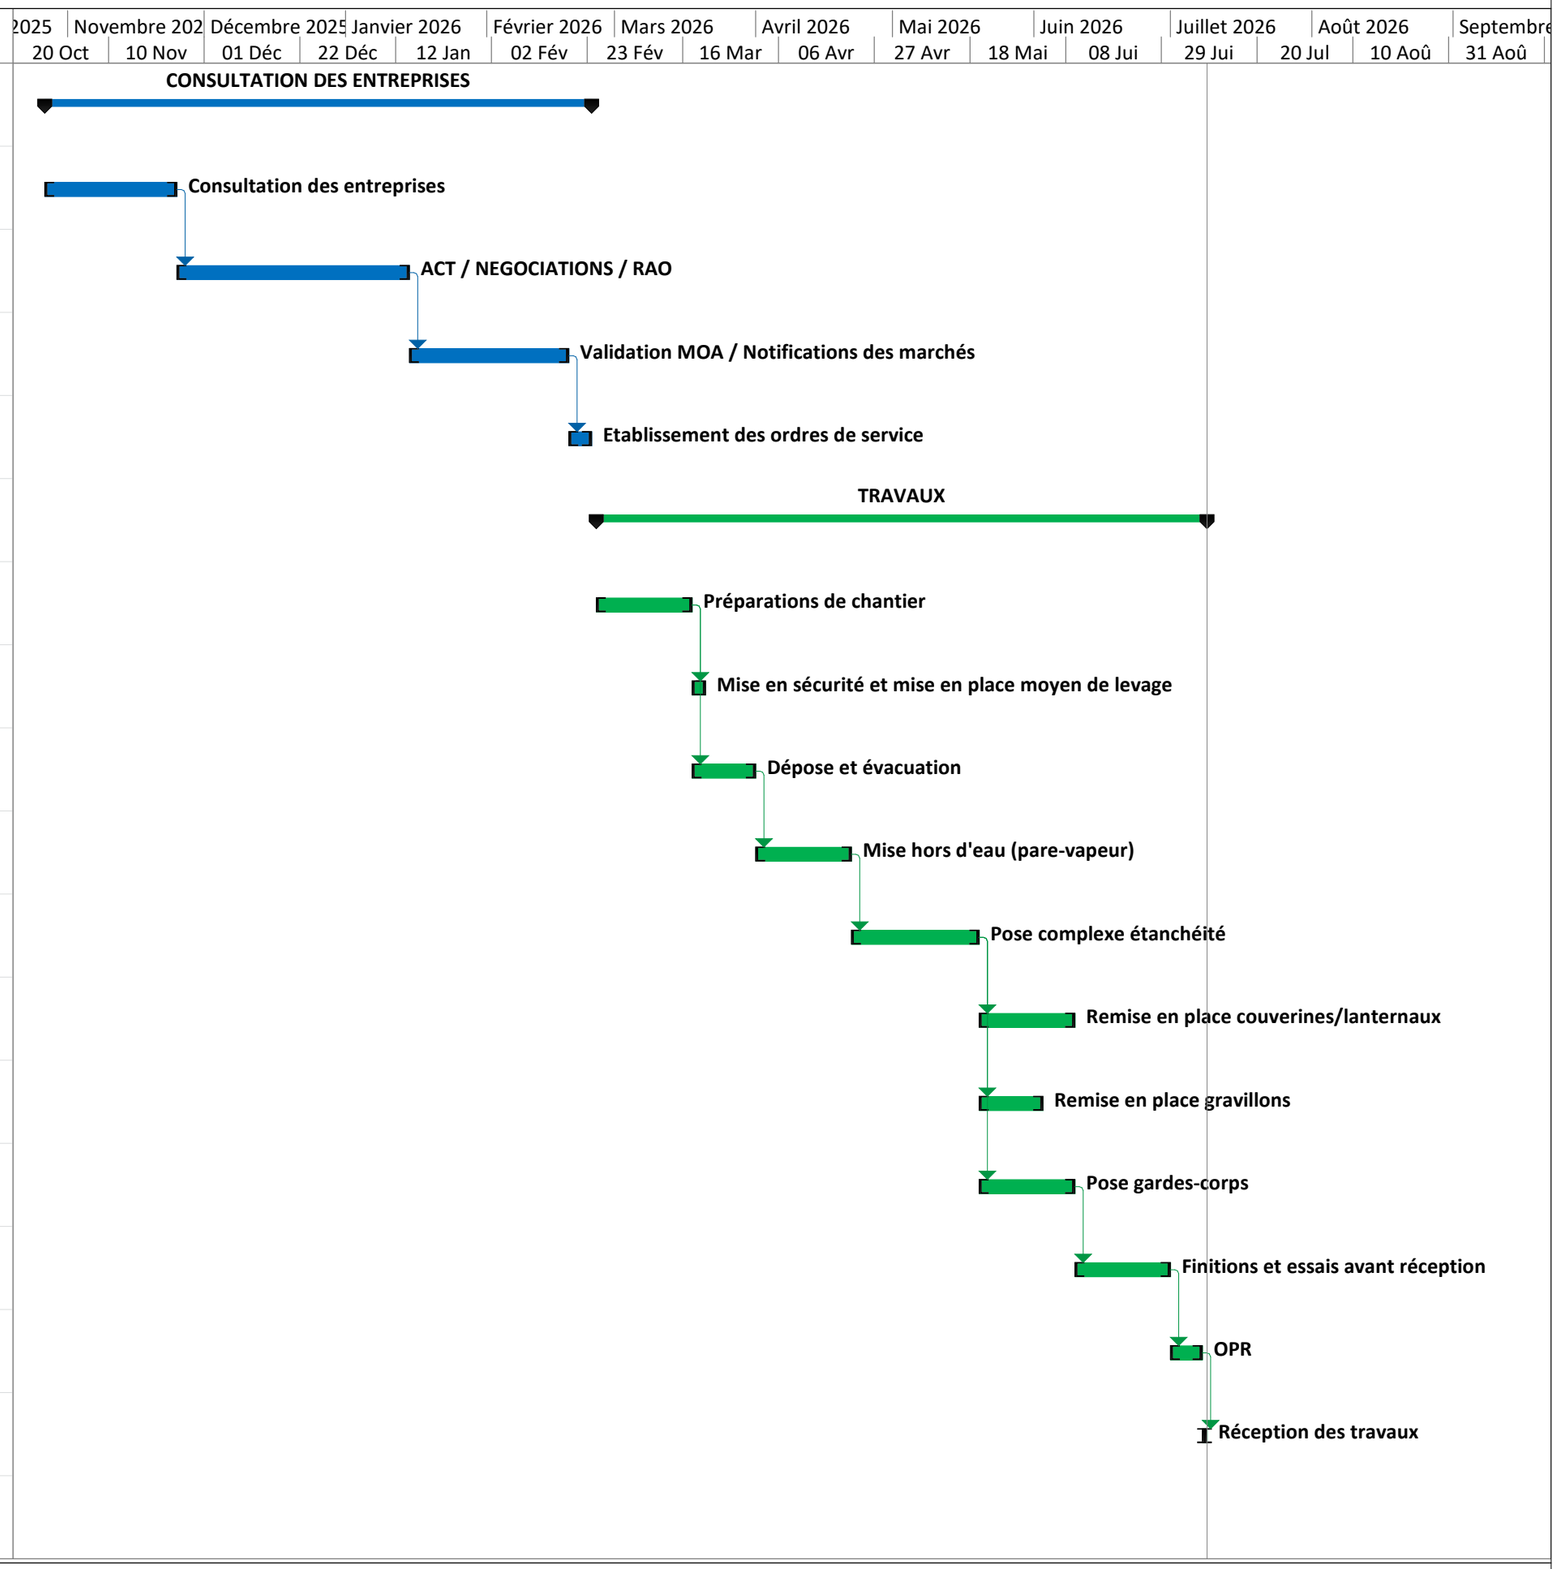
N°	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1	**Lun 27/10/25**	**Lun 23/02/26**	**86 jrs**	**CONSULTATION DES ENTREPRISES**
2	Lun 27/10/25	Lun 24/11/25	21 jrs	Consultation des entreprises
3	Mar 25/11/25	Mer 14/01/26	37 jrs	ACT / NEGOCIATIONS / RAO
4	Jeu 15/01/26	Mer 18/02/26	25 jrs	Validation MOA / Notifications des marchés
5	Jeu 19/02/26	Lun 23/02/26	3 jrs	Etablissement des ordres de service
6	**Mer 25/02/26**	**Mer 08/07/26**	**96 jrs**	**TRAVAUX**
7	Mer 25/02/26	Mar 17/03/26	15 jrs	Préparations de chantier
8	Mer 18/03/26	Ven 20/03/26	3 jrs	Mise en sécurité et mise en place moyen de levage
9	Mer 18/03/26	Mar 31/03/26	10 jrs	Dépose et évacuation
10	Mer 01/04/26	Mar 21/04/26	15 jrs	Mise hors d'eau (pare-vapeur)
11	Mer 22/04/26	Mar 19/05/26	20 jrs	Pose complexe étanchéité
12	Mer 20/05/26	Mar 09/06/26	15 jrs	Remise en place couverines/lanternaux
13	Mer 20/05/26	Mar 02/06/26	10 jrs	Remise en place gravillons
14	Mer 20/05/26	Mar 09/06/26	15 jrs	Pose gardes-corps
15	Mer 10/06/26	Mar 30/06/26	15 jrs	Finitions et essais avant réception
16	Mer 01/07/26	Mar 07/07/26	5 jrs	OPR
17	Mer 08/07/26	Mer 08/07/26	1 jr	Réception des travaux
18
