N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**01 GROS ŒUVRE VRD**	**30 jours**	**Lun 01/12/25**	**Ven 23/01/26**
2	* Préparation	10 jours	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25
3	* Démolitions + dépose intérieure	5 jours	Lun 15/12/25	Ven 19/12/25
4	* Modification allège + création appui béton	2 jours	Lun 05/01/26	Mar 06/01/26
5	* Création des saignées	2 jours	Mer 07/01/26	Jeu 08/01/26
6	* Création dalle + rebouchage	4 jours	Ven 09/01/26	Mer 14/01/26
7	* Création et modification des ouvertures intérieures	5 jours	Jeu 15/01/26	Mer 21/01/26
8	* Retouche d'enduit en façade	2 jours	Jeu 22/01/26	Ven 23/01/26
9				
10	**01 VRD**	**8 jours**	**Lun 06/04/26**	**Mer 15/04/26**
11	* Découpe enrobé existant	1 jour	Lun 06/04/26	Lun 06/04/26
12	* Aménagements VRD	5 jours	Mar 07/04/26	Lun 13/04/26
13	* Engazonnement et plantations	2 jours	Mar 14/04/26	Mer 15/04/26
14				
15	**02 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM**	**42 jours**	**Lun 01/12/25**	**Lun 09/02/26**
16	* Préparation	10 jours	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25
17	* Commandes	30 jours	Lun 15/12/25	Jeu 05/02/26
18	* Pose	2 jours	Ven 06/02/26	Lun 09/02/26
19				
20	**03 ISOLATION - PLÂTRERIE - PEINTURE**	**100 jours**	**Lun 01/12/25**	**Jeu 30/04/26**
21	* Préparation	10 jours	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25
22	* Flocage	2 jours	Jeu 22/01/26	Ven 23/01/26
23	* Cloisons + doublages	10 jours	Sam 24/01/26	Jeu 05/02/26
24	* Enduit cloisons + doublage	10 jours	Ven 06/02/26	Jeu 19/02/26
25	* Faux-plafonds	10 jours	Ven 20/02/26	Jeu 05/03/26
26	* Enduit plafond	10 jours	Ven 06/03/26	Jeu 19/03/26
27	* Peinture tous supports	15 jours	Ven 20/03/26	Jeu 09/04/26
28	* Finitions	5 jours	Ven 10/04/26	Jeu 16/04/26
29	* Nettoyage	1 jour	Jeu 30/04/26	Jeu 30/04/26
30				
31	**04 MENUISERIE INTERIEURE BOIS**	**43 jours**	**Lun 01/12/25**	**Mar 10/02/26**
32	* Préparation	10 jours	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25
33	* Commandes	20 jours	Lun 15/12/25	Ven 23/01/26
34	* Pose des huisseries	3 jours	Ven 06/02/26	Mar 10/02/26
35				
36	**05 REVÊTEMENT DE SOLS DURS - FAÏENCES**	**95 jours**	**Lun 01/12/25**	**Jeu 23/04/26**
37	* Préparation	10 jours	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25
38	* Ragréages	2 jours	Ven 20/03/26	Lun 23/03/26
39	* Réparation des carrelages existants	2 jours	Mar 24/03/26	Mer 25/03/26
40	* Faïences + carrelages	10 jours	Ven 10/04/26	Jeu 23/04/26
41				
42	**06 SERRURERIE**	**52 jours**	**Lun 01/12/25**	**Lun 23/02/26**
43	* Préparation	10 jours	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25
44	* Commandes	20 jours	Lun 15/12/25	Ven 23/01/26
45	* Pose serrurerie extérieure	10 jours	Mar 10/02/26	Lun 23/02/26
46				
47	**07 ELEC**	**92 jours**	**Lun 01/12/25**	**Lun 20/04/26**
48	* Préparation	10 jours	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25
49	* Consignation	1 jour	Lun 15/12/25	Lun 15/12/25
50	* Réseaux	55 jours	Sam 24/01/26	Jeu 09/04/26
51	* Equipements	5 jours	Ven 10/04/26	Jeu 16/04/26
52	* Essais et mise en service	2 jours	Ven 17/04/26	Lun 20/04/26
53				
54	**08 CVPS**	**105 jours**	**Lun 01/12/25**	**Jeu 07/05/26**
55	* Préparation	10 jours	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25
56	* Consignation	2 jours	Lun 15/12/25	Mar 16/12/25
57	* Commandes	30 jours	Lun 15/12/25	Jeu 05/02/26
58	* Réseaux chauffage + plomberie	10 jours	Sam 24/01/26	Jeu 05/02/26
59	* Réseaux ventilation + CTA	44 jours	Ven 06/02/26	Mer 08/04/26
60	* Equipements	2 jours	Ven 24/04/26	Lun 27/04/26
61	* Essais et mise en service	2 jours	Mar 28/04/26	Mer 29/04/26
62				
63	**OPR**	9 jours	Ven 24/04/26	Mer 06/05/26
64	**RECEPTION**	1 jour	Jeu 07/05/26	Jeu 07/05/26

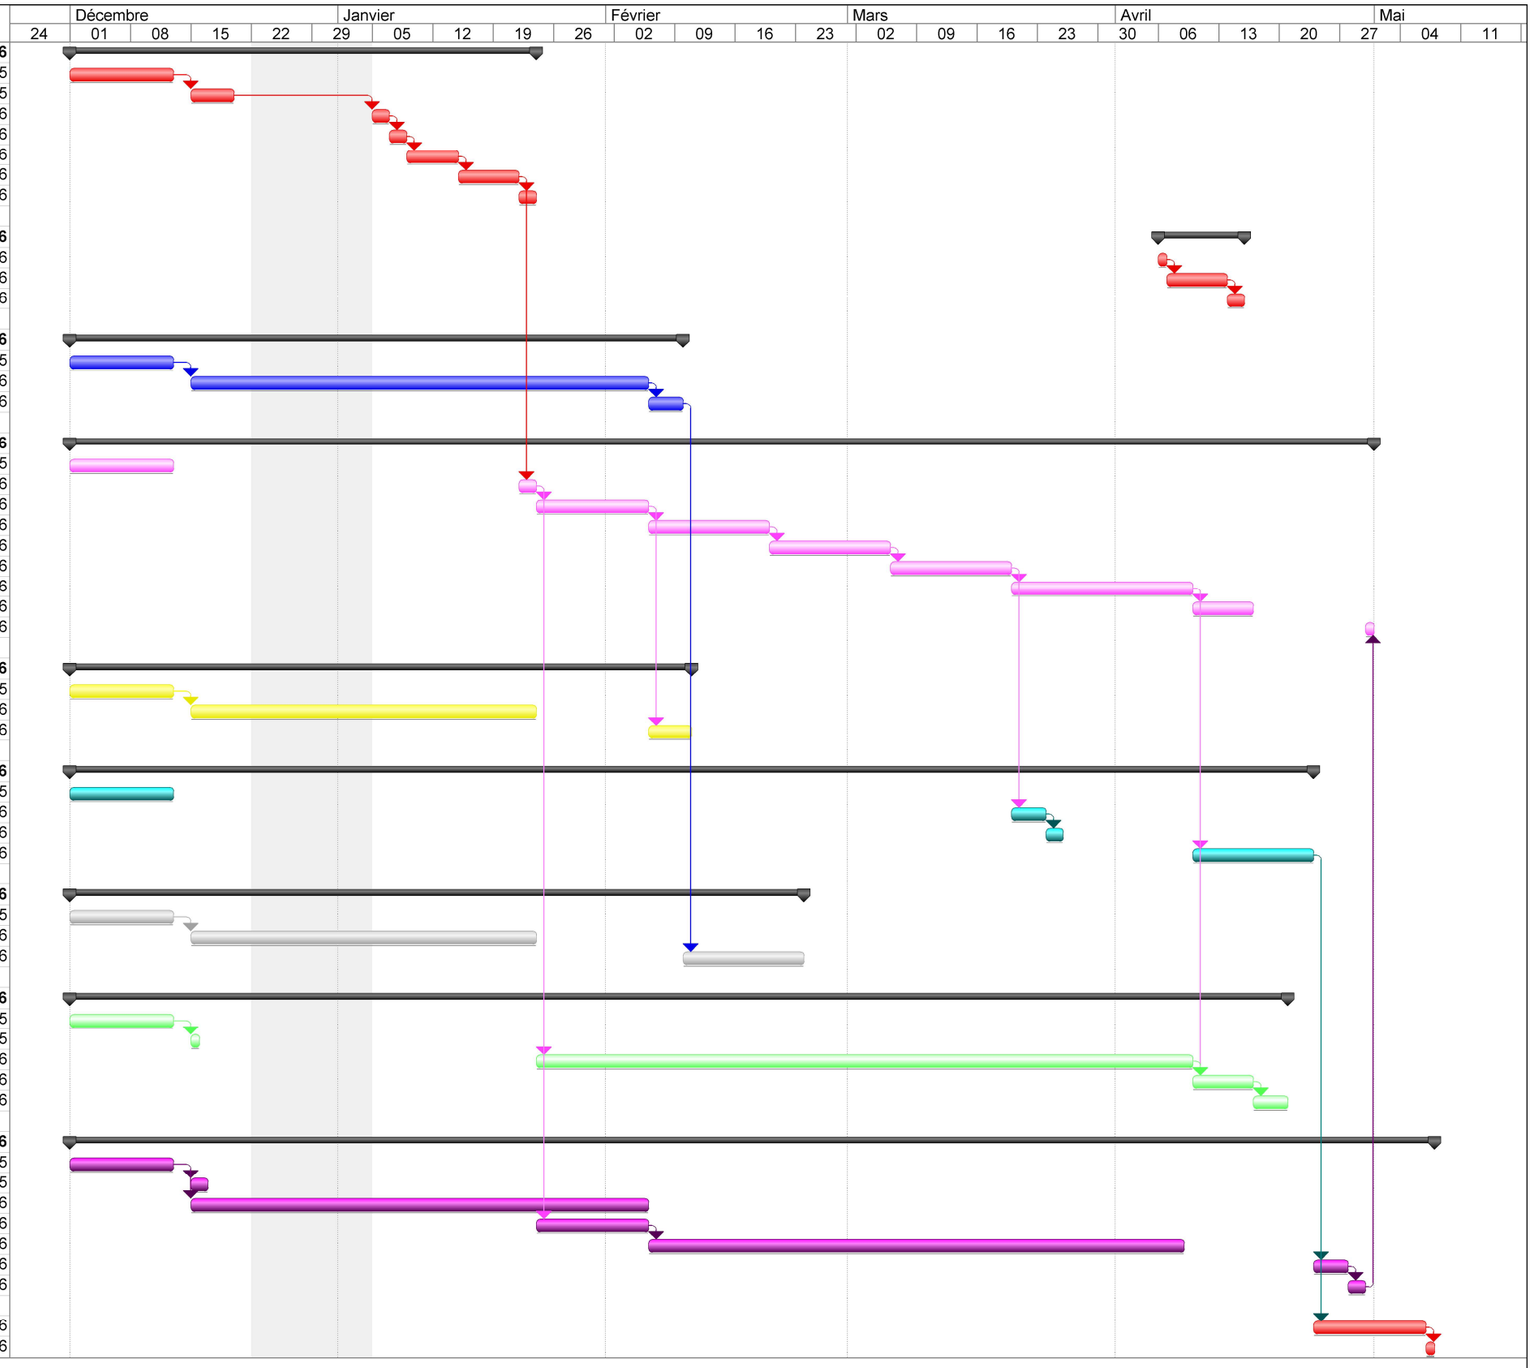

AMENAGEMENT D'UN LOCAL POUR L'ASSOCATION PHI-SCIENCES
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES - VANDOEUVRE LES NANCY
