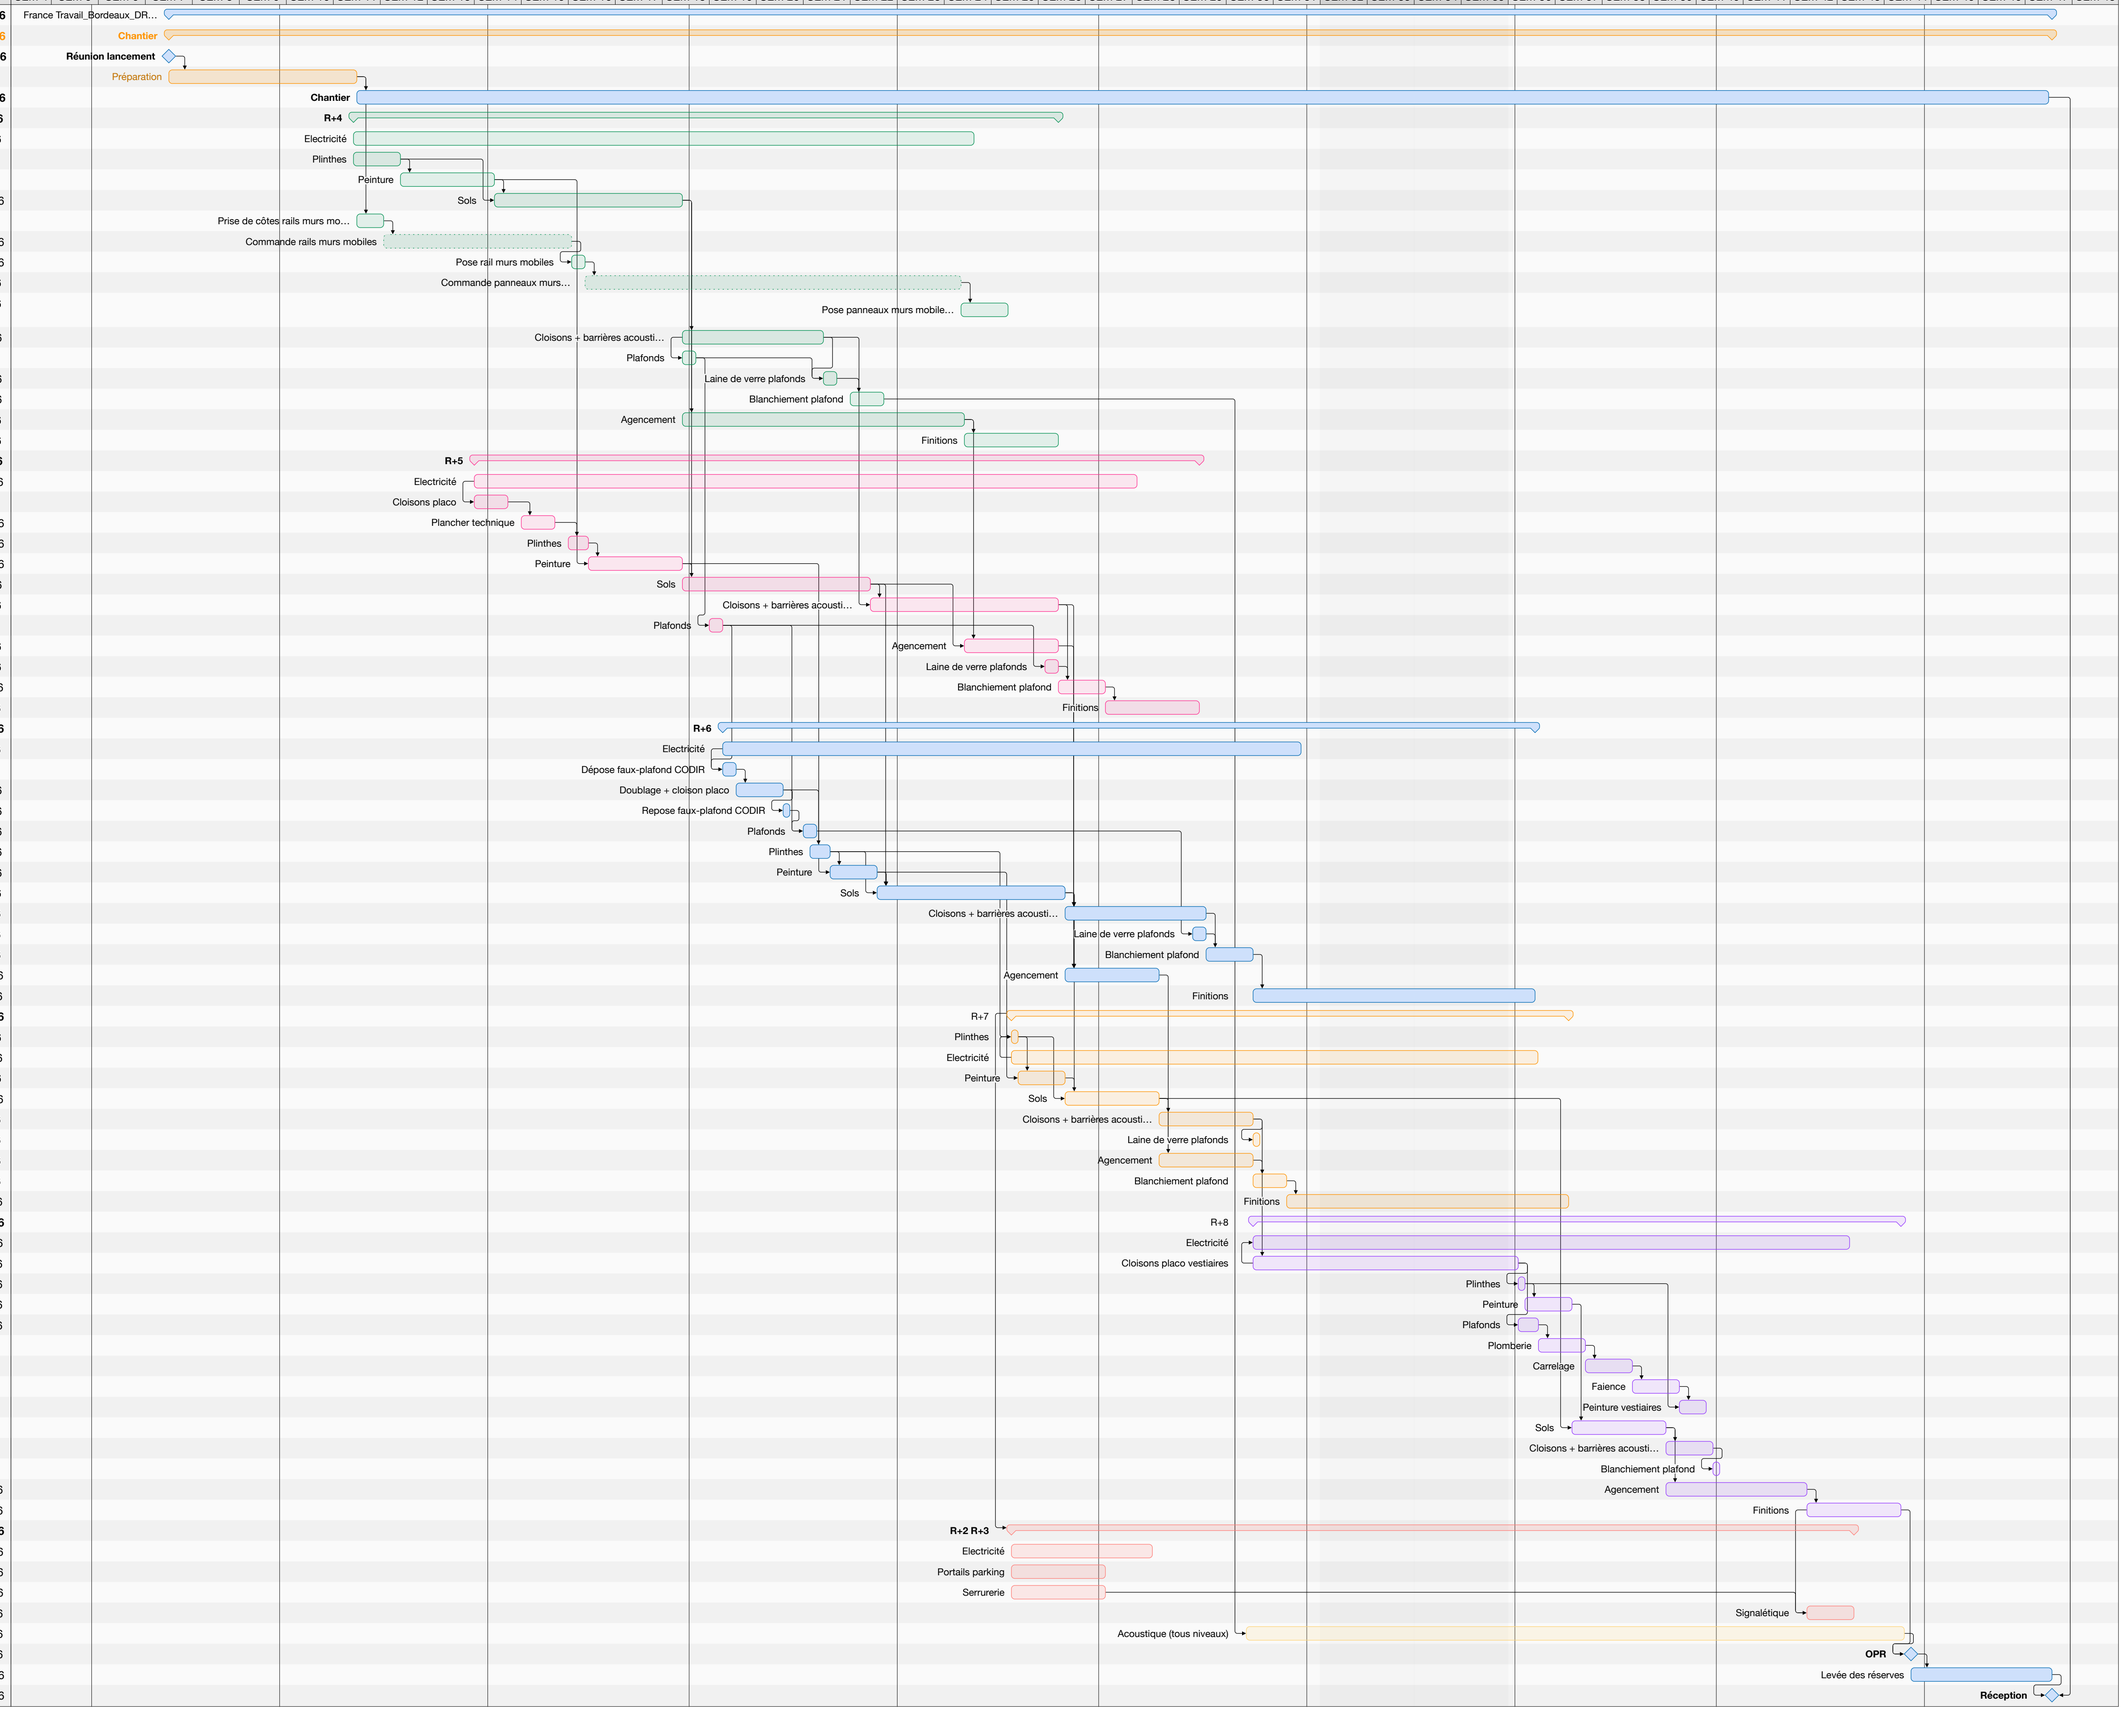Titre	Travail donné	Début prévu	Fin prévue
France Travail_Bordeaux_DR Le Lac		**12/02/2026**	**19 nov. 2026**
Chantier		12/02/2026	19 nov. 2026
Réunion lancement		**12/02/2026**	**12 févr. 2026**
Préparation	1 mois	12 févr. 2026	12/03/2026
Chantier	**8 mois**	**12/03/2026**	**19 nov. 2026**
R+4		**12/03/2026**	**24 juin 2026**
Electricité	3,32 mois	12/03/2026	12 juin 2026
Plinthes	1 semaine	12/03/2026	18/03/2026
Peinture	2 semaines	19/03/2026	1 avril 2026
Sols	1 mois	2 avril 2026	29 avril 2026
Prise de côtes rails murs mobiles	2 jours	12/03/2026	16/03/2026
Commande rails murs mobiles	4 semaines	16/03/2026	13 avril 2026
Pose rail murs mobiles	2 jours	13 avril 2026	15 avril 2026
Commande panneaux murs mobiles	8 semaines	15 avril 2026	10 juin 2026
Pose panneaux murs mobiles + réglages	1 semaine	10 juin 2026	17 juin 2026
Cloisons + barrières acoustiques	3 semaines	30 avril 2026	20 mai 2026
Plafonds	2 jours	30 avril 2026	1 mai 2026
Laine de verre plafonds	2 jours	21 mai 2026	22 mai 2026
Blanchiement plafond	1 semaine	25 mai 2026	29 mai 2026
Agencement	1,5 mois	30 avril 2026	10 juin 2026
Finitions	2 semaines	11 juin 2026	24 juin 2026
R+5	**2 mois**	**30/03/2026**	**15 juil. 2026**
Electricité	3,54 mois	30/03/2026	6 juillet 2026
Cloisons placo	1 semaine	30/03/2026	3 avril 2026
Plancher technique	1 semaine	6 avril 2026	10 avril 2026
Plinthes	3 jours	13 avril 2026	15 avril 2026
Peinture	2 semaines	16 avril 2026	29 avril 2026
Sols	1 mois	30 avril 2026	27 mai 2026
Cloisons + barrières acoustiques	1 mois	28 mai 2026	24 juin 2026
Plafonds	2 jours	4 mai 2026	5 mai 2026
Agencement	2 semaines	11 juin 2026	24 juin 2026
Laine de verre plafonds	2 jours	23 juin 2026	24 juin 2026
Blanchiement plafond	1 semaine	25 juin 2026	1 juillet 2026
Finitions	2 semaines	2 juillet 2026	15 juil. 2026
R+6	**2 mois**	**6 mai 2026**	**3 sept. 2026**
Electricité	3,11 mois	6 mai 2026	31 juil. 2026
Dépose faux-plafond CODIR	2 jours	6 mai 2026	7 mai 2026
Doublage + cloison placo	1 semaine	8 mai 2026	14 mai 2026
Repose faux-plafond CODIR	1 jour	15 mai 2026	15 mai 2026
Plafonds	2 jours	18 mai 2026	19 mai 2026
Plinthes	3 jours	19 mai 2026	21 mai 2026
Peinture	1 semaine	22 mai 2026	28 mai 2026
Sols	1 mois	29 mai 2026	25 juin 2026
Cloisons + barrières acoustiques	3 semaines	26 juin 2026	16 juil. 2026
Laine de verre plafonds	2 jours	15 juil. 2026	16 juil. 2026
Blanchiement plafond	1 semaine	17 juil. 2026	23 juil. 2026
Agencement	2 semaines	26 juin 2026	9 juillet 2026
Finitions	2 semaines	24 juil. 2026	3 sept. 2026
R+7	**2 mois**	**18 juin 2026**	**8 sept. 2026**
Plinthes	1 jour	18 juin 2026	18 juin 2026
Electricité	1,82 mois	18 juin 2026	4 sept. 2026
Peinture	1 semaine	19 juin 2026	25 juin 2026
Sols	2 semaines	26 juin 2026	9 juillet 2026
Cloisons + barrières acoustiques	2 semaines	10 juil. 2026	23 juil. 2026
Laine de verre plafonds	1 jour	24 juil. 2026	24 juil. 2026
Agencement	2 semaines	10 juil. 2026	23 juil. 2026
Blanchiement plafond	3 jours	24 juil. 2026	28 juil. 2026
Finitions	2 semaines	29 juil. 2026	8 sept. 2026
R+8	**2 mois**	**24 juil. 2026**	**28 oct. 2026**
Electricité	2,14 mois	24 juil. 2026	20 oct. 2026
Cloisons placo vestiaires	1,5sem	24 juil. 2026	1 sept. 2026
Plinthes	1 jour	1 sept. 2026	2 sept. 2026
Peinture	1 semaine	2 sept. 2026	9 sept. 2026
Plafonds	3 jours	1 sept. 2026	4 sept. 2026
Plomberie	1 semaine	4 sept. 2026	11/09/2026
Carrelage	1 semaine	11/09/2026	18/09/2026
Faience	1 semaine	18/09/2026	25/09/2026
Peinture vestiaires	2 jours	25/09/2026	29/09/2026
Sols	2 semaines	9 sept. 2026	23/09/2026
Cloisons + barrières acoustiques	1 semaine	23/09/2026	30/09/2026
Blanchiement plafond	1 jour	30/09/2026	1 oct. 2026
Agencement	3 semaines	23/09/2026	14 oct. 2026
Finitions	2 semaines	14 oct. 2026	28 oct. 2026
R+2 R+3	**2 mois**	**18 juin 2026**	**21 oct. 2026**
Electricité	3 semaines	18 juin 2026	8 juillet 2026
Portails parking	2 semaines	18 juin 2026	1 juillet 2026
Serrurerie	2 semaines	18 juin 2026	1 juillet 2026
Signalétique	1 semaine	14 oct. 2026	21 oct. 2026
Acoustique (tous niveaux)	10sem	23 juil. 2026	28 oct. 2026
OPR		30 oct. 2026	30 oct. 2026
Levée des réserves	3 semaines	30 oct. 2026	19 nov. 2026
Réception		19 nov. 2026	19 nov. 2026
