PLANNING PREVISIONNEL CHAMBRE DE METIERS D'ANGOULEME

FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES
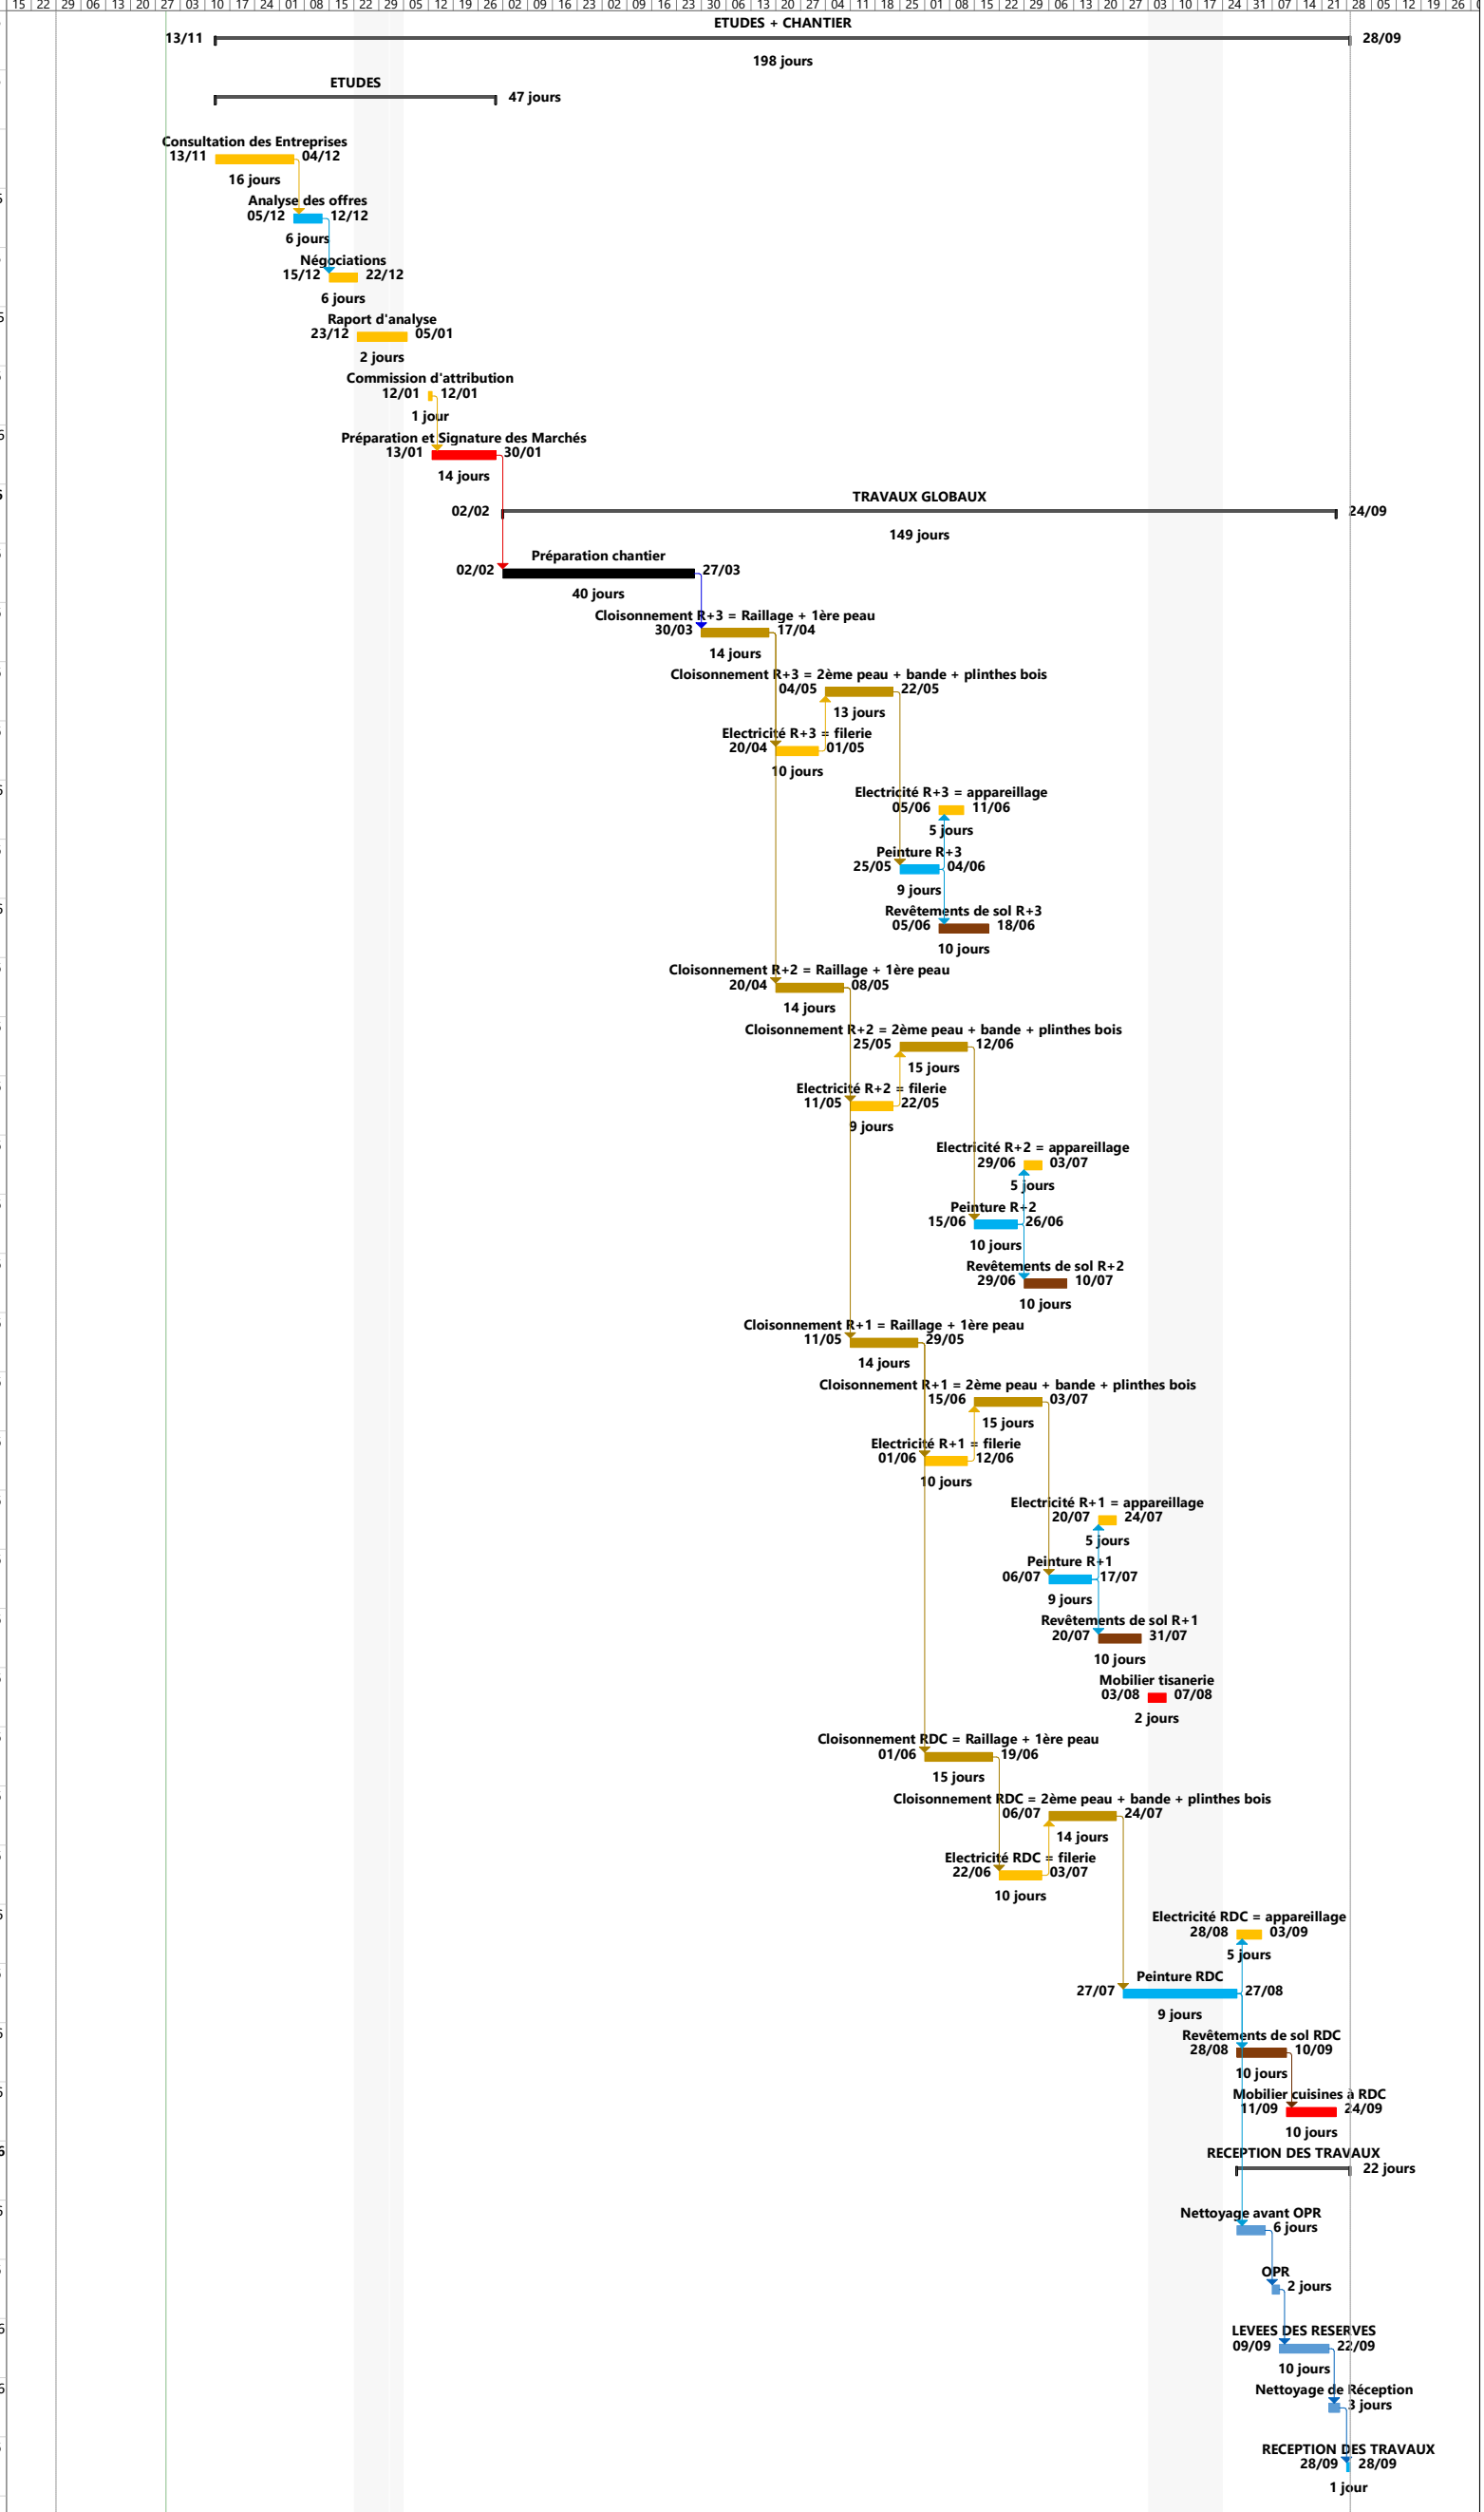
N°	Nom de la tâche	Fin	Début
1	**ETUDES + CHANTIER**	**Lun 28/09/26**	**Jeu 13/11/25**
2	**ETUDES**	**Ven 30/01/26**	**Jeu 13/11/25**
3	Consultation des Entreprises	Jeu 04/12/25	Jeu 13/11/25
4	Analyse des offres	Ven 12/12/25	Ven 05/12/25
5	Négociations	Lun 22/12/25	Lun 15/12/25
6	Raport d'analyse	Lun 05/01/26	Mar 23/12/25
7	Commission d'attribution	Lun 12/01/26	Lun 12/01/26
8	Préparation et Signature des Marchés	Ven 30/01/26	Mar 13/01/26
9	**TRAVAUX GLOBAUX**	**Jeu 24/09/26**	**Lun 02/02/26**
10	Préparation chantier	Ven 27/03/26	Lun 02/02/26
11	Cloisonnement R+3 = Raillage + 1ère peau	Ven 17/04/26	Lun 30/03/26
12	Cloisonnement R+3 = 2ème peau + bande + plinthes bois	Ven 22/05/26	Lun 04/05/26
13	Electricité R+3 = filerie	Ven 01/05/26	Lun 20/04/26
14	Electricité R+3 = appareillage	Jeu 11/06/26	Ven 05/06/26
15	Peinture R+3	Jeu 04/06/26	Lun 25/05/26
16	Revêtements de sol R+3	Jeu 18/06/26	Ven 05/06/26
17	Cloisonnement R+2 = Raillage + 1ère peau	Ven 08/05/26	Lun 20/04/26
18	Cloisonnement R+2 = 2ème peau + bande + plinthes bois	Ven 12/06/26	Lun 25/05/26
19	Electricité R+2 = filerie	Ven 22/05/26	Lun 11/05/26
20	Electricité R+2 = appareillage	Ven 03/07/26	Lun 29/06/26
21	Peinture R+2	Ven 26/06/26	Lun 15/06/26
22	Revêtements de sol R+2	Ven 10/07/26	Lun 29/06/26
23	Cloisonnement R+1 = Raillage + 1ère peau	Ven 29/05/26	Lun 11/05/26
24	Cloisonnement R+1 = 2ème peau + bande + plinthes bois	Ven 03/07/26	Lun 15/06/26
25	Electricité R+1 = filerie	Ven 12/06/26	Lun 01/06/26
26	Electricité R+1 = appareillage	Ven 24/07/26	Lun 20/07/26
27	Peinture R+1	Ven 17/07/26	Lun 06/07/26
28	Revêtements de sol R+1	Ven 31/07/26	Lun 20/07/26
29	Mobilier tisanerie	Ven 07/08/26	Lun 03/08/26
30	Cloisonnement RDC = Raillage + 1ère peau	Ven 19/06/26	Lun 01/06/26
31	Cloisonnement RDC = 2ème peau + bande + plinthes bois	Ven 24/07/26	Lun 06/07/26
32	Electricité RDC = filerie	Ven 03/07/26	Lun 22/06/26
33	Electricité RDC = appareillage	Jeu 03/09/26	Ven 28/08/26
34	Peinture RDC	Jeu 27/08/26	Lun 27/07/26
35	Revêtements de sol RDC	Jeu 10/09/26	Ven 28/08/26
36	Mobilier cuisines à RDC	Jeu 24/09/26	Ven 11/09/26
37	**RECEPTION DES TRAVAUX**	**Lun 28/09/26**	**Ven 28/08/26**
38	Nettoyage avant OPR	Ven 04/09/26	Ven 28/08/26
39	OPR	Mar 08/09/26	Lun 07/09/26
40	LEVEES DES RESERVES	Mar 22/09/26	Mer 09/09/26
41	Nettoyage de Réception	Ven 25/09/26	Mer 23/09/26
42	RECEPTION DES TRAVAUX	Lun 28/09/26	Lun 28/09/26
43
