CNRS MULHOUSE - PLANNING TRAVAUX IND A - 23 01 2026
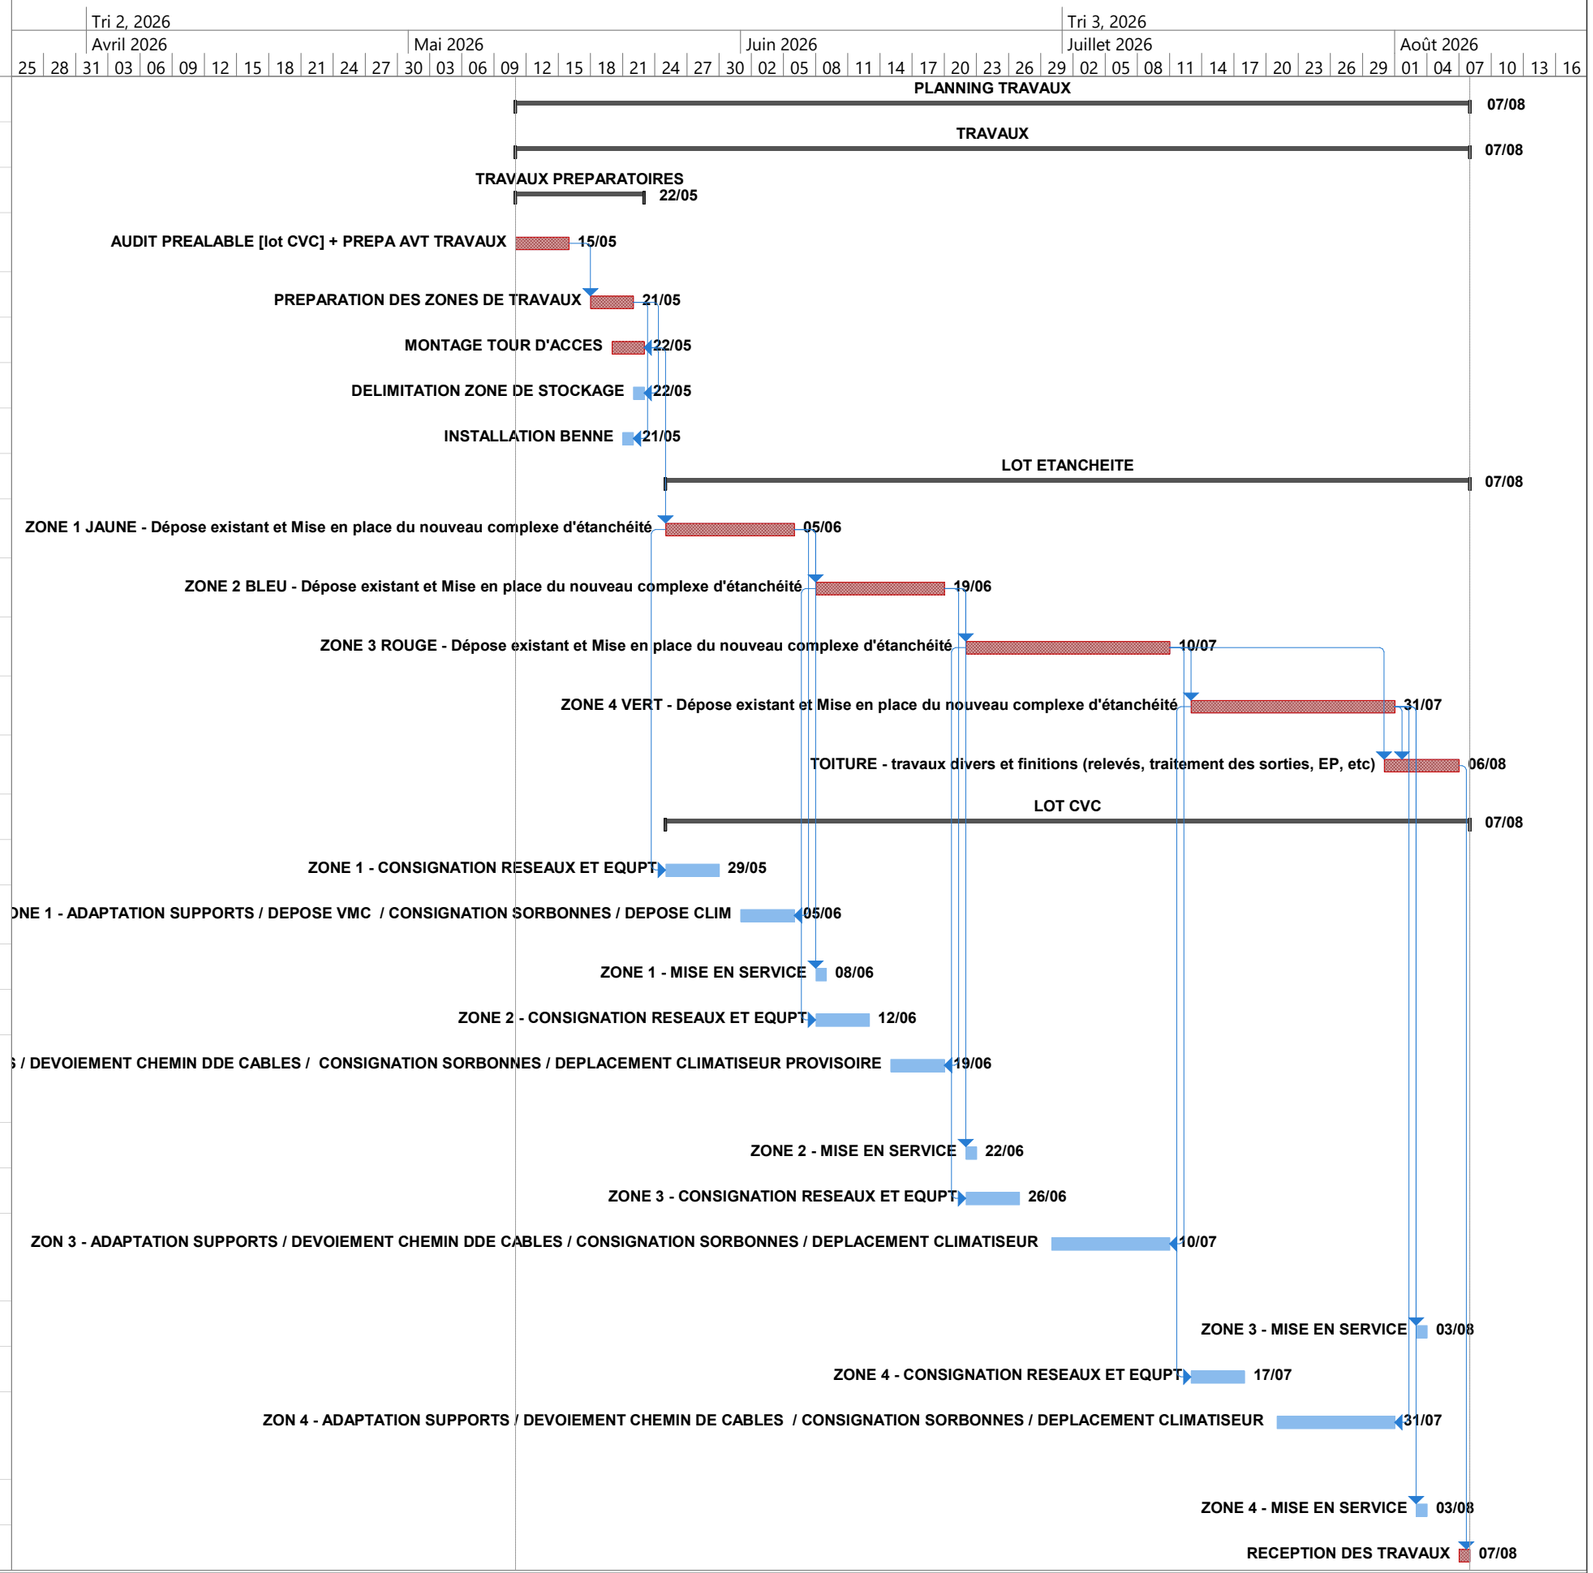
N°	Nom de la tâche	Durée	Début
1	**PLANNING TRAVAUX**	**65 jours**	**11/05/2026**
2	**TRAVAUX**	**65 jours**	**11/05/2026**
3	**TRAVAUX PREPARATOIRES**	**10 jours**	**11/05/2026**
4	AUDIT PREALABLE [lot CVC] + PREPA AVT TRAVAUX	5 jours	11/05/2026
5	PREPARATION DES ZONES DE TRAVAUX	4 jours	18/05/2026
6	MONTAGE TOUR D'ACCES	3 jours	20/05/2026
7	DELIMITATION ZONE DE STOCKAGE	1 jour	22/05/2026
8	INSTALLATION BENNE	1 jour	21/05/2026
9	**LOT ETANCHEITE**	**55 jours**	**25/05/2026**
10	ZONE 1 JAUNE - Dépose existant et Mise en place du nouveau complexe d'étanchéité	10 jours	25/05/2026
11	ZONE 2 BLEU - Dépose existant et Mise en place du nouveau complexe d'étanchéité	10 jours	08/06/2026
12	ZONE 3 ROUGE - Dépose existant et Mise en place du nouveau complexe d'étanchéité	15 jours	22/06/2026
13	ZONE 4 VERT - Dépose existant et Mise en place du nouveau complexe d'étanchéité	15 jours	13/07/2026
14	TOITURE - travaux divers et finitions (relevés, traitement des sorties, EP, etc)	5 jours	31/07/2026
15	**LOT CVC**	**55 jours**	**25/05/2026**
16	ZONE 1 - CONSIGNATION RESEAUX ET EQUPT	5 jours	25/05/2026
17	ZONE 1 - ADAPTATION SUPPORTS / DEPOSE VMC / CONSIGNATION SORBONNES / DEPOSE CLIM	5 jours	01/06/2026
18	ZONE 1 - MISE EN SERVICE	1 jour	08/06/2026
19	ZONE 2 - CONSIGNATION RESEAUX ET EQUPT	5 jours	08/06/2026
20	ZONE 2 - ADAPTATION SUPPORTS / DEVOIEMENT CHEMIN DDE CABLES / CONSIGNATION SORBONNES / DEPLACEMENT CLIMATISEUR PROVISOIRE	5 jours	15/06/2026
21	ZONE 2 - MISE EN SERVICE	1 jour	22/06/2026
22	ZONE 3 - CONSIGNATION RESEAUX ET EQUPT	5 jours	22/06/2026
23	ZON 3 - ADAPTATION SUPPORTS / DEVOIEMENT CHEMIN DDE CABLES / CONSIGNATION SORBONNES / DEPLACEMENT CLIMATISEUR	9 jours	30/06/2026
24	ZONE 3 - MISE EN SERVICE	1 jour	03/08/2026
25	ZONE 4 - CONSIGNATION RESEAUX ET EQUPT	5 jours	13/07/2026
26	ZON 4 - ADAPTATION SUPPORTS / DEVOIEMENT CHEMIN DE CABLES / CONSIGNATION SORBONNES / DEPLACEMENT CLIMATISEUR	9 jours	21/07/2026
27	ZONE 4 - MISE EN SERVICE	1 jour	03/08/2026
28	RECEPTION DES TRAVAUX	1 jour	07/08/2026
