Diagramme de Gantt
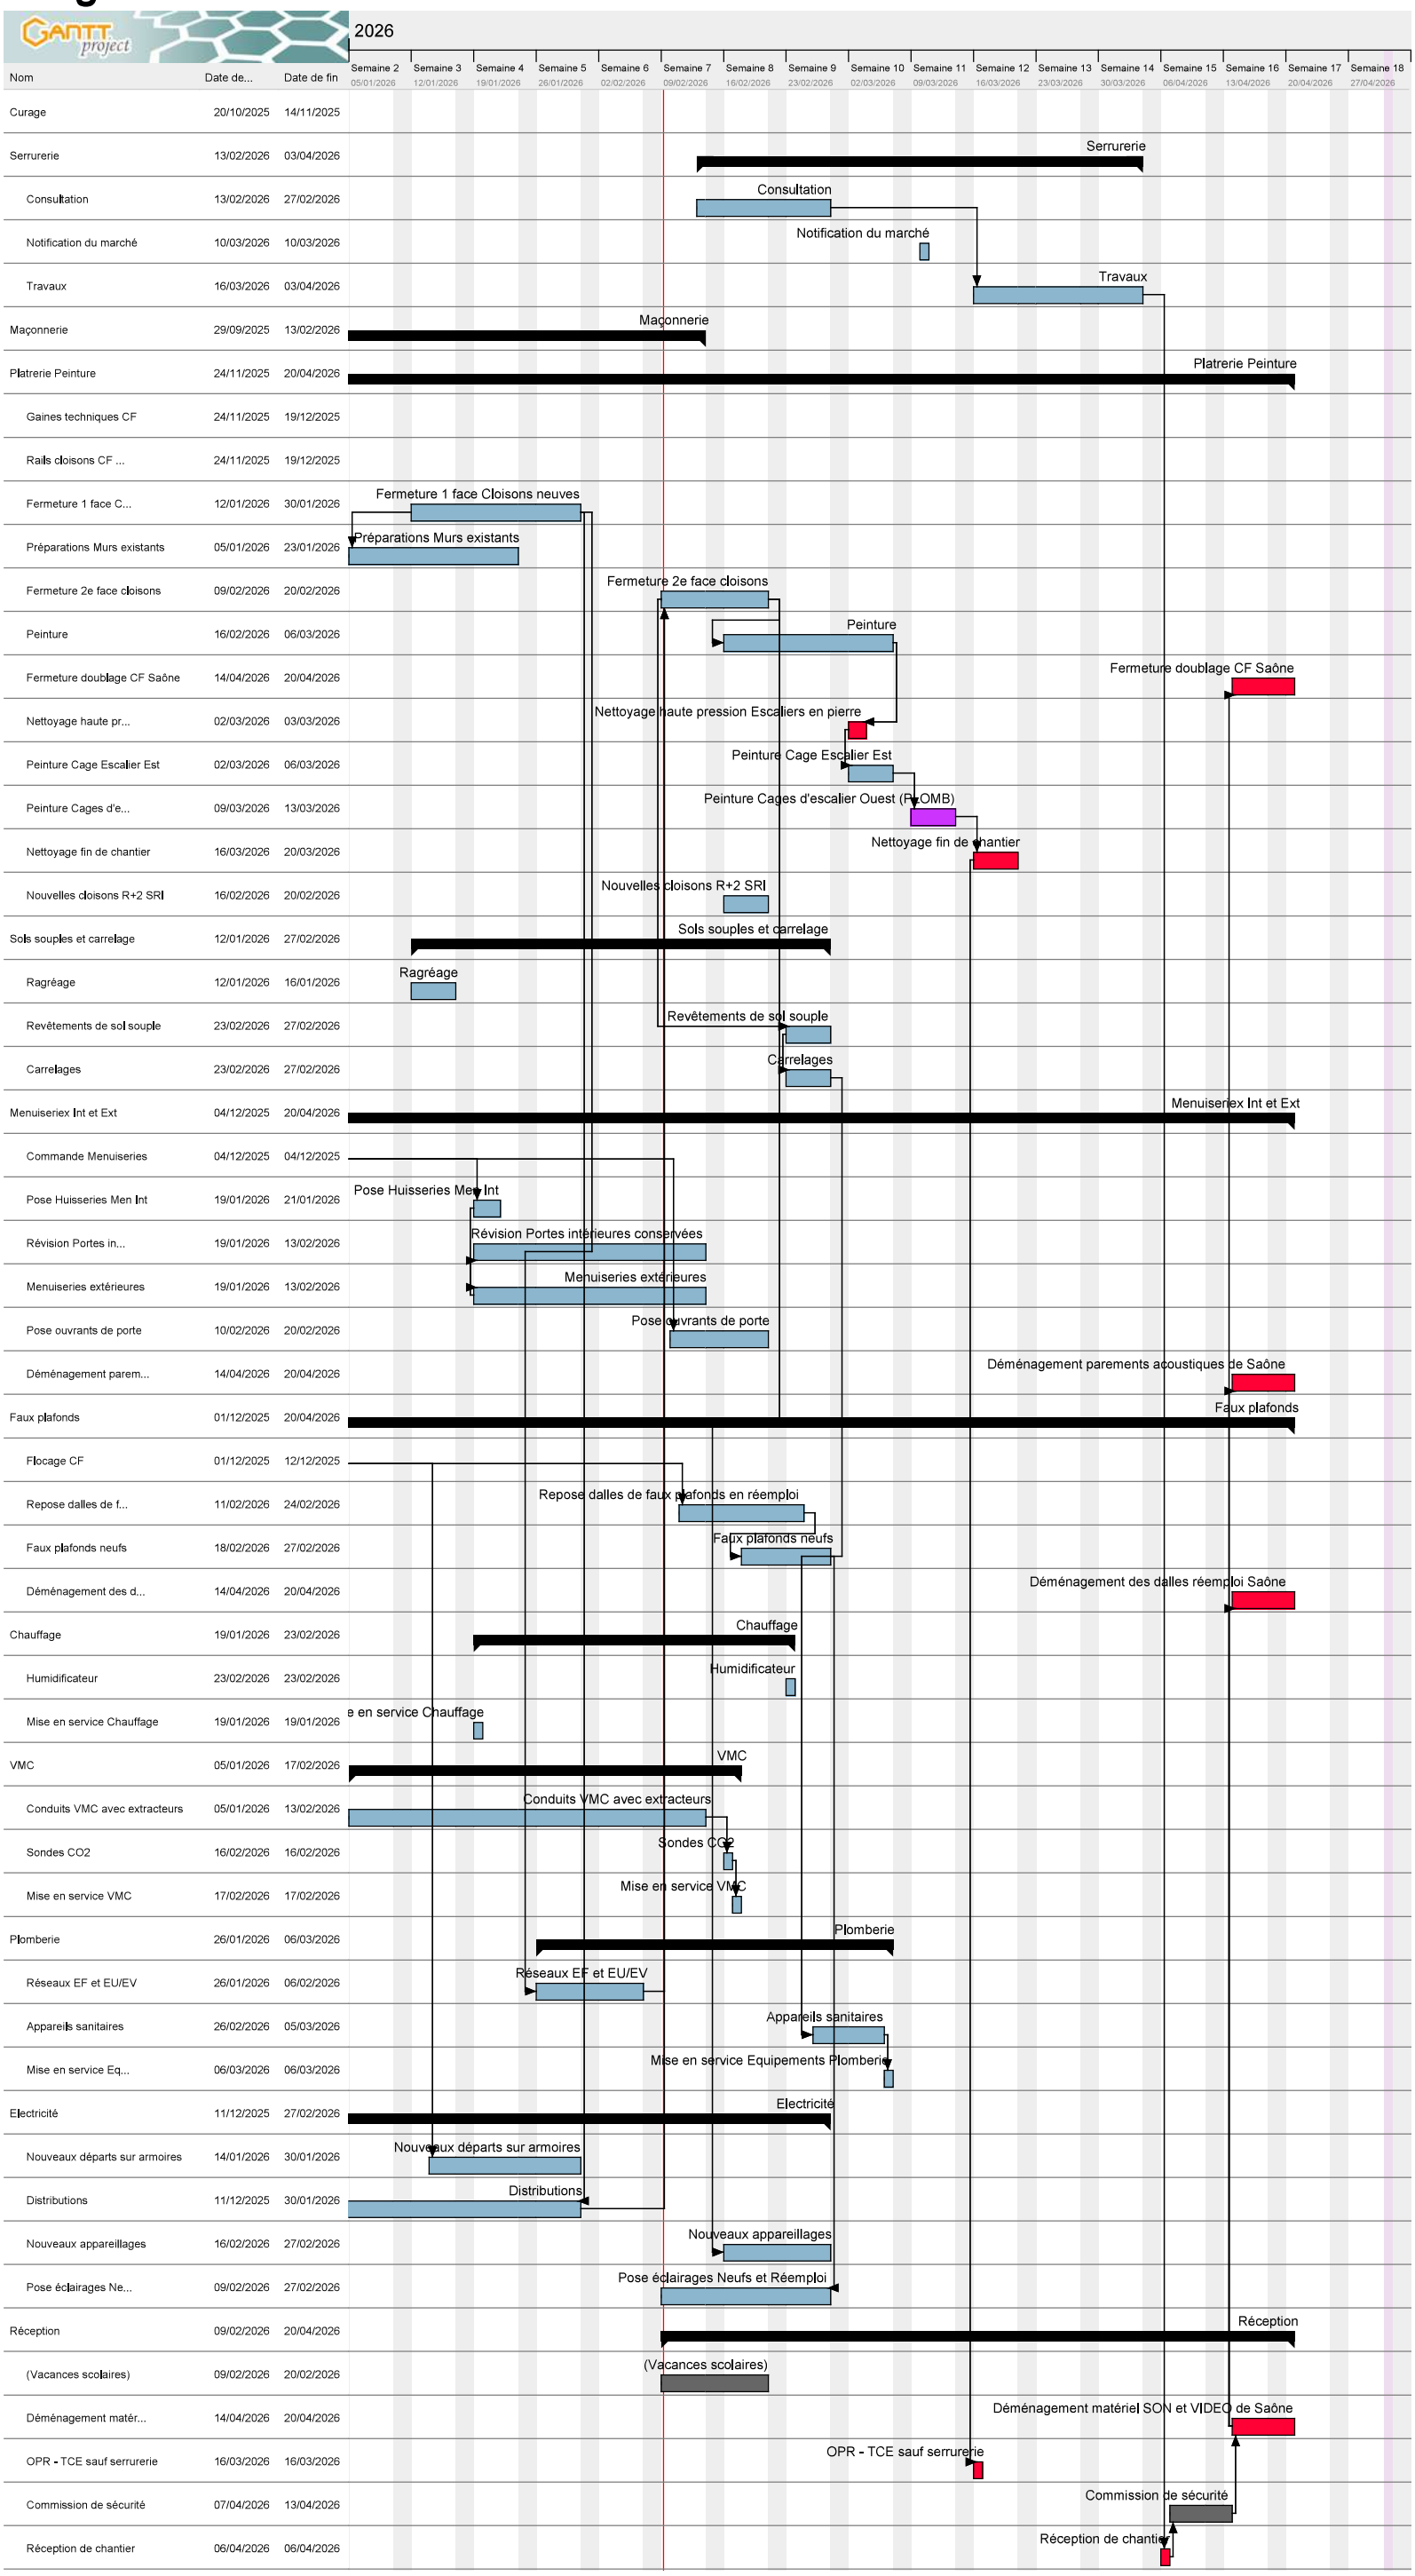
Nom	Date de...	Date de fin
Curage	20/10/2025	14/11/2025
Serrurerie	13/02/2026	03/04/2026
Consultation	13/02/2026	27/02/2026
Notification du marché	10/03/2026	10/03/2026
Travaux	16/03/2026	03/04/2026
Maçonnerie	29/09/2025	13/02/2026
Platrerie Peinture	24/11/2025	20/04/2026
Gaines techniques CF	24/11/2025	19/12/2025
Rails cloisons CF ...	24/11/2025	19/12/2025
Fermeture 1 face C...	12/01/2026	30/01/2026
Préparations Murs existants	05/01/2026	23/01/2026
Fermeture 2e face cloisons	09/02/2026	20/02/2026
Peinture	16/02/2026	06/03/2026
Fermeture doublage CF Saône	14/04/2026	20/04/2026
Nettoyage haute pr...	02/03/2026	03/03/2026
Peinture Cage Escalier Est	02/03/2026	06/03/2026
Peinture Cages d'e...	09/03/2026	13/03/2026
Nettoyage fin de chantier	16/03/2026	20/03/2026
Nouvelles cloisons R+2 SRI	16/02/2026	20/02/2026
Sols souples et carrelage	12/01/2026	27/02/2026
Ragréage	12/01/2026	16/01/2026
Revêtements de sol souple	23/02/2026	27/02/2026
Carrelages	23/02/2026	27/02/2026
Menuiseriex Int et Ext	04/12/2025	20/04/2026
Commande Menuiseries	04/12/2025	04/12/2025
Pose Huisseries Men Int	19/01/2026	21/01/2026
Révision Portes in...	19/01/2026	13/02/2026
Menuiseries extérieures	19/01/2026	13/02/2026
Pose ouvrants de porte	10/02/2026	20/02/2026
Déménagement parem...	14/04/2026	20/04/2026
Faux plafonds	01/12/2025	20/04/2026
Flocage CF	01/12/2025	12/12/2025
Repose dalles de f...	11/02/2026	24/02/2026
Faux plafonds neufs	18/02/2026	27/02/2026
Déménagement des d...	14/04/2026	20/04/2026
Chauffage	19/01/2026	23/02/2026
Humidificateur	23/02/2026	23/02/2026
Mise en service Chauffage	19/01/2026	19/01/2026
VMC	05/01/2026	17/02/2026
Conduits VMC avec extracteurs	05/01/2026	13/02/2026
Sondes CO2	16/02/2026	16/02/2026
Mise en service VMC	17/02/2026	17/02/2026
Plomberie	26/01/2026	06/03/2026
Réseaux EF et EU/EV	26/01/2026	06/02/2026
Appareils sanitaires	26/02/2026	05/03/2026
Mise en service Eq...	06/03/2026	06/03/2026
Electricité	11/12/2025	27/02/2026
Nouveaux départs sur armoires	14/01/2026	30/01/2026
Distributions	11/12/2025	30/01/2026
Nouveaux appareillages	16/02/2026	27/02/2026
Pose éclairages Ne...	09/02/2026	27/02/2026
Réception	09/02/2026	20/04/2026
(Vacances scolaires)	09/02/2026	20/02/2026
Déménagement matér...	14/04/2026	20/04/2026
OPR - TCE sauf serrurerie	16/03/2026	16/03/2026
Commission de sécurité	07/04/2026	13/04/2026
Réception de chantier	06/04/2026	06/04/2026
